

MEMORANDO

PARA **Johanna Alejandra Sanchez Muñoz**
1.3.2. Gerencia Contratación

DE **1.13. Vicepresidencia De Tecnología Y Transformación Digital**

ASUNTO Remisión Informes de Supervisión y pago Factura(s) y Soportes

FECHA 02/10/2025 10:46:54 a. m.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica previstas en el Anexo 2 – Reglas para la supervisión contractual del Manual de Contratación, versión 5, remitimos la siguiente relación de documentos correspondiente al Contrato 173-2023, con el fin de que se proceda a su archivo en el expediente contractual electrónico correspondiente.

ITEM	# Informe	# Factura Original	# Documento de Pago (Orden de Pago)	Total, imágenes
1	36	45	5300483370	99
2	37	46	5300507172	54
3	38	47	5300545106	103

Cordialmente,

JESSEBELL CRISTINA MEJIAS LINARES
Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital

Anexos: Dos archivos PDF

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016				
	PROCESO CONTRATACION		Versión: 1				
INFORME No 36		FACTURA No No. FE 45		FECHA			
No. DE ACEPTACIÓN: 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737				15	07	25	
				dd	mm	aaaa	
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONTRATO No 173		DE 2023		TIPO DE CONTRA1 Prestación de servicios			
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)		(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)			
ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN		SECRETARIA GENERAL					
(Nombre del ordenador del Gasto)		(Cargo del ordenador del Gasto)					
CONTRATISTA CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA		(Escriba el nombre o razón social del contratista)					
TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL ☒ COLEGIADA ☐							
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Juan Sebastian Cardenas Hernández		(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)					
APOYO SUPERVISIÓN Enrique Alfredo Arrazola Montes		Jonathan Escobar Rodriguez					
(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)		(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)					
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATAR UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD QUE PROPORCIONE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRADOS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO							
DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO		VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL (Gerencia de Ciberseguridad y Aseguramiento Informatico)					
		(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		24 Meses					
		(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		22	DE	dic	DE	2023	
		(Día)		(Mes)		(Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		21	DE	dic	DE	2025	
		(Día)		(Mes)		(Año)	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		5400001604 - 6200000102 - 5400001890 - 6200000115					
VALOR DEL CONTRATO							
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$36.499.583.610,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A LAS QUE HAYA LUGAR. ADICIÓN NRO. 1 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$19.922.987.493) El valor del presente contrato es hasta la suma DE CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE (\$56.422.571.103)							
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)							
PRÓRROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES			
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No	DESDE	HASTA
		1	\$ 19.922.987.493	5400001890			

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 36.499.583.610,00	64,69%
Adiciones	\$ 19.922.987.493,00	35,31%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 56.422.571.103,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 46.448.512.481,00	82,32%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 613.778.200,00	1,09%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 47.062.290.681,00	83,41%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		83,45%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		-0,04%

OBSERVACIONES

Cuenta 36: Pago de administración y soporte de los Items 1-16 prefectura C-2-38
Periodo del 22 de abril de 2025 al 21 de mayo de 2025
La diferencia en la ejecución Presupuestal se presenta por cobros de ANS en cuentas 3 y 4.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	74%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	74%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0%

*Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI ☐ NO ☒

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación ☐ Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos para el CTO 173 de 2023, encontrando que el contratista cumplió con todas las actividades estipuladas contractualmente sin que se dé lugar a ninguna penalización.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 173 de 2023 en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa y, por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta, la cual es por valor de Seiscientos trece millones setecientos setenta y ocho mil doscientos PESOS MCTE (\$ 613.778.200).

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE CIBERSEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO INFORMATICO, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 173 DEL 2023

CERTIFICA:

Que CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA, identificado con NIT. No 901781625-1, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 173 del 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social ☒	PDF	Certificaciones, planilla pago parafiscales
Informes ☒	PDF	Informe de Supervisión Informe Gestión Proveedor
Actas ☒	PDF	Acta Seguimiento Mensual ANS
OTROS ☒	PDF	Pre-factura Certificación Cuenta Bancaria Rut's Resolución Facturación Certificación Cumplimiento Circular SFC

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Quince

15

días del mes de

julio

de

2025

(día en letras)

(día en números)

(mes en letras)

(Año)

Juan Sebastian Cardenas Hernández

**Gerente de Ciberseguridad y Aseguramiento Informatico
Supervisor CTO173-2023**

Revisó y aprobó: Enrique Alfredo Arrazola Montes - Jonathan Escobar Rodríguez Apoyos a la supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	20

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100001335	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	16.07.2025	Fecha contab.	16.07.2025	Período	07
Calc.impuestos	☒				
Referen.	45				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202507160868627				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003700788	CONSORCIO UNIDAD DE		W0	576,043,735-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	34,162,520
3	91	5130950408	GESTION Y MON SGSI		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	88,040,960
5	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	337,836,240
7	91	5130950401	CENTRO OPER SEG		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	40,327,910
9	91	5130950405	END POINT SECURITY		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	16,993,200
11	91	5130950408	GESTION Y MON SGSI		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	27,906,690
13	91	5130950408	GESTION Y MON SGSI		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	31,474,310
15	91	5130950409	SERV SEGURID INFORMA		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	37,036,370
17	91	5130950408	GESTION Y MON SGSI		W0	0
18	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			18,052,300-
19	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			14,699,730-
20	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			4,982,435-



**CONSORCIO UNIDAD DE
CIBERSEGURIDAD FNA**
NIT 901.781.625-1
CALLE 99 10 19
Tel: (601) 5527210
Bogotá - Colombia
contadorjunior@mnemo.com



**Factura electrónica de venta
No. FE 45**

Señores	Fondo Nacional de Ahorro SA		
NIT	899.999.284-4	Teléfono	(601) 3810150 - Ext. 000
Dirección	CR 12 65 11	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/07/2025, 14:50
Expedición	16/07/2025, 14:50
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor desc.	Vr. Total
1	Administración y soporte de la plataforma XDR N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	3,957,940.00
2	Administración y soporte de la plataforma SIEM N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	181,966,470.00
3	Administración y soporte de la plataforma SOAR N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	17,406,130.00
4	Administración y soporte de la plataforma THREAT INTELLIGENCE. N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	33,078,430.00
5	Administración y soporte Servicio BRAND CYBERSECURITY MONITORING. N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	66,632,860.00
6	Administración y soporte Servicio de MONITOREO DE DNS N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	61,978,770.00
7	Administración y soporte de la plataforma SECURE DEVELOPMENT ASSESSMENT N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	9,852,010.00
8	Administración y soporte Endpoint PROTECCIÓN ANTIMALWARE, CONTROL DE APLICACIONES, PROTECCIÓN WEB, CONTROL DE ACCESO SEGURO A LA NUBE, SERVER SECURITY, INTRUSION PREVENTION SYSTEM, ISOLATED EXECUTION. N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	40,327,910.00
9	Administración y soporte de la plataforma CIBERDEFENSA. N° de aceptación de 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	6,990,060.00
10	Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	10,003,140.00
11	Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE BASES DE DATOS (DAM) N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	27,906,690.00
12	Administración y soporte de la plataforma SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES (Actividades de responsabilidad con 4.16. SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES Anexo técnico). N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	31,474,310.00
	Administración y soporte de la plataforma (ASM) - Attack			

13	Surface Management por la vigencia del Contrato. N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	29,968,960.00
14	Administración y soporte de la plataforma para la protección, control y monitoreo del acceso y uso de las cuentas privilegiadas - PAM. N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	34,162,520.00
15	Administración y soporte de la plataforma (MAS) para la validación de controles y protección de la aplicación móvil del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	9,832,970.00
16	Administración y soporte del servicio de Ciber-analítica (Recurrente a partir del 8 de mayo, fecha de salida en producción) N° de aceptación 1000056706 / 1000056725 / 1000056731 / 1000056732 / 1000056734 / 1000056735 / 1000056736 / 1000056737	1.00	0.00	48,239,030.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Seiscientos trece millones setecientos setenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-15 por \$ 613,778,200.00

Observaciones:
Distribucción de ingresos:

Mnemo Colombia S.A.S. 49% NIT 900.396.176-1 Contribuyente
Mnemo Cyber Sec SAS 50% NIT 901.447.968-1 Contribuyente
Mnemo Evolution & integration Service SA 1% NIT:901.306.687-2 Contribuyente

Total Bruto	515,780,000.00
IVA 19%	97,998,200.00
Total a Pagar	613,778,200.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085737391 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 33 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 9.66
CUFE: 7ba1a8502dbc6c75116c06b7ac2db6fb98973b1341dac756eab9734502cece2d822c6ad416b7ef661a03ff7a50ed38c5

CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA
NIT 901.781.625-1

CERTIFICA QUE:

HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 8.770.446 expedida en Soledad-Atlántico, obrando en calidad de Representante legal del **CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA**, identificado con el NIT No. 901.781.625-1, de conformidad con lo establecido en el documento de conformación del CONSORCIO en mención, medio del presente me permito **CERTIFICAR**, que el CONSORCIO no tiene empleados a cargo vinculados para el proyecto del Contrato No. 173-2023, suscrito entre el **CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA** y el **FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA**, razón por la cual no estamos obligados a realizar pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, como quiera que el personal del proyecto se encuentra vinculado directamente por **MNEMO COLOMBIA S.A.S.** con una participación del 49%, **MNEMO CYBER SEC SAS** con una participación del 50% y **MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES SAS** con una participación del 1%.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los Once (7) siete días del mes de Julio de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,



HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO

Representante Legal **CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA**

C.C. No. 8.770.446 expedida en Soledad-Atlántico.

Dirección: Calle 99 No. 10 – 19 Oficina 502 Edificio Trade Center de Bogotá D.C.

Teléfono: 6913133 – 310 8569109

Correo electrónico: h.dejesusvelez@mnemo.com



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 -
PERSONA JURÍDICA.**

HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. **8.770.446** de Soledad - Atlántico, y con Tarjeta Profesional No. 61.061-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad extranjera con sucursal en Colombia **MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES SA**, identificada con NIT 901.306.687-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sucursal en mención **NO CUENTA CON PERSONAL VINCULADO EN COLOMBIA** por lo que no tiene obligaciones pendientes durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Bogotá D.C., a los Once (07) siete días del mes de Julio de 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Velez Castro', written over a horizontal dashed line.

HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO

C.C. 8.770.446 de Soledad – Atlántico

T.P. No. 61.061-T de la Junta Central de Contadores de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

61061-T

HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO
C.C. 8770446
RES. INSCRIPCION 98 DEL 20/06/1998
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251625 69149

Identificación Plástica S.A. 1800176118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.





FIRMA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

C E R T I F I C A

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, la empresa **MNEMO CYBER SEC SAS**, con NIT **901.447.968-1**, legalmente constituida, cuyo domicilio principal se encuentra en la CL 99 10 19 OF 502, de la ciudad de Bogotá, D.C., dedicada a la actividad de desarrollo de sistemas informáticos CIIU 6201, durante el período de los **ÚLTIMO SEIS MESES**, presentó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se pudo verificar que la administración ha cumplido con lo establecido en norma.

Que los registros presentados se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan los pagos a la seguridad social y parafiscales.

Esta certificación se expide por el Revisor Fiscal **JAIRO DAVID TOVAR LOZANO**, identificado C.C. 1.018.408.876 de Bogotá y T.P. 232325-T, para el único fin consagrado en la norma mencionada anteriormente.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Bogotá, D.C., a los (7) Siete días del mes de Julio de 2025.

At.



JAIRO DAVID TOVAR LOZANO

Revisor Fiscal T.P. 232325-T

C.C.1.018.408.876 de Bogotá

Cel.3017710213

contadorjunior@mnemo.com

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

C E R T I F I C A

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, la empresa **MNEMO COLOMBIA S.A.S., con NIT 900.396.176-1**, legalmente constituida, cuyo domicilio principal se encuentra en la CL 99 10 19 OF 502, de la ciudad de Bogotá, D.C., dedicada a la actividad de desarrollo de sistemas informáticos CIIU 6201, durante el período de los **ÚLTIMO SEIS MESES**, presentó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se pudo verificar que la administración ha cumplido con lo establecido en norma.

Que los registros presentados se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan los pagos a la seguridad social y parafiscales.

Esta certificación se expide por el Revisor Fiscal **JOSÉ IGNACIO SALAZAR GÓMEZ**, identificado C.C. 14.239.581 de Ibagué y T.P. 27.398-T, para el único fin consagrado en la norma mencionada anteriormente.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Bogotá, D.C., a los (07) siete días del mes de Julio de 2025.

At.



JOSE IGNACIO SALAZAR GOMEZ

Revisor Fiscal T.P. 27.398-T

C.C. 14.239.581 de Ibagué – Cel. 3158889246 joseignaciosago@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901447968	1	MNEMO CYBER SEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 99 10 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5527210	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2025-05	2025-06	1558804645	9487513548	E	2025/06/17	2025/06/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$64,809,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (43 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (42 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (42 Afiliados)																														
1	CC	80180206	AMAZO WALTER																	230301	28	EPS008	28	CCF24	28	14-25	28	0.522%	28	SI
2	CC	80180206	AMAZO WALTER										X							230301	2	EPS008	2	CCF24	0	14-25	2	0.000%	0	SI
3	CC	80759237	AREVALO EDWIN	X																25-14	19	EPS008	19	CCF24	19	14-25	19	0.522%	19	SI
4	CC	1015425546	CAITA CHRISTIAM																	25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
5	CC	80772089	CARDENAS ROGER	X																231001	5	EPS005	5	CCF24	5	14-25	5	0.522%	5	SI
6	CC	1070981128	COLLAZOS MATEO																	25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
7	CC	1018423823	CORTES ALFREDO																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
8	CC	80169118	COY JOHAN																	230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
9	CC	79619776	ENCISO JOHN																	230301	26	MIN001	26	CCF24	26	14-25	26	0.522%	26	SI
10	CC	79619776	ENCISO JOHN										X							230301	2	MIN001	2	CCF24	0	14-25	2	0.000%	0	SI
11	CC	79619776	ENCISO JOHN										X							230301	2	MIN001	2	CCF24	0	14-25	2	0.000%	0	SI
12	CC	91180662	GARRIDO YEINSON																	230301	30	MIN001	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
13	CC	80833507	GONZALEZ WILLIAM	X																230301	19	EPS008	19	CCF24	19	14-25	19	0.522%	19	SI
14	CC	1000351203	GUTIERREZ ESTEBAN	X																230301	24	EPS010	24	CCF24	24	14-25	24	0.522%	24	SI
15	CC	80048819	JARAMILLO MIGUEL																	25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
16	CC	1024460422	JIMENEZ BRAYAN									X								25-14	30	EPSC34	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
17	CC	1193390038	LIZARAZO ANDREY																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
18	CC	1015474263	LOZANO JOHAN									X								25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
19	CC	1019138524	MALLAMA JOHNNY									X								230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
20	CC	1136889383	MARQUEZ FRANCISCO	X																230301	17	EPS005	17	CCF24	17	14-25	17	0.522%	17	SI
21	CC	1016017636	MARTIN GUSTAVO																	25-14	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
22	CC	13871620	MARTINEZ HECTOR																	230901	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
23	CC	1023951729	MARTINEZ MAIKOL																	230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
24	CC	1018453849	MERCHAN LUISA									X								230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
25	CC	1032488654	MESA NICOLAS	X																230301	5	EPS017	5	CCF24	5	14-25	5	0.522%	5	SI
26	CC	1012373695	MONTERO SINDY									X								230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
27	CC	1023937645	MORENO WENDY									X								230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
28	CC	1233901826	MOYAN CRISTIAN									X								230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
29	CC	1019079260	PABON PEDRO									X								230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	SI
30	CC	1128271061	PALENCIA JOHN	X																25-14	19	EPS008	19	CCF24	19	14-25	19	0.522%	19	SI

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901447968	1	MNEMO CYBER SEC SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CL 99 10 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5527210	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor	
2025-05	2025-06	1558804645	9487513548	E	2025/06/17	2025/06/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0	\$64,809,700	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					43	\$40,562,400	\$0	\$0		\$40,562,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,588,800	\$0	\$0		\$1,588,800		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$15,408,600	\$0	\$0		\$15,408,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$11,600,000	\$0	\$0		\$11,600,000		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$9,897,500	\$0	\$0		\$9,897,500		
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,067,500	\$0	\$0		\$2,067,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					43	\$1,329,400	\$0	\$0		\$1,329,400	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	43	\$1,329,400	\$0	\$0		\$1,329,400		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					43	\$9,654,000	\$0	\$0		\$9,654,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	43	\$9,654,000	\$0	\$0		\$9,654,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)					43	\$11,968,300	\$0	\$0		\$11,968,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$132,700	\$0	\$0		\$132,700		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$2,265,700	\$0	\$0		\$2,265,700		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$2,073,200	\$0	\$0		\$2,073,200		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$1,530,500	\$0	\$0		\$1,530,500		
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$940,200	\$0	\$0		\$940,200		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$289,400	\$0	\$0		\$289,400		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$160,800	\$0	\$0		\$160,800		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$1,429,900	\$0	\$0		\$1,429,900		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$3,145,900	\$0	\$0		\$3,145,900		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$777,400	\$0	\$0		\$777,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$777,400	\$0	\$0		\$777,400		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$518,200	\$0	\$0		\$518,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$518,200	\$0	\$0		\$518,200		
TOTAL					43	\$64,809,700	\$0	\$0		\$64,809,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900396176	1	MNEMO COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 99 10 19 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5527210	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-06	1565908302	9487587402	E	2025/06/19	2025/06/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$168,327,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (97 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ACTIVIDADES EN CLIIENTE VISITA / TRASLADOS (20 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)																														
1	CC	1023002210	ACEVEDO OSCAR																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
2	CC	93387321	ARANA JAMES																	25-14	28	MIN001	28	CCF24	28	14-25	28	1.044%	28	No
3	CC	93387321	ARANA JAMES										X							25-14	2	MIN001	2	CCF24	0	14-25	2	0.000%	0	No
4	CC	67016350	BOCANEGRA ANA																	25-14	26	EPS001	26	CCF24	26	14-25	26	1.044%	26	No
5	CC	67016350	BOCANEGRA ANA												X					25-14	4	EPS001	4	CCF24	4	14-25	4	0.000%	4	No
6	CC	1122651302	CARO JONATHAN																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
7	CC	79136413	CASTRO HECTOR																	230301	30	MIN001	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
8	CC	1013592039	EMBUS JULIAN												X					231001	4	EPS005	4	CCF24	4	14-25	4	0.000%	4	No
9	CC	1013592039	EMBUS JULIAN																	231001	26	EPS005	26	CCF24	26	14-25	26	1.044%	26	No
10	CC	6319789	ESPAÑA JESUS																	230201	28	EPS005	28	CCF24	28	14-25	28	1.044%	28	No
11	CC	6319789	ESPAÑA JESUS												X					230201	2	EPS005	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	No
12	CC	52794429	LEGUIZAMON NINI																	25-14	30	EPS001	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
13	CC	1073163243	ORTIZ WILSON												X					231001	2	EPS005	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	Si
14	CC	1073163243	ORTIZ WILSON																	231001	28	EPS005	28	CCF24	28	14-25	28	1.044%	28	Si
15	CC	1033687848	POMPEYO VICTOR																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
16	CC	79865487	PUESTES DAVID																	25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
17	CC	79717549	RODRIGUEZ JOHN																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
18	CC	80791790	ROJAS RICARDO																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	No
19	CC	80066361	ROMERO DANIEL																	230201	30	MIN001	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
20	CC	1032439248	SANCLEMENTE SERGIO																	230901	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
21	CC	24659147	VALDES ALBA																	0	EPS005	18	CCF24	18	14-25	18	1.044%	18	No	
22	CC	24659147	VALDES ALBA												X					0	EPS005	12	CCF24	12	14-25	12	0.000%	12	No	
23	CC	79950164	VARGAS FERNANDO												X					230301	5	EPS002	5	CCF24	5	14-25	5	0.000%	5	Si
24	CC	79950164	VARGAS FERNANDO									X								230301	25	EPS002	25	CCF24	25	14-25	25	1.044%	25	Si
25	CC	1032410736	VARGAS HENRY																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	No
26	CC	1022411758	VARGAS MARIA																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	1.044%	30	Si
27	CC	1025525887	ZABALA DANIEL																	0	EPS002	30		0	0	0.000%	0	0	No	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (73 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (73 Afiliados)																														
28	CC	93128242	ALDANA TITO																	25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
29	CC	1023953140	ARIAS NATALIA									X								230201	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si

[illegible]

[illegible]

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					92	\$91,822,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$10,143,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$21,926,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	\$27,701,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	\$27,121,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$4,930,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					93	\$4,472,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	93	\$4,472,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					93	\$24,022,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	93	\$24,022,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)					98	\$39,504,200
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,335,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$122,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$3,420,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$574,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$2,069,800	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	\$3,394,600	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$200,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$1,046,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$3,246,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	\$23,094,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$5,103,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	\$5,103,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$3,402,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	\$3,402,200	
TOTAL					98	\$168,327,000

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	84	Tema:	Reunión de revisión de ANS, contrato 173 de 2023
Fecha:	02/07/2025	Ubicación:	Virtual.
Hora inicio:	10:30 am	Hora fin:	11:30 am

Objetivo	Reunión de revisión de ANS, contrato 173-2023 para el periodo comprendido entre el 22/04/2025 a 21/05/2025		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Jonathan Escobar	Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático FNA	Profesional universitario 2	Si
Enrique Arrazola	Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático FNA	Profesional 3	Si
Frank Leonardo Ortiz	Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático FNA	Asesor ejecutivo	Si
Cristian Samir	Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático FNA	Analista de gestión	Si
Luz Helena Riaño	Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático FNA	Profesional 4	Si
Maria Camila Vargas	Consortio unidad de ciberseguridad FNA	Apoyo a la gerencia del proyecto	Si
Cesar Orlando Pinto	Consortio unidad de ciberseguridad FNA	Gerente de proyecto	Si

1. TEMAS TRATADOS (Describir los puntos tratados en la reunión)

Revisión cumplimiento de ANS del periodo del 22 de abril de 2025 al 21 de mayo de 2025.

De manera conjunta, el FNA y Mnemo, verificaron cada uno de los siguientes niveles de servicio para la actividad desarrollada.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

2. Acuerdos de niveles de servicio generales

2.1. Documentación

Durante el periodo evaluado se entregaron los siguientes documentos:

- Informe mensual de gestión del 22 de abril de 2025 al 21 de mayo de 2025.
- Informes técnicos por solución o servicio

Los anteriores documentos fueron enviados al apoyo a la supervisión de contrato designado por el FNA y cargados en la carpeta respectiva de Transfer.

2.2. Cumplimiento del sistema de gestión de calidad

En materia de cumplimiento de procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA, no se evidenció incumplimiento alguno por parte del Consorcio Mnemo SOC, por lo que se considera que no hay penalización.

1.2. Sistema de Gestión de Calidad					
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA.					
Sistema de Gestión de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Cumplimiento en procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA.	A partir de 1 incumplimiento en procedimiento, políticas, normas y directrices	0	0	0	Ninguna

2.3. Atención de casos de soporte

Para el tiempo cubierto por la presente revisión:

Se generaron 17 peticiones de soporte para la solución Darktrace:

Número	Título	
RF430543	Closed	RV: REPORTE CORREO RETENIDO
RF430889	Closed	RV: CORREO RETENIDO // ENVÍO LINK AUDIO ENTREVISTAS INVESTIGACIÓN EMPRESAS Y CONSTRUCTORAS
RF431252	Closed	CORREO RETENIDO // NOTICE OF PERSONAL INFORMATION PROCESSING
RF431585	Closed	PROBLEMAS EN ANALISIS DE CORREO

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

RF431804	Closed	VERIFICACIÓN ANTIGENA EMAIL
RF432169	Closed	CORREO SFC
RF432171	Closed	CORREO RETENIDO
RF432258	Closed	ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS
RF432540	Closed	CORREO RETENIDO // FALLO PRIMERA INSTANCIA (STC9658-2025)
RF432609	Closed	CORREO RETENIDO // TOKEN PARA FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL DE LA PLACA 13994
RF432647	Closed	FW: CORREO RETENIDO // TOKEN PARA FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL DE LA PLACA 13994
RF432817	Closed	CORREOS EXTERNOS DESBLOQUEO
RF433548	Closed	CORREO RETENIDO
RF433642	Closed	RE: REPORTE CORREO SOSPECHOSO
RF433701	Closed	RV: CORREO RETENIDO // RV: CURSO ESTÁNDARES GRI - CERTIFICADO
RF433800	Closed	RV: ENCUESTA ACTUALIZACIÓN DEL IVANTI SECURE ACCESS CLIENT VERSIÓN 22.7 PARA EL NUEVO CUD
RF434030	Closed	RE: CORREO RETENIDO // 20247875-AVISO DE EMBARGO EN TRÁMITE-2024587574

Casos solicitados herramienta darktrace

Se generaron 7 peticiones de soporte para la solución trendmicro:

Tareas de petición		
Número	Estado	Categoría
RFT165930	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT165941	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT165945	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT165991	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT166037	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT166075	Cerrado	Transferencia segura de información

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

RFT166144	Cerrado	Transferencia segura de información
-----------	---------	-------------------------------------

Casos solicitados herramienta trendmicro

2.4. Cumplimiento del cronograma

El avance en el cronograma del contrato 173-2023 para el periodo en cuestión, a corte del 21 de mayo del 2025, corresponde al 73% esperado vs 74% completado, con un adelanto del 1% de desviación.

ID	% completado	% completado esperado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	74%	73%	FMA 173 2023	556 días	vie 22/12/23	jue 29/01/26
2	✓ 100%	100%	Fase de Inicio	6 días	vie 22/12/23	lun 01/01/24
10	✓ 100%	100%	Fase de planeación	45 días	lun 01/01/24	vie 01/03/24
11	✓ 100%	100%	Identificación del contexto estratégico de la unidad de ciberseguridad en el FMA	25 días	lun 22/01/24	vie 23/02/24
15	✓ 100%	100%	Construcción del plan de trabajo del proyecto	5 días	jue 01/02/24	mié 07/02/24
27	✓ 100%	100%	Planeación de la implementación de la unidad de ciberseguridad	5 días	lun 26/02/24	vie 01/03/24
33	✓ 100%	100%	Planeación de la arquitectura tecnológica de seguridad integral	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
38	✓ 100%	100%	Planeación de apoyos y transferencia de conocimiento	43 días	lun 01/01/24	mié 28/02/24
42	✓ 100%	0%	Entregables de planeación	27 días	lun 22/01/24	mié 28/02/24
50	73%	73%	Fase de ejecución	556 días	vie 22/12/23	jue 29/01/26
51	✓ 100%	100%	Implementación de la unidad de ciberseguridad	80 días	jue 08/02/24	mar 28/05/24
59	60%	60%	Ejecución de actividades de apoyo circular 007	486 días	vie 01/03/24	mié 31/12/25
148	61%	60%	Ejecución de actividades de apoyo al plan de sensibilización	486 días	vie 01/03/24	mié 31/12/25
235	✓ 100%	100%	Ejecución de análisis GAP de herramientas y servicios de ciberseguridad existentes	41 días	lun 15/01/24	lun 11/03/24
238	✓ 100%	100%	Ejecución de actividades de evaluación de nivel de madurez actual	79 días	mié 27/12/23	lun 15/04/24
245	58%	58%	Medición periódica del nivel de madurez (monitoreo y mejora continua)	366 días	lun 22/07/24	mar 09/12/25
306	✓ 100%	100%	Adquisición de herramientas tecnológicas	6 días	vie 22/12/23	lun 01/01/24
323	✓ 100%	100%	Despliegue de herramientas tecnológicas	162 días	vie 22/12/23	jue 01/08/24
324	✓ 100%	100%	Despliegue de hardware	87 días	vie 22/12/23	lun 22/04/24
381	✓ 100%	100%	Despliegue de herramientas de software	162 días	vie 22/12/23	jue 01/08/24
404	✓ 100%	0%	Hitos de entrada en operación de herramientas y servicios	161 días	vie 22/12/23	jue 01/08/24
429	✓ 100%	100%	Ejecución de actividades de transferencia de conocimiento	47,25 días	lun 01/04/24	mar 04/06/24
430	✓ 100%	100%	Unidad de ciberseguridad	37 días	mar 16/04/24	mar 04/06/24
435	✓ 100%	100%	Servicios SOC	3,5 días	lun 01/04/24	vie 05/04/24
450	✓ 100%	100%	Plataformas	3 días	vie 05/04/24	mié 10/04/24
463	✓ 100%	100%	Servicios	1,5 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24
470	46%	32%	Actividades de consultoría FMA	177 días	lun 17/03/25	vie 14/11/25
471	60%	100%	Formalización Indicadores de Ciberseguridad	23 días	lun 17/03/25	mar 15/04/25
478	32%	28%	Ajustes de Procedimientos	131 días	mar 25/03/25	lun 22/09/25
575	80%	25%	Pruebas de playbooks	166 días	mar 01/04/25	vie 14/11/25
608	60%	60%	Operación de servicios de ciberseguridad	556 días	vie 22/12/23	jue 29/01/26
980	67%	67%	Fase de monitoreo y control	509 días	dom 28/01/24	mar 30/12/25
981	68%	68%	Reunión de seguimiento	497,25 días	mar 13/02/24	mar 30/12/25
1081	67%	67%	Reunión de ANS	507,25 días	dom 28/01/24	lun 29/12/25
1106	0%	0%	Fase de cierre	75 días	mié 01/10/25	mar 13/01/26

A continuación, se detalla el avance en el cronograma de la extensión Otro si del contrato 173-2023 para el periodo en cuestión, a corte del 21 de mayo del 2025, corresponde al 100% esperado vs 96 % completado, con una desviación de un 4 %.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

ID	% completado	% completado copiado 11	Nombre de tarea	Duración	Comenzó	Fin	Predecesoras
1	✓	96% 100%	Etapla Implementacion Extension contrato 173 UC	93 días	jue 26/12/24	vie 09/05/25	
2	✓	100% 100%	Inicio	18 días	jue 26/12/24	mié 22/01/25	
3	✓	100% 100%	Firma de polizas	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24	
4	✓	100% 100%	Incorporación de personal técnico	11 días	mar 07/01/25	mar 21/01/25	3
5	✓	100% 100%	Presentación de KickOff	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25	4
6	✓	96% 100%	Implementacion tecnologías y servicios	93 días	jue 26/12/24	vie 09/05/25	
7	✓	100% 100%	Datatabric	88 días	jue 26/12/24	vie 02/05/25	
8	✓	100% 100%	Planación	21 días	vie 27/12/24	mar 28/01/25	
14	✓	100% 100%	Implementación	87 días	jue 26/12/24	mié 30/04/25	
145	✓	100% 100%	Cierre etapa implementacion Ciberanalítica	1 día	vie 02/05/25	vie 02/05/25	117
146	✓	100% 100%	IPAM	72 días	mié 08/01/25	mié 16/04/25	
147	✓	100% 100%	Planación	37 días	lun 20/01/25	lun 10/03/25	
157	✓	100% 100%	Implementación	72 días	mié 08/01/25	mié 16/04/25	
185	✓	52% 100%	CiberArk PAM	93 días	jue 26/12/24	vie 09/05/25	
186	✓	100% 100%	Planación	53 días	vie 27/12/24	mié 12/03/25	
187	✓	100% 100%	Renovación del licenciamiento actual (Onpremise)	5 días	vie 27/12/24	vie 03/01/25	
188	✓	100% 100%	Levantamiento de información y funcionamiento actual	8 días	mar 07/01/25	jue 16/01/25	
191	✓	100% 100%	Identificación de requisitos para migración	15 días	mié 05/02/25	lun 24/02/25	
195	✓	100% 100%	Prerrequisitos técnicos	19 días	sáb 15/02/25	mié 12/03/25	
203	✓	43% 100%	Implementación	15 días	mar 18/03/25	lun 07/04/25	
235	✓	60% 100%	Despliegue de Identity Endpoint MFA	1 día	mar 08/04/25	mar 08/04/25	
239	✓	50% 100%	Configuración de ALCM (Advanced Lifecycle Management)	2 días	mié 09/04/25	jue 10/04/25	
244	✓	40% 100%	Configuración de 1 campaña de Identity Compliance para revisión de accesos y	2 días	vie 11/04/25	lun 14/04/25	
249	✓	37% 100%	Activación y pruebas iniciales de las Sesiones Web Seguras (SWS) para la autenticación, protección, supervisión, y control continuo de	2 días	lun 14/04/25	mar 15/04/25	
254	✓	30% 100%	Despliegue de aplicaciones del catalogo de aplicaciones para SSO	2 días	mié 16/04/25	lun 21/04/25	
257	✓	36% 100%	Descubrimiento y planificación a PAM SaaS	4 días	mar 22/04/25	vie 25/04/25	
268	✓	34% 100%	Provisión de la documentación requerida para CyberArk Identity Security Platform	2 días	vie 25/04/25	lun 28/04/25	
274	✓	13% 100%	instalación, configuración y hardening de los componentes CyberArk (última versión)	1 día	mar 29/04/25	mar 29/04/25	
279	✓	15% 100%	Configuración de integraciones incorporadas y componentes desarrollados por la entidad	2 días	mié 30/04/25	vie 02/05/25	
286	✓	10% 100%	Verificación del correcto funcionamiento de CPM y gestión de sesiones por medio de PSM para plataformas	1 día	lun 05/05/25	lun 05/05/25	
289	✓	0% 100%	Implementación de Browser seguro (CSB) para 2 usuarios	1 día	lun 05/05/25	lun 05/05/25	
293	✓	0% 100%	Configuración y pruebas de SIA para 2 usuarios	1 día	mar 06/05/25	mar 06/05/25	
297	✓	0% 100%	Pruebas de la funcionalidad de acceso fuera de la red para 2 usuarios	1 día	mar 06/05/25	mar 06/05/25	
299	✓	0% 100%	Revisión general de los avances con los administradores de la solución y el fabricante	1 día	mar 06/05/25	mar 06/05/25	
302	✓	14% 100%	Migración de cuentas actuales y sus respectivos almacén de contraseñas	2 días	mié 07/05/25	jue 08/05/25	
308	✓	0% 100%	Posterior a la validación del privilege cloud se replica y migra SAFE, Cuentas, y permisos	93 días	jue 26/12/24	vie 09/05/25	
317	✓	100% 100%	ASM & IE (Superficie de Ataques)	63 días	jue 26/12/24	mar 25/03/25	
318	✓	100% 100%	Planación	43 días	jue 26/12/24	mar 25/02/25	
329	✓	100% 100%	Implementación	54 días	vie 10/01/25	mar 25/03/25	
330	✓	100% 100%	Configuración	54 días	vie 10/01/25	mar 25/03/25	
345	✓	100% 100%	Cierre etapa implementacion ASM	1 día	mar 25/03/25	mar 25/03/25	344
346	✓	100% 100%	MAS Mobile Access Secure	67 días	jue 26/12/24	lun 31/03/25	
347	✓	100% 100%	Planación	34 días	jue 26/12/24	jue 13/02/25	
354	✓	100% 100%	Implementación	60 días	vie 03/01/25	jue 27/03/25	
372	✓	100% 100%	Cierre implementacion MAS	1 día	lun 31/03/25	lun 31/03/25	371

Observaciones:

El retraso en tiempos se da por las novedades técnicas en el proceso los tiempos tomados por el fabricante para la etapa del diseño de RBAC en el proceso de migración de la solución de cyberark.

Tener en cuenta que se generó una versión 2 de cronograma de común acuerdo entre la supervisión del contrato de parte de FNA (Mónica Grand) , el director comercial de Consorcio unidad de ciberseguridad FNA (Ricardo Rojas) y director de operaciones del Consorcio unidad de ciberseguridad FNA (Henry Vargas), dada la extensión de licenciamiento de la solución de ciber analítica y los cambios en fechas de implementación para el cronograma general para la implementación de las soluciones comprometidas en la extensión según acuerdo descrito en el acta # 35 con nombre GEGPFO001ACTADEREUNION_FNA 173-2023.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0



GEGPFO001ACTADE
REUNION_FNA 173-2

2 cumplimiento de cronograma					
El proveedor deberá hacer entrega de un cronograma donde se plasmen todas las actividades el contrato					
Cumplimiento cronograma	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Ejecución de actividades según lo establecido en el cronograma del contrato. Máximo 2 días de atraso en la fecha de ejecución con respecto a la planeada en el cronograma para el corte que se defina	Por cada 3 incumplimientos → 0,5% del valor de la facturación mensual que se irán acumulando.	1	0	0	Ninguna

Medición:

93 días equivale al 100% para la etapa de implementación de las soluciones de la extensión de acuerdo con cronograma, es decir que 1 día equivale al 1,07 %, por lo cual un retraso del 4% equivale a 3,73 días de retraso.



De acuerdo con ello no hay penalidad, teniendo en cuenta que la aplicación del 0,5% de ans debería excederse en más de 6 días de retraso en el cronograma.

2.5. Disponibilidad de Plataformas

2.5.1. Disponibilidad solución Darktrace

1. Disponibilidad de la plataforma DARKTRACE					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por la plataforma Darktrace					
Disponibilidad del servicio	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	0	Ninguna

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

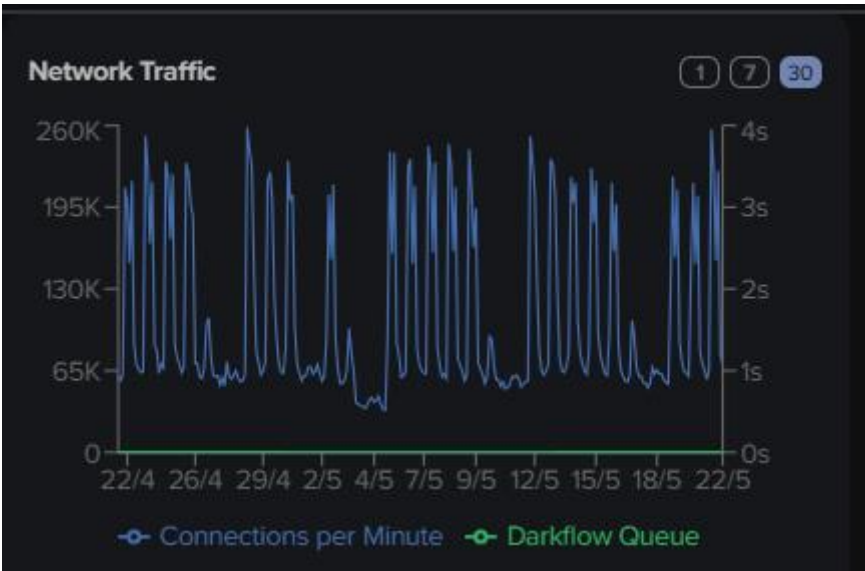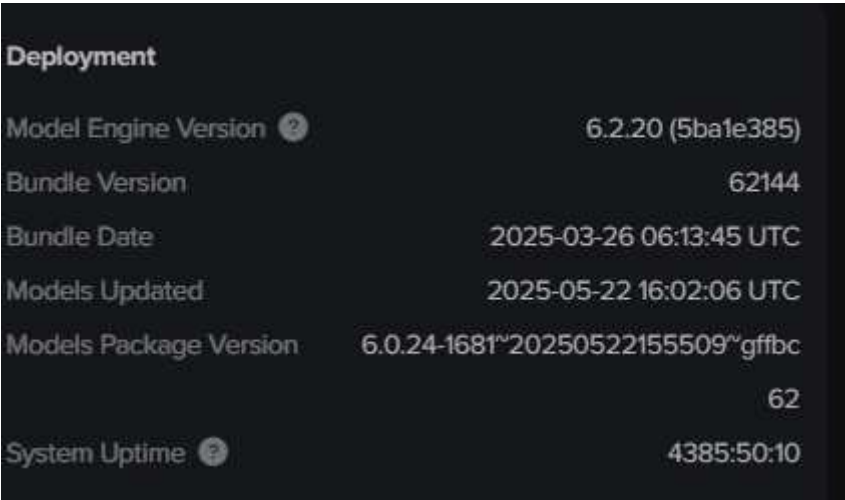

promedio de conexiones por minuto procesadas en los últimos 30 días

2.5.2. Disponibilidad solución DAM

2. Disponibilidad de la plataforma DATABASE MONITORING					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por las plataformas de DAM					
Disponibilidad del servicio	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	0	Ninguna





FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código
GE-GP-FO-001

GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

Versión: 0

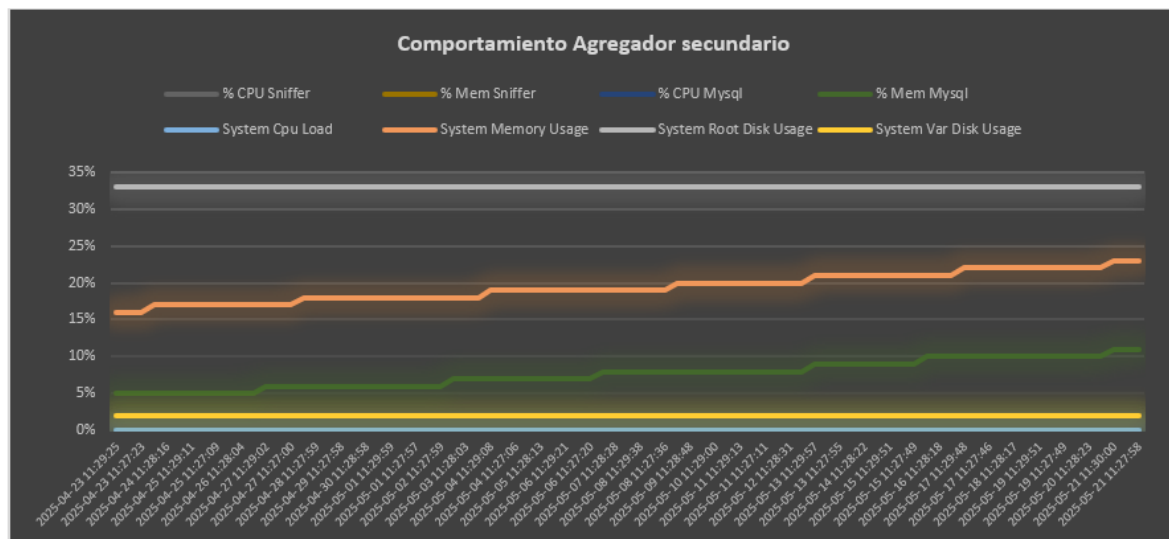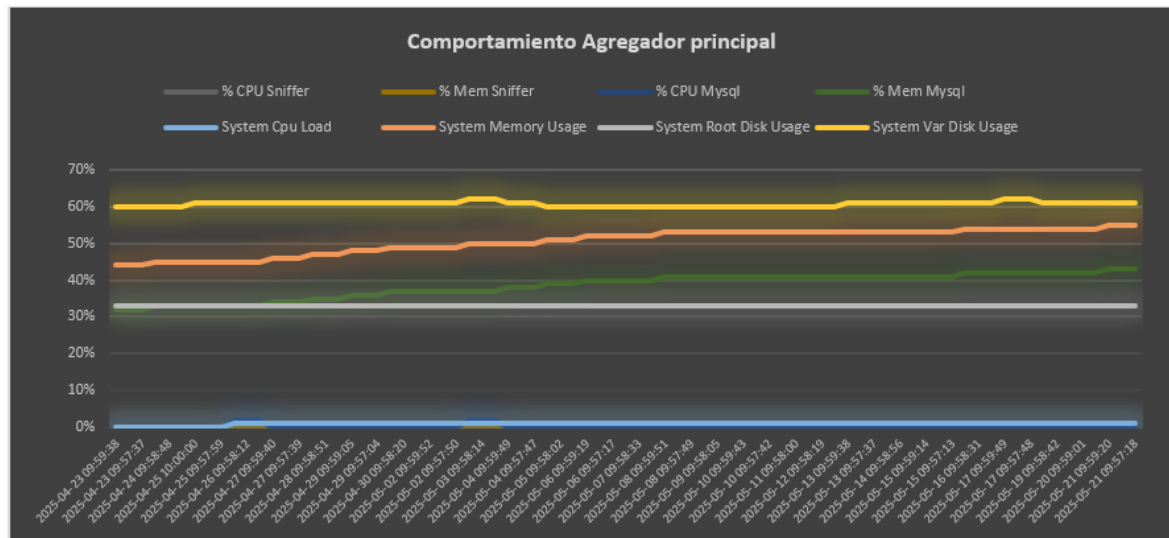






FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código
GE-GP-FO-001

GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

Versión: 0

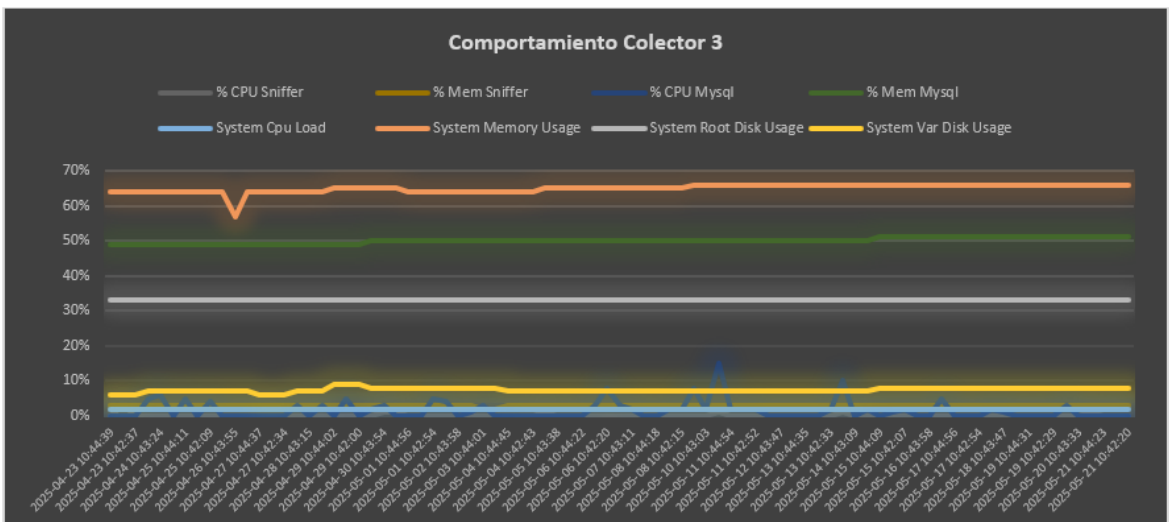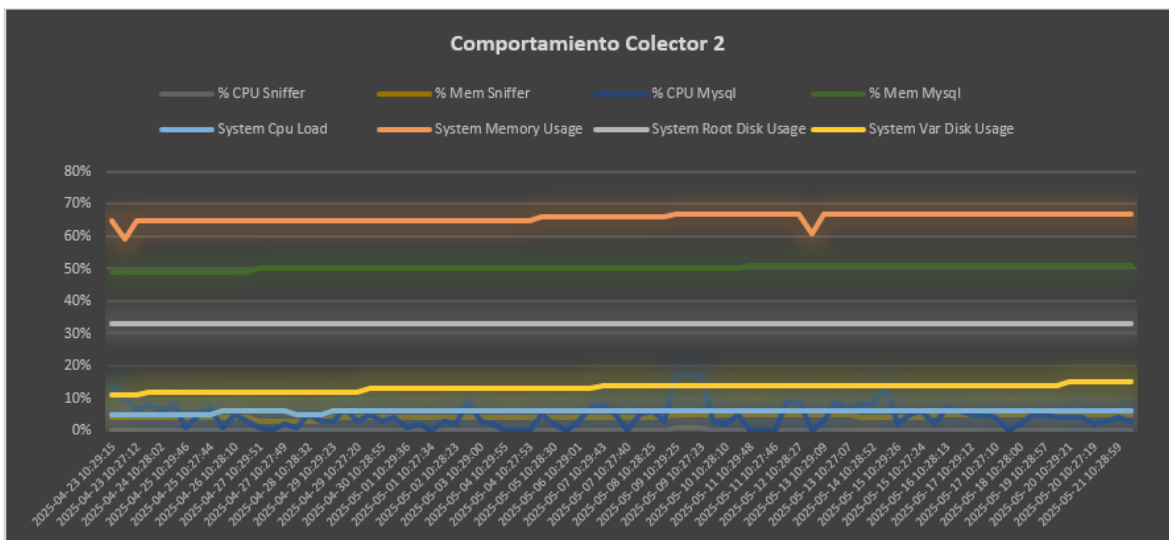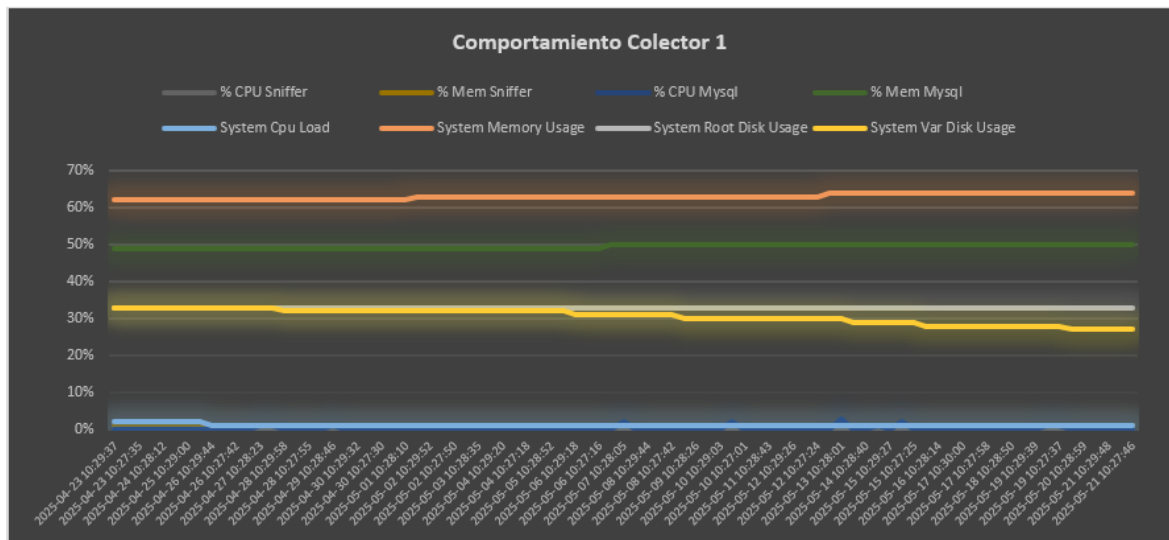

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

2.5.3. Disponibilidad solución Antimalware

3. Disponibilidad de la plataforma ANTIMALWARE					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por las plataformas Antimalware					
Disponibilidad del servicio	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	0	Ninguna

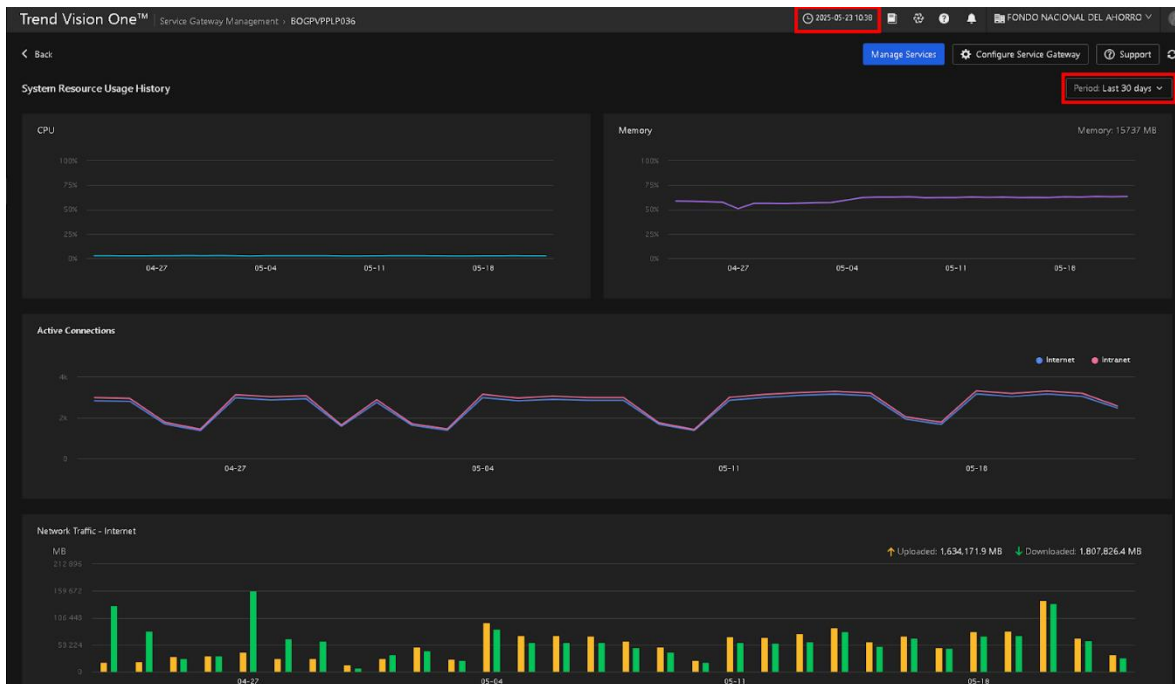


Imagen de conexiones durante el periodo.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

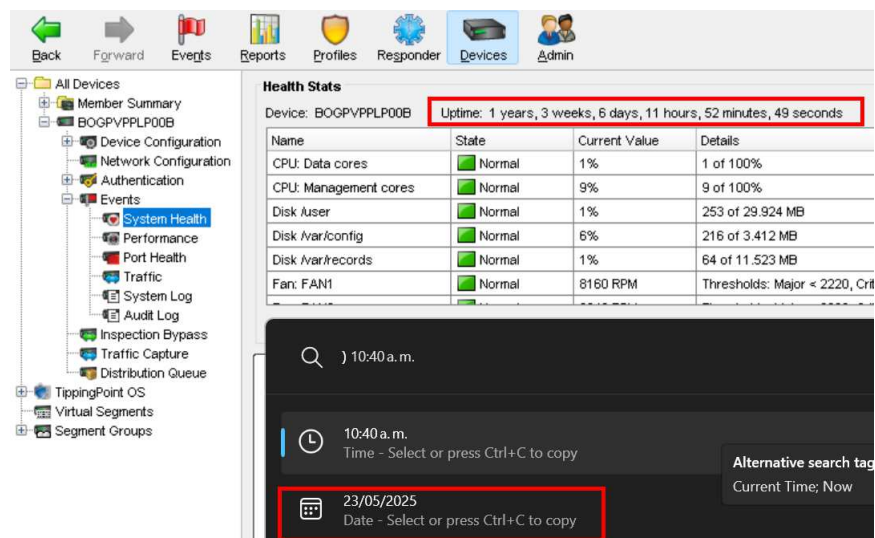
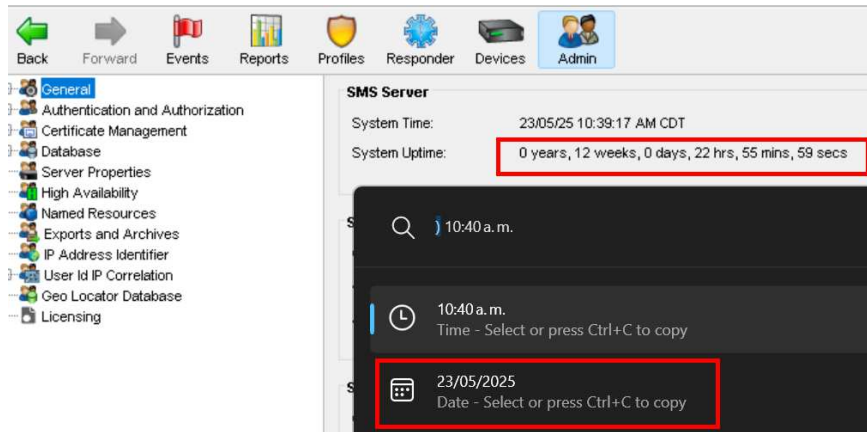


Imagen BOGPVPPLP00B sensor IPS tiempo activo


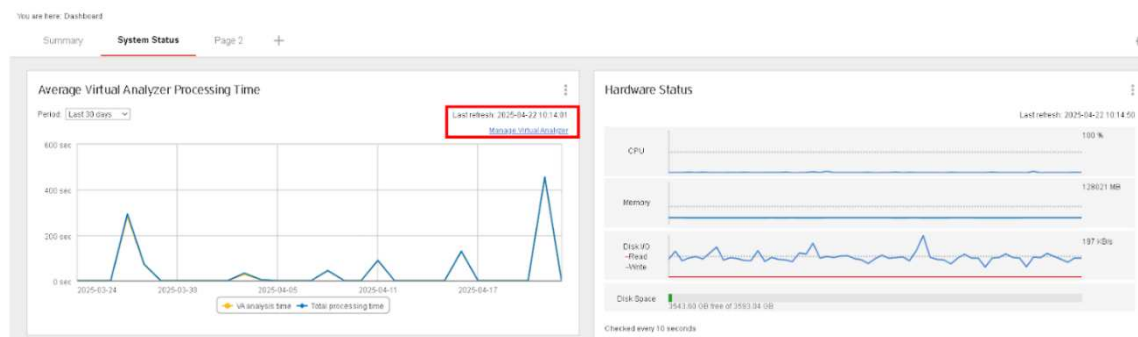


Imagen de disponibilidad servidor sandbox DDAN

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0


2.5.4. Disponibilidad Plataformas de Correlación SIEM

4. Disponibilidad de la plataforma SOC					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por las plataformas de del servicio SOC					
Disponibilidad del servicio	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	0	Ninguna

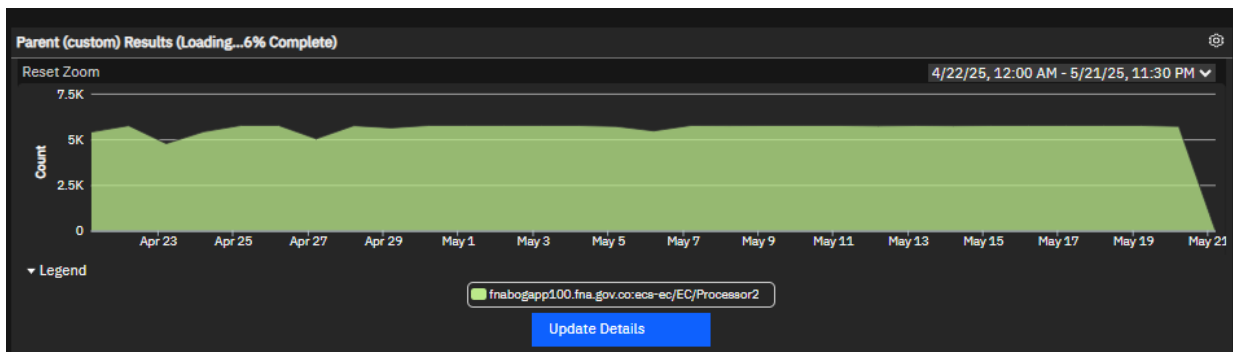


2.5.5. Disponibilidad Secure Development Assesment (Fortify)

Fortify – 172.16.132.101

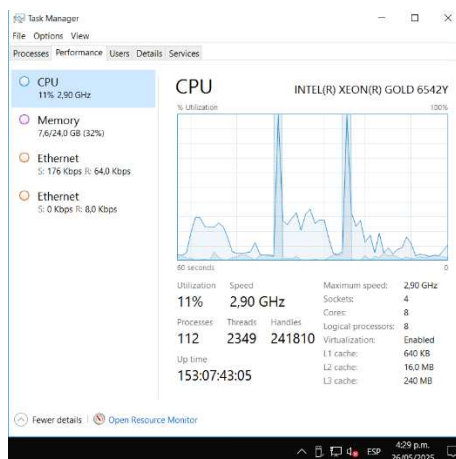


	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Fortify – 172.16.132.102

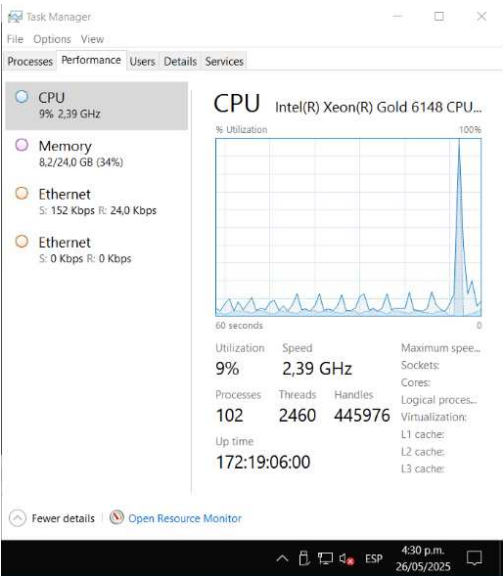


Fortify – 172.16.132.103

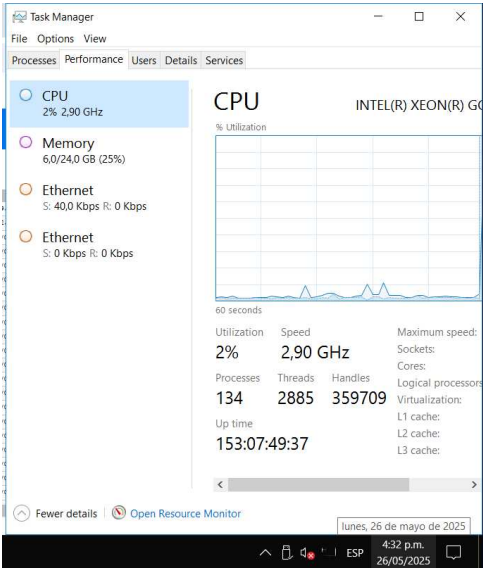

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Fortify – 172.16.132.104

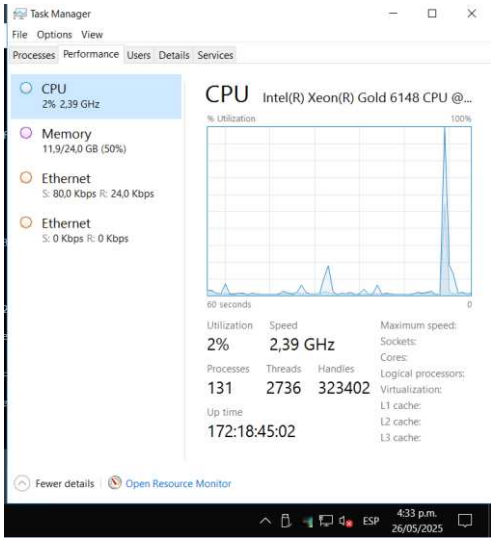

2.5.6. Disponibilidad monitoreo especiales DNS

☐	ZTP_BOGPVPLP029_6661976453710046849	Online
	NIOS-X (BloxOne) Virtual Server VMware v5.4.7 SN: VMware-42 00 6e cf d8 da a8 ff-7b 91 15 23 01 06 b2 55	
☒	ZTP_BOGPVPLP027_1600_789361926821280278	Online
	NIOS Physical Server 9.0.3-50212-ee11d5834df9 License UID: 2e34ecd8ff18419a8c09a6c689e6b758	
☒	ZTP_BOGPVPLP028_20250320_2878961269649...	Online
	NIOS Physical Server 9.0.3-50212-ee11d5834df9 License UID: 6ea8b8ab77cd4bcab0e45d11872d67aa	




FORMATO ACTA DE REUNIÓN


Código
GE-GP-FO-001

GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

Versión: 0

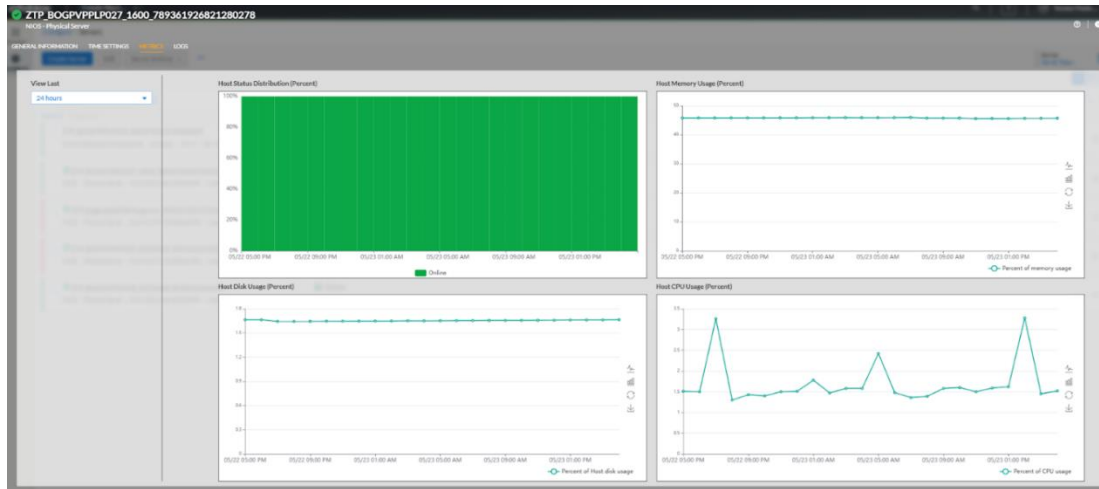


Disponibilidad ZTP_BOGVPVPLP027

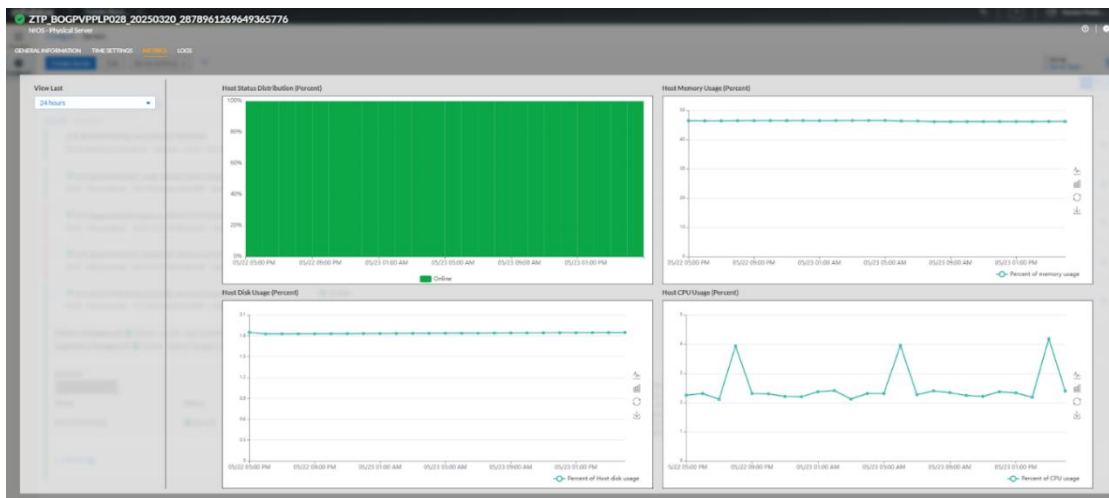

Disponibilidad ZTP_BOGVPVPLP028

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

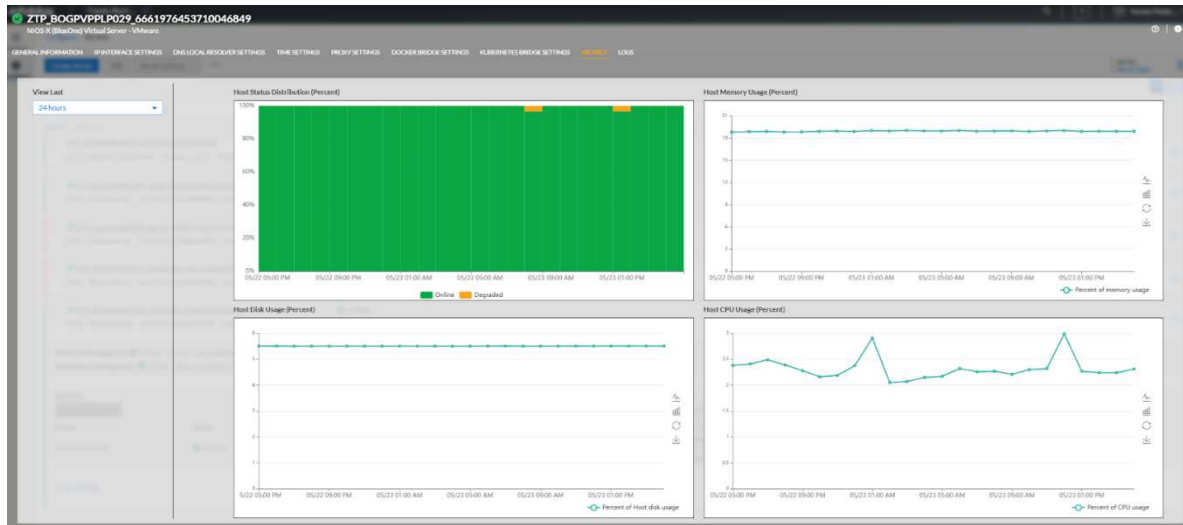

Disponibilidad ZTP_BOGVPVPLP029

2.5.7. Disponibilidad monitoreo especiales Portales Web


System Information		🔄 🔍 ⚙️
HA Status	Active-Passive	
Cluster Name	FWHA01	
Cluster Members	FortiWeb/ FV-1KET119900223 (Primary) MASTERFWEB/ FV-1KET119900223 (Secondary)	
Serial Number	FV-1KET119900223	
Operation Mode	Reverse Proxy	
System Time	Wed May 21 16:18:24 2025	
Firmware Version	FortiWeb-1000E 7.4.3,build0638(GA),240405	
System Uptime	[376 day(s) 18 hour(s) 21 min(s)]	

Uptime Waf Fortiweb

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

2.5.8. Disponibilidad Plataforma Qualys

5. Disponibilidad de la plataforma QUALYS					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por la plataforma de Líneas Base					
Disponibilidad del servicio	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	0	Ninguna

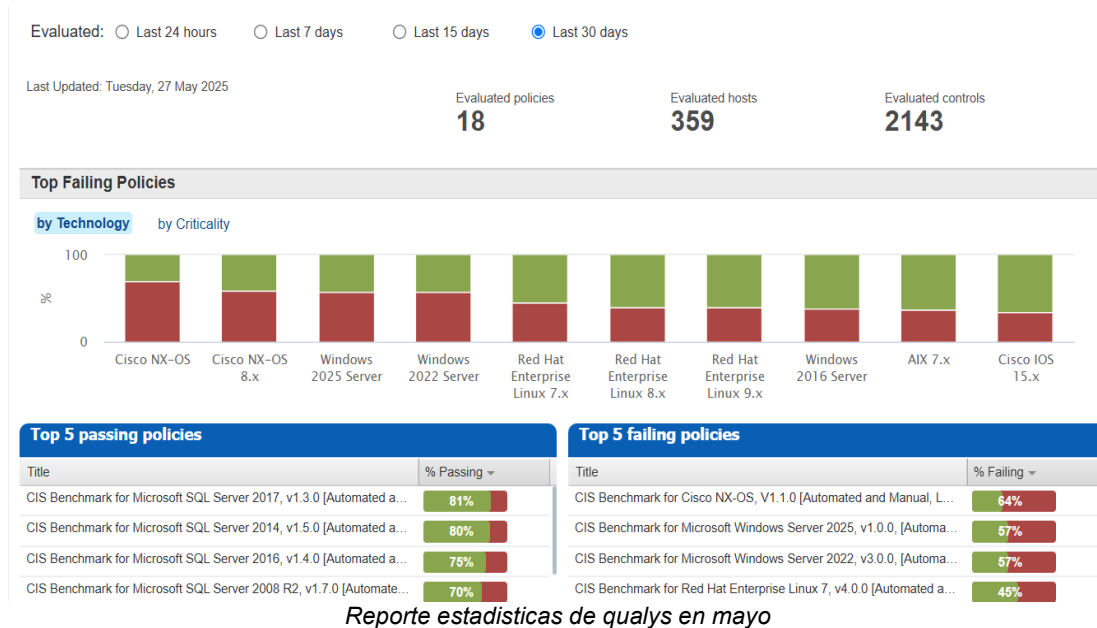

Observación: Se debe tener en cuenta que para esta solución el gateway y el scanner, se encuentran virtualizados en un servidor propiedad de FNA, por lo cual no aplica la evaluación de disponibilidad a Mnemo referente al equipo en el que se tienen alojados.
La disponibilidad va atada al servicio en nube de qualys

3. Anexo 2.1 Otros ANS Adicionales

De acuerdo con la revisión realizada, para los ANS adicionales contemplados en el Anexo 2.1, no se evidenciaron penalidades aplicables al periodo en cuestión. A continuación, se relacionan los ANS del Anexo 2:

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

3.1. Recurso Humano

5. Disponibilidad del recurso humano					
Garantizar que el personal asignado por el proveedor cumpla tanto con los perfiles definidos en el Anexo especificaciones técnicas.					
Disponibilidad del servicio	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Garantizar que el personal asignado por el proveedor cumpla tanto con los perfiles definidos en el Anexo especificaciones técnicas.	Por cada dos (2) incumplimientos → 1% del valor de la facturación mensual que se irán acumulando.	0	0	0	

Durante el periodo entre el 22/04/2025 a 21/05/2025 se garantizó la disponibilidad del personal de acuerdo con el anexo técnico.

3.2. Facturación

Se realiza la entrega y radicación de documentación soporte requerida junto con la Pre-factura y factura en los tiempos establecidos, por tal motivo no se genera penalidad.

3.3. Modelo de Gestión de Incidentes de Seguridad.

Durante el periodo revisado no se generaron casos de incidentes de seguridad en la infraestructura de FNA, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

3.4. Modelo de Gestión de Requerimientos.

Se realizó la actualización y entrega de matriz de comunicación, escalamiento jerárquico y funcional y para realizar la gestión de incidentes, de acuerdo con el horario del servicio y horario de soporte contratado, sin embargo, durante el periodo revisado no se generaron requerimientos por parte de FNA o incumplimientos asociados a los requerimientos, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

Detalle en Imagen:

Casos solicitados herramienta darktrace / Casos solicitados herramienta Trendmicro

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

3.5. Modelo de Gestión de Problemas.

Durante el periodo revisado no se generaron requerimientos problemas y tareas de problemas por parte de FNA, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

3.6. Modelo de Gestión de Cambios.

Durante el periodo revisado se generaron los siguientes controles de cambios, los cuales cumplieron con los requerimientos y lineamientos del procedimiento de cambios, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

Número	Categoría	Prioridad	Fase	Fecha de Creacion	Título
C70871	Cambio Estándar	2 - Alta	Closure	29/04/2025 9:49	DAM Guardium - Permisos FW infraestructura - Cambio anterior C67376
C71165	Cambio Normal	3 - Media	Registro y categorización	6/05/2025 9:39	Permisos Analisis dinamico de muestras Sandbox
C71259	Cambio Normal	2 - Alta	Closure	8/05/2025 16:19	DAM-Guardium, COBIS, modificacion tasa
C71379	Cambio Estándar	1 - Crítica	Closure	12/05/2025 16:41	Permisos de comunicacion para herrmienta de escaneo de vulnerabilidades - Caso de referencia C64434
C71597	Cambio Estándar	3 - Media	Abandonado	19/05/2025 15:28	Implementación permisos Infoblox - IPAM REF_C44981
C70596	Cambio Normal	3 - Media	Closure		Registro de servidores para cyberark cloud

3.7. Modelo de Gestión Aseguramiento.

Con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos que garantizan el aseguramiento de la infraestructura del FNA se da cumplimiento a los procedimientos definidos que cuentan con monitoreo permanente, sin embargo, no se tienen vulnerabilidades identificadas que requieren remediación, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

5. Determinación del valor a facturar

A continuación, se describen los ítems y valores de la facturación de acuerdo con lo revisado en sesión de ans para el mes de MAYO del 2025:

DESCRIPCIÓN	VALOR SERVICIO SIN IVA	APLICACIÓN ANS	VALOR DESPUÉS DE ANS	IVA (19%)	TOTAL DESPUÉS DE IVA
Administración y soporte de la plataforma XDR	3.326.000,00 COP	- COP	3.326.000,00 COP	631.940,00 COP	3.957.940,00 COP
Administración y soporte de la plataforma SIEM	152.913.000,00 COP	- COP	152.913.000,00 COP	29.053.470,00 COP	181.966.470,00 COP
Administración y soporte de la plataforma SOAR	14.627.000,00 COP	- COP	14.627.000,00 COP	2.779.130,00 COP	17.406.130,00 COP
Administración y soporte de la plataforma THREAT INTELLIGENCE	27.797.000,00 COP	- COP	27.797.000,00 COP	5.281.430,00 COP	33.078.430,00 COP
Administración y soporte Servicio BRAND CYBERSECURITY MONITORING.	55.994.000,00 COP	- COP	55.994.000,00 COP	10.638.860,00 COP	66.632.860,00 COP
Administración y soporte Servicio de MONITOREO DE DNS	52.083.000,00 COP	- COP	52.083.000,00 COP	9.895.770,00 COP	61.978.770,00 COP
Administración y soporte de la plataforma SECURE DEVELOPMENT ASSESSMENT	8.279.000,00 COP	- COP	8.279.000,00 COP	1.573.010,00 COP	9.852.010,00 COP
Administración y soporte Endpoint PROTECCIÓN ANTIMALWARE, CONTROL DE APLICACIONES, PROTECCIÓN WEB, CONTROL DE ACCESO SEGURO A LA NUBE, SERVER SECURITY, INTRUSION PREVENTION SYSTEM, ISOLATED EXECUTION	33.889.000,00 COP	- COP	33.889.000,00 COP	6.438.910,00 COP	40.327.910,00 COP
Administración y soporte de la plataforma CIBERDEFENSA	5.874.000,00 COP	- COP	5.874.000,00 COP	1.116.060,00 COP	6.990.060,00 COP

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD	8.406.000,00 COP	- COP	8.406.000,00 COP	1.597.140,00 COP	10.003.140,00 COP
Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE BASES DE DATOS (DAM)	23.451.000,00 COP	- COP	23.451.000,00 COP	4.455.690,00 COP	27.906.690,00 COP
Administración y soporte de la plataforma SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES (Actividades de responsabilidad con 4.16. SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES Anexo técnico)	26.449.000,00 COP	- COP	26.449.000,00 COP	5.025.310,00 COP	31.474.310,00 COP
Administración y soporte de la plataforma (ASM) - Attack Surface Management por la vigencia del Contrato	25.184.000,00 COP	- COP	25.184.000,00 COP	4.784.960,00 COP	29.968.960,00 COP
Administración y soporte de la plataforma para la protección, control y monitoreo del acceso y uso de las cuentas privilegiadas - PAM	28.708.000,00 COP	- COP	28.708.000,00 COP	5.454.520,00 COP	34.162.520,00 COP
Administración y soporte de la plataforma (MAS) para la validación de controles y protección de la aplicación móvil del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	8.263.000,00 COP	- COP	8.263.000,00 COP	1.569.970,00 COP	9.832.970,00 COP
Administración y soporte del servicio de Ciber-analítica (Recurrente a partir del 8 de mayo, fecha de salida en producción)	40.537.000,00 COP	- COP	40.537.000,00 COP	7.702.030,00 COP	48.239.030,00 COP
Valor total	\$ 515.780.000,00		\$ 515.780.000,00	\$ 97.998.200,00	613.778.200,00 COP

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Observaciones:

Se genera la facturación del ítem de Administración y soporte del servicio de Ciber-analítica por 14 días, esto teniendo en cuenta que la solución salió a producción el 8/05/2025.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

APROBACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ
 Cesar Pinto Gerente de Proyecto Consortio unidad de ciberseguridad FNA	 Jonathan Escobar Apoyo a la supervisión 173-2023 Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático
APROBÓ	APROBÓ
 Frank Ortiz Apoyo a la supervisión 173-2023 Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático	 Enrique Arrazola Apoyo a la supervisión 173-2023 Gerencia de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático



FONDO NACIONAL DEL AHORRO
VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y
TRANSFORMACION DIGITAL
SUPERVISIÓN CTO 173 - 2023

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. 173 de 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 36

Recurrente mensual (administración y soporte en sitio): plataformas XDR, SIEM, SOAR, Threat Intelligence Platform (TIP), BRAND CIBERSECURITY MONITORING (Monitoreo Marca), servicio de Monitoreo DNS, Secure Development Assessment (Fortify), Antimalware (control de aplicaciones, protección web, control de acceso seguro a la nube, server security, intrusion prevention system, isolated execution), Ciberdefensa (DarkTrace), Líneas Base (QUALYS), monitoreo de bases de datos (DAM), solución de GOBIERNO DE IDENTIDADES (IAM), ASM, PAM, MAS y Ciberanalítica del periodo comprendido del 22 de abril de 2025 al 21 de mayo de 2025.

OBJETO: Contratar unidad de ciberseguridad que proporcione servicios de seguridad integrados al fondo nacional del ahorro

Bogotá, D.C. mayo de 2025



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato No. 173 de 2023, cuyo objeto es "Contratar unidad de ciberseguridad que proporcione servicios de seguridad integrados al Fondo Nacional del Ahorro", suscrito entre el FNA y el CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA, presenta un resumen general del seguimiento realizado y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al Contrato 173 de 2023.

La información detallada relacionada con las actividades de administración y soporte se encuentra documentada en el informe correspondiente de cada solución.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Gerencia de Estrategia TI y Aseguramiento Informático del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el CTO 173 de 2023. El presente informe tiene como fin el análisis realizado en cuanto al cumplimiento a los hitos:

- a) Servicios de administración y soporte en sitio prestados por el contratista durante el período del **22 de abril de 2025 al 21 de mayo de 2025** referente al **17vo** mes de recurrente mensual de las plataformas que hacen parte de los servicios de la Unidad de ciberseguridad, a saber:

1. XDR
2. SIEM
3. SOAR
4. Threat Intelligence Platform (TIP)
5. BRAND CIBERSECURITY MONITORING (Monitoreo Marca)
6. Servicio de Monitoreo DNS
7. Secure Development Assessment (Fortify)
8. Antimalware
9. Ciberdefensa (DarkTrace)
10. Líneas Base (QUALYS)
11. Monitoreo Bases de Datos (DAM)
10. Solución GOBIERNO DE IDENTIDADES (IAM)
11. ASM
12. PAM
13. MAS
14. Ciberanalítica

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento a los servicios y entregables acorde con lo contratado en el CTO 173 de 2023.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Realizar seguimiento a las actividades contratadas y ejecutadas durante el periodo.
- Expedir constancia del cumplimiento a cargo del contratista previo al pago de la factura.
- Identificar las observaciones o desviaciones de las actividades realizadas con el fin de definir los planes de acción para su mitigación o eliminación.

5. INFORME DE AVANCE

Las actividades realizadas en cuanto a administración y soporte de cada una de las plataformas asociadas al presente pago se encuentran documentadas en informes específicos, los cuales no se incluyen dentro de este documento, pero se entregan como parte del paquete de supervisión correspondiente.

- XDR

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **10-TrendMicroMayo1.0.docx**

- SIEM y SOAR

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **02- Gestion QRadar SIEM Mayo 2025.docx**

- DAM

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **12-DAMTecnicomayov1.0.docx**

- Servicio de Monitoreo DNS

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **04-WAF-INFOBLOX TecnicoMayo1.0.docx**

- Threat Intelligence Platform (TIP)

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **05-CTI - Threat Hunting - LAB_MALWARE - Mayo1.0.docx**

- **BRAND CIBERSECURITY MONITORING (Monitoreo Marca)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **06-VigilanciaTecnico Mayo**

- **Líneas Base (QUALYS)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **08-Qualys SCA mayo v1.docx**

- **Secure Development Assessment (Fortify)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **09-Fortify Mayo 1.0.docx**

- **Antimalware**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **10-TrendMicroMayo1.0.docx**

- **Ciberdefensa (DarkTrace)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **11-CiberdefensaDarktraceTecnicoMayov1.0.docx**

- **Solución GOBIERNO DE IDENTIDADES (IAM)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **13-IAM-VERIFY Tecnico Mayo V1.0**

- **ASM**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **14-ASM_IE_Técnico_Tenable.docx**

- **PAM**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **04. Cyberark_Mayo_2025v1.0.docx**

- **MAS**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **15-MAS_Appdome_Mayo1.0.docx**

- Ciberanalítica

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **16-Ciberanalítica_Mayo_v1.0.docx**

- RETEST ASOCIADO MENSUALES

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **07-AuditoriaTecnico- Mayo -Nessus1.0.docx**

5.1 INFORMACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 36.499.583.610,00	64,69%
Adiciones	\$ 19.922.987.493,00	35,31%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 56.422.571.103,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 46.448.512.481,00	82,32%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 613.778.200,00	1,09%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 47.062.290.681,00	83,41%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		83,45%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		-0,04%

Se define que el avance presupuestal del contrato a la fecha va de acuerdo con lo planeado incluyendo ANS penalizados.

Por lo cual se concluye que se verificaron cada una de las actividades y entregables definidos en el cronograma de actividades del proyecto, así como los compromisos y observaciones establecidas en las reuniones de seguimiento y relacionadas en las respectivas actas; concluyendo que el avance del proyecto está acorde con lo establecido en el CTO 173 de 2023.

5.2 CONCEPTO SUPERVISION

El contratista cumplió a satisfacción con el servicio de administración y soporte en sitio durante los periodos del **22 de abril de 2025 al 21 de mayo de 2025**.

A continuación, se detalla el porcentaje de avance realizado de la actividad:

Porcentaje de ejecución proyectado	74%
Porcentaje de ejecución realizado	74%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CTO 173 de 2023	0%

ID	% completado	% completado esperado	Nombre de tarea	Origen	Inicio	Fin
1	74%	73%	FNA 173 2023		556 días vie 22/12/23	jue 29/01/26
2	100%	100%	Fase de inicio		6 días vie 22/12/23	lun 01/01/24
10	100%	100%	Fase de planeación		45 días lun 01/01/24	vie 01/03/24
11	100%	100%	Identificación del contexto estratégico de la unidad de ciberseguridad en el FNA		25 días lun 22/01/24	vie 23/02/24
15	100%	100%	Construcción del plan de trabajo del proyecto		5 días jue 01/02/24	mié 07/02/24
27	100%	100%	Planeación de la implementación de la unidad de ciberseguridad		5 días lun 26/02/24	vie 01/03/24
33	100%	100%	Planeación de la arquitectura tecnológica de seguridad integral		10 días lun 01/01/24	vie 12/01/24
38	100%	100%	Planeación de apoyos y transferencia de conocimiento		43 días lun 01/01/24	mié 28/02/24
42	100%	0%	Entregables de planeación		27 días lun 22/01/24	mié 28/02/24
50	73%	73%	Fase de ejecución		556 días vie 22/12/23	jue 29/01/26
51	100%	100%	Implementación de la unidad de ciberseguridad		80 días jue 08/02/24	mar 28/05/24
59	60%	60%	Ejecución de actividades de apoyo circular 007		486 días vie 01/03/24	mié 31/12/25
148	61%	60%	Ejecución de actividades de apoyo al plan de sensibilización		486 días vie 01/03/24	mié 31/12/25
235	100%	100%	Ejecución de análisis GAP de herramientas y servicios de ciberseguridad existentes		41 días lun 15/01/24	lun 11/03/24
238	100%	100%	Ejecución de actividades de evaluación de nivel de madurez actual		79 días mié 27/12/23	lun 15/04/24
245	50%	50%	Medición periódica del nivel de madurez (monitoreo y mejora continua)		366 días lun 22/07/24	mar 09/12/25
306	100%	100%	Adquisición de herramientas tecnológicas		6 días vie 22/12/23	lun 01/01/24
323	100%	100%	Despliegue de herramientas tecnológicas		162 días vie 22/12/23	jue 01/08/24
324	100%	100%	Despliegue de hardware		87 días vie 22/12/23	lun 22/04/24
381	100%	100%	Despliegue de herramientas de software		162 días vie 22/12/23	jue 01/08/24
404	100%	0%	Hitos de entrada en operación de herramientas y servicios		161 días vie 22/12/23	jue 01/08/24
429	100%	100%	Ejecución de actividades de transferencia de conocimiento		47,25 días lun 01/04/24	mar 04/06/24
430	100%	100%	Unidad de ciberseguridad		37 días mar 16/04/24	mar 04/06/24
435	100%	100%	Servicios SOC		3,5 días lun 01/04/24	vie 05/04/24
450	100%	100%	Plataformas		3 días vie 05/04/24	mié 10/04/24
453	100%	100%	Servicios		1,5 días mié 10/04/24	jue 11/04/24
470	46%	32%	Actividades de consultoría FNA		177 días lun 17/03/25	vie 14/11/25
471	60%	100%	Formalización indicadores de Ciberseguridad		23 días lun 17/03/25	mar 15/04/25
478	32%	20%	Ajustes de Procedimientos		131 días mar 25/03/25	lun 22/09/25
575	80%	25%	Pruebas de playbooks		165 días mar 01/04/25	vie 14/11/25
608	60%	60%	Operación de servicios de ciberseguridad		556 días vie 22/12/23	jue 29/01/26
980	67%	67%	Fase de monitoreo y control		509 días dom 28/01/24	mar 30/12/25
981	60%	60%	Reunión de seguimiento		497,25 días mar 13/02/24	mar 30/12/25
1081	67%	67%	Reunión de ANS		507,25 días dom 28/01/24	lun 29/12/25
1106	0%	0%	Fase de cierre		75 días mié 01/10/25	mar 13/01/26

6. NIVELES DE SERVICIO

Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos para el CTO 173 de 2023, encontrando que el contratista cumplió con todas las actividades estipuladas contractualmente sin que se dé lugar a ninguna penalización.

VALOR PARA FACTURAR

DESCRIPCIÓN	VALOR SERVICIO SIN IVA	APLICACIÓN ANS	VALOR DESPUÉS DE ANS	IVA (19%)	TOTAL DESPUÉS DE IVA
Administración y soporte de la plataforma XDR	3.326.000,00 COP	- COP	3.326.000,00 COP	631.940,00 COP	3.957.940,00 COP
Administración y soporte de la plataforma SIEM	152.913.000,00 COP	- COP	152.913.000,00 COP	29.053.470,00 COP	181.966.470,00 COP
Administración y soporte de la plataforma SOAR	14.627.000,00 COP	- COP	14.627.000,00 COP	2.779.130,00 COP	17.406.130,00 COP
Administración y soporte de la plataforma THREAT INTELLIGENCE	27.797.000,00 COP	- COP	27.797.000,00 COP	5.261.430,00 COP	33.078.430,00 COP
Administración y soporte Servicio BRAND CYBERSECURITY MONITORING	55.994.000,00 COP	- COP	55.994.000,00 COP	10.638.860,00 COP	66.632.860,00 COP
Administración y soporte Servicio de MONITOREO DE DNS	52.083.000,00 COP	- COP	52.083.000,00 COP	9.895.770,00 COP	61.978.770,00 COP
Administración y soporte de la plataforma SECURE DEVELOPMENT ASSESSMENT	8.279.000,00 COP	- COP	8.279.000,00 COP	1.573.010,00 COP	9.852.010,00 COP
Administración y soporte Endpoint PROTECCIÓN ANTIMALWARE, CONTROL DE APLICACIONES, PROTECCIÓN WEB, CONTROL DE ACCESO SEGURO A LA NUBE, SERVER SECURITY, INTRUSION PREVENTION SYSTEM, ISOLATED EXECUTION	33.889.000,00 COP	- COP	33.889.000,00 COP	6.438.910,00 COP	40.327.910,00 COP
Administración y soporte de la plataforma CIBERDEFENSA	5.874.000,00 COP	- COP	5.874.000,00 COP	1.116.060,00 COP	6.990.060,00 COP
Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD	8.406.000,00 COP	- COP	8.406.000,00 COP	1.597.140,00 COP	10.003.140,00 COP
Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE BASES DE DATOS (DAM)	23.451.000,00 COP	- COP	23.451.000,00 COP	4.455.690,00 COP	27.906.690,00 COP
Administración y soporte de la plataforma SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES (Actividades de responsabilidad con 4.16. SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES Anexo técnico)	26.449.000,00 COP	- COP	26.449.000,00 COP	5.025.310,00 COP	31.474.310,00 COP
Administración y soporte de la plataforma (ASM) - Attack Surface Management por la vigencia del Contrato	25.184.000,00 COP	- COP	25.184.000,00 COP	4.784.960,00 COP	29.968.960,00 COP
Administración y soporte de la plataforma para la protección, control y monitoreo del acceso y uso de las cuentas privilegiadas - PAM	28.708.000,00 COP	- COP	28.708.000,00 COP	5.454.520,00 COP	34.162.520,00 COP
Administración y soporte de la plataforma (MAS) para la validación de controles y protección de la aplicación móvil del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	8.263.000,00 COP	- COP	8.263.000,00 COP	1.569.970,00 COP	9.832.970,00 COP
Administración y soporte del servicio de Ciber-análisis (Recurrente a partir del 8 de mayo, fecha de salida en producción)	40.537.000,00 COP	- COP	40.537.000,00 COP	7.702.030,00 COP	48.239.030,00 COP
Valor total	\$ 515.780.000,00		\$ 515.780.000,00	\$ 97.998.200,00	613.778.200,00 COP

7. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Por el desarrollo de las actividades ejecutadas en cuanto a los servicios de soporte y administración en sitio de las plataformas descritas en el presente documento, el contratista ha facilitado los siguientes entregables producto de las actividades gestionadas y acordadas en el cronograma de trabajo:

Seguimiento a Entregables del Periodo				
Nº.	Nombre del entregable	Criterio de aceptación	Fecha de entrega	Observaciones
1	02- Gestion QRadar SIEM Mayo 2025.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
2	04-WAF-INFOBLOX TecnicoMayo1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
3	05-CTI - Threat Hunting - LAB_MALWARE - Mayo1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
4	06-VigilanciaTecnico Mayo	Bueno	28/05/2025	Ninguna
5	07-AuditoriaTecnico- Mayo -Nessus1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
6	08-Qualys SCA mayo v1.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
7	09-Fortify Mayo 1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
8	10-TrendMicroMayo1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
9	11- CiberdefensaDarktraceTecnicoMayov1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
10	12-DAMTecomayov1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
11	13-IAM-VERIFY Tecnico Mayo V1.0	Bueno	28/05/2025	Ninguna
12	14-ASM IE Técnico Tenable.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
13	04. Cyberark Mayo 2025v1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
14	15-MAS Appdome Mayo1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna
15	16-Ciberanalítica Mayo v1.0.docx	Bueno	28/05/2025	Ninguna

Se define que, para la facturación del pago del periodo reportado, el contratista debe entregar junto a la prefactura los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia
- Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales
- Informe de Gestión del Contratista o Acta de entrega formal
- RUT Actualizado
- Certificación Bancaria
- Acta de ANS de la actividad

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 173 de 2023 en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa y, por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta, la cual es por valor de **Seiscientos trece millones setecientos setenta y ocho mil doscientos PESOS MCTE (\$ 613.778.200)**.

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe:

EVALUACIÓN	
Criterio	Calificación (1-5)
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

Se firma a los 11 días del mes de julio de 2025.



**JUAN SEBASTIAN CARDENAS
HERNANDEZ**
Gerente Ciberseguridad -
Aseguramiento Informático
Supervisor CTO 173 de 2023



**ENRIQUE ALFREDO ARRAZOLA
MONTES**
Profesional 03
Apoyo a la Supervisión CTO 173 de
2023



**JONATHAN ESCOBAR
RODRIGUEZ**
Profesional Universitario 2
Apoyo a la Supervisión CTO 173 de
2023

Informe mensual Unidad de Ciberseguridad 2025

FNA contrato 173
22 de Abril al 21 de Mayo

Indicadores

2025

94,51%

Aseguramiento de Activos Críticos

95,87%

Aseguramiento Global

100%

Contención de amenazas

87,24%

Gestión de Incidentes

19,07%

Gestión de Vulnerabilidades

Cobertura de los activos críticos (bases de datos, portales y otros activos clave) asegurados con las soluciones de seguridad implementadas, interna y externamente.

Cobertura general de infraestructura tecnológica (servidores, equipos, redes, buzones y puntos finales) en las diferentes capas de seguridad implementadas.

Efectividad de los controles de seguridad en la detección y contención de amenazas

Efectividad en el alertamiento de eventos de seguridad y gestión de hallazgos externos.

Efectividad en la mitigación de vulnerabilidades o remediación de malas prácticas de configuración.

47

Fuentes de información

6

Casos de uso nuevos

60

Alertas SOC

2/4

Fuentes SOAR

20

Playbooks Generales

18

Playbooks Trend Micro

Qradar

Mayo 2025

Actividades realizadas SOC (SIEM y SOAR)

Tareas continuas

Monitoreo Continuo

Seguimiento y estados de los diferentes servicios

Tareas específicas

28 de abril: Sesión de validación de casos de uso relacionados con VPN.

29 de abril: Sesión de validación de eventos de tipo Cobtemporal.

30 de abril: Validación de un posible caso de uso referente a la adición de equipos al dominio.

3 de mayo: Revisión del reporte del SOC y validación de eventos de auditoría relacionados con la IP pública 181.225.75.203.

5 de mayo: Validación adicional de eventos relacionados con la misma IP (181.225.75.203), con foco en comportamiento y contexto.

8 de mayo: Sesión de validación de la integración entre SOAR y Cisco Firepower, realizada con el ingeniero Omar Combariza.

12 de mayo: Creación del caso de uso "FNA_AD_Se ha creado una cuenta de equipo", según validaciones anteriores.

13 de mayo: Creación del caso de uso "FNA_COBIS_Utilización Rol 1 Diferente cnxadmcobis", con base en análisis de roles críticos.

15 de mayo: Creación del caso de uso "FNA_COBIS_Eliminación Rol 98", orientado a detección de eliminación de roles de riesgo.

16 de mayo: Creación del caso de uso "FNA_COBIS_Eliminación Rol 1", para monitorear eliminaciones de roles sensibles.

19 de mayo: Creación del caso de uso "FNA_COBIS_Asignación Rol 98".

Validación del correo "Solicitud Logs CF", para confirmar disponibilidad y formato de los registros solicitados.

20 de mayo: Creación del caso de uso "FNA_COBIS_Asignación Rol 1".

Validación y afinamiento del caso de uso "FNA_FW_Posible_DoS_afiliacionesc", relacionado con tráfico anómalo o malicioso.

Para este periodo se identificó un decrecimiento en el alertamiento con respecto al periodo anterior, debido a que se está realizando un proceso de afinamiento en diferentes casos de Directorio activo y firewall según sesión con los ingenieros de redes

49

Alertas Preventivas

5

Alertas Tempranas

74.927

IoC reportados

43

Amenazas reportadas

37

Actores de amenazas
identificados

95

Vulnerabilidades reportadas

Informe CTI

MAYO 2025

Actividades realizadas CTI

- Generación y envío de 49 alertas preventivas y 5 tempranas.
- Los indicadores de compromiso han sido integrados en la plataforma de inteligencia de amenazas (TIP), con el objetivo de facilitar su correlación y uso por parte de otras soluciones de seguridad implementadas.
- Se ha compartido alertas tempranas junto con las recomendaciones de mitigación proporcionadas por los fabricantes responsables de emitir actualizaciones para los productos afectados.
- Se reitera la importancia de mantener una política sólida y continua de actualización y gestión de parches en todo el software corporativo, como medida preventiva ante posibles vulnerabilidades y para reforzar la postura de seguridad de los sistemas.
- Se han establecido relaciones entre los indicadores de compromiso integrados en la herramienta y los objetos de malware correspondientes, fortaleciendo la contextualización y trazabilidad de los elementos maliciosos.
- Se incorporaron manualmente indicadores de compromiso que no estaban contemplados en otras fuentes de inteligencia, gracias al análisis proactivo y a las capacidades de Threat Hunting del equipo especializado en ciberinteligencia de amenazas.

02

Regla a nivel de comportamiento

01

Análisis de amenazas en profundidad y focalizado

Informe Threat Hunting

MAYO 2025

Actividades realizadas Threat hunting

- Tanto los indicadores de comportamiento como de compromiso fueron ingresados en la TIP.
- Se compartieron las siguientes reglas Sigma:
 - **Running the Navigator in Headless Mode with Temporary Profile to capture visual information:** Este comportamiento, observado por la amenaza **Remcos RAT**, utiliza el ejecutable SndVol.exe o colorcpl.exe para iniciar el navegador (Chrome, Edge) en modo headless, utilizando un perfil temporal limpio almacenado en C:\User\ApplicationsData\LocalTempTmpUserData para la captura de información visual del equipo infectado.
 - **Remcos uses colorcpl.exe to run artifacts .PIF artifacts:** Se observó que la amenaza Remcos RAT utiliza el ejecutable colorcpl.exe del sistema ubicado en la ruta C:\Windows\System32 para ejecutar artefactos con extensión .PIF.
- Se realizó un análisis focalizado sobre la amenazas **Vidar Stealer**, donde se explican detalles de su funcionamiento, distribución y recomendaciones que permiten detectar y contener la amenaza.

38

Muestras sospechosas
analizadas

32

Muestras confirmadas con
algún tipo de malware

Informe Laboratorio avanzado de malware

MAYO 2025

Actividades realizadas laboratorio avanzado de malware

Para el periodo informado se realizaron los siguientes análisis solicitados por la entidad:

- Ticket #161647#: Análisis de un correo electrónico legítimo, en el que se encuentran adjuntos varios archivos de tipo PDF adjunto, y que contenían información acerca de una solicitud de crédito para la construcción de un proyecto de vivienda.
- Ticket #162080#: Análisis realizado a un correo electrónico que no contenía ningún tipo de amenaza a la seguridad de la información.
- Ticket #162490#: Análisis a una URL correspondiente a un recurso de sandbox de propiedad de Salesforce. La infraestructura del sitio se encuentra alojada en Amazon y no representa ningún riesgo para la seguridad de la información.
- Ticket #163331#: El ticket presenta un correo electrónico legítimo, en el cual se abordan recomendaciones de seguridad frente a un problema de suplantación de correos electrónicos a la compañía ISAGEN. El correo no representa amenazas a la seguridad de la información.

En el periodo reportado, el equipo del Cyber Threat Intelligence ha llevado a cabo 47 análisis de muestras sospechosas.

Los indicadores de compromiso se tienen en cuenta para ser agregados a eventos en la herramienta de MISP así como a la herramienta de Threat Intelligence Platform TIP donde se enriquecen los indicadores con información como actores de amenaza, familias de malware, tácticas y técnicas de la matriz de Mitre ATT&CK. Por consiguiente, los indicadores son agregados a las herramientas de seguridad del cliente.



Actividades realizadas Protección DNS

Para el periodo en mención se evidenció una disminución de 2.222 eventos dentro de la categoría de DoHservice en las consultas DNS, para la categoría malware download generic se evidenció un aumento de 8 siendo las categorías con más consultas dentro del DNS.

Actividades realizadas

- Monitoreo de plataforma Infoblox para la verificación de conexiones sospechosas y maliciosas.
- Validación de disponibilidad de la plataforma Infoblox.

Actividades semanales:

- Monitoreo de eventos revisión de los eventos para detectar cualquier actividad inusual o anómala que pueda indicar un posible ataque.
- Análisis de direcciones IP esto con el de identificar si se encuentran direcciones inactivas.
- Revisión plataforma Infoblox para evaluar el estado general de tu infraestructura.

25 M

Eventos detectados

33

Indicadores de amenaza

FORTINET

FortiWeb™

MAYO 2025

Actividades realizadas protección portales (WAF)

A nivel de políticas en FNA se ha dispuesto bloquear el tráfico desde Rusia y Ucrania.

Actividades diarias:

- Análisis de eventos, como ataques bloqueados o intentos de acceso no autorizados.
- Verificación de recepción de alertas en el SIEM.
- Revisión de los registros del WAF de información sobre los eventos del sistema del dispositivo en busca de alertas de fallas o bajo rendimiento que pueda afectar la disponibilidad del WAF.
- Revisión del estado de la actualización de las firmas y protección web.

Actividades semanales:

- Limpiar registros y archivos temporales para mantener un estado saludable en el espacio del dispositivo.
- Verificación del sistema operativo del WAF respecto a su correcto funcionamiento.

+236 M

Eventos verificados por el WAF

8

Categorías de amenaza
Detectadas por WAF

276.988

Know Botnets

210.096

IP Reputation

29.474

SQL/XSS

1.997

Signature detection

1.202

Geo IP

6.560

Dispositivos
modelados

183

Subredes

946

Dispositivos en
brechas

1.347

Brechas

132

Modelos

128

Brechas
contenidas

Informe solución Darktrace/Respond

MAYO 2025

Actividades realizadas ciberdefensa (NDR)

Durante el periodo del 22 de Abril al 21 de Mayo se realizaron las siguientes actividades principales

- Se realizan exclusiones para los modelos Antigena Internal Data Transfer Block y Network Scan de acuerdo con el cambio C70863 - Servidor de VeamBackup, acción generada por nuevo servidor implementado y tareas que se ejecutaron durante el periodo de BackUp de dispositivos.
- Se escala al área de CTI de Mnemo, diferentes correos electrónicos reportados por usuarios finales, para ser analizados y determinar su veracidad y que no contengan archivos o links maliciosos.
- Se evidencia un aumento aproximado de 1000 nuevos equipos modelados, esto se debe al reingreso de personal y cambio de equipos portátiles.
- Se puede evidenciar que la cantidad en TB de data procesada por cada una de las interfaces, con un total de 580 TB aproximadamente aumento durante el periodo con respecto al mes anterior, esto se puede justificar con las tareas de Back Up de los servidores de Veam Back up

285.310

Correos Entrantes

10.537

Correos con accion

274.773

Correos Entregados

990.522

Correos Salientes

Informe solución Darktrace/Email

MAYO 2025

Actividades realizadas protección Email

- Se realiza acompañamiento en las actividades del C70117, para el retiro de Servidores de Infoblox e implementando nuevos servidores
- Se realiza acompañamiento en sesión de revisión de inconvenientes con resolución de DNS, efectos secundarios del C70117
- Se escala al área de CTI para el análisis del correo "Documentación proyecto torres del dorado - La Cumbre Construcciones" (El correo electrónico no presenta ningún tipo de amenaza, el adjunto contiene una serie de documentos de tipo PDF)
- Se realizan exclusiones en los modelos Antigena Internal Data Transfer Block y Network Scan de acuerdo con el cambio C70863 - Servidor de VeamBackup

Top Acciones	Total, Acciones	% total de correos
Move to Junk	4.277	1%
Lock Link	2.729	1%
Hold	2.575	0,9%
Convert Attachment	354	0,1%
Double Lock Link	602	0,2%

- Se escala al área de CTI para el análisis del correo "ISAGEN - Suplantación de órdenes de compra y personal de ISAGEN" (enviado por la compañía ISAGEN indicando que se han identificado varios mensajes de correos electrónicos con supuestas órdenes de compra falsas y suplantaciones de colaboradores de la organización)
- Se escala al área de CTI para el análisis del correo "Asunto: Creación usuario de acceso a Inspektor" (El correo es legítimo y contiene las credenciales de acceso para la aplicación Inspektor, la cual es utilizada para realizar búsquedas de tipo SARLAFT,)
- Se realiza exclusión en el modelo SMB Enumeration de acuerdo a la alerta reportada 60966
- Se realiza análisis del correo reportado por Andrés Garzón "Re: CORREO CAPITAL" el cual se evidencia que no esta siendo bloqueado por Darktrace/Email y el link que contiene no es malicioso



Guardium®
Mayo 2025

395
Data Exfiltration

38
OS Command Injection

7
SQL Injection - Side channel

36
SQL Injection - Tautology

4
Cross-Site Scripting

Actividades realizadas protección de base de datos (DAM)

Actividades macro ejecutadas

- Finalización regla COBIS, modificación tasas, rol 79.
- Evaluación TSM, plataforma backup.
- Gestión de agentes con pérdida de conectividad.
- Depuración de reglas y grupos sin uso.

Actividades a ejecutar

- Configuración alerta modificación políticas.
- Configuración reporte auditoría roles y transacciones COBIS.
- Alerta system administrator.
- SOC realice radicación tickets fallo agente STAP.
- Supervisión y definición de reglas alcance del negocio.

Activo	Cobertura
Servidores	33
Instancias	79
Bases de datos	687

COBIS

101
Eventos asignación de roles

255
Eventos eliminación de roles

1
Eventos adición de transacciones

SAPHANA

157
Eventos asignación de roles

53
Eventos eliminación de roles



IBM Security Verify

Operación

Integraciones en proceso

Sistema de Turnos: La integración se encuentra en fase de desarrollo, avanzando conforme a los lineamientos establecidos y con base en los resultados obtenidos durante la etapa de pruebas.

Administración de Usuarios: Esta integración se encuentra actualmente en fase de desarrollo y ha sido escalada al equipo de fábrica de Administración de Usuarios, debido a que se presentaron errores en los WebServices de Consultar por Documento, Desasignar Rol y Modificar Usuario.

CRM: La integración con el sistema CRM se encuentra en fase de validación. Se está a la espera del apoyo por parte del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para la entrega de información adicional requerida, la cual es necesaria para continuar con el diseño y desarrollo de la solución. Una vez recibida dicha información, se procederá con las configuraciones técnicas y las pruebas correspondientes.

Gestión Funcional

Durante el periodo anterior se atendieron 18.665 solicitudes, mientras que en el periodo actual se gestionaron 11.370 solicitudes, lo que representa una disminución en aproximadamente un 39,07% respecto al periodo anterior en la cantidad de solicitudes atendidas. Esta disminución obedece a una menor demanda de soporte y gestión operativa sobre la plataforma, impulsada principalmente por los procesos gestionados por la Gerencia de Gestión Humana relacionados con las ausencias durante la Semana Santa y la salida masiva de colaboradores con contrato temporal por finalización de periodo laboral que se vio reflejado en el mes anterior.

Adicionalmente, se realizó una nueva capacitación al personal de la Mesa de Servicio, enfocada en reforzar el conocimiento sobre las funcionalidades clave a tener en cuenta ante eventos recurrentes del día a día. Asimismo, se continúa trabajando en la sensibilización del usuario final, promoviendo el uso de la autogestión a través de Verify como primera alternativa de atención.

18.665

Operaciones IAM

+1,5K

Usuarios con autogestión

56

Eventos
reportados

42

Identity Fraud

11

Data Protection

3

Brand Protection

Informe Monitoreo de Marca

Mayo 2025

Actividades realizadas vigilancia digital

- Identificación y notificación de eventos.
- Monitoreo de redes sociales.
- Seguimiento y gestión de baja de 2 eventos de suplantación VIP
- Seguimiento de 1 ataque a la reputación VIP
- Gestión de baja de contenidos para 63 eventos relacionados principalmente con el ofrecimiento de retiro de cesantías, logrando la baja efectiva del 83.9% de los eventos gestionados.
- Notificación de 1368 credenciales de terceros.
- Seguimiento y notificación de menciones de marca.
- Seguimiento y notificación quincenal de Ataques a la reputación

387

Activos evaluados

7

Activos duplicados

22

Activos sin controles

6

Activos sin conexión en un mes

18

Políticas evaluadas

5.127

Controles evaluados

Informe de Actividades Qualys módulo SCA

Mayo 2025



Actividades realizadas Líneas Base

Más del 50% de los controles se encuentran en cumplimiento, sin embargo, existe una cantidad importante de controles en estado no superado los cuales deben ser verificados con el fin de validar si el criterio de evaluación es el correcto o por el contrario se debe ajustar la configuración en cada carga de trabajo.

- Los cambios en las métricas mostrados mes a mes se deben a la eliminación o adición de agentes, reinstalación de agentes, solución de problemas de conexión con el Gateway.
- Actualmente no se encuentra con alcance y autenticación a 6 dispositivos compartidos por FNA, se realiza el escalamiento al área encargada para la validación de estos.
- Actualmente se cuenta con un promedio 5 servidores que son dados de baja, en caso de que estos lleguen a ser reemplazados, es importante realizar la notificación vía electrónica para realizar su adición a través del proceso de instalación de agente en estos dispositivos o servidores nuevos.
- Se requiere realizar el envío del formato 031 con el fin de realizar el cruce de información.

GESTIÓN PLATAFORMA – ACTIVIDADES REALIZADAS

- Revisión semanal para validar el estado de los agentes en su etiquetado, duplicidad y última conexión.
- Identificación de agentes que llevan más de un mes sin reportar conexión.
- Solicitud de información sobre servidores Windows, Red Hat sin reportar en más de un mes.
- Identificación de causa de duplicidad de activos.
- Generación de reportes de cumplimiento bajo demanda.
- Solicitud de inventario 2025 de dispositivos de red, bases de datos y servidores (Linux, AIX y Windows).
- Cruce de información de inventarios con plataforma.
- Pruebas de alcance y autenticación dispositivos de red.
- Programación de escaneos y reportes mensuales.
- Pruebas de alcance para autenticación a bases de datos y validación de agentes instalados en servidores.
- Se realiza solicitud de validación con los administradores de LINUX y WINDOWS esto con el fin de validar la funcionalidad del sistema operativo.
- Se realiza la adición de la política CIS Benchmark for Microsoft Windows Server 2025.

7

Ethical Hacking

0

Retest Ethical Hacking

5

Retest Análisis de Vulnerabilidades

2

Análisis de Vulnerabilidades

8

Análisis de Código

0

Ingeniería Social

Informe Seguridad Ofensiva

Mayo 2025

Actividades realizadas seguridad ofensiva

Se ejecutan los siguientes ejercicios de retest y análisis de vulnerabilidades, los activos pertenecen a los siguientes proveedores encargados de la administración:

- Re-test_29042025_COMWARE
- Re-test_23042025_Servialco
- Re-test_23042025_Impresoras
- Re-test_23042025_COMWARE_2
- Re-test_23042025_COMWARE
- AV_Cisco2
- AV_T270596_0525

Durante el proceso de re-test, se enviaron al escáner los mismos hallazgos que fueron auditados en el período anterior con el objetivo de validar cuáles de estos habían sido completamente remediados y cuáles no. En total, se gestionaron **193** hallazgos, los cuales fueron sometidos a los re-tests correspondientes. De estos, se identificó que **115** hallazgos fueron completamente remediados, mientras que **14** hallazgos fueron parcialmente remediados, el restante aún siguen activos. En estos casos, se está a la espera de la respuesta del administrador respecto a la implementación de las soluciones finales para dar el cierre total.

Las vulnerabilidades activas que afectan al mayor número de activos están relacionadas con los siguientes hallazgos:

- TLS Version 1.0 Protocol Detection
- SSL Certificate Expiry
- SSL Certificate Cannot Be Trusted
- Apache Tomcat 9.0.0.M1 < 9.0.90



Fortify SCA

Informe de Actividades y Funcionamiento Fortify

Mayo 2025

Actividades realizadas análisis de código (fortify)

Actividad General:

Durante el periodo actual, se ejecutaron **8** análisis de código correspondientes a la circular 033. Dentro de la auditoría se identificó un total de **51** vulnerabilidades clasificadas de la siguiente manera: **6 altas**, **30 medias** y **15 bajas**.

Integraciones y Automatizaciones (Desarrollos):

Durante este período, no se llevaron a cabo integraciones.

Rendimiento y Disponibilidad:

No se registraron tiempos de inactividad, tanto planificados como no planificados. Además, el rendimiento del sistema se mantuvo dentro de los parámetros normales, incluso durante los picos de carga máxima.

Esta estabilidad refleja un nivel adecuado de operación y una infraestructura tecnológica sólida y bien gestionada. Se continúa con las prácticas actuales de monitoreo y gestión de la infraestructura para garantizar que el sistema mantenga su disponibilidad y rendimiento en niveles óptimos a medida que evolucionen las demandas de carga.

Planes para futuras mejoras o actualizaciones:

Actualmente, la suite Fortify se encuentra actualizada a una versión estable proporcionada por el fabricante. Esta actualización asegura que la herramienta esté alineada con las últimas mejoras de seguridad, correcciones de errores y nuevas funcionalidades, lo que optimiza su rendimiento y fiabilidad en el proceso de auditoría de aplicaciones.

Es recomendable continuar con el monitoreo de futuras actualizaciones para mantener la suite al día y aprovechar las mejoras tecnológicas que el fabricante continúe implementando.

34

Archivos nuevos
encontrados por
Behavior monitoring

57

Eventos en equipos
finales

442

positivos

943

Device Control

811

iones nuevas

86118

Eventos IPS

32701

Eventos correo

Informe Soluciones Antimalware

Mayo 2025

Actividades realizadas protección antimalware

De acuerdo con los eventos generados en las diferentes herramientas y la gestión diaria dentro del FNA se dan las siguientes recomendaciones y conclusiones.

- Antivirus el usuario Nvillalba en el dispositivo GCE-TCC-03-2634, se encuentra dentro del top de eventos esto debido a que se registra dentro de un archivos de backup shadowcopy algunos archivos maliciosos como activadores e instaladores, reconocidos como troyanos, al estar dentro de una copia de seguridad registran varias veces dentro de los eventos. Se requiere validar con soporte en sitio para eliminar esa copia corrupta.
- Antivirus servidores Se registran 340 eventos maliciosos, estos corresponden a 2 detecciones una por el archivo PUA.Win32.KeyView.AA, en el servidor FNABOGACL, esta fue registrada como un spyware y puesto en cuarentena. En el servidor FNABOGPR1, se registraron 339 eventos debido a la detección de archivo DEXON, este fue detectado en una copia de respaldo que al parecer es periódicamente replicada, por lo que este eventos se repite constantemente, se creó caso con administradores para realizar validación de la copia.
- Application control registro 190 aplicaciones bloqueadas dentro de lista negra.
- Application control registro en lista blanca 342 eventos, estos son solo de monitoreo con el fin de alimentar la lista de aplicaciones a bloquear.
- XDR Workbench IC-35600-20250513-00003: evento correspondiente a la ejecución de archivo D:\SSTR\MInst\Portable\x86\DATTEX.EXE el cual es reconocido como un backdoor y bloqueado en el dispositivo VRE-PA-CAN-3567.
- IC-35600-20250505-00002: Evento relacionado con el intento de desactivación de la característica en MAC GateKeeper, Gatekeeper, una función de seguridad en macOS, está diseñada para garantizar que solo se ejecute software confiable en una Mac. Esta detección identifica intentos de desactivar o eludir Gatekeeper mediante la modificación de configuraciones del sistema o atributos de archivos, detección en el equipo MacBook-Pro-de-Fondo por el usuario jaimearturoquinteroamaya.

34

Archivos nuevos
encontrados por
Behavior monitoring

57

Eventos en equipos
finales

442

positivos

943

Device Control

811

iones nuevas

86118

Eventos IPS

32701

Eventos correo

Informe Soluciones Antimalware

Mayo 2025

Actividades realizadas protección antimalware

- Attack Surface Discovery: La clasificación alta del dominio agendamiento.fna.gov.co, es asignada debido a que indica que el certificado no es válido o a expirado, por lo que puede llegar a ser accesible desde internet, se recomienda realizar actualización del certificado.
- Se realiza configuración de API para la integración completa de Trend Micro con las solución de Qradar, se trabaja en hacer seguimiento para confirmar correcto funcionamiento.
- CASB adición de url <http://www.facebcok.com> en la política de web control ya que es un falso positivo.
- Se realizó cambio físico para la redirección del tráfico que antes pasaba por el Exinda hacia el IPS, pero que ahora directo por el IPS. se encuentra pendiente cambio para el día 07 de junio para el cambio lógico con el área de redes.
- Se trabaja en el cambio de equipos a Windows 11 con soporte en sitio, por medio de los casos creados en service manager y la confirmación de la activación en la consola de Trend Micro, se recomienda dar los permisos para el uso de PDQ, ya que se observa algunos equipos con fallos en la activación de XDR y algunos que no se instalaron
- Cierre tarea de petición T270607 Inclusión de excepciones en Antivirus de FNA, de acuerdo con el documento que se adjunta en la tarea y los KB <https://www.veeam.com/kb1999> y <https://www.veeam.com/kb2034>.
- Se confirma funcionamiento de la herramienta ADSync tool después de cierre de cambio con redes, pendiente de creación de caso para que la tarea de actualización de usuarios del AD quede automatizada.
- Creación de caso para validación de servidores Linux con poco espacio de almacenamiento, se realiza validación y el antivirus se encuentra instalado correctamente por lo que puede ser un falso positivo.
- Se encuentra en el momento del informe 108 dispositivos dentro de la política de AppControl en lista blanca, con el fin de recopilar aplicaciones no deseadas y agregarlas a lista negra. Se continúa validando las aplicaciones reportadas y aumentando la cantidad de máquinas en la regla de monitoreo
- exclusión de URLs reportadas por Trend Micro, <https://app.firmacentral.com>, <https://certstest.pkipaynet.com.co> y <https://app01.firmacentral.com>, debido a bloqueo en aplicación
- Actualmente se tiene activas las reglas de detección de cédulas, ejecutables y extensiones de bases de datos para CASB, se trabajó para confirmar su correcto funcionamiento. Se recomienda validar nuevas reglas para la solución.

Informe Cyberark

Mayo 2025

362

Sesiones generadas

52.48%

Sesiones con duración
mayor a 60 minutos

Actividades

- Durante el periodo se identifico el uso de 25 licencias EPV, posterior a la depuración realizada
- Se generaron un total de 362 sesiones durante el periodo de las cuales el 59.67% fueron por medio de los portales PVWA y el 40.33% por medio de herramientas nativas
- El 96.96% de estas sesiones muestran una duración superior a un minuto y el 52.48% de estas sesiones tienen una duración superior 60 minutos
- Para el periodo evaluado se observan sesiones todos los días, realizadas por los usuarios por medio de CyberArk

ASM

DOMINIOS

5

Debilidades en configuración de SSL/TLS

6

Activos con CVE

31

Sitios expuestos

5 SUBDOMINIOS

10 TOTAL ASSETS

IE

8,266

USUARIOS REGISTRADOS

79,73%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

ATTACK SURFACE MANAGEMENT (ASM) - IDENTITY EXPOSURE (IE)

Mayo 2025

Actividades Realizadas ASM

- Se mantuvo el monitoreo activo del dominio **fna.gov.co**, luego de dar de baja al dominio **fna.com.co**, el cual fue previamente analizado y explicado en sesiones técnicas.
- Se gestionaron **110 activos expuestos**, distribuidos en **1 dominio y 65 subdominios**.
- **5.45%** de los activos están asociados a **vulnerabilidades (CVEs)** conocidas, y **0.91%** presentan **certificados SSL expirados**.
- Se identificaron **31 sitios web** expuestos públicamente, aumentando la superficie de ataque.
- Se identificaron también servicios sensibles como **5 activos SMTP**, **2 MySQL** y **1 activo con SSL expirado**.

IE

- Se revisaron **más de 8.200 cuentas** en Active Directory, evaluando estados, inactividad y cumplimiento de políticas.
- Se identificaron **indicadores críticos** como **delegación peligrosa de Kerberos** y **usuarios no autorizados gestionando controladores de dominio**. Se realizaron sesiones técnicas para exponer hallazgos, aclarar funcionamiento de los módulos y entregar resultados.

100%

Aplicaciones aseguradas

1

Versiones aseguradas

2

Sistemas Operativos asegurados

3

Firmas aseguradas



Durante el periodo del 22 de abril al 21 de Mayo se realizo diferentes mesas de trabajo para la implementación.

- Se realiza socialización de proceso para el cargue y aseguramiento de la aplicación móvil.
- Por parte del equipo de FNA se realizó la creación de los usuarios para el ingreso al transfer donde se cargaron las aplicaciones, certificados, firmas, bitácora etc.
- Una vez confirmado el cargue de la aplicación por parte del equipo de desarrollo, Mnemo procedió a realizar el aseguramiento de las aplicaciones.
- Durante el proceso de aseguramiento de la aplicación, Appdome genero un error al momento de firmar la aplicación del sistema operativo iOS , donde se solicitó soporte con fabricante para solventar el error reportado.
- Se realizaron diferentes sesiones con fabrica, el área de desarrollo y Mnemo, en donde se obtuvo solución y se logró asegurar las aplicaciones sin ningún problema.
- Se realiza sesión en conjunto con fabrica para realizar el aseguramiento de las aplicaciones en conjunto.
- Se realiza el cargue de las aplicaciones aseguradas (Android y iOS) en el transfer, esto para el entorno de certificación (pruebas) y las respectivas pruebas QA.
- Se recibió el workshop de Signing (Firma) por parte de fábrica.
- Se recibió el workshop de QA & troubleshooting (Soporte e incidentes) por parte de fábrica.

80

términos de negocio
documentados

6

Reglas de calidad activas

26

Tickets gestionados

5

Flujos de ingesta
automatizados

Informe Administración Ciberanalítica

Mayo 2025

- **Gobierno del dato:** ontología “Cyber”, 80 términos modelados y reglas de calidad automatizadas sobre datos críticos de ciberseguridad.
- **Soporte técnico:** más de 20 tickets gestionados vía Jira; operación activa en niveles N1-N3.
- **Automatización de datos:** workflows diarios/mensuales y scheduler por fuente (SFTP, API, BBDD) para alimentar dashboards y KPIs.
- **Caso de uso perfilamiento:** flujo digital trazable propuesto; su implementación requeriría un sistema transaccional externo.

Informe de Consultoría

2025

Objetivo

Presentar las principales actividades realizadas para la implementación de la unidad de ciberseguridad en el FNA indicando su estado actual y pasos a seguir.

Alcance

Incluye las actividades de planeación realizadas a la fecha del corte, las actividades ejecutadas en busca de concretar los objetivos planeados, los logros alcanzados y los pasos siguientes.

GT-GGT-PR-005 GESTION DE CIBERSEGURIDAD

PROPUESTA DE
ORGANIZACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE ACUERDO CON
MODELO NIST
= 2.0

Gobernar

- Política de ciberseguridad
- Funciones y responsabilidades

Identificar

- Gestión de activos
- Evaluación de riesgos (vulnerabilidades)

Proteger

- Gestión de identidades, autenticación y control de acceso
- Capacitación y concientización
- Seguridad de datos
- Seguridad de plataformas

Detectar

- Monitoreo continuo
- Análisis de eventos adversos

Responder

- Gestión de incidentes

Recuperar

- Plan de recuperación de incidentes
- Plan de continuidad de la UCS
- Plan de continuidad de los terceros de la cadena de suministro de ciberseguridad

Avances en documentación de Indicadores y Procedimientos

Se documentaron, sustentaron y se encuentran en ajuste los siguientes indicadores:

- Activos Críticos
- Contención de amenazas
- Gestión de eventos
- Gestión de vulnerabilidades
- Seguridad de infraestructura

Se documentaron cambios a los siguientes procedimientos:

- Aseguramiento de plataforma tecnológica
- Conexión a la red corporativa del FNA
- Configuración de equipos de cómputo y periféricos
- Gestión de certificados criptográficos
- Políticas de seguridad
- Gestión de controles de aseguramiento informático
- Instructivo gestión del centro de operación SOC
- Procedimiento Seguimiento a Terceros (autorizaciones para el tercero de ciberseguridad)
- Procedimiento de Gestión de Activos

Pendiente realizar las pruebas de los siguientes playbooks:

- Password Spraying
- Intrusiones

**Pruebas de
Playbooks**



Para : Fondo Nacional de Ahorro SA
Nit : 899.999.284-4
Fecha : 2025-07-07

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764085737391 vigencia desde 19-12-2024 hasta el 18-12-2025 desde el FE 33 al 5.000 vigencia 12 meses.

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	Administración y soporte de la plataforma XDR	1.00	3,326,000.00	3,957,940.00	0.00
2	Administración y soporte de la plataforma SIEM	1.00	152,913,000.00	181,966,470.00	0.00
3	Administración y soporte de la plataforma SOAR	1.00	14,627,000.00	17,406,130.00	0.00
4	Administración y soporte de la plataforma THREAT INTELLIGENCE	1.00	27,797,000.00	33,078,430.00	0.00
5	Administración y soporte Servicio BRAND CYBERSECURITY MONITORING.	1.00	55,994,000.00	66,632,860.00	0.00
6	Administración y soporte Servicio de MONITOREO DE DNS	1.00	52,083,000.00	61,978,770.00	0.00
7	Administración y soporte de la plataforma SECURE DEVELOPMENT ASSESSMENT	1.00	8,279,000.00	9,852,010.00	0.00
8	Administración y soporte Endpoint PROTECCIÓN ANTIMALWARE, CONTROL DE APLICACIONES, PROTECCIÓN WEB, CONTROL DE ACCESO SEGURO A LA NUBE, SERVER SECURITY, INTRUSION PREVENTION SYSTEM, ISOLATED EXECUTION	1.00	33,889,000.00	40,327,910.00	0.00
9	Administración y soporte de la plataforma CIBERDEFENSA	1.00	5,874,000.00	6,990,060.00	0.00
10	Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD	1.00	8,406,000.00	10,003,140.00	0.00
11	Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE BASES DE DATOS (DAM)	1.00	23,451,000.00	27,906,690.00	0.00
12	Administración y soporte de la plataforma SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES (Actividades de responsabilidad con 4.16. SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES Anexo técnico)	1.00	26,449,000.00	31,474,310.00	0.00
13	Administración y soporte de la plataforma (ASM) - Attack Surface Management por la vigencia del Contrato	1.00	25,184,000.00	29,968,960.00	0.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
14	Administración y soporte de la plataforma para la protección, control y monitoreo del acceso y uso de las cuentas privilegiadas - PAM	1.00	28,708,000.00	34,162,520.00	0.00
15	Administración y soporte de la plataforma (MAS) para la validación de controles y protección de la aplicación móvil del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	1.00	8,263,000.00	9,832,970.00	0.00
16	Administración y soporte del servicio de Ciber-analítica (Recurrente a partir del 8 de mayo, fecha de salida en producción)	1.00	40,537,000.00	48,239,030.00	0.00

Total Bruto 515,780,000.00

Subtotal 515,780,000.00

IVA 19% 97,998,200.00

Total a Pagar 613,778,200.00

Valor en Letras: SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

Mnemo Colombia S.A.S. 49% NIT 900.396.176-1 Contribuyente

Mnemo Cyber Sec SAS 50% NIT 901.447.968-1 Contribuyente

Mnemo Evolution & integration Service SA 1% NIT:901.306.687-2 Contribuyente

DAVID TOVAR LOZANO
contadorjunior@mnemo.com
(3017710213)



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **CONSORCIO UNIDAD DECIBERSEGURIDAD FNA**, identificado(a) con NIT número **901.781.625-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS EM No. 0136002901** apertura el **19 de diciembre del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **15 de mayo del 2025**.


Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:


Cuenta de 10 dígitos:**0136002901**


Cuenta de 16 dígitos:**0136000200002901**

Cuenta de 20 dígitos:**00130136000200002901**


Firma autorizada
BBVA Colombia


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141064929586			
				 (415)7707212489984(8020) 000014106492958 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 4 7 9 6 8		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
MNEMO CYBER SEC S.A.S							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 99 NO 10 19 OF 502							
42. Correo electrónico j.parra@mnemo.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
1 1 0 1 1 1		6 9 1 3 1 3 3					
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1 2		51. Código			
6 2 0 1		2 0 2 0, 1 2, 2 9		6 2 0 2		2 0 2 0, 1 2, 2 9	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VELEZ CASTRO HUMBERTO DE JESUS			
				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141064929586			
 (415)7707212489984(8020) 000014106492958 6							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 4 7 9 6 8		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 2 8			
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri		101. Número de identificación 2 2 6 6 7 3 5 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VICENT		105. Segundo apellido FERNANDEZ		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 1 1 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 8 7 7 0 4 4 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional 6 1 0 6 1 - T	
104. Primer apellido VELEZ		105. Segundo apellido CASTRO		106. Primer nombre HUMBERTO		107. Otros nombres DE JESUS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141064929586				
 (415)7707212489984(8020) 000014106492958 6								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 1 4 4 7 9 6 8		1		Impuestos de Bogotá		3 2		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV		127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 1 8 4 0 8 8 7 6				2 3 2 3 2 5 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres	
	TOVAR		LOZANO		JAIRO		DAVID	
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
	135. Fecha de nombramiento		2 0 2 3 0 3 3 0					
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada			
	147. Fecha de nombramiento							
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 3 0 6 1 8 6 2 6				2 8 1 3 8 9 T	
Contador	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
	PINZON		ROJAS		ANDRES		CAMILO	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 2 2 3					


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141064925838	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9003961761				6. DV 1	
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá				14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social MNEMO COLOMBIA SAS		36. Nombre comercial	
37. Sigla		38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.	
40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		41. Dirección principal CL 99 10 19 OF 502		42. Correo electrónico recepcion.colombia@mnemo.com	
43. Código postal 110111		44. Teléfono 1 3183835117		45. Teléfono 2 575527210	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 6201		47. Fecha inicio actividad 20101112		48. Código 6202	
49. Fecha inicio actividad 20101112		50. Código 1 6209		2 8551	
51. Código		52. Número establecimientos			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 57910141819264142485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 26- Declaración individual precios de tran					
07- Retención en la fuente a título de rent 41- Declaración anual de activos en el exte					
09- Retención en la fuente en el impuesto 42- Obligado a llevar contabilidad					
10- Obligado aduanero 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrónico					
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales					
19- Productor de bienes y/o servicios exen					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 23			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:		
984. Nombre VELEZ CASTRO HUMBERTO DE JESUS			985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado		


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141064925838			
				 (415)7707212489984(8020) 000014106492583 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 9 6 1 7 6		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 8 2 9			
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri		101. Número de identificación 2 2 6 6 7 3 5 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VICENT		105. Segundo apellido FERNANDEZ		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 1 1 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 8 7 7 0 4 4 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional 6 1 0 6 1 - T	
104. Primer apellido VELEZ		105. Segundo apellido CASTRO		106. Primer nombre HUMBERTO		107. Otros nombres DE JESUS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141064925838			
 (415)7707212489984(8020) 000014106492583 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 9 6 1 7 6		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 4 2 3 9 5 8 1		2 7 3 9 8 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	SALAZAR		GOMEZ		JOSE		IGNACIO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 2 3 0 3 3 1						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 1 8 4 0 8 8 7 6		2 3 2 3 2 5 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	TOVAR		LOZANO		JAIRO		DAVID
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 2 0 1 1 7							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141064931180			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 0 6 6 8 7 2				6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1			25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES S.A.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bogotá D.C. 1 1		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1			
41. Dirección principal CL 99 10 19 OF 502							
42. Correo electrónico Jc.aponte@mnemo.com							
43. Código postal 1 1 0 1 1 1				44. Teléfono 1 6 9 1 3 1 3 3		45. Teléfono 2 3 1 0 3 2 4 3 4 7 5	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6 2 0 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 7 0 2		48. Código 6 2 0 2		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 7 0 2	
50. Código 1 6 2 0 9		51. Código					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PARRA GAMBOA JOHN JAIRO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141064931180			
 (415)7707212489984(8020) 000014106493118 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 0 6 6 8 7		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		9 9	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5				82. Nacional	
72. Número						0 %	
73. Fecha		2 0 1 9 0 7 2 6				83. Nacional público	
74. Número de notaría		6 5				0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 9 0 7 2 6				0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 3 1 4 4 6 0 3				85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				1 0 0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
						0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 1 9 0 7 2 6				1 0 0 . 0 %	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	4 9	2 0 1 9 0 7 2 6		-			
2	8 1	2 0 1 9 0 7 2 6		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141064931180			
				 (415)7707212489984(8020) 000014106493118 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 0 6 6 8 7		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 4 0 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 8 0 8 0 8 4 2 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido PARRA		105. Segundo apellido GAMBOA		106. Primer nombre JOHN		107. Otros nombres JAIRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141064931180			
 (415)7707212489984(8020) 000014106493118 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 0 6 6 8 7		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		8 7 7 0 4 4 6		6 1 0 6 1		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	VELEZ		CASTRO		HUMBERTO		DE JESUS
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 2 1 0 2 1 5						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 1 8 4 0 8 8 7 6				2 3 2 3 2 5
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	TOVAR		LOZANO		JAIRO		DAVID
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 1 0 6 0 1							

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085737391



(415)7707212489984(8020) 001876408573739 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 7 8 1 6 2 5

1

11. Razón social

CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 99 # 10 - 19 OF 502 ED TRADE CENTER

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VELEZ CASTRO HUMBERTO DE JESUS

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 8 7 7 0 4 4 6


1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 2 - 1 9 / 1 5 : 4 8 : 1 0

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18764085737391			
						(415)7707212489984(8020) 001876408573739 1			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 1 7 8 1 6 2 5		1							
11. Razón social									
CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento								
	CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA CL 99 # 10 - 19 OF 502 ED TRADE CENTER								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	33	5,000	12	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	



Bogotá, 13 de Junio de 2025

Señores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Ciudad.

REF: CIRCULAR 042 DE 2012

Respetados señores:

Con la presente certificamos que para la empresa **CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA SA**, identificada con **NIT.901.781.625-1**, no aplica la circular en referencia, debido a que no nos encontramos vigilados por la Superintendencia de Sociedades.

Agradecemos la atención a la presente,

Cordialmente,

HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO
Representante legal
MNENO COLOMBIA SAS

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	45	FECHA DE CONTABILIZACION	30-jul-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300483370	FECHA DE DOCUMENTO	30-jul-25
		FECHA DE COMPENSACION	30-jul-25
PROPUESTA	52633	FECHA DE LA PROPUESTA	30-jul-25

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSE		
No. IDENTIFICACION	9017816251	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	0136002901	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO BBVA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD		
No. IDENTIFICACIÓN	9017816251	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	CONSORCIO UNIDAD DE		
OBSERVACIONES:	FE45 RAD 02-2303-202507160868627		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BV02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	576.043.735		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003700788	5300483370	45	576.043.735	FE45 RAD 02-2303-202507160868627	5400001890	CTO 173-2023 AD

División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300483370	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	16.07.2025
N° DE REFERENCIA	45	FECHA DE PAGO	30.07.2025

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
N° IDENTIFICACIÓN	NIT	8999992844	

PROVEEDOR	CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD	N° IDENTIFICACION	9017816251
BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	CONSORCIO UNIDAD DE		
N° IDENTIFICACION	9017816251	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	CIUDAD	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	0136002901	BANCO	BANCO BBVA
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	INFORME N°	CTO 173-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FE45 RAD 02-2303-202507160868627		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
20001368	6200000115	00010	CTO 173 DE 2023 .	1000055442	5105630994	337.836.240
20001368	6200000115	00020	CTO 173 DE 2023 .	1000056732	5105630994	40.327.910
20001368	6200000115	00050	CTO 173 DE 2023 .	1000056734	5105630994	16.993.200
20001368	6200000115	00060	CTO 173 DE 2023 .	1000056735	5105630994	27.906.690
20001368	6200000115	00040	CTO 173 DE 2023 .	1000055440	5105630994	31.474.310
20001368	6200000115	00070	CTO 173 DE 2023 .	1000056042	5105630994	37.036.370
AFECTACIÓN PEDIDO						491.574.720
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.		491.574.720,00				
DESCUENTOS		-84.469.015,00				
NOTAS CRÉDITOS		0,00				
VALOR A PAGAR		576.043.735,00				
