

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

1. INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN									
Fecha de elaboración del informe	16	07	2025	Periodo de seguimiento	1 - 31	mayo	2025	Informe número	01
Nombre del supervisor	Carolina Otilia Montealegre Castillo				Documento delegación			Correo electrónico	
Cargo	Supervisor Proyectos SGR				Resolución 0477 del 15 de julio de 2025			drq-supervisorsgr@minciencias.gov.co	
Profesional de apoyo a la supervisión	Carlos Rojas Ortiz				Correo electrónico			cyrojas@minciencias.gov.co	
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
BPIN	Nombre del proyecto							Nombre de la entidad ejecutora	
2024000100034	Desarrollo de tecnologías regenerativas que promuevan la fertilidad de los suelos y la producción sostenible del cultivo de plátano y banano con estrategias que integren la apropiación social del conocimiento y transferencia tecnológica a productores del Departamento del Quindío.							Universidad La Gran Colombia seccional Armenia	
Convocatoria de la cual deriva el proyecto	032 "Convocatoria Para La Conformación De Un Listado De Proyectos Elegibles Que Contribuyan A Resolver Los Retos Asociados Con El Derecho A La Alimentación – Colombia Por Un Campo Productivo Y Sostenible"	Acuerdo aprobatorio	No.	Fecha	Valor aprobado conforme Acuerdo de Aprobación			Fe de erratas Acuerdo aprobación	
					SGR (ACTel)	Contrapartida	Total		
			050	31/12/2024	\$ 3.359.315.943,00	\$ 723.100.000,00	\$4.082.415.943,00		N/A
Plazo Inicial (meses)		Fecha de inicio del proyecto	Fecha de inicio reportada en GESPROY	Fecha final Inicial reportada en GESPROY	Ampliación de Horizonte (meses)		Fecha Final del proyecto		
26		07/05/2025	07/05/2025	25/07/2027	N/A		25/07/2027		
Descripción Alcance del Proyecto: El objetivo de esta investigación es que pretende aumentar la fertilidad del suelo en fincas de los departamentos del Quindío, a través de procesos de regeneración de suelos consistentes en el desarrollo de un biofertilizante de compost, el uso abonos verdes y cobertura vegetales del suelo, promoviendo la productividad de cultivos de plátano y banano en sistemas de policultivos, a partir de la apropiación social del conocimiento de productores mediante el diseño de estrategias de participación y transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible. La investigación tiene un proceso de investigación de acuerdo a cada área de trabajo a saber: i). El desarrollo de bio-fertilizantes, ii). El segundo componente utilizará un proceso de evaluación entre sistemas productivos de contraste, para lo cual se realizará por medio de la metodología MESMIS, iii). El objetivo tres utilizará en parte la metodología MESMIS, al igual que otras tecnologías sociales para realizar el diagnóstico participativo de los productores con los que se trabaja de manera conjunta en el proyecto, con los cuales se harán evidentes los vacíos sociales que conducen al desarrollo de procesos en las fincas que deterioran los suelos. Los resultados esperados del proyecto son: 1. La caracterización de los materiales en finca para la elaboración de compost; 2. Modelo de producción de compost; 3. Protocolos de evaluación del compost; 4. Línea base de la aplicación de la metodología MESMIS en cada una de las 36 fincas de los campesinos; 5. Aplicación y evaluación de los indicadores de la metodología MESMIS en cada finca; 6. Análisis de la evolución del diseño experimental de investigación en la producción de plátano y banano en cada una de las fincas; 7. Identificación y apropiación comunitaria de las necesidades que justifican el desarrollo del proyecto, y de los propósitos comunes. (Tomado de la MGA – Análisis Técnico de la Alternativa de Solución pg. 13)									
3. OBJETIVOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO									
OBJETIVO GENERAL	Incrementar los niveles de fertilidad del suelo en la producción de cultivos de plátano y banano en sistemas agrícolas campesinos del departamento del Quindío.				Indicador del Objetivo General Fincas con procesos de agricultura regenerativa implementados, Medido a través de: Numero; Meta: 73				
Objetivo Especifico 1	Generar investigación en evaluación de biofertilizantes de compost de cama estática para la producción sostenible de cultivos de plátano y banano.				Producto del Objetivo Especifico 1: Servicio de apoyo financiero a programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. (I+D+i) (Producto principal del proyecto) Indicador: Programas y proyectos financiados Medido a través de: Número de programas y proyectos Meta total: 36				
Objetivo Especifico 2	Fomentar la implementación de procesos en agricultura regenerativa para la fertilidad de los suelos en cultivos de plátano y banano				Producto del Objetivo Especifico 2: Documentos de investigación Indicador: Documentos de investigación elaborados Medido a través de: Número de documentos Meta total: 3				
Objetivo Especifico 3	Fortalecer los procesos de difusión en agricultura regenerativa de suelos con liderazgo participativo de los actores clave en el proceso de producción de plátano y banano.				Producto del Objetivo Especifico 3: Servicio de apropiación social del conocimiento Indicador: Estrategias de apropiación realizadas Medido a través de: Número de estrategias				

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

				Meta total: 2					
Licencias o permisos									
Nombre de licencia o permiso		Fecha de expedición		Vigencia		Entidad que expide			
Certificado emitido por la Entidad Ejecutora ULGC el 28/02/2025 donde consta que el proyecto incluye dentro de sus componentes la adquisición de licencias y permisos de uso tecnológico, por un valor de \$5.537.307, los cuales serán financiados con cargo a la ACTel Rubro: Equipos y Software: Ítem: Software de análisis estadístico, compra de dos (2) licencias. Descripción: Software de análisis estadístico descriptivo, inferencial, diseño de experimentos y multivariante de datos.		28/02/2025		.N/A		Universidad La Gran Colombia Armenia			
Localización	Departamento (s)	Quindío	No. de beneficiarios	Cumplimiento de requisitos de pre-ejecución					
	Municipio (s)	Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, Buenavista, Génova							
	Localización específica de la alternativa de solución	Armenia: Golconda, El Rhin, Murillo, EL caimo, Marmato	144	Fecha del certificado de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	Fecha del acto de apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados	Fecha de publicación SPGR del acta de apertura o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados	Fecha de publicación SECOP del acta de apertura o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados	No. fecha del CDP	No. y fecha del CRP
		Calarca: Buenos Aires, Calle Larga, Guayaquil alto, La Bella, Travesías							
	Montenegro: Buenos Aires, Culatas La Julia, La Esmeralda, Risaralda								
	Quimbaya: Vigilante, Naranjal, Morelia, La Morelia, Pueblo Rico, La Carmelita								
4. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO									
ENTIDAD		VALOR FINANCIADO SGR		VALOR FINANCIADO POR OTRAS FUENTES			VALOR TOTAL DEL PROYECTO		
Departamento Quindío		\$ 3.138.315.943,00		\$ 45.000.000,00			\$ 3.183.315.943,00		
Universidad La Gran Colombia		-		\$ 659.900.000,00			\$ 659.900.000,00		
AXM Green		-		\$ 18.200.000,00			\$ 18.200.000,00		
Supervisión Minciencias - SGR		\$ 221.000.000,00		-			\$ 221.000.000,00		
Ajustes en valores APROBADOS por OCAD ACTel- SGR		-		-			-		
TOTAL		\$ 3.359.315.943,00		\$ 723.100.000,00			\$ 4.082.415.943,00		
5. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN									
Avance de ejecución	% de avance físico del periodo reportado por la entidad	% de avance físico del periodo validado por la supervisión	% de avance acumulado GESPROY SGR	Tipología de Alerta Alertas no subsanadas (GESPROY SGR)					
			% de avance acumulado Avalado Supervisión						
Físico	2,95%	2.7%	3.01%	Código / Descripción	Detalle	Consecuencia			
			2.7%						

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

	Valor Total Desembolsado	Valor Total Certificado Contrapartida	% de avance acumulado del proyecto SGR + Contrapartida (-Supervisión)	EJ-1-01 Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR	Proyectos: Sin proceso precontractual	1. El proyecto no cuenta con información completa y/o consistente según el estado.
Financiero	-	\$20.038.462	0,52%	EJ-1-31 Riesgo de liberación automática	Han transcurrido 230 desde la publicación del acuerdo de aprobación o fecha de aprobación. La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 02-07-2025. Tiene 49 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto.	1. Restricción automática de registro de información en Gesproy. 2. Desaprobación automática del proyecto.

6. SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN

6.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO

6.1.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCIÓN

Objetivos específicos	Actividad MGA	Entregables	Evidencias o soportes de ejecución del periodo reportado No. Expediente virtual (Minciencias) del proyecto: AZ 2024000100034		Fecha evidencia	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en IT	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en POA
			Descripción breve de la evidencia	Radicado Minciencias			
(Oe 1). Generar investigación en evaluación de biofertilizantes de compost de cama Estática para la producción sostenible de cultivos de plátano y banano.	Actividad 1.1. Caracterizar insumos disponibles en las fincas con la participación de la comunidad campesina productora de plátano y banano. Solo las actividades reportadas por el ejecutor	Inventario realizado, plataforma digital certificados y	Anexo C. Inventario (base de datos) de insumos y materiales en las fincas. Sistema de registro donde se expresa el tipo de material (estiércol, material vegetal herbáceo o lignificado y	20250031660R	31/05/2025	0,0%	1,4%

**INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN
PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA**

	en el mes.		residuos de cosecha).				
			Anexo D Base de datos bibliográficas Mendeley desarrollada Actas de reuniones para la construcción del documento técnico Socialización de bases de datos a las cuales podemos tener acceso tanto de la Universidad La Gran Colombia como de otras universidades del departamento. Anexo E. Avance de documento técnico de caracterización de insumos para compost de cama estática y su relación de C/N.	20250031660R	31/05/2025		
	Actividad 1.4 Desarrollar la administración del proyecto	26 informes de ejecución administrativa y financiera	1. Matriz proyección ejecución física, financiera y en especie. 2. Planeación del proyecto, establecimiento del cronograma de entregas. 3. Cronograma de flujos. Certificación de contrapartida mes de mayo Universidad La Gran Colombia. 5. Asignación de cuentas contables por cada rubro. 6. Gestión del aplicativo GESPROY 3.0 en las siguientes actividades: • Programación hito de contratación. • Ajuste de las fuentes en especie. • Programación de las actividades. • Programación inicial. • Reportes de información de los meses enero, febrero, marzo y abril. • Cumplimiento requisitos previos a la ejecución. 7. Gestión del aplicativo Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías en las siguientes actividades: • Asignación de apropiaciones a dependencia de gasto.	20250031660R	31/05/2025	0,0%	0,88%

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

			<ul style="list-style-type: none"> • Creación del certificado de disponibilidad presupuestal. • Registro de la cuenta bancaria. • Confirmación de la cuenta bancaria. • Delegación del ordenador del gasto. • Apertura del proceso y decreto de gasto. • Creación del registro presupuestal. • Creación cronograma de flujos. <p>8. Registro del proceso del proyecto en la plataforma SECOP II.</p> <p>Reuniones de seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta No.1 Del 7 de mayo del 2025- Planeación entrega física de cada actividad. • Reunión de seguimiento al proyecto equipo de trabajo Acta. No 9 del 26 de mayo. <p>10. Reuniones de comité directivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión comité directivo del proyecto Acta No. 05 del 19 de mayo del 2025. • Reunión comité directivo del proyecto Acta No11. Del 29 de mayo del 2025. <p>11. Reuniones equipo administrativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión equipo administrativo- directora científica socialización proceso gastos de viaje- Acta No.1 del 8 de mayo del 2025. • Reunión equipo administrativo- directora científica socialización presupuesto- Acta No.2 del 8 de mayo del 2025. • Reunión equipo administrativo revisión proceso de construcción y entrega de informes MinCiencias- Acta No.03 del 9 de mayo del 2025. • Reunión seguimiento proceso contable proyecto y 				
--	--	--	--	--	--	--	--

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

			UGCA Acta No.6 del 21 de mayo 2025. • Reunión UGCA y equipo administrativo proyecto definición protocolo de pago. Acta No 07 del 22 de mayo del 2025. • Reunión equipo administrativos, revisión informe mensual y asignación de tareas. Acta No.8 de 22 de mayo del 2025. • Reunión equipo administrativo definición proceso gestión documental administrativo y contable del Acta no.10 del 26 de mayo del 2025. • Asistencia reunión socialización de lineamientos financieros BPIN 2024000100034-Minciencias-Registro Fotográfico 15 de mayo- Captura de reunión.				
(Oe 3). Fortalecer los procesos de difusión en agricultura regenerativa de suelos Con liderazgo participativo de los actores clave en el proceso de producción de plátano y banano.	Actividad 3.1. Consolidar un grupo a partir de la construcción de afecto, confianza e intenciones comunes.	Documento de registros del grupos	1. 15 actas de visita a las fincas. 2. 15 listas de asistencia con los participantes en cada finca socializada. 3. 15 registros fotográficos individuales, correspondientes a cada una de las fincas visitadas. 1. Formato de encuesta de caracterización social de los productores (as). 2. 15 encuestas diligenciadas caracterización de social de los productores (as). Acta de planeación del evento de apertura del proyecto.	20250031660R	31/05/2025	0,0%	0,67%
Avance total en el periodo						0,0%	2,95%
6.2. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RELACIONADA POR EL EJECUTOR							
ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE (ACTIVIDAD)				DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN		
Actividad 1.1. Caracterizar insumos disponibles en las fincas con la participación de la comunidad campesina productora de plátano y banano. Solo las actividades reportadas por el ejecutor en el mes. \$ 283.931.307,00	Anexo C. Inventario (base de datos) de insumos y materiales en las fincas. Sistema de registro donde se expresa el tipo de material (estiércol, material vegetal herbáceo o lignificado y residuos de cosecha).				La supervisión avala el 1,15% En documento técnico se evidencia reporte del 13,8% y en POA del 1,4%. Se solicita aclarar y se toma como valor referencia el POA. Se evidencia reporte de 17 fincas de 36. Del total de fincas		

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

		reportadas 3 no se encuentran en el documento técnico. Se solicita aclaración para los predios: Ciudadela del saber la Santa María, Balboa e Islandia. En el listado de asistencia al predio Ciudadela del saber la Santa María y en su acta de visita, se evidencia el nombre Finca Agroecológica Universidad la Gran Colombia – Campus. Se solicita aclarar si el predio corresponde al predio denominado: Universidad La Gran Colombia ubicado en la vereda Murillo del municipio de Armenia (DT pg.5)
Actividad 1.4 Desarrollar la administración del proyecto \$ 922.760.000,00	Observación referente al porcentaje reportado en DT y POA	Se evidencia en informe técnico avance reportado de 3,84% y en POA 0,88. Se toma como referencia el POA y se avala 0,88% Se solicita aclaración respecto a la diferencia reportada en Documento Técnico y POA
Actividad 3.1. Consolidar un grupo a partir de la construcción de afecto, confianza e intenciones comunes \$ 95.550.004,00	Observación referente al porcentaje reportado en DT y POA	Reportan en Documento Técnico 14,8% de avance, mientras en POA se reporta 0,67%. Se toma como referencia el POA y se avala 0,67%. Se solicita aclaración respecto a la diferencia reportada en Documento Técnico y POA

Revisadas las evidencias técnicas presentadas en el periodo, no se evidencia reporte de % de avance de actividades en el Informe Técnico del periodo reportado. **La supervisión avala un avance del 2.7% sobre un 2,95% presentado por la Entidad Ejecutora en POA.** Las diferencias se encuentran en 3 predios no encontrados en la localización específica de la MGA contrastada con el documento técnico: Se solicita aclaración para los predios: 1. Ciudadela del saber la Santa María, 2. Balboa e 3. Islandia. Si bien en el listado de asistencia y acta de visita al predio Ciudadela del saber la Santa María, se evidencia el nombre Finca Agroecológica Universidad la Gran Colombia – Campus. Se solicita aclarar si el predio corresponde al predio denominado Universidad La Gran Colombia ubicado en la vereda Murillo del municipio de Armenia

Porcentaje de Avance reportado en Gesproy, POA y Avalado por la Supervisión

Periodo	% Reportado en Gesproy (A)	% Reportado en POA (B)	Dif Reporte Gesproy y POA (A-B)	% Avalado por la supervisión (C)	Dif Gesproy vs Avalado supervisión (A-C)
may-25	3,01%	2,95%	0,06%	2,70%	0,31%

- No se evidencia reporte de porcentaje de avance por actividad en el informe técnico del periodo respecto a lo proyectado y ejecutado en el POA.
- La entidad ejecutora mediante informe técnico presentado el 31/05/2025 reporta avance en la actividad 1.1 de 41.6% (IT pg. 10), en POA del mes de mayo se evidencia un reporte de 1,4% para la misma actividad que corresponde un 20% de avance en la ejecución. Se solicita aclarar la diferencia encontrada (21,6%)
- Se evidencia en el IT reporte de 15 fincas encuestadas y en el anexo C Inventario de caracterización de insumos, un reporte de 17 fincas
- La entidad ejecutora mediante informe técnico presentado el 31/05/2025 reporta avance en la actividad 1.4 de 3,84% (IT pg. 11), en POA del mes de mayo se evidencia un reporte de 0,88% para la misma actividad que corresponde un 3,8% de avance en la ejecución. Se solicita aclarar la diferencia encontrada (0.04%)
- Los porcentajes reportados de avance en el Informe Técnico (IT) no coinciden con los porcentajes reportados en POA.
- Se evidencia en POA Técnico una sumatoria de actividades programadas del 176,88% (celda K34, POA Técnico) se solicita revisar la programación reportada.
- Se evidencia en el IT (pg. 16) reporte de "Otros resultados obtenidos" haciendo referencia a "Asistencia por parte del equipo investigador al Simposio Biomasa agroindustrial: Ciencia y energía para la producción animal y vegetal liderado por la Oficina de Investigaciones de la UGCA" con indicador de cumplimiento "Número de investigadores que asistieron al evento" y como soporte de evidencia "Dos listados de asistencia y Registro fotográfico". Se solicita a la Entidad ejecutora aclarar si estos hacen parte de la ejecución presupuestal y/o recursos de contrapartida, toda vez que no se evidencian en la programación registrada, ni en el presupuesto del proyecto.
- Se evidencia en el informe técnico del periodo un avance físico del objetivo general de 3,85% vs 3.84% en POA vs 3.01% en Gesproy-SGR, se solicita aclarar las diferencias.


INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Programación Gesproy Vs Ejecución

Programación vs Ejecución				
Periodo	Prog Inicial Acum	Prog Actual Acum	% Ejecutado Acum	% Avance Financiero
1 May-25	0,00	4,46	3,01	0,49

Para mayo 2025, la programación acumulada en Gesproy-SGR es de 4.46% vs una ejecución reportada de 3.01 en el aplicativo.

Curva S – Desempeño del proyecto Gesproy-SGR

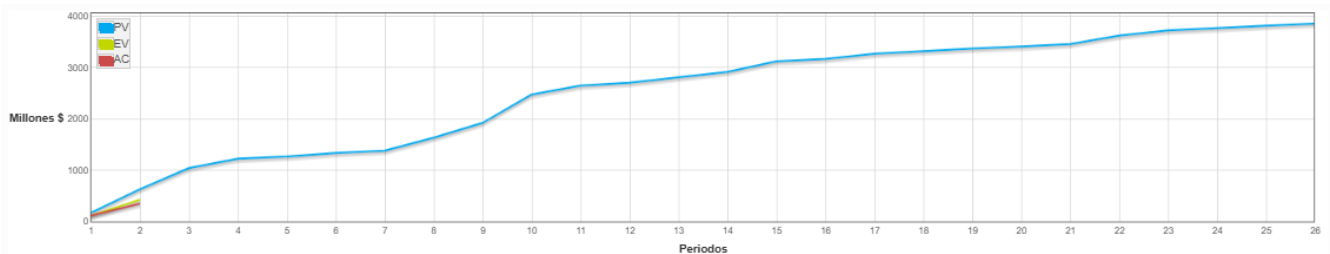

Línea	Periodos																									
	1 may- 25	2 jun- 25	3 jul- 25	4 ago- 25	5 sep- 25	6 oct- 25	7 nov- 25	8 dic- 25	9 ene- 26	10 feb- 26	11 mar- 26	12 abr- 26	13 may- 26	14 jun- 26	15 jul- 26	16 ago- 26	17 sep- 26	18 oct- 26	19 nov- 26	20 dic- 26	21 ene- 27	22 feb- 27	23 mar- 27	24 abr- 27	25 may- 27	26 jun- 27
* Valor Planeado (PV) (i)	172	633	1042	1227	1270	1336	1382	1634	1925	2478	2650	2704	2810	2918	3125	3170	3271	3321	3371	3415	3460	3624	3725	3770	3816	3861
* Valor Ganado (EV) (i)	116	426																								
* Costo Actual (AC) (i)	117	350																								
Cumplimiento en la programación (SPI) (i)	0.67	0.67																								
Cumplimiento del costo (CPI) (i)	1	1.22																								
Retraso SV(t) Meses (i)		0.53																								

Para el periodo reportado se evidencia una programación de 172 Millones con ejecución de 116 Millones, de los cuales la ejecución real fueron 90,8 Millones, con un cumplimiento en la programación de 52.7% respecto a lo programado en Gesproy y 77,9% respecto a la programación en POA. Se evidencia un cumplimiento del costo de 100%. Se solicita a la entidad ejecutora implementar medidas para garantizar la ejecución del proyecto según los valores programados en los plazos establecidos.

MATRIZ DE RIESGOS DE LA MGA

El proyecto reporta en la MGA, análisis de riesgos para: **1. Propósito, asociados al objetivo general**; **2. Componente, asociados a productos y 3. Actividades y/o Entregables**, describiendo el tipo de riesgo, la probabilidad e impacto, efectos y las medidas de mitigación. Se solicita especial atención durante la ejecución del proyecto a los riesgos que presentan probabilidad: 4. Probable, con impacto 2. Menor o 3. Moderado, donde según las medidas de mitigación se debe realizar seguimiento constante a las fluctuaciones de los precios en el mercado y análisis normativos durante la ejecución.

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Riesgos operaciones producto de la planificación y algunos agentes externos en los procesos de contratación y adquisiciones.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Atrasos en el desarrollo del cronograma	Desarrollo de planificación estratégica del proyecto e inicio de procesos administrativos y operaciones de manera anticipada del proyecto.
	Asociados a fenómenos de origen biológico; plagas, epidemias	Riesgo biológico asociado a posibles pandemias y problemas de salud pública.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	Atraso en la ejecución de las actividades, cierre temporal de algunas acciones.	Planes de emergencia y control sanitario.
	Financieros	Riesgo asociado a las posibles fluctuaciones en los precios de los divisas que se puedan presentar dentro del tiempo de ejecución y adquisición de los equipos y materiales.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 2. Menor	Cambios significativos en el costo de equipos requeridos para el desarrollo del proyecto.	Análisis de costos y seguimiento constante a las fluctuaciones de los precios en el mercado.
	Legales	Cambios en las normativas legales aplicables al proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Cambios en los procesos a desarrollar al interior de la ejecución del proyecto	Análisis normativo y apoyo jurídico durante la ejecución del proyecto
2-Componente (Producto)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales; aglomeración de público	Riesgo asociado a problemas de orden público en las zonas o regiones de influencia del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	Atraso en el desarrollo y conformación de los grupos de trabajo y algunas actividades de campo.	Procesos de socialización en cada etapa del proyecto, manejo con autoridades locales institucionales para garantizar el desarrollo del proyecto
	De calendario	Modificaciones en las fechas de entrega de los documentos por parte de los investigadores.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Atraso en la obtención del producto según calendario generado.	Plan de seguimiento y control al avance de estos documentos por parte de la supervisión y el comité técnico del proyecto
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Algunos inconvenientes en la consolidación de los grupos de trabajo por intereses particulares.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 2. Menor	Atraso en los procesos de apropiación y transferencia de conocimiento del proyecto.	Plan de trabajo colectivo con comunidades, construido de manera conjunta. Acompañamiento permanente de las comunidades al proyecto (Desde su formulación) Trabajo conjunto entre la comunidad y las instituciones desde hace muchos años que garantiza la confianza y su participación activa en el proyecto.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

Mesas Técnicas:	No. ____	Orientaciones en ajustes al proyecto	No. ____	Orientaciones en cierre de proyectos	No. ____	Otros	No 1	Visitas a Campo	No. ____
-----------------	----------	--------------------------------------	----------	--------------------------------------	----------	-------	------	-----------------	----------

En caso de la realización de Otros: Durante el periodo reportado se realizó la revisión de los documentos presentados por la entidad ejecutora, el aplicativo Gesproy-SGR, SPGR y SECOP II, manteniendo el expediente del proyecto actualizado

8. AJUSTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APROBADOS POR OCAD

Numero de ajuste	Tipo de ajuste	Breve descripción del ajuste	Fecha de presentación de la solicitud	Fecha y documento de aval del supervisor	Fecha de acuerdo de aprobación del OCAD de CTel
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.1. Presupuesto Inicial y ajustes aprobados

Código de la Actividad	Actividades del proyecto	Valor Inicial	Ajuste 1	Ajuste 2	Ajuste 3
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN

Número de contratos suscritos	Valor total comprometido	Registro presupuestal SPGR		Publicación en SECOP		Cargados en GESPROY SGR	
19	\$200.800.000	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	SI <u> </u>	NO <u>X</u>

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Contratos suscritos en el periodo

BPIN	2024000100034
Contratación	may-25
Proveedor	Valor comprometido
Mayo	
Administrativos	
ALEJANDRA ZULUAGA BELTRAN	\$ 12.000.000,00
LEIDY YULIETH TORRES QUINTERO	\$ 13.500.000,00
MARIA ANGELICA ALZATE GARZON	\$ 8.400.000,00
Proeje Inndex	\$ 12.000.000,00
Total Administrativos	\$ 45.900.000,00
Gastos de viaje	
(en blanco)	\$ 0,00
Total Gastos de viaje	\$ 0,00
Talento humano	
ANDREA RIVERA RAMIREZ	\$ 8.400.000,00
CARLOS GILBERTO ALZATE VALENCIA	\$ 12.000.000,00
DIEGO ANDRES OSPINA LOAIZA	\$ 12.000.000,00
FANNY CADAVID ROMERO	\$ 12.000.000,00
JENNY CAROLINA ORJUELA GARCIA	\$ 15.000.000,00
JESUS ANTONIO QUINTERO CARDOZO	\$ 12.000.000,00
JUAN ESTEBAN BERNAL GUTIERREZ	\$ 8.400.000,00
JUAN FELIPE PEÑA MOJICA	\$ 12.000.000,00
KAREM SOFIA ARIZA BECERRA	\$ 8.400.000,00
LINA MARIA RIOS PINILLA	\$ 4.000.000,00
LUZ AMARIS GIRALDO OCAMPO	\$ 13.500.000,00
MARIA CAMILA GRAJALES LONDOÑO	\$ 8.400.000,00
MARIA CAMILA GUZMAN HERNANDEZ	\$ 8.400.000,00
MARIA JOSE MORALES USECHE	\$ 8.400.000,00
SARA VALENTINA CELIS CASTAÑO	\$ 12.000.000,00
Total Talento humano	\$ 154.900.000,00
Total Mayo	\$ 200.800.000,00

Se evidencian 19 contratos suscritos (**Anexo 4 - Financiero**): siendo cuatro (4) del rubro administrativos por valor comprometido de \$45.900.000,00 y quince (15) contratos del rubro talento humano con valor comprometido por \$154.900.000,00 Para un total comprometido de \$200.800.000,00

SECOP: Se evidencia contrato publicado el 07/05/2025

Gesproy-SGR: Un contrato cargado


Contratos cargados en Gesproy-SGR

Contratos

Mostrar 100 registros por página

Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: \$3,149,459,143.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
 01	07/05/2025	Prestación de Servicios	860015685	860015685-UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SEDE ARMENIA	3,138,315,943.0	SPGR	13/05/2025

Así mismo de los 19 contratos suscritos solo se evidencia un contrato cargado en Gesproy-SGR: contratista, Universidad La Gran Colombia, sede Armenia por valor de \$3.138.315.943,00 con fecha de suscripción del 07/05/2025 y fecha de creación 13/05/2025, el cual corresponde a ejecución directa

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL PROYECTO DE INVERSIÓN

Consultado el POA financiero presentado por la entidad ejecutora para el periodo reportado se evidencia la programación de 4 actividades por valor total de \$116'575.481,48 presentando una ejecución de \$90'838.461.56, (78%) respecto a lo programado. La diferencia de \$25'737.019,93 corresponde a la ejecución de la actividad 1.1.1 A1. "Caracterizar insumos disponibles en las fincas con la participación de la comunidad campesina productora de plátano y banano". Adicionalmente se encontró una diferencia de -\$ 0.02 de la actividad "Instalar y validar las pilas de compost de cama

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

estática tanto en fincas con agricultura regenerativa como convencionales productoras de banano y plátano", no programada para el periodo, obedece a error en la escritura en la fórmula de la celda (AI12) donde a la sumatoria de las celdas (AJ12:B12) le restan -0.02. Se solicita a la entidad ejecutora para el próximo periodo revisar y corregir el reporte de la actividad 1.1.2 A2.

No. de la actividad	Descripción de la actividad	No. de Tareas	Descripción de la Tarea	Mes de Inicio	Mes de Terminación	Valor de la Tarea	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO- DESEMBOLSOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS EJECUTADO
							Mes 1 May	Mes 1 May	Mes 1 May
1.1.1 A1	Caracterizar insumos disponibles en las fincas con la participación de la comunidad campesina productora de plátano y banano(*)	3	Realizar inventario y caracterización de materiales en las fincas, Plataforma digital, Curso en aplicación de tecnologías regenerativas en cultivos de plátano y banano.	1	5	149.321.307,00	49.234.711,25	23.497.691,33	25.737.019,93
1.1.4 A4	Desarrollar la Administración del proyecto	1	Administración del proyecto	1	26	401.759.999,94	15.452.307,69	15.452.307,69	-
3.1.1 A9	Consolidar un grupo a partir de la construcción de afecto, confianza e intenciones comunes.(*)	1	Consolidación grupo a partir de la construcción de afecto	1	3	95.550.003,00	31.850.001,00	31.850.001,00	-
						3.138.315.934,93	96.537.019,94	70.800.000,02	25.737.019,93
1.1.4 A4	Desarrollar la Administración del proyecto	1	Administración del proyecto	1	26	521.000.000,04	20.038.461,54	20.038.461,54	-
						723.100.000,03	20.038.461,54	20.038.461,54	-
Valor total del Proyecto						4.082.415.934,96	116.575.481,48	90.838.461,56	25.737.019,93

Consultado el aplicativo Gesproy-SGR no se evidencian pagos realizados para el periodo reportado. Se debe realizar la homologación de pagos pendientes al interior de cada contrato para que se visualicen los pagos en la tabla y se afecte el avance financiero del proyecto.

Pagos						
Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar	Reintegros Cuenta Unica SGR
SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación - Convocatorias	\$3.265.574.171,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.265.574.171,98	
SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación	\$93.741.771,02	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.741.771,02	
Propios	\$678.100.000,00	\$130.475.385,54	\$0,00	\$0,00	\$547.624.614,46	
Aportes en especie	\$45.000.000,00	\$2.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.750.000,00	
Total	\$4.082.415.943,00	\$132.725.385,54	\$0,00	\$0,00	\$3.949.690.557,46	\$0,00

Si bien se evidencian pagos por \$130.475.385,54 millones con recursos propios y aportes en especie por valor de \$2'250.000 millones para un total de \$132.725.385,54 millones, corresponde al periodo reportado el valor de \$20'038.461,54 reportado en POA y Anexo 2. Fecha de consulta Gesproy-SGR 21/08/2025

Consultado el Anexo 2 suscrito por la Rectora Delegataria Bibiana Vélez Medina, se evidencia una ejecución acumulada para el primer periodo por valor de \$79.300.000 (incluida la supervisión por valor de \$8'500.000), de estos, \$70'800.000 corresponde a valores del SGR ejecutados por la EE, se evidencian igualmente \$20'038.462 reportados para los valores de contrapartida.

Se solicita que los valores reportados en el informe técnico, POA y documentos financieros concuerden entre sí.

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Período de Ejecución: 7 de mayo al 31 de mayo del 2025		Fecha de presentación del informe: 3 de junio 2025					
Entidad Ejecutora: Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia							
Entidad Beneficiaria:							
Título del Proyecto: Desarrollo de tecnologías regenerativas que promuevan la fertilidad de los suelos y la producción sostenible del cultivo de plátano y banano con estrategias que integren la apropiación social del conocimiento y transferencia tecnológica a productores del departamento del Quindío							
Código del Proyecto BPIN:		2024000100034					
RUBROS	Presupuesto Inicial Aprobado	APORTES DE MINICIENCIAS			APORTES DE CONTRAPARTIDA		
		Modificaciones		Presupuesto Vigente	Total Ejecución Acumulada	Presupuesto Aprobado	Total Ejecución Acumulada
		Reducción	Aumento				
1. Talento humano	\$ 1.697.000.000			\$1.697.000.000	\$54.300.000		\$73.000.000
2. Equipos y software	\$ 427.963.286			\$427.963.286			
3. Capacitación	\$ 129.276.000			\$129.276.000			
4. Servicios tecnológicos y pruebas	\$ 283.226.932			\$283.226.932			
5. Materiales, insumos y documentación	\$ 95.059.725			\$95.059.725		\$129.100.000	
6. Protección de conocimiento y divulgación	\$ 29.950.000			\$29.950.000			
7. Gastos de viaje	\$ 74.080.000			\$74.080.000	\$1.200.000		
8. Infraestructura	\$ -			\$0			
9. Administrativos	\$ 401.760.000			\$401.760.000	\$15.300.000		\$20.038.462
10. Interventoría	\$ 221.000.000			\$221.000.000	\$8.500.000		
11. Otros							
12.							
TOTALES	\$3.359.315.943	\$0	\$0	\$3.359.315.943	\$79.300.000	\$723.100.000	\$20.038.462

Observación: El valor reportado de \$79'300.000 incluye \$8'500.000 de la supervisión. Se solicita no reportar este valor debido a que es ejecución propia de la supervisión

10.1 ODP PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

ODP	Valor Total	Fecha máxima de pago	Presupuestal	NO Presupuestal (Reintegro)	Valor desembolsado Verificar SPGR
197088625	\$70'800.000,00	26/06/2025	\$70'800.000,00	-	-
Total	\$70'800.000,00		\$70'800.000,00	-	-

Observaciones: No se realizan pagos para el periodo reportado. La ODP 197088625 corresponde a ejecución directa, presenta observaciones jurídicas y financieras respecto a la claridad y especificidad de los entregables, actividades definidas y forma de pago en el documento por medio del cual la entidad ejecutora se acredita como ejecutor directo de los recursos de regalías.

10.2 CONSOLIDADO DE ODP PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

No de ODP presentadas	VALOR TOTAL	Fecha Máxima de pago	Presupuestal	No presupuestal	Valor Total
N/A	-	N/A	-	-	-
N/A	-	N/A	-	-	-

N/A: Corresponde al primer periodo de ejecución

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN

CONCLUSIONES:

En concordancia con la Constitución Política de Colombia, el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 55 de la Ley 2056 del 2020, la guía de supervisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS), las normas del Sistema General de Regalías (SGR) y demás normas concordantes para el buen cumplimiento de la ejecución de los recursos del SGR de los proyectos de las entidades ejecutoras privadas.

Lo estipulado en la Ley 1474 en su artículo 84 "(...) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente".

- El proyecto se enmarca en la convocatoria 032 "Convocatoria Para La Conformación De Un Listado De Proyectos Elegibles Que Contribuyan A Resolver Los Retos Asociados Con El Derecho A La Alimentación – Colombia Por Un Campo Productivo Y Sostenible", con un plazo de ejecución de 26 meses y fecha de terminación inicial para el 25/07/2027.
- El objetivo general del proyecto es Incrementar los niveles de fertilidad del suelo en la producción de cultivos de plátano y banano en sistemas agrícolas campesinos del departamento del Quindío, el cual es medido a través del indicador: Fincas con procesos de agricultura regenerativa implementados, siendo la meta: 73 predios.
- A su vez el cumplimiento del objetivo general se da a través de tres objetivos específicos detallados en el acápite 3: Objetivos y Productos del Proyecto. En cuyo objetivo específico No 1. "Generar investigación en evaluación de biofertilizantes de compost de cama estática para la producción sostenible de cultivos de plátano y banano" se encuentra medido a través del indicador No de programas y proyectos, con una meta total de 36 programas y proyectos financiados.
- Para el periodo reportado, la entidad ejecutora reporta un avance en POA de 2,95% para tres (3) actividades reportadas en el Informe Técnico. Ver acápite 6.1 y 6.2

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

- No se evidencia concordancia entre la planeación registrada en el aplicativo Gesproy-SGR, la programación en POA y el reporte de información en el informe de actividades del periodo.
- La supervisión avala un avance del 2.7% sobre un 2,95% presentado por la Entidad Ejecutora en POA. Las diferencias se encuentran en 3 predios no encontrados en la localización específica de la MGA contrastada con el documento técnico: Se solicita aclaración para los predios: 1. Ciudadela del saber la Santa María, 2. Balboa e 3. Islandia
- Se solicita a la Entidad Ejecutora, aclarar la localización específica del proyecto relacionada en la MGA y aprobada por parte del OCAD. Es importante señalar lo contemplado en el Acuerdo 007 de 2022, puntualmente: "CAPÍTULO 5. AJUSTES Y LIBERACIONES. SECCIÓN 1. AJUSTES. Artículo 4.5.1.1. Definición de ajuste. De conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.1.2.14 del Decreto Único Reglamentario del SGR, los ajustes son aquellas modificaciones introducidas al proyecto de inversión que no cambian su alcance, entendido este último como los objetivos generales y específico, los productos y la localización.
- Se solicita a la entidad ejecutora implementar medidas efectivas para garantizar la ejecución del proyecto según los valores programados en los plazos establecidos.

RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO PERIODO DE EJECUCIÓN:

"...las responsabilidades de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control contempladas en el Art. 1.2.10.1.4 del Decreto 1821 de 2020, dentro de lo cual establece el registro de información de forma veraz, oportuna e idónea en los aplicativos dispuestos por el DNP.

En caso de contar con evidencia de que la información reportada por las entidades en el aplicativo GESPROY SGR, no corresponde a la realidad de los proyectos de inversión, se procederá en virtud del artículo 182 de la Ley 2056 de 2020, a realizar el respectivo reporte a la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público en el marco del artículo 286 del Código Penal (Ley 599 de 2000) o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, o los delitos a los que hubiere a lugar de acuerdo a las conductas irregulares encontradas..."

- Se solicita a la entidad ejecutora presentar los informes de ejecución suscrito por el representante legal o quien haga sus veces.
- Reportar información concordante entre la programación Gesproy-SGR, POA e informe de actividades
- Cumplir con la localización del proyecto de inversión, según lo registrado en la MGA
- Se solicita reportar en Anexo 2 únicamente los valores ejecutados por la Entidad, sin tener en cuenta la supervisión.

COMO RECOMENDACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN A LA ENTIDAD EJECUTORA y ADICIONALES AL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ EN LOS PRÓXIMOS INFORMES DE EJECUCIÓN SOPORTAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:


- Impacto a los beneficiarios del proyecto (cumplimiento de la población objetivo y caracterización demográfica de la población objetivo contenidas en la MGA).
- Sostenibilidad del Proyecto (soporte de las estrategias de sostenibilidad).
- Indicadores de productos – Medios de verificación.
- Cumplimiento Control social (Qué ejercicios de control social realizaron y las evidencias).
- Cumplimiento del modelo de gobernanza (Evidencias del seguimiento).
- Cumplimiento de las demandas territoriales sobre las cuales se presentó el proyecto a la convocatoria.
- Balance físico y financiero por actividades y de contratos suscritos en el marco del proyecto de inversión.
- Gestión sobre cierre y liquidación de contratos.
- Análisis de todas las entidades cooperantes (recursos al proyecto en contrapartida especie/ efectivo).
- Gestión documental de todo el proyecto de inversión.
- Relación de los bienes y servicios adquiridos derivados de la ejecución del proyecto. Equipos/insumos, etc. (Si aplica: Actas de entrega debidamente firmadas, Actas de recibo a satisfacción por parte de los receptores de los bienes/servicios, Facturas de las compras, y demás soportes de adquisiciones).
- Análisis de licencias y permisos necesarios para el proyecto de inversión.
- Bitácora de los ajustes o modificaciones decididas por el ejecutor en el marco del proyecto con sus debidas justificaciones técnicas, jurídicas y financieras.
- Aporte de las actividades al componente de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la convocatoria de la cual se derivan los recursos del SGR para la financiación de este proyecto.
- La tabla de recopilación de porcentajes tomados de los informes de ejecución mensuales y de los informes de supervisión firmados y notificados por la supervisión.
- La entidad ejecutora deberá poner en conocimiento de la supervisión los requerimientos del DNP o entes de control en el marco de la ejecución del proyecto (y la respuesta de la entidad ejecutora en caso de requerimiento por estas entidades).
- Análisis de los Derechos de Propiedad Intelectual derivados del proyecto de inversión.

Con relación al desarrollo metodológico del proyecto de inversión se solicita a la entidad ejecutora soportar la ejecución del proyecto de manera organizada y consecuente con el documento técnico aprobado por OCAD-ACTeI-SGR.

Se solicita a la entidad ejecutora lo siguiente en el aplicativo GESPROY

- Completitud de la información de la pestaña de contratos.
- Ejecución física registrada hasta el último periodo.
- "Aprueba y Envía" hasta el último periodo
- Información de cada contrato registrado (acta de inicio, pólizas, actas de liquidación, etc.)
- Información de beneficiarios y sostenibilidad
- Programación de los ejercicios de control social. Pestaña programación/Hitos.

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

<p>Teniendo en cuenta que la suscrita asumió funciones como supervisora de proyectos el 15 de julio de 2025, conforme a la Resolución No. 0447 de 2025, notificada el 15 de julio del mismo año, el presente informe fue elaborado a partir de la revisión de los antecedentes documentales obrantes en el expediente y los informes previos. Este informe, suscrito por la actual supervisora, Carolina Otilia Montealegre Castillo abarca periodos anteriores a su designación, razón por la cual su contenido se basa en la trazabilidad disponible y en los insumos generados por el equipo de apoyo a la supervisión.</p>		
12. ANEXOS SOPORTES DE LA SUPERVISIÓN		
<p>Los documentos soporte del proyecto se encuentran en el expediente del proyecto AZDigital 2024000100034</p>		
13. FIRMAS		
 CARLOS AMEL ROJAS ORTIZ Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Nacional Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.	PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ Contratista Apoyo a la supervisión SGR Regional Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	YERLY PATRICIA CARDONA MONTOYA Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Técnico Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
LADY VIVIANA MATA LLANA QUIROGA Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Financiero Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	MADIVA MÍSULA PÉREZ DURÁN Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Jurídico Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	DANA CAROLINA GUATAQUIRA ROBAYO Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Nacional Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
<p>FIRMADO DIGITALMENTE POR AZSIGN</p> <p>CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO Supervisor Proyectos SGR. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>El supervisor actual ejerce esta actividad desde el 15 de julio de 2025, conforme a lo establecido en la Resolución 0477 del 15 de julio de 2025</p>		
