



Ciencias

BPIN 2022000100083

**IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA
FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA MEDIANTE EL USO DE NFT Y CONTRATOS
INTELIGENTES BAJO TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

Mes de Julio de 2025
Equipo de Supervisión de
Entidades Privadas SGR




BPIN 2022000100083

Universidad Autónoma del Caribe

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE EL USO DE NFT Y CONTRATOS INTELIGENTES BAJO TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.



El proyecto tiene como propósito “Incrementar oportunidades para la comercialización del arte digital en el departamento del Atlántico.” Se plantea la siguiente metodología para cubrir cada uno de los siguientes objetivos específicos.” Implementar estrategias de apropiación social del conocimiento alrededor de la industria 4.0

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Convocatoria No. 025 del 22 de febrero de 2022: “Convocatoria para la innovación y transferencia de tecnología enfocadas en la implementación de las recomendaciones de la misión internacional de sabios 2019 en el foco temático de tecnologías convergentes e industrias 4.0.- Mecanismo 2: Identificación Nacional Digital</p> | <p>Total: \$10.090.000.000,00 ACTel-SGR: \$9.796.000.000,00 Contrapartida: \$ 90.000.000,00 Supervisión: \$ 204.000.000,00</p> <p> Actualizado a Julio 16 de 2025</p> | <p> Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2023 Ejecución Física: <u>73,35%</u> Ejecución Financiera: <u>33,01%</u> Fecha de Finalización: Septiembre 25 de 2025</p> <p>Plazo de ejecución inicial: 24 meses. Ejecutor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE Contempla Supervisión - MINCIENCIAS</p> |
|---|--|---|

Cadena de valor de la alternativa:

1. Incrementar escenarios para la circulación de la producción artística en el país.
2. Aumentar mecanismos innovadores para la protección de derechos de autor
3. Generar desarrollos tecnológicos encaminados a la comercialización del arte.
4. Implementar estrategias de apropiación social del conocimiento alrededor de la industria 4.0.

5.135



Beneficiarios Estimados

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE EL USO DE NFT Y CONTRATOS INTELIGENTES BAJO TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Impacto del Proyecto

IMPACTOS CIENCIA Y TECNOLOGÍA A CORTO PLAZO: Contar con una plataforma que apoye a la dinamización del sector artístico en el departamento del Atlántico, se constituye en un escenario para el intercambio de saberes y aplicación de uso de tecnología que favorece que la comunidad en general se vea beneficiada por la transferencia tecnológica, que redunde en beneficios para la comunidad.

IMPACTOS CIENCIA Y TECNOLOGÍA A MEDIANO PLAZO: La comunidad se ve afectada positivamente ya que permite se potencie el sector artístico en el departamento del Atlántico. **IMPACTOS CIENCIA Y TECNOLOGÍA A LARGO PLAZO:** La implementación de este proyecto, logra mejorar la brecha tecnológica en la comunidad en general, tener acceso a este tipo de herramientas y mejorando las capacidades de los artistas del departamento. Permitirá incrementar el número de ventas y la visibilización de sus obras. Lo cual redundará en la mejora de ingresos para la comunidad que se ve beneficiada de la participación masiva de personas para ofrecer sus productos y servicios.

- **SECTORES**
- CIENCIA
- TECNOLOGÍA
- INNOVACIÓN

Estrategia

El presente proyecto se alinea Con:

- Plan Nacional de Desarrollo: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018 -2022”.
- Estrategia transversal: “Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro”.
- Objetivo: Objetivo C, “Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social”.
- Estrategia: “Fomentar la generación de nuevo conocimiento con estándares internacionales”.
- Plan Departamental de Desarrollo: “Atlántico para la gente. Plan de desarrollo 2020 - 2023”
- Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental: Eje dignidad: “Aprovechar nuestras potencialidades para generar oportunidades de empleo y emprendimiento para nuestra gente”

Plan de Sostenibilidad

Ejecución:

Ampliación del portafolio y uso de tecnología basada en BlockChain para fortalecimiento de productores artísticos

Oferta de nuevas ofertas de servicios y productos asociados al uso de imágenes NFT.

Oferta de obras artísticas socializadas en la plataforma

Post Ejecución:

Cabe resaltar que las entidades involucradas en la presente propuesta continuarán prestando servicios de actualización, mantenimiento, asesoría y acompañamiento, velando que el proyecto sea financiera, ambiental y socialmente sostenible, Todas estas actividades permiten garantizar la permanencia de este proyecto en el tiempo, así como su estabilidad.

Componente Jurídico

Estado de las pólizas, ajustes, modificaciones requerimientos de incumplimiento y/o notificaciones al SGR para el inicio de procedimiento administrativo de control PAC, según art. 169 Ley 2056/2020)
En estos momentos el proyecto no tiene ajustes, ni modificaciones .

ALERTAS / RIESGOS


Este proyecto empezó el día 11 de septiembre de 2023 y en diciembre de acuerdo al seguimiento realizado por la supervisión se logro que entregaran los informes de septiembre, octubre y noviembre de 2023, estos informes no llegaron con los soportes solicitados tanto técnicos como financieros, se les dio plazo de entregarlos el 25 de enero de 2024. Fue entregado el informe de diciembre de 2023 en esa fecha. El informe del mes de enero fue entregado el día 9 de abril de 2024 y febrero y marzo de 2024 el día 5 de Abril de 2024.
El proyecto va a realizar una reprogramación de las actividades.

LÍNEA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

GESPROY

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S

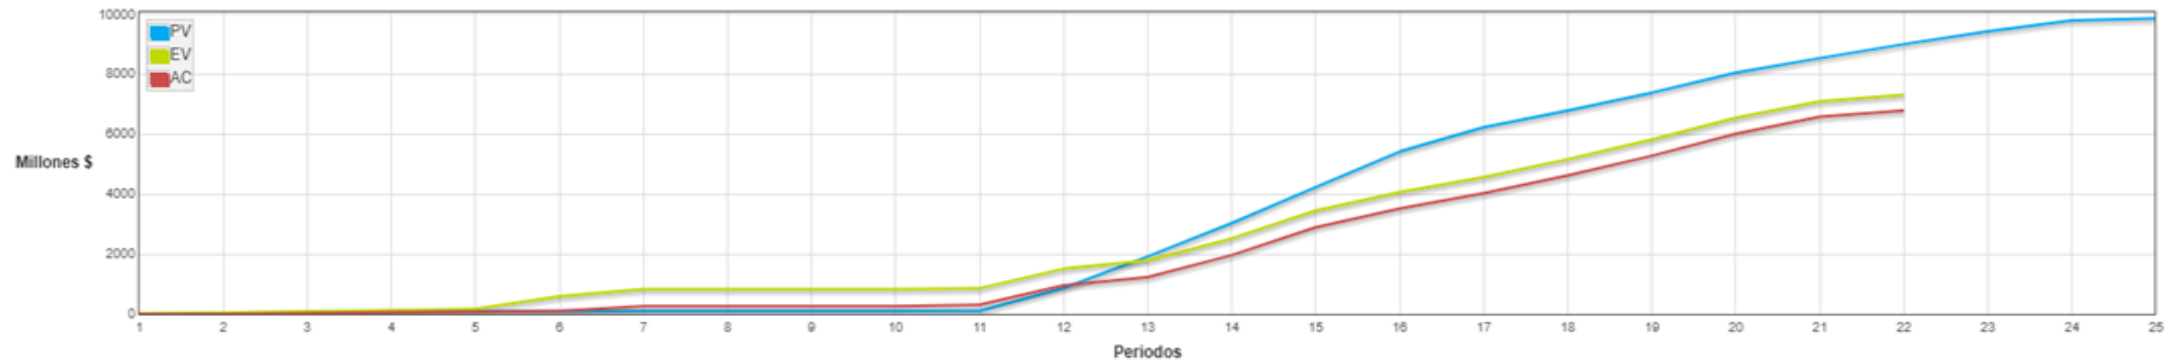

| Línea | Periodos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 sep-23 | 2 oct-23 | 3 nov-23 | 4 dic-23 | 5 ene-24 | 6 feb-24 | 7 mar-24 | 8 abr-24 | 9 may-24 | 10 jun-24 | 11 jul-24 | 12 ago-24 | 13 sep-24 | 14 oct-24 | 15 nov-24 | 16 dic-24 | 17 ene-25 | 18 feb-25 | 19 mar-25 | 20 abr-25 | 21 may-25 | 22 jun-25 | 23 jul-25 | 24 ago-25 | 25 sep-25 |
| * Valor Planeado (PV) ⓘ | 0,98911968 | 13 | 55 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 864 | 1923 | 3033 | 4239 | 5428 | 6245 | 6798 | 7398 | 8069 | 8552 | 9019 | 9452 | 9814 | 9886 |
| * Valor Ganado (EV) ⓘ | 23 | 45 | 88 | 131 | 171 | 594 | 838 | 838 | 838 | 838 | 861 | 1512 | 1793 | 2525 | 3456 | 4078 | 4573 | 5174 | 5826 | 6563 | 7108 | 7321 | | | |
| * Costo Actual (AC) ⓘ | 2 | 5 | 28 | 52 | 76 | 99 | 268 | 268 | 268 | 268 | 304 | 955 | 1236 | 1968 | 2899 | 3521 | 4035 | 4635 | 5288 | 6025 | 6592 | 6805 | | | |
| Cumplimiento en la programación (SPI) ⓘ | 23 | 3,54 | 1,59 | 1,33 | 1,75 | 6,06 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,79 | 1,75 | 0,93 | 0,83 | 0,82 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | | | |
| Cumplimiento del costo (CPI) ⓘ | 12,44 | 9,95 | 3,09 | 2,49 | 2,24 | 5,99 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 2,83 | 1,58 | 1,45 | 1,28 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | | | |
| Retraso SV(t) Meses ⓘ | -1,17 | -0,73 | -0,73 | -7,10 | -6,10 | -5,63 | -4,97 | -3,93 | -2,93 | -1,90 | -0,93 | -0,57 | 0,20 | 0,50 | 0,73 | 1,20 | 1,80 | 2,33 | 2,57 | 2,47 | 2,50 | 3,17 | | | |

* Valores en millones de pesos

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE EL USO DE NFT Y CONTRATOS INTELIGENTES BAJO TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

OBJETIVO GENERAL:

Indicador del Objetivo General – Incrementar la comercialización del arte Digital en el departamento del Atlántico- Informe final de supervisión

OBJETIVO 1:

Producto del Especifico 1.

1.1 Servicio de fomento a la vigilancia y prospectiva tecnológica. Estudios cantidad 1.

OBJETIVO 2:

Producto del Especifico 2.

2.1 Artículos científicos derivados de procesos de innovación y desarrollo tecnológico. Artículos cantidad 5.

OBJETIVO 3

Producto del Especifico 3

3.1 Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación (Producto principal del proyecto). Proyectos cantidad 2.

OBJETIVO 4

Producto del Especifico 4

4.1 Servicio de apoyo para la generación e implementación de estrategias de integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el fomento de la apropiación social del conocimiento- Estrategias cantidad 4.



Ciencias
