

Aguazul, 30 de diciembre de 2025

Señor:

JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ

secretario de desarrollo económico y medio ambiente.

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega Informe Mensuales N°4 correspondiente al mes de octubre del 2025, contrato N° 574 del 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente con el fin de realizar la entrega del informe mensual correspondiente al mes de octubre, contrato N°574-2025 con el cual se da cumplimiento al objeto en referencia.

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte S.

ALEXANDER DUERTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Yopal - Casanare

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0574-2025

CONTRATISTA: ALEXANDER DUARTE SIERRA

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

INF. MENSUAL No. 4 - CTO 0574-2025

INFORME N°4 DE ACTIVIDADES Y RECURSOS EJECUTADOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

INTRODUCCIÓN

El MUNICIPIO DE AGUAZUL a través de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL convocó y adjudicó la Licitación Pública No. MA-SDEA-LP-003-2025, cuyo proyecto tiene por objeto: **"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"**.

En el desarrollo de dicho proceso de licitación pública, El MUNICIPIO DE AGUAZUL, suscribió con la Empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos S.A.S "ISMANT S.A.S" el Contrato N° 0613 de fecha 15 de julio de 2025 y el contrato de interventoría No. 0574-2025 cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"**.

La empresa Consultoría & Asesorías Alexander Duarte Sierra presenta el cuarto informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, relacionado con el seguimiento y avance administrativo, financiero, contable y jurídico de las actividades desarrolladas para la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental.

Este informe tiene como finalidad exponer el avance físico y económico de las acciones ejecutadas durante el periodo mencionado, con el propósito de facilitar el seguimiento al porcentaje de ejecución de los trabajos y actividades previstas dentro del contrato, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos y la adecuada supervisión contractual.

1. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se presenta el resumen general del Contrato de interventoría N° 574-2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA, No. 574 DE 01/07/2025
MODALIDAD:	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
PROCESO:	MA-CMA-SDEA-003-2025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".
CONTRATISTA:	ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT:	1.116.868.212-2
R/L:	ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C.	1.116.868.212 EXPEDIDA EN TAME (ARAUCA).
VALOR:	\$40.708.389 M/CTE.
PLAZO:	SEIS (6) MESES.
FECHA INICIO:	01 DE JULIO DEL 2025.
FECHA TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA TERMINACION ACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
REINICIO No. 1:	N/A
PERIODO DEL INFORME	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

El contrato de Interventoría realizó acta de inicio de fecha 01 de julio del 2025 y la adquisición de pólizas que fueron debidamente aprobada de conformidad a:

2. ESTADO GENERAL DE LAS POLIZAS.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA A HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01/07/2025	03/07/2026	\$4.070.838,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-46-101059734
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/07/2025	03/07/2029	\$2.035.419,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-46-101059734
CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2025	03/05/2026	\$4.070.838,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-46-101059734
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/07/2025	03/01/2026	\$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-54-101007413
Póliza Acta de Inicio					

3. RELACIÓN DE PERSONAL OFERTADO Y VINCULADO AL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en la Propuesta presentada por ALEXANDER DUARTE SIERRA y las hojas de vida presentadas, se relaciona a continuación el personal contratado para realizar dicha consultoría, tiempo de duración y porcentajes de dedicación según lo ofertado y aprobado.

Nº	NOMBRE	DURACION	DEDICACION	FECHA DE INICIO
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	6 MESES	20%	01/07/2025
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	6 MESES	20%	01/07/2025

• RELACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

A continuación, se relaciona los pagos realizados por el personal profesional vinculado al contrato en cumplimiento de las obligaciones parafiscales:

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	Nº PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	OCTUBRE-2025	9495371768
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	OCTUBRE-2025	9495371768

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

• COSTOS DIRECTOS

Para el cumplimiento de la ejecución de actividades la interventoría cuenta con vehículo para transporte del personal profesional con el fin de realizar el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, legal y ambiental para el contrato que se deriva del objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", de la misma manera cuenta con oficina ubicada en la carrera 8 No. 14 – 34 del municipio de Aguazul Casanare.

DESCRIPCIÓN	UND	VALOR	DÍAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VALOR PARCIAL
Vehículos tipo campero PICKUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300cc hasta 1999cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible, modelo: igual a 2021 o superior.	6	\$10'500.000	180 días	6	20%	\$12'600.000

TIPO DE VEHICULO	SERVICIO	PLACA Y COLOR	CILINDRAJE
Vehículo tipo camioneta TOYOTA Hilux	PÚBLICO	LJT465 SUPER BLANCO	2.393

(Ver anexo, documentos vehículo)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

4. COMITES DE SEGUIMIENTO:

A la fecha de corte del presente informe se realizaron los siguientes comités.

Nº	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	18 - JUL- 2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	21 - JUL - 2025
3	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	22 - JUL - 2025
4	APROBACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250HRS	17 - OCT - 2025

4.1. CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA

Correspondencia contrato de consultoría mes de julio:

- Enviada

Nº	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	SDEA	21 - JUL - 2025
2	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE INICIO AL CTO No. 0613 DE 2025	ISMANT	21 - JUL - 2025
3	SOLICITUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO ° 0613 DE 2025.	ISMANT	24 - JUL - 2025

- Recibida

Nº	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	SDEA	18 - JUL- 2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ISMANT	18 - JUL - 2025
3	ENTREGA DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO	ISMANT	22 - JUL - 2025
4	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ISMANT	25 - JUL- 2025
5	RELACIÓN PERSONAL AFILIADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ISMANT	30 - JUL- 2025
6	ENTREGA DE MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS QUINCENAL	ISMANT	30 - JUL- 2025

Correspondencia contrato de consultoría mes de agosto:

• Enviada

Nº	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ALMACEN	04-AGO-2025
2	REQUERIMIENTO INFORME MENSUAL	SDEA	26-AGO-2025

• Recibida

Nº	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA PROGRAMACIÓN	SDEA	01-AGO - 2025
2	ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	ISMANT	04 - AGO - 2025
3	ENTREGA DE MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS QUINCENAL	ISMANT	15 - AGO - 2025
4	REQUERIMIENTO DE INFORME MENSUAL CTO No. 0613 DE 2025	SDEA	26 - AGO - 2025

Correspondencia contrato de consultoría mes de septiembre:

• Enviada

Nº	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	SOLICITUD – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01 – SEP - 2025
2	APROBACIÓN H.V OPERARIOS CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	02-SEP-2025
3	Radicación Informe 1 contrato 613 de 2025	SDEA	08-SEP-2025
4	OFICIO DE OBSERVACIONES, CORRECCIÓN DE INFORME MENSUAL 1 CONTRATO 613-2025	ISMANT	10-SEP-2025
5	SOLICITUD – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	12-SEP-2025
6	RADICACIÓN INFORME 1 Y 2 CONTRATO 613 DE 2025	SDEA	30-SEP-2025

• Recibida

Nº	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01 – SEP - 2025
2	SOLICITUD – CAMBIO DE OPERADORES DE TRACTOR	ISMANT	01 – SEP - 2025
3	ENTREGA – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	16 – SEP - 2025

Correspondencia contrato de consultoría mes de octubre:

• Enviada

Nº	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	SOLICITUD – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01-OCT-2025
2	SOLICITUD – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	12-OCT-2025
3	ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ALMACEN	17-OCT-2025
4	CONVOCATORIA COMITÉ ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA, 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250h CONTRATO N° 0613 DE 2025.	SDEA	17-OCT-2025
5	RADICACIÓN INF 1 Y 2 CONTRATO N° 574-2025 Y CONTRATO 0613-2025	SDEA	23-OCT-2025
6	RADICACIÓN ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO 0613-2025	SDEA	23-OCT-2025
7	SOLICITUD ENTREGA INF N°3 CONTRATO N° 0613-2025	ISMANT	27-OCT-2025

• Recibida

Nº	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA – MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01- OCT-2025
2	ENTREGA INSUMOS Y ELEMENTOS EN EL MARCO DEL CPS N° 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025	ISMANT	15 -OCT- 2025
3	ENTREGA – 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	16- OCT- 2025
4	COMITÉ APROBACIÓN ENTREGA DE INSUMOS	SDEA	17-OCT-2025
5	SOLICITUD DE COBRO PARCIAL N° 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 0613 DE 2025	ISMANT	17-OCT-2025
6	ACTA – ENTRADA Y SALIDA INSUMOS Y ELEMENTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA CONT. N° 613-2025	ALMACEN	17-OCT-2025

5. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA

5.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

1. Acopiar documentación producida en la etapa precontractual que requiera.
- ✓ La interventoría en cumplimiento de su labor descargó de la página del Secop II la documentación correspondiente al proceso de Licitación Pública N° MA-SDEA-LP-003-2025, que generó el contrato que es de nuestra vigilancia, control y seguimiento, Contrato No. 613 del 17 de julio de 2025, información que reposa en el archivo digital de la misma.
2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
- ✓ La interventoría establece como mecanismos, protocolos claros para la comunicación y seguimiento del contrato, utilizando herramientas digitales (correo electrónico (Ingeniero.a.d@gmail.com), reuniones periódicas (comités técnicos), y fomentando una cultura de mejora continua que permita adaptarse a los cambios del proyecto y al cumplimiento de los objetivos contractuales.
3. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con los contratistas, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el MUNICIPIO intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.
- ✓ La interventoría creó como canal oficial o designado para la correspondencia relacionada con el contrato, un correo electrónico denominado Ingeniero.a.d@gmail.com, así como la recepción física de los mismos, los cuales llevan un orden de fechas de la correspondencia producida durante la ejecución (enviadas y recibidas) todo esto con el fin de llevar control.
4. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados.
- ✓ La interventoría implementó un área de archivo para los documentos por orden cronológico manteniéndolos al día y verificando que la información esté completa y actualizada en caso de ser requerida. **NOTA:** Este numeral se encuentra referenciado en el numeral **4.1 CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA**.
5. Coordinar con las dependencias del MUNICIPIO que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de estas funciones se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las

actuaciones contractuales.

- ✓ La interventoría establece una comunicación fluida y colaborativa entre las diferentes áreas y dependencias de la administración que están involucradas en la ejecución del contrato, de esta manera las acciones tomadas se realizan de manera inmediata y directa según lo amerite la situación.
- 6. Procurar que por causas atribuibles al MUNICIPIO no se cause un rompimiento del equilibrio financiero.
- ✓ Se realiza una gestión y verificación cuidadosa de los recursos y de las políticas o acciones que afecten el contrato asegurando que las acciones de las partes se mantengan dentro de lo acordado a lo largo del proceso y no se desajusten por decisiones municipales. Esta labor hace parte de las actividades propias de la interventoría, orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada programación de actividades, la disponibilidad oportuna de los insumos y la correcta asignación de las actividades entre las partes.
- 7. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato.
- ✓ Durante el tiempo transcurrido se ha programado y coordinado comités con el fin de evaluar peticiones y el estado de la ejecución del contrato, garantizando que el contratista cumpla con los términos y especificaciones del acuerdo de manera oportuna y correcta dando cumplimiento el objeto contractual. **NOTA:** Este numeral se encuentra referenciado en el numeral **4. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.**
- 8. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza del mismo; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo.
- ✓ Según los requerimientos, los informes deben ser mensuales, para lo cual la interventoría presenta revisión y formulación del cuarto informe con corte a 31 de octubre, con el cual a la fecha se incluirá el seguimiento a las actividades de mecanización, continuando con dichas labores para los terrenos aprobados y faltantes según solicitudes presentadas.

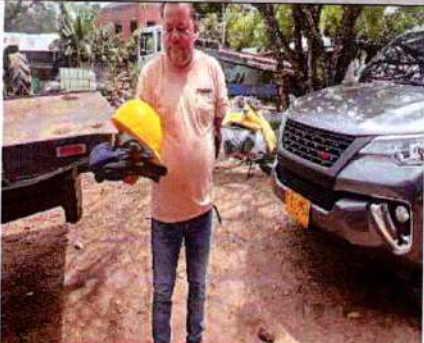
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
Informe 1 - julio	16 - sep. - 2025	Informe 1 julio	16 - sep. - 2025
Informe 2 - agosto	16 - sep. - 2025	Informe 2 agosto	16 - sep. - 2025

- 9. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y

ambiental que sean aplicables.

- ✓ La interventoría vigila el cumplimiento de normas y regulaciones pertinentes sobre la seguridad de los trabajadores, las condiciones de higiene del lugar de trabajo, la salud de los empleados y la protección del medio ambiente se sigan y se cumplan rigurosamente en el ámbito laboral y durante el desarrollo de los procesos desarrollados.

El Día 25 de Julio de 2025 se realizó la entrega correspondiente de los elementos de protección personal a cada uno de los operadores de cada tractor.

ITEM	NOMBRE	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	OMAR ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES	
2	CARLOS JULIO MUÑOZ VEGA	
3	MANUEL ALEXANDER VARGAS VELA	

4	CARLOS REINEL SALAMANCA DIAZ	
5	OSCAR JULIAN PARRA CACERES	

10. Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento de los contratos, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

- ✓ Durante el periodo evaluado **no se identificaron hechos, situaciones o indicios** que constituyan incumplimiento contractual por parte del contratista o de la entidad, ni circunstancias que puedan configurarse como actos de corrupción, conductas punibles, o que representen un riesgo para el adecuado desarrollo y cumplimiento del contrato.

Se revisó la documentación administrativa, financiera y jurídica disponible, así como los avances reportados en las actividades programadas, sin que se evidenciaran anomalías, irregularidades o alertas que requirieran reporte especial a la entidad contratante.

En caso de presentarse cualquier situación que pudiera afectar la transparencia, la correcta ejecución contractual o el cumplimiento de los objetivos, se informará de manera inmediata y formal según los protocolos establecidos.

11. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración de los contratos.

- ✓ Durante el periodo reportado se realizaron las actuaciones administrativas

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

necesarias para garantizar la correcta administración de los contratos, incluyendo la revisión de documentos contractuales, seguimiento a cronogramas, verificación de entregables, actualización de registros y comunicación oportuna con las dependencias involucradas.

Estas actuaciones permitieron mantener el control adecuado sobre el desarrollo de las obligaciones contractuales, asegurar la trazabilidad de las gestiones realizadas y apoyar la toma de decisiones por parte de la entidad contratante. No se presentaron situaciones que requirieran medidas extraordinarias y todas las actuaciones se ejecutaron conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la entidad.

5.2 OBLIGACIONES DE CARACTER TÉCNICO:

1. Verificar y aprobar las especificaciones condiciones técnicas y demás consideraciones que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato.

✓ Como interventoría se solicitó la aprobación de pólizas al contratista:

Póliza Minuta

CONCEPTO DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-04-2026	\$ 52.791.760,90
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-12-2028	\$ 26.395.880,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-04-2026	\$ 52.791.760,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	15-07-2025	25-04-2026	\$ 211.167.043,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-40-101082931	15-07-2025	25-12-2025	\$ 284.700.000,00

Garantías aprobadas por la oficina asesora jurídica el día 17 de julio de 2025.

Póliza Acta de Inicio

CONCEPTO DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-12-2028	\$ 26.395.880,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	\$ 211.167.043,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-40-101082931	17-07-2025	27-12-2025	\$ 284.700.000,00

Garantías aprobadas por la oficina asesora jurídica el día 08 de agosto de 2025.

Una vez que la Interventoría verifico el cumplimiento integral de los requisitos de legalización contractual, incluyendo la revisión de garantías, verificación de los documentos habilitantes, cumplimiento de requisitos financieros, administrativos y jurídicos, así como la constatación de las condiciones necesarias para el inicio de la ejecución.

En consecuencia, y habiéndose corroborado que existían las condiciones técnicas, administrativas y operativas para dar inicio a las actividades contratadas, el **17 de julio de 2025** se procedió a la firma del **Acta N° 1 de Inicio**, documento suscrito conjuntamente por la **Interventoría**, el **Contratista** y la **Supervisión**, mediante el cual se formaliza el comienzo de la ejecución contractual.

En cumplimiento de la función de verificar y aprobar las especificaciones, condiciones técnicas y demás consideraciones necesarias para la adecuada ejecución del contrato, durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes revisiones y aprobaciones:

N°	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	18-JU-2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	21-JUL-2025
3	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	22-JUL-2025
4	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	17-OCT-2025

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, equipo, población beneficiada, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requieren los contratos.

- ✓ Para el presente periodo no se presentaron cambios de personal ni hojas de vida de operadores.
- 3. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones a los contratos. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría.
- ✓ La interventoría realizó el estudio y verificación de las solicitudes realizadas por el contratista emitiendo su correspondiente concepto de acuerdo a cada solicitud realizada durante el proceso y llevando a comité y aprobaciones finales por parte de la supervisión donde se remite una nueva forma de pago "El municipio pagará al contratista el valor del presente contrato mediante actas parciales, hasta por un ochenta por ciento (80%) del valor total, de acuerdo con el avance de las actividades contratadas y previa verificación, aprobación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría y supervisión designadas. Para cada pago, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social (salud, riesgos laborales y pensiones) y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, ICBF y SENA), así como entregar el informe de avance, y la certificación del interventor y del supervisor respecto de las actividades ejecutadas. El veinte por ciento (20%) restante será pagado mediante la suscripción del acta de liquidación del contrato, una vez se haya ejecutado la totalidad de las actividades, se presente el informe final (en medio físico y magnético), se cuente con el recibido a entera satisfacción por parte de la interventoría y supervisión, y se hayan cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato. Todos los pagos estarán condicionados a la verificación y certificación del avance real del contrato por parte de la interventoría y la supervisión. En consecuencia, no habrá desembolsos sin la correspondiente verificación y certificación previa de dichas obligaciones.

Modificación	Fecha	Observación
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación -(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO

- 4. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma revisto y recomendar los ajustes a que haya lugar.
- ✓ La Interventoría realiza la revisión en detalle de los cronogramas de mecanización presentados por el contratista de manera quincenal con el objetivo de garantizar que las actividades relacionadas con la ejecución del contrato se desarrollen conforme a los plazos y condiciones establecidas en los documentos contractuales.

La Interventoría garantiza el cumplimiento de los cronogramas mediante un monitoreo permanente del avance de las actividades. En caso de identificarse



desviaciones o riesgos de retraso, estos son informados de manera oportuna a la Supervisión, junto con las recomendaciones pertinentes orientadas a efectuar los ajustes necesarios o a realizar la reprogramación de actividades, de ser requerida.
Anexos Cronogramas de Mecanizaciones mensuales - Matriz de Mecanización.

5. Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al MUNICIPIO de los equipos, elementos y documentos suministrados por Él y constatar su estado y cantidad.
- ✓ En el momento de ser requerido la interventoría dará cumplimiento a las actividades correspondientes.
6. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.
- ✓ Durante el periodo evaluado, la Interventoría llevó a cabo todas las actividades necesarias para garantizar el desarrollo adecuado del objeto contractual, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.
7. Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual.
- ✓ La interventoría solicita, mediante oficio, la entrega de los cronogramas de mecanización quincenal correspondientes a cada periodo, con el propósito de dar seguimiento puntual al cumplimiento por parte del contratista de cada una de las actividades programadas y acordadas con el Municipio y la revisión de los informes mensuales. Esta gestión permite, que, en su debido momento, certificar el cumplimiento de las actividades del contrato ya sea mediante actas parciales de cumplimiento o liquidación contractual.
8. Adelantar revisiones periódicas de las actividades ejecutadas, para verificar que ellas cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra este y su garante cuando dichas condiciones no se cumplan.
- ✓ Durante el periodo de seguimiento, la Interventoría ha adelantado revisiones periódicas de las actividades ejecutadas con el propósito de verificar que todas cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y establecidas en el contrato.
 Para facilitar este proceso, el contratista presenta informes mensuales, los cuales contienen la descripción de las actividades realizadas, los avances físicos y técnicos, y las evidencias de cumplimiento de los estándares de calidad requeridos. Estos informes permiten a la Interventoría realizar un seguimiento detallado y sistemático de cada actividad, identificando oportunamente cualquier desviación o incumplimiento.
 Estas revisiones periódicas, apoyadas en los informes mensuales del contratista, permiten asegurar la ejecución eficiente y de calidad del contrato, protegiendo los

intereses del Municipio y garantizando la correcta prestación del objeto contractual.

9. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
- ✓ La interventoría ha ejercido su función de exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el contratista cumplan estrictamente con los requisitos mínimos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas (NTC). En los en que no exista una norma colombiana aplicable, se verifica que los bienes y servicios se ajusten a normas.

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, la Interventoría realiza revisiones periódicas de los informes de adquisición y entrega de bienes y servicios, así como inspecciones técnicas en los repuestos e implementos suministrados.

Adicionalmente, mediante oficio formal, se certifica que los repuestos y materiales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, con el fin de autorizar su ingreso y salida del almacén municipal, asegurando así la correcta trazabilidad y control de los recursos utilizados en la ejecución del contrato.

Nº	CONCEPTO	DIRIGIDO	FECHA
1	CONVOCATORIA A COMITÉ PARA APROBACION DE REPUESTOS E INSUMOS	SDEA	21-JUL-2025
2	ACTA DE COMITÉ INTERINSTITUCIONAL		22-JUL-2025
3	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	04 -AGO-2025
4	CONVOCATORIA A COMITÉ PARA APROBACION DE REPUESTOS E INSUMOS	SDEA	17-OCT-2025
5	DOCUMENTO VISTO BUENO REPUESTOS E INSUMOS	SDEA	17-OCT-2025
6	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	17-OCT-2025

5.3 OBLIGACIONES DE CARÁCTER CONTABLE Y FINANCIERO:

1. Verificar que los contratistas cumplan con los requisitos para la entrega del anticipo pactado y constatar su correcta inversión. (solo si aplica)
- ✓ La interventoría avaló solicitud presentada por el contratista en la cual renunció al anticipo, soporte acta de 21 de julio con la cual la administración aprueba dicha solicitud.
- ✓ La interventoría revisó y aprobó solicitud presentada por el contratista para el

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

cobro de la primera acta parcial del contrato N°0613-2025, aprobada por parte de la administración con fecha del 23 de octubre de 2025

Modificación	Fecha	Observación
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA-FORMA DE PAGO

2. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por los contratistas y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.
- ✓ Durante el presente periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025, el contratista presento solicitud del primer pago parcial. Por lo tanto, se requirió efectuar revisión, aprobación y pago de la primera acta parcial para este contrato en este periodo.

ACTA	Fecha	Observación
Acta N°2 PARCIAL N° 1	23-10-25	ACTA PARCIAL DE COBRO N° 1

3. Emitir concepto sobre la pertinencia o no de autorizar cesión de derechos económicos, en caso de solicitarse por parte del contratista, de conformidad con la reglamentación expedida por el municipio para tal efecto.
- ✓ Durante el periodo comprendido, no se presentó ninguna solicitud por parte del contratista para la cesión de derechos económicos. Por lo tanto, no fue necesario emitir concepto alguno sobre la pertinencia de autorizar dicha cesión.

La Interventoría continuara atenta a cualquier solicitud futura, evaluando su procedencia conforme a la normatividad vigente del Municipio y asegurando que cualquier autorización cumpla con los procedimientos y requisitos legales establecidos.

4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiera lugar.
- ✓ Durante el periodo evaluado, la Interventoría no identifico incumplimientos contractuales que generaran la aplicación de sanciones pecuniarias ni la ejecución de garantías por parte del contratista. Por lo tanto, no fue necesario adelantar gestiones para el reconocimiento o cobro de las mismas.

No obstante, la Interventoría mantiene un seguimiento permanente a la ejecución del contrato y está en disposición de gestionar oportunamente cualquier situación que pueda derivar en sanciones o afectación de garantías, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de los intereses del Municipio.

5. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero de los contratos.
- ✓ Durante este periodo no se presentaron fenómenos ni circunstancias que afectaran el equilibrio económico o financiero del contrato, por lo que no fue necesario solicitar actualización o revisión de los precios al contratista.

5.4 OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL:

1. Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta la liquidación del contrato.
- ✓ Durante el desarrollo del presente contrato la interventoría ha realizado las solicitudes correspondientes mediante oficios mensuales, a los que el contratista ha dado respuesta con la presentación de las pólizas exigidas (cumplimiento, calidad, estabilidad, salarios y prestaciones, entre otras).

Anexo: En el numeral 5.2 se relacionan las pólizas del contratista

2. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al municipio, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias.
- ✓ Como interventoría se ha acompañado en el proceso la comunicación entre el municipio y el contratista para garantizar que las directrices se lleven a cabo de manera correcta y eficiente.

En este periodo no fue necesario promover el ejercicio de las facultades de dirección o reorientación de la acción contractual por parte del municipio, dado que la ejecución del contrato se desarrolló dentro de los parámetros establecidos.

No se presentaron situaciones que ameritaran la aplicación de prerrogativas extraordinarias ni medidas especiales, por lo cual la interventoría se limitó a realizar el seguimiento habitual, verificando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.

3. En caso de requerirse verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados
- ✓ La interventoría solicita al contratista copia de los subcontratos suscritos con el fin de verificar que dichos acuerdos se encuentren debidamente formalizados y que su contenido sea coherente con el objeto, alcance y obligaciones establecidas en el contrato principal.

Durante este proceso de revisión, se examinan aspectos como: el cumplimiento de los requisitos legales, la idoneidad del subcontratista, la correspondencia entre las actividades subcontratadas y las permitidas en el marco contractual, así como la adecuada definición de responsabilidades, plazos y condiciones de ejecución.

Esta verificación permite garantizar que los subcontratos no generen riesgos para la correcta ejecución del contrato principal y que se mantenga la alineación con los intereses y normas del municipio.

En caso de requerirse ajustes o aclaraciones, la interventoría los comunica oportunamente al contratista para su correspondiente corrección o actualización

4. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.
- ✓ La interventoría a analizado técnicamente las causas que motivan la adición o modificación,

La interventoría avaló solicitud presentada por el contratista en la cual renunció al anticipo, soporte acta de 21 de julio con la cual la administración aprueba dicha solicitud.

Modificación	Fecha	Observación
Acta Modificatorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.
- ✓ La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales derivadas del contrato, verificando que los trabajadores vinculados a la ejecución se encuentren debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral en los componentes de salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales correspondientes.

Durante el periodo evaluado, se revisó la documentación soportada por el contratista —incluyendo planillas de aportes, afiliaciones y comprobantes de pago— para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

Con base en la información suministrada, se constató que el contratista mantiene al día los pagos y obligaciones laborales exigidas, y que el personal que participa en la ejecución del contrato cumple con las afiliaciones requeridas por la

normatividad vigente. En caso de identificarse inconsistencias, estas se comunican oportunamente al contratista para su corrección inmediata.

6. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar.
- ✓ Durante el periodo evaluado no se presentaron reclamaciones por parte del contratista. En consecuencia, no fue necesario adelantar procesos de estudio o análisis, ni emitir recomendaciones asociadas a este aspecto. La interventoría mantuvo seguimiento continuo y disposición para atender cualquier solicitud que pudiera surgir, sin registrarse novedades en este ítem.
7. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.
- ✓ La interventoría participó en la elaboración y revisión de las actas generadas durante la ejecución del contrato, suscribiendo aquellas que correspondían según el avance y las actividades desarrolladas. Todas las actas requeridas en este periodo fueron firmadas de manera oportuna, garantizando la adecuada formalización de los hechos y eventos registrados en el proceso contractual. A continuación, se relacionan las actas que se han realizado hasta el reporte de este periodo.

ACTAS CONTRACTUALES

Modificación	Fecha	Observación
Acta N°1 de Inicio	01/07/2025	Terminación 31/12/2025
Acta Modificadorio N° 1	19/08/2025	Modificación –(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO
Acta N° 2 parcial N°1	23-10-25	Acta parcial de cobro N°1

ACTAS DE COMITE DE SEGUIMIENTO:

A la fecha de corte del presente informe se realizaron los siguientes comités.

N°	CONCEPTO	FECHA
1	ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	18-JUL-2025
2	RENUNCIA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0613 DE 2025.	21-JUL-2025
3	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	22-JUL-2025
4	APROBACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS	17-OCT-2025

8. Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan.
- ✓ La interventoría revisará y corroborará la ejecución total del contrato: actividades cumplidas, pagos efectuados, garantías, entregables y elaboración del informe final de interventoría con soportes técnicos, financieros y fotográficos, una vez se verifique el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y se cuenten con



NIT: 1.116.868.212-2

los requisitos técnicos, administrativos y financieros necesarios para ello. Hasta el periodo evaluado, este proceso no se ha activado por encontrarse el contrato en ejecución.

9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.
- ✓ La interventoría ha velado por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones presentadas por particulares o autoridades relacionadas con el desarrollo del contrato, garantizando su recepción, análisis y remisión al contratista o al municipio según corresponda.

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento a cada requerimiento con el fin de asegurar respuestas oportunas y adecuadas, manteniendo así la transparencia y continuidad en la ejecución contractual

• Enviada

Nº	CONCEPTO	DESTINO	FECHA
1	SOLICITUD - MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01-OCT-2025
2	SOLICITUD - 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	12-OCT-2025
3	ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ALMACEN	17-OCT-2025
4	CONVOCATORIA COMITÉ ENTREGA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MAQUINARIA AGRICOLA, 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250h CONTRATO N° 0613 DE 2025.	SDEA	17-OCT-2025
5	RADICACIÓN INF 1 Y 2 CONTRATO N° 574-2025 Y CONTRATO 0613-2025	SDEA	23-OCT-2025
6	RADICACIÓN ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO 0613-2025	SDEA	23-OCT-2025

• Recibida

Nº	CONCEPTO	ORIGEN	FECHA
1	ENTREGA - MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	01- OCT-2025
2	ENTREGA INSUMOS Y ELEMENTOS EN EL MARCO DEL CPS N° 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025	ISMANT	15 -OCT- 2025
3	ENTREGA - 2da MATRIZ DE SOLICITUD DE USUARIOS DE MECANIZACIÓN QUINCENAL CONTRATO N° 0613 DE 2025.	ISMANT	16- OCT- 2025
4	SOLICITUD DE COBRO PARCIAL N° 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 0613 DE 2025	ISMANT	17-OCT-2025
5	SOLICITUD ENTREGA INF N°3 CONTRATO N° 0613-2025	ISMANT	27-OCT-2025

10. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.

- ✓ La interventoría cumplió con las demás funciones inherentes a su naturaleza y establecidas en la normatividad vigente, realizando el acompañamiento técnico,

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

administrativo y documental necesario para garantizar la correcta ejecución del contrato.

Estas actividades incluyeron la verificación permanente del avance contractual, la revisión de soportes entregados por el contratista, la elaboración de informes, el seguimiento a obligaciones transversales y la comunicación oportuna de cualquier situación que pudiera afectar el normal desarrollo del contrato.

Todas las acciones se ejecutaron conforme a los principios de transparencia, eficiencia y rigor técnico que orientan la función de interventoría.

11. Suministrar la información que les sea requerida por la entidades públicas o entes de control.
- ✓ La interventoría mantiene disponible toda la documentación técnica, financiera y contractual para auditorías o visitas de control.

5.5 OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTALES:

1. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las actividades se enmarque dentro de los requerimientos ambientales.
- ✓ La interventoría efectuó el seguimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas, verificando que estas se desarrollaran conforme a los requerimientos ambientales establecidos para el contrato. Para este fin, fueron contratados profesionales y técnicos especializados, quienes realizaron las visitas de campo y llevaron a cabo la revisión ambiental correspondiente del contratista.

Como evidencia del cumplimiento de esta labor, se diligenciaron los formatos de verificación ambiental en cada una de los predios evaluados para la mecanización y preparación de terrenos, los cuales registran las observaciones, hallazgos y el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del contratista. Estos documentos quedaron disponibles como soporte del seguimiento realizado durante el periodo.

6. EJECUCION FISICO FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA N°574/2025 del 01 al 31 de octubre.

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

PERSONAL	Nº	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VALOR BASICO MENSUAL	F.M	VR PARCIAL
1. COSTOS DE PERSONAL								
PERSONAL PROFESIONAL Y								
Profesional CAT.6. Profesional en Ingeniería Agrónoma y/o a fines; 2 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada.	1	\$ 5.694.000	120,00	4,00	20%	\$ 1.138.800,00	2,3	\$ 10.476.960,00
	1	\$ 2.135.250	120,00	4,00	20%	\$ 427.050,00	2,3	\$ 3.928.860,00
Técnico CAT. Única. Técnico en Mantenimiento automotor y/o afines; 2 años de experiencia profesional y 1 año de experiencia relacionada	COSTOS DE PERSONAL							
\$ 14.405.820,00								
2. COSTOS DIRECTOS								
CONCEPTO	UND	VALOR	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VALOR PARCIAL		
EQUIPOS								
Vehículo tipo campero PICKUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300cc hasta 1999cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible, modelo: igual a 2021 o superior.	Mes	\$ 10.500.000,00	120,00	4,00	20%	\$ 8.400.000,00		
TOTAL, COSTOS DIRECTOS						\$ 8.400.000,00		
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS						\$ 22.805.820,00		
4. IVA 19,00 %						\$ 4.333.105,80		
5. COSTO FINAL (Ajustado al Peso)						\$ 27.138.926,00		
						66,67%		



7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 574-2025

RESUMEN FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	\$ 40.708.389,00
Valor Ejecutado en el periodo	\$ 6.784.731,00
Valor Ejecutado a la Fecha	\$ 27.138.926,00
Porcentaje (%) de Avance a la Fecha	66,67%
Valor del Anticipo	N/A
Porcentaje (%) por Ejecutar	33,33%
Saldo por Ejecutar	\$ 13.569.463,00
Porcentaje (%) para liquidación	100,00%
Valor para acta de liquidación	\$ 40.708.389,00

Nota: A la fecha no se ha realizado cobros parciales correspondientes, motivo por el cual los valores ejecutados únicamente reflejan los avances financieros por la interventoría, mas no representan pagos efectuados.



8. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES AL CONTRATISTA INGENIERÍA SUMINISTROS MANTENIMIENTOS S.A.S, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 0613-2025 DEL 15 DE JULIO DE 2025. (PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. MA-LP-SDEA-003-2025) SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL E "ISMANT S.A.S." INGENIERÍA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S.

a. RESUMEN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 613 DEL 15 DE JULIO DE 2015.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No.:	0613 del 15 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	"ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S NIT. 901.673.633-8
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR ROJAS RICÓN C.C. 1.026.552.430 de Bogotá.
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.
VALOR:	QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$527.917.609,00)
ACTA 1 - INICIO:	17 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
APROBACION ACTA MODIFICATORIA No. 1:	19 DE AGOSTO DE 2025 Modificación – (CLÁUSULA NOVENA-FORMA DE PAGO).
ACTA 2 PARCIAL N°1	23 DE OCTUBRE DE 2025
INTERVENTOR:	ALEXANDER DUARTE SIERRA

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare



b. INFORME LEGAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

i. ESTUDIO PREVIO

La interventoría verificó que el día 22 de abril de 2025, se aprobó el estudio previo para el proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", que beneficia a los medianos y pequeños productores del municipio de Aguazul.

ii. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA Contrato aprobado por un valor de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML/CTE (\$527.917.609,00.) de fecha 22 de abril de 2025.

TERMINOS DE REFERENCIA.

La interventoría verificó que la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL generó los TERMINOS DE REFERENCIA para el proceso de contratación N° 613 de 2025, Que tiene por objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

iii. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO

La interventoría verificó que el Ocho (08) de Julio de 2025, mediante resolución 170.12.-009 del 08 de Julio de 2025 se Ordenó la adjudicación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. MA-LP-SDEA-003-2025 cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", a INGENIERÍA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S, con NIT. 901.673.633-8.

iv. FIRMA DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 613 DE 2025.

La interventoría verificó que el día Quince (15) de julio de 2025 firmaron el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025., que tiene por objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare



MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", por valor de QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML/CTE (\$527.917.609,00.), con un plazo de ejecución de cinco (5) meses y diez (10) días, entre "ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S con NIT. 901.673.633-8 y la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL.

v. PÓLIZAS PRESENTADAS Y APROBADAS PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 613 DE 2025.

La interventoría verificó que la "ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S presentó las garantías únicas expedidas por la **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, mediante las siguientes Pólizas: Póliza 65-44-101241049 amparando obligaciones a terceros, patronal, contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, responsabilidad civil extracontractual. Póliza No. 65-40-101082931 amparando el manejo de anticipo, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales y cumplimiento del contrato, las cuales fueron aprobadas por OFICINA ACESORA JURIDICA, el 17 de julio de 2025 de acuerdo al siguiente detalle:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO	15-07-2025	25-04-2026	\$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.	15-07-2025	25-04-2026	\$211.167.043,60	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	15-07-2025	25-12-2028	\$ 26.395.880,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
CALIDAD DEL SERVICIO	15-07-2025	25-04-2026	\$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	15-07-2025	25-12-2025	\$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082931



vi. PÓLIZAS PRESENTADAS Y APROBADAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 613 DE 2025 SEGÚN ACTA DE INICIO

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA A HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	17-07-2025	27-04-2026	\$211.167.043,60	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	17-07-2025	27-12-2028	\$ 26.395.880,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
CALIDAD DEL SERVICIO	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	17-07-2025	27-12-2025	\$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082931
Póliza Acta de Inicio - aprobadas por OFICINA ACESORA JURIDICA, el 08 de agosto de 2025					

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA A HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	17-07-2025	27-12-2028	\$ 26.395.880,45	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
CALIDAD DEL SERVICIO	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90	SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241049
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	17-07-2025	27-12-2025	\$284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082931
Póliza Renuncia al Anticipo- Pendiente por aprobación por parte de la OFICINA ACESORA JURIDICA					



8.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

La interventoría verificó que el 15 de julio de 2025, el SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, generó el Registro Presupuestal del compromiso - RP No. 202500904, por concepto de: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", por un valor QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML/CTE (\$527.917.609,00.)

8.2 FIRMA DEL ACTA DE INICIO

La interventoría verificó que el día Diez y siete (17) de Julio de 2025, firmaron el acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 613 DEL 17 DE JULIO DE 2025, cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", a partir de esta fecha se dio inicio formal a la ejecución de las actividades pactadas contractualmente.

8.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El día 18 de julio de 2025, el contratista "ISMANT SAS" INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S presentó a la interventoría el Oficio de renuncia al anticipo, dicha solicitud fue presentada ante la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL con recibido del día 21 de julio del 2025 por parte de la interventoría; Dicha solicitud fue atendida por la supervisión bajo acta modificatoria N° 1, de fecha 19 de agosto del 2025, con la cual la entidad supervisora del contrato 613 del 2025, realiza Modificación -(CLÁUSULA NOVENA- FORMA DE PAGO) aprobando dicha solicitud .

8.4 INFORME ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

Seguridad social personal

La interventoría verificó los pagos de seguridad social realizados para el personal vinculado en el mes de octubre de 2025, como se relaciona a continuación:

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare



N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	JULIO-2025	9492334371
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	JULIO-2025	9492334371

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	AGOSTO-2025	9492334438
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	AGOSTO-2025	9492334438

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	SEPTIEMBRE-2025	9492736641
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	SEPTIEMBRE-2025	9492736641

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	1.116.544.552	OCTUBRE-2025	9495371768
2	WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	1.006.443.435	OCTUBRE-2025	9495371768

8.5 EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

8.5.1 BALANCE DE PAGOS REALIZADOS AL EJECUTOR

VALOR DEL CONTRATO: \$ 527.917.609,00.

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: N/A

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO (Anticipos, actas, pagos)	COMPROMISOS DE PAGO	FECHA	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$527.917.609,00	Anticipo	N/A		
Acta Parcial N°1		Acta Parcial	Orden de pago de Acta Parcial No 1 No. 202503656	28-10-2025	\$ 320.272.866,00

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare


8.6 MATRIZ DE EJECUCIÓN FÍSICO – FINANCIERA CTO 613-2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance del presente proyecto es la Mecanización de áreas rurales del municipio, zonas para las cuáles la misma comunidad realizó la solicitud de manera directa por medio de la radicación de oficios ante la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental, con el fin de les sea prestado apoyo y mecanización a los medianos y pequeños agricultores del municipio de Aguazul.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta en el siguiente cuadro el resumen del presupuesto contractual inicial.

ITEM	DESCRIPCION	%	VALOR
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO	9,51%	50.220.000,00
2	PERSONAL OPERATIVO	14,54%	76.767.718,00
3	ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE TRACTORES Y MAQUINARIA	8,27%	43.659.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	14,64%	77.270.891,00
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	53,04%	280.000.000,00
	COSTO TOTAL	100,0%	\$ 527.917.609,00

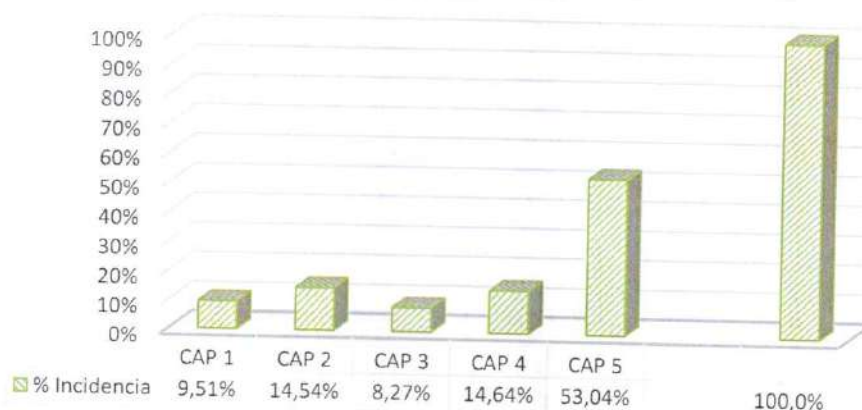

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

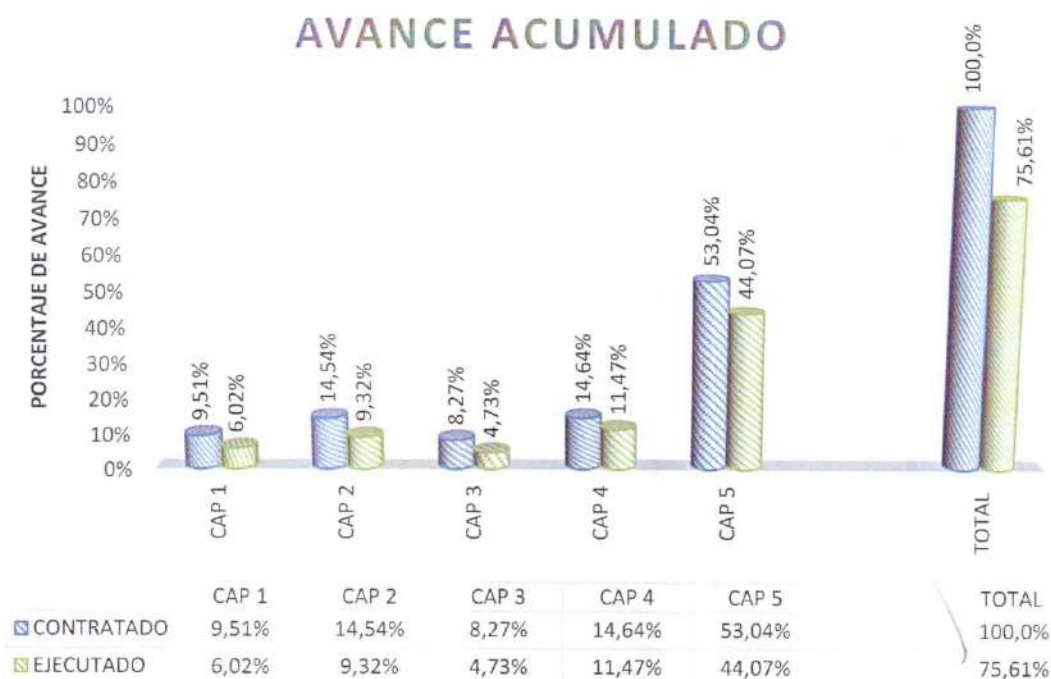
Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

8.7 MATRIZ DE EJECUCIÓN FÍSICO – FINANCIERA AVALADA PARA COBRO DE ACTAS PARCIALES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS A CORTE DEL PRESENTE INFORME

En la siguiente tabla la interventoría presenta el resumen físico-financiero de las actividades realizadas en el periodo del informe, presentándose porcentaje de ejecución avalado para pagos de las actividades del contrato, a la fecha de corte del presente informe, el Resumen de Ejecución físico – financiero es el siguiente:



A la fecha del presente informe, se ha realizado un avance correspondiente al **75,61%** de ejecución del contrato N° 613-2025, que equivale a **\$ 399.144.999,00** Trescientos noventa y nueve millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte. Quedando, así como un saldo a ejecutar de 24,39%, correspondiente a un valor de \$ 128.772.610,00 ciento veintiocho millones setecientos setenta y dos mil seiscientos diez pesos m/cte.

A continuación, presupuesto General de las cantidades y actividades ejecutadas según avance en todos los ítems del contrato 613-2025.

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL CANTIDADES Y PRESUPUESTO										ACTIVIDADES EJECUTADAS									
"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCAUENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".										CANTIDADES EJECUTADAS									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES										ACTIVIDADES CONTRATADAS									

AGUAZUL DE AGUAZUL		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL												MUNICIPIO DE AGUAZUL		REPUBLICA DE COLOMBIA		DEPARTAMENTO DE CASANARE		MUNICIPIO DE AGUAZUL		AGUAZUL DE AGUAZUL	
"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"																							
CANTIDADES EJECUTADAS																							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES												ACTIVIDADES CONTRATADAS											
CANTIDADES EJECUTADAS												ACTIVIDADES EJECUTADAS											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	%	TOTAL EJECUTADO	VUNITARIO	VIPARCIAL	%	VR SIN EJECUTAR	%									
9	KIT VALVULAS DE ESCAPE	KIT	0,00	\$ 556.667,00	\$ 105.766,73	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 662.434,00	\$ 662.434,00	0,13%	\$ -	0,00%									
10	KIT VALVULAS DE ADMISION	KIT	0,00	\$ 485.667,00	\$ 82.276,73	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 577.944,00	\$ 577.944,00	0,11%	\$ -	0,00%									
11	KIT GUAS VALVULAS	KIT	0,00	\$ 239.000,00	\$ 45.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 284.410,00	\$ 284.410,00	0,05%	\$ -	0,00%									
12	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ESCAPE	KIT	0,00	\$ 221.667,00	\$ 168.469,92	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	4,00	\$ 263.783,75	\$ 1.055.135,00	0,20%	\$ -	0,00%									
13	KIT ASIENTOS VALVULAS DE ADMISION	KIT	0,00	\$ 342.000,00	\$ 599.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	4,00	\$ 406.980,00	\$ 1.627.920,00	0,31%	\$ -	0,00%									
14	BOMBA DE AGUA	UND	0,00	\$ 390.000,00	\$ 4.170.000,00	\$ 792.300,00	\$ 0,00	0,00%	3,00	\$ 1.654.100,00	\$ 4.962.300,00	0,94%	\$ -	0,00%									
15	RETENEDOR TRASERO CIGUEVAL	UND	0,00	\$ 235.667,00	\$ 23.243,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 280.444,00	\$ 280.444,00	0,05%	\$ -	0,00%									
16	RETENEDOR DELANTERO CIGUEVAL	UND	0,00	\$ 122.333,00	\$ 23.243,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 145.576,00	\$ 145.576,00	0,03%	\$ -	0,00%									
17	EMPAQUETADURA INFERIOR	UND	0,00	\$ 1.160.000,00	\$ 220.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 1.380.400,00	\$ 1.380.400,00	0,26%	\$ -	0,00%									
18	EMPAQUETADURA SUPERIOR	UND	0,00	\$ 856.667,00	\$ 162.766,73	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 1.019.434,00	\$ 1.019.434,00	0,19%	\$ -	0,00%									
19	RECTIFICACIÓN SIGUEVAL	UND	0,00	\$ 963.333,00	\$ 183.033,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 1.146.366,00	\$ 1.146.366,00	0,22%	\$ -	0,00%									
20	MANO DE OBRA (ELECTRICA Y MECANICA)	UND	0,00	\$ 4.706.667,00	\$ 894.266,73	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 5.600.934,00	\$ 5.600.934,00	1,06%	\$ -	0,00%									
SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y CONTROL DE POTENCIA																							
1	KIT EMBRAGUE COMPLETO (PRENSA, DISCO, COLLARIN Y VOLANTE)	KIT	0,00	\$ 11.083.333,00	\$ 2.105.833,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 13.189.166,00	\$ 13.189.166,00	2,50%	\$ -	0,00%									
2	MANO DE OBRA CAMBIO KIT EMBRAGUE COMPLETO	UND	0,00	\$ 959.667,00	\$ 182.306,73	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 1.142.004,00	\$ 1.142.004,00	0,22%	\$ -	0,00%									
3	RODAMIENTO DE BOLAS Y290797	UND	0,00	\$ 188.333,00	\$ 35.783,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 224.116,00	\$ 224.116,00	0,04%	\$ -	0,00%									
4	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTO DE BOLAS Y290797	UND	0,00	\$ 100.000,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00	0,02%	\$ -	0,00%									
5	RODAMIENTO DE BOLAS Y290832	UND	0,00	\$ 450.000,00	\$ 85.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 535.500,00	\$ 535.500,00	0,10%	\$ -	0,00%									
6	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTO DE BOLAS Y290832	UND	0,00	\$ 100.000,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00	0,02%	\$ -	0,00%									
7	RODAMIENTO DE RODILLOS SU68953	UND	0,00	\$ 398.333,00	\$ 75.683,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 474.016,00	\$ 474.016,00	0,06%	\$ -	0,00%									
8	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTO DE RODILLOS SU68953	UND	0,00	\$ 100.000,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00	0,02%	\$ -	0,00%									
9	RODILLO Y PISTA CANASTA CORONA	UND	0,00	\$ 180.000,00	\$ 68.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	2,00	\$ 214.200,00	\$ 428.400,00	0,08%	\$ -	0,00%									
10	MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO Y PISTA CANASTA CORONA AL235445	UND	0,00	\$ 78.333,00	\$ 14.893,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 93.216,00	\$ 93.216,00	0,02%	\$ -	0,00%									
11	SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	\$ 103.333,00	\$ 19.633,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 122.966,00	\$ 122.966,00	0,02%	\$ -	0,00%									
12	MANO DE OBRA CAMBIO SELLO EJE DE ATAQUE	UND	0,00	\$ 61.667,00	\$ 11.716,73	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 73.384,00	\$ 73.384,00	0,01%	\$ -	0,00%									
13	BIJUE DEL YOKE	UND	0,00	\$ 333.333,00	\$ 666.666,00	\$ 126.666,54	\$ 0,00	0,00%	2,00	\$ 366.666,50	\$ 793.333,00	0,15%	\$ -	0,00%									
14	MANO DE OBRA INSTALACIÓN BIJUE DEL YOKE	UND	0,00	\$ 173.333,00	\$ 32.933,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 206.266,00	\$ 206.266,00	0,04%	\$ -	0,00%									
15	CRUCETA YOKE	UND	0,00	\$ 351.667,00	\$ 267.266,92	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	4,00	\$ 416.483,75	\$ 1.673.935,00	0,32%	\$ -	0,00%									
16	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CRUCETA YOKE	UND	0,00	\$ 173.333,00	\$ 32.933,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 206.266,00	\$ 206.266,00	0,04%	\$ -	0,00%									
17	KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	\$ 110.667,00	\$ 221.334,00	\$ 42.053,46	\$ 0,00	0,00%	2,00	\$ 131.693,50	\$ 263.387,00	0,05%	\$ -	0,00%									
18	MANO DE OBRA INSTALACIÓN KIT SELLOS YOKE	UND	0,00	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 83.300,00	\$ 83.300,00	0,02%	\$ -	0,00%									
SISTEMA HIDRAULICO																							
1	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO DIRECCION	KIT	0,00	\$ 696.667,00	\$ 1.393.334,00	\$ 264.733,46	\$ 0,00	0,00%	2,00	\$ 829.033,50	\$ 1.958.067,00	0,31%	\$ -	0,00%									
2	MANO DE OBRA CAMBIO KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO DIRECCION	UND	0,00	\$ 273.333,00	\$ 546.666,00	\$ 103.666,54	\$ 0,00	0,00%	2,00	\$ 325.266,50	\$ 650.533,00	0,12%	\$ -	0,00%									
3	RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	\$ 394.000,00	\$ 1.162.000,00	\$ 224.500,00	\$ 0,00	0,00%	3,00	\$ 468.860,00	\$ 1.406.580,00	0,27%	\$ -	0,00%									
4	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDOR TOMA FUERZA	UND	0,00	\$ 90.000,00	\$ 270.000,00	\$ 51.300,00	\$ 0,00	0,00%	3,00	\$ 107.400,00	\$ 321.300,00	0,05%	\$ -	0,00%									
5	TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	\$ 2.180.000,00	\$ 4.360.000,00	\$ 828.400,00	\$ 0,00	0,00%	2,00	\$ 2.594.200,00	\$ 5.188.400,00	0,98%	\$ -	0,00%									
6	MANO DE OBRA CAMBIO TENSORES BRAZO HIDRAULICO	UND	0,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 142.800,00	\$ 142.800,00	0,03%	\$ -	0,00%									
7	BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA HIDRAULICO	UND	0,00	\$ 114.170.000,00	\$ 2.682.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 16.862.300,00	\$ 16.862.300,00	3,19%	\$ -	0,00%									
8	MANO DE OBRA INSTALACION Y CALIBRACION BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA HIDRAULICO	UND	0,00	\$ 823.333,00	\$ 156.433,27	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	1,00	\$ 979.766,00	\$ 979.766,00	0,19%	\$ -	0,00%									
SISTEMA DE RUEDAS																							
1	RODAMIENTOS CONICOS	UND	0,00	\$ 550.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 418.000,00	\$ 0,00	0,00%	4,00	\$ 654.500,00	\$ 2.618.000,00	0,50%	\$ -	0,00%									
2	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTOS CONICOS	UND	0,00	\$ 146.667,00	\$ 393.334,00	\$ 55.733,46	\$ 0,00	0,00%	2,00	\$ 174.533,50	\$ 349.067,00	0,07%	\$ -	0,00%									
3	RODAMIENTOS DE BOLAS	UND	0,00	\$ 345.000,00	\$ 1.380.000,00	\$ 262.200,00	\$ 0,00	0,00%	4,00	\$ 410.550,00	\$ 1.642.200,00	0,31%	\$ -	0,00%									
4	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTOS DE BOLAS	UND	0,00	\$ 146.667,00	\$ 293.334,00	\$ 55.733,46	\$ 0,00	0,00%	2,00	\$ 174.533,50	\$ 349.067,00	0,07%	\$ -	0,00%									
5	RETENEDORES TREN DELANTERO	UND	0,00	\$ 178.667,00	\$ 1.072.002,00	\$ 203.680,38	\$ 0,00	0,00%	6,00	\$ 212.613,67	\$ 1.275.682,00	0,24%	\$ -	0,00%									

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL CANTIDADES Y PRESUPUESTO													
"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."													
CANTIDADES EJECUTADAS													
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CONTRATADAS		ACTIVIDADES EJECUTADAS		VR SIN EJECUTAR		%					
SISTEMA ELÉCTRICO													
1	BATERIA 30H	UND	0,00	\$ 895.333,00	\$ 340.226,54	\$ 0,00	2,00	\$ 1.065.447,00	\$ 2.130.894,00	0,40%	\$ -	0,00%	
2	MANO DE OBRA INSTALACION BATERIA 30H	UND	0,00	\$ 41.667,00	\$ 7.916,73	\$ 0,00	1,00	\$ 49.584,00	\$ 49.584,00	0,01%	\$ -	0,00%	
SISTEMA DE DIRECCIÓN													
1	TERMINALES DE DIRECCIÓN	UND	0,00	\$ 302.333,00	\$ 57.443,27	\$ 0,00	1,00	\$ 359.776,00	\$ 359.776,00	0,07%	\$ -	0,00%	
2	MANO DE OBRA INSTALACION TERMINALES DE DIRECCION	UND	0,00	\$ 133.333,00	\$ 25.333,27	\$ 0,00	1,00	\$ 158.666,00	\$ 158.666,00	0,03%	\$ -	0,00%	
MECANISMO INSTALACIÓN ACCESORIOS													
1	BARRA TERCER PUNTO	UND	0,00	\$ 2.303.333,00	\$ 437.633,27	\$ 0,00	1,00	\$ 2.740.966,00	\$ 2.740.966,00	0,52%	\$ -	0,00%	
2	MANO DE OBRA CAMBIO BARRA DEL TERCER PUNTO	UND	0,00	\$ 126.667,00	\$ 24.066,73	\$ 0,00	1,00	\$ 150.734,00	\$ 150.734,00	0,03%	\$ -	0,00%	
IMPLEMENTOS													
RASTRA DE 20 DISCOS													
1	CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	\$ 250.000,00	\$ 142.500,00	\$ 0,00	3,00	\$ 297.500,00	\$ 892.500,00	0,17%	\$ -	0,00%	
2	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	\$ 95.667,00	\$ 55.100,19	\$ 0,00	3,00	\$ 115.033,67	\$ 345.101,00	0,07%	\$ -	0,00%	
3	DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1-1/8"	UND	0,00	\$ 350.833,00	\$ 333.291,35	\$ 0,00	5,00	\$ 417.491,20	\$ 2.087.456,00	0,40%	\$ -	0,00%	
4	MANO DE OBRA INSTALACION DISCO PARA RASTRA DE 24" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1-1/8"	UND	0,00	\$ 20.667,00	\$ 19.633,65	\$ 0,00	5,00	\$ 24.593,60	\$ 122.969,00	0,02%	\$ -	0,00%	
RASTRA DE 22 DISCOS													
1	CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	\$ 323.333,00	\$ 184.299,81	\$ 0,00	3,00	\$ 384.766,33	\$ 1.154.299,00	0,22%	\$ -	0,00%	
2	MANO DE OBRA INSTALACIÓN CHUMACERA DE FRICCIÓN	UND	0,00	\$ 96.667,00	\$ 18.366,73	\$ 0,00	1,00	\$ 115.034,00	\$ 115.034,00	0,02%	\$ -	0,00%	
3	DISCO PARA RASTRA DE 22" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1-1/8"	UND	0,00	\$ 210.000,00	\$ 199.500,00	\$ 0,00	5,00	\$ 249.500,00	\$ 1.249.500,00	0,24%	\$ -	0,00%	
4	MANO DE OBRA INSTALACION DISCO PARA RASTRA DE 22" DE DIÁMETRO, 6 MM DE ESPESOR, BORDE DENTADO Y AGUJERO CUADRADO DE 1-1/8"	UND	0,00	\$ 20.667,00	\$ 3.926,73	\$ 0,00	1,00	\$ 24.594,00	\$ 24.594,00	0,00%	\$ -	0,00%	
VALOR DEL COSTO TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA													
						\$ 527.917.609,00	100%	TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 399.144.999,00	75,61%	\$ 128.772.610,00	24,39%

ACTIVIDAD 1: ENTREGA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS

Nota: Revisar Anexos: Acta 001 - ACTA DE ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL Y EL CONTRATISTA INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO ISMANT S.A.S con fecha del 18 de Julio del 2025.

Se formaliza la entrega del Banco de Maquinaria Agrícola e implementos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental del Municipio de Aguazul al contratista Ingeniería Suministros & Mantenimiento ISMANT S.A.S., en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 0613 de 2025, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", mediante un acta de entrega, en la que incluye el Listado de Equipos e Implementos de propiedad del municipio de Aguazul con el fin iniciar con el desarrollo de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a que haya lugar descritas en el informe técnico llamado Diagnostico del Banco de Maquinaria del Municipio de Aguazul.

REGISTO FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LA MAQUINARIA



Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

ACTIVIDAD 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

La interventoría mediante oficio de fecha 21 de julio de 2025, solicitó la realización de un comité técnico con el fin de sustentar los cambios significativos identificados y obtener su debida aprobación. Esta solicitud se efectuó en atención a las necesidades y requerimientos derivados del informe de desarme de los tractores presentado por el contratista, garantizando así la correcta evaluación técnica y la toma de decisiones alineadas con los objetivos del contrato.

- Se aprobaron los repuestos y cambios significativos mediante Acta de Comité 003, del día 22 de julio de 2025 para el ingreso 1 a almacén municipal por motivo de Mantenimiento correctivo 1 y preventivo 1.
- Se aprobaron repuestos y elementos para mantenimiento preventivo 2, mediante Acta de comité 004, del 17 de octubre de 2025 para el ingreso a almacén municipal.

Una vez revisados y verificados los elementos, constatando que se encontraban debidamente sellados, rotulados, sin alteración en sus empaques y en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, la interventoría procedió a solicitar el ingreso al Almacén Municipal.

Adicionalmente, se emitió el correspondiente recibo de satisfacción por parte de la interventoría, dejando constancia de la conformidad con el estado y las condiciones de los bienes recibidos.

Nº	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	FECHA
1	SOLICITUD DE COMITÉ TECNICO	SDEA	21-JUL-2025
2	INFORME DE DESMONTE Y DESARME DE EQUIPOS	INTERVENTORIA	
3	ACTA DE COMITÉ APROBACIÓN		22-JUL-2025
4	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	04-AGO-2025
5	ACTA DE COMITÉ APROBACIÓN		17-OCT-2025
7	ACTA DE RECIBO/ENTREGA Y SALIDA DE BIENES	ALMACEN	17-OCT-2025

El objetivo de este servicio es asegurar que los tractores estén óptimas condiciones de funcionamiento, minimizando los tiempos de inactividad y maximizando su productividad en el desarrollo de las actividades agrícolas que se realizaran.

Nota: Una vez se realizan el respectivo mantenimiento correctivo y los mantenimientos preventivos, la interventoría solicitara la entrega de los inservibles (reparaciones correctivas que están orientadas a sustituir por repuestos nuevos, aquello que cumplieron su ciclo y se tornan inservibles) al Almacén Municipal.

Posterior a esta actividad la interventoría se revisó se movilizarán las máquinas al taller, procediendo con los mantenimientos correspondientes cada uno de los cinco (5) tractores y verificando que cada procedimiento que se realizara se llevara a cabo siguiendo

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare



especificaciones técnicas de instalación y utilizando insumos que cumplieran con la calidad mínima contenida en fichas técnicas para cada producto según fuese la marca del parque automotor.

INFORMACIÓN TALLER:

Ubicación del taller: Carrera 16 N 12-54 Barrio el centro del municipio de Aguazul.

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 Am a 5:00 pm.
Sábados de 7:00 Am a 2:00 pm.

Responsable Operativo: Sr EDGAR ROJAS RINCÓN propietario del taller.

Teléfono: 3238055203.

ACTIVIDAD 2.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Para el siguiente ítem la interventoría presenta las actividades relacionadas al mantenimiento correctivo que se realizó a la maquinaria, según los procesos que se llevaron a cabo en el taller de propiedad del contratista, a excepción de las actividades del lavado, para lo cual la interventoría revisó que fueran llevadas a centros especializados que cuentan con las instalaciones necesarias y todos los requerimientos exigidos para dicha operación.

Registro fotográfico de la actividad:



REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare



ACTIVIDAD 2.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INICIAL:

La Interventoría, una vez verificado el correcto ensamble de los repuestos y finalizado el mantenimiento correctivo, procedió a supervisar la ejecución del mantenimiento preventivo inicial requerido para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos.

Una vez verificados todos los parámetros técnicos y mecánicos, la Interventoría autorizó la puesta en operación de los tractores, asegurando que estos cumplieran con las condiciones necesarias para iniciar las labores de preparación y mecanización de suelos en las diferentes unidades productivas.

ACTIVIDAD 3: INSCRIPCIÓN DE USUARIOS

La Interventoría recibió de la secretaria de Desarrollo Económico Y Ambiental, quien inicialmente realizó entrega de sesenta y cinco (65) solicitudes de usuarios que se encuentra requiriendo el servicio de mecanización de terrenos, dichas solicitudes fueron efectuadas por pequeños y medianos productores de distintas veredas del municipio de Aguazul, los solicitantes presentaron la documentación requerida para proseguir con el debido proceso.

Todos los usuarios se ingresaron a una matriz según el orden de radicación de los documentos, posteriormente, se inició con la elaboración de la programación de servicio, esta se realizó respetando el orden de radicado para garantizar la transparencia del servicio de todas las solicitudes allegadas que cumplieran con los requisitos.

Fotocopia de la Cedula

Tenencia del Predio

Registro del cultivo y caracterización del predio.

Por otra parte, la interventoría acompañó al equipo profesional y técnico, realizando visitas a los predios de los usuarios que realizaron solicitud con el fin de constatar la necesidad expuesta en los requerimientos y que cada uno de los predios seas idóneos y cuenten con las condiciones para la mecanización de los terrenos, en estas visitas se verificó que el área a intervención no presentara ni generara impactos ambientales severos o que ésta fuese un área de reserva o hiciera parte de ecosistemas frágiles, comprobándose que los terrenos no presentarían zonas que pudieran ser afectados.

NOTA: Se anexa Actas de seguimiento por parte de la interventoría a los procesos de mecanización realizados durante el periodo de octubre.



ACTIVIDAD 4: MOVILIZACIÓN DE TRACTORES E IMPLEMENTOS DONDE DESEMPEÑARON LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS.

La interventoría verificó y solicitó que una vez consolidada la matriz de usuarios, se entregara por parte del contratista el cronograma de actividades para así llevar control en tiempo de los procesos a desarrollarse, procediéndose así a la movilización de los equipos a cada una de las veredas y predios correspondientes donde se iniciaron las actividades de preparación y mecanización de terrenos, la interventoría verificó que el traslado de los equipos y maquinaria agrícola se efectuara por el personal idóneo para tales fines.

La interventoría verificó el cumplimiento a lo establecido en el decreto **N° 348 de 2015** Por El Cual Se Reglamenta **El Servicio Público De Transporte Terrestre Automotor Especial.**

REGISTRO FLETES GENERADOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO
<p>Transporte de la maquinaria a las zonas asignadas y su retorno en el momento de terminar el servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cinco (5) servicios para llevarlos al sitio donde se realizarán los mantenimientos correctivos y preventivos. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde desempeñarán las actividades de preparación y adecuación de tierras. • Cinco (5) servicios para traslado de maquinaria e implementos adicionales solicitados por los productores o maquinaria que requieren alguna reparación que no se pueda realizar en campo. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde se realizará el mantenimiento preventivo a las 250 horas. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde continuaran desempeñando las actividades de preparación y adecuación de tierras, luego de realizar los mantenimientos preventivos 250 horas. • Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde se realizará el mantenimiento preventivo a las 500 horas • Cinco (5) servicios para llevarlos al sitio donde el supervisor lo indique para el recibo del inventario del Banco Maquinaria. 	Fletes	35	20

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

Cinco (5) servicios para llevarlos al sitio donde se realizaron los mantenimientos correctivos y preventivo inicial



Cinco (5) servicios para llevarlos al lugar donde desempeñaran las actividades de preparación y adecuación de tierras, luego de realizar el mantenimiento preventivo inicial y correctivo.



Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

ACTIVIDAD 5: ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS

La interventoría verificó que el contratista adelantara las actividades cumpliendo con los profesionales y técnicos idóneos para el desarrollo de dichos trabajos, así mismo se verificó que cumplieran con la experiencia necesaria de acuerdo a lo contratado, al igual que los operadores que hacen parte del personal del contratista para la operación de los 5 tractores, que se encuentren debidamente certificados para cumplir con las labores de mecanización de terrenos, corroborando la disponibilidad 100 %, con el fin de dar cumplimiento al objeto del proceso contractual, así como la verificación de entrega de dotación al personal, con el fin de un buen desarrollo de las labores de campo.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE PROFESIONALES EN CAMPO



INFORMACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA ACTIVIDAD

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UND	CANT	PROFESIONAL Y/O TECNICO	TIEMPO CONTRATACIÓN	NOVEDAD
1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
1.1	UN INGENIERO AGRÓNOMO Y/O AGRÍCOLA, Y/O ÁREA AFINES, CON TÍTULO PROFESIONAL CON EXPERIENCIA GENERAL DE 2 AÑOS DE LOS CUALES DEBE DEMOSTRAR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA EN ASISTENCIA TÉCNICA.	Mes	1	ERIKA CARMENZA RAMOS GUARNIZO Ing. Agrónoma	Fecha Inicio: 27 de Julio de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	PRESENTADO Y APROBADO EN LA PROPUESTA PARA LA ACTIVIDAD 1.1.
1.2	TÉCNICOS EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y /O ÁREAS AFINES, CON TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA REQUERIDA Y EXPERIENCIA RELACIONADA SUPERIOR A 4 AÑOS.	Mes	2	MARIA JOHANNA CARVAJAL PEREZ HERBERT ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ	Fecha Inicio: 27 de Julio de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	PRESENTADOS Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA
2. PERSONAL OPERATIVO						
2,1	OPERARIOS DE TRACTOR (5)	Mes	3	-OMAR RODRIGUEZ -MANUEL VARGAS - CARLOS SALAMANCA	Fecha Inicio: 27 de Julio de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	PRESENTADOS Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA
2,1	OPERARIOS DE TRACTOR (5)	Mes	2	- CARLOS MUÑOZ - OSCAR PARRA	Fecha Inicio: 01 de septiembre de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	PRESENTADOS Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INFORMACION DEL CONTRATO	TIEMPO CONTRATADO
1	ERIKA CARMENZA RAMOS GUARNIZO C.C. 40.043.393	PROFESIONAL	Fecha Inicio: 27 de Julio de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
2	MARIA JOHANNA CARVAJAL PEREZ C.C. 40.219.171	TÉCNICO	Fecha Inicio: 27 de Julio de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
3	HERBERT ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ C.C. 74754136	TÉCNICO	Fecha Inicio: 27 de Julio de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
4	OMAR ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES C.C. 1.116.550.610	OPERADOR	Fecha Inicio: 27 de Julio de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
5	MANUEL ALEXANDER VARGAS VELA C.C. 74.754.631	OPERADOR	Fecha Inicio: 27 de Julio de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
6	CARLOS REINEL SALAMANCA DIAZ C.C. 74.795.519	OPERADOR	Fecha Inicio: 27 de Julio de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	Cinco (05) Meses y diez (10) días
7	CARLOS JULIO MUÑOS VEGA C.C. 74.752.408	OPERADOR	Fecha Inicio: 01 de septiembre de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	Tres (03) Meses y veinte seis (26) días
8	OSCAR JULIAN PARRA CACERES C.C. 1.118.552.849	OPERADOR	Fecha Inicio: 01 de septiembre de 2025 Fecha Terminación: 26 de diciembre del 2025	Tres (03) Meses y veinte seis (26) días

9 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

En el marco de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 613-2025, se realizó el seguimiento por parte de la interventoría a las actividades iniciando con el mantenimiento correctivo y preventivo de los tractores, para luego, sobre la fecha del 27 de julio se inició con la preparación y mecanización de tierras y adecuación final de las mismas, actividades cronológicamente relacionadas a continuación:

Tabla No. 1: Actividades a ejecutar en el contrato 0613 del 2025




No. ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	ENTREGA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS
2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
2.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INICIAL
3	INSCRIPCION DE USUARIOS
4	MOVILIZACION DE TRACTORES E IMPLEMENTOS DONDE DESEMPEÑARAN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS
5	ADECUACION Y PREPARACION DE TERRENOS
6	MOVILIZACION DE TRACTORES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 – 500 HORAS





DATOS ESTADISTICOS

DIAGRAMA DE EJECUCION CONTRATO 0613 DE 2025		
PERIODO DE OPERACIÓN	Nº USUARIOS	HA MECANIZADAS
JULIO	10	44
AGOSTO	55	196.5
SEPTIEMBRE	51	230.5
OCTUBRE	56	227
TOTAL, USUARIOS ATENDIDOS	172	698

Usuarios mecanizados por periodo reportado



A continuación, se adjunta matriz de mecanización de predios con días y horas trabajadas.

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PRECIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"																		
ID	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CECILA / INT	VEREDA	NOMBRE DEL PRECIO	CELULAR	CULTIVO A SEMBRAR	GPS COORDENADAS	FECHA DE MECANIZACIÓN		SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANÍA A	DOCUMENTO - TENENCIA TIPO	N° HECTÁREAS MECANIZADAS	Metros Aprox. Laborados	REGISTRO FOTOGRAFICO		
									INICIO	FINALIZÓ						ANTES	DURANTE	DESPUES
1	117	MARIELA MOLANO BARRERA	2427666	LA VICTORIA	PORTALEZA	304846098	MAIZ	N 4.580384 - W 72.231546	1/10/2025	2/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
2	118	OLEGARIO GUTIERREZ	9627782	RINCON DEL BRUJO	SAN RAFAEL	3215487541	MAIZ	N 5.020654 - W 72.262581	1/10/2025	2/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
3	119	RUFERTO CONTRERAS PAEZ	74751169	LA VICTORIA - CERRITO	MATEPALMA	320827972	PLATANO	N 4.854584 - W 72.310245	1/10/2025	2/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
4	120	MARIA TUBIELA ORTIZ RAMIREZ	47433488	RIO CHOJITO	VILLANUEVA	3205989113	ADECUA TERRENOS	N 5.113824 - W 72.539881	1/10/2025	2/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
5	121	LILIANA RODRIGUEZ GARCIA	52114780	LA PRIMAVERA	SAN ANTONIO	3142548033	PASTO	N 5.058824 - W 72.303881	1/10/2025	2/10/2025	SI	SI	SI	2	16			
6	122	YESSI BRANCA CARDENAS SANABRIA	1116544823	TURJUA	VILLA FLOR	3105746289	PASTO	N 5.102885 - W 72.203881	5/10/2025	6/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
7	123	AGUILINO BAUTISTA	4193511	SALITRICO	EL PROGRESO	3214587549	PASTO	N 5.081533 - W 72.342385	5/10/2025	6/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
8	124	MELLYS JOHANNA BELTRAN ROYERO	1125647090	SALITRICO	BUENOS AIRES	3212148384	MAIZ	N 4.688184 - W 72.178342	5/10/2025	6/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
9	125	LUZ MILA AFANGO OSMAN	37179208	ISLA TURBAYISTA	SANTA INES	3114753390	ADECUA TERRENOS	N 5.038842 - W 72.387881	5/10/2025	6/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
10	126	ADRIA CHAPARRO RIVAS	47423117	LA GRACIELA	BUENOS AIRES	3118278461	FORRAJES - PRADEIRAS	N 4.701025 - W 72.351024	5/10/2025	6/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
11	127	RODRIGO ANDRES VEGA SANABRIA	100842084	AGUALINDA	LA BENDICION	3142700390	PASTO	N 5.078881 - W 72.193485	6/10/2025	9/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
12	128	ELMA CONSTANZA JARRO NARANJO	33648677	AGUALINDA	LA BENDICION	3204736661	MAIZ	N 4.850651 - W 72.258615	6/10/2025	9/10/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PRECIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"																	
FHM	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA INT	VEREDA	NOMBRE DEL PUEBLO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR					REGISTRO FOTOGRAFICO					
							CULTIVO A SEMBRAR	COORDENADAS	FECHA DE MECANIZACIÓN	SOLICITUD	CECULA DE CUDOMINI A	DOCUMENTO - TENENCIA TIPO	N° HECTÁREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	ANTES	DURANTE	DESPUES
13	128	DOCELINE GUTIERREZ LOPEZ	74645489	AGUALINDA	LA BENEDICION	3144687792	PASTO	N 5.012397 - W 72.369305	8/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
14	130	EDILMA ALEXANDRA ACERVEDO PERILLA	1116545966	AGUALINDA	LA BENEDICION	3115641785	PASTO	N 5.097358 - W 72.554572	8/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
15	131	ROBINSON MARTIN BERNAL	86084434	BELLAVISTA	EL RUBY	3115333023	MAIZ	N 4.601238 - W 72.300394	8/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
16	132	DEBY CAROLINA MARTINEZ VARGAS	33547117	CHARANENA	LOTE 1	312502471	FORRALES Y PRAJERAS	N 5.016489 - W 72.364553	12/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
17	133	MARIA INES GOMEZ SALAMANCA	24220324	SALTIRICO	LOS DOS POTRILLOS	3167546625	MAIZ	N 5.092566 - W 72.343465	12/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
18	134	EDY JOHANA MARTINEZ SANABRIA	1116545486	AGUALINDA	LA BENEDICION	3122504034	PASTO	N 5.067799 - W 72.364468	12/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
19	135	LEONOR RODRIGUEZ GUARIN	24225630	SALTIRICO	BUENOS AIRES	3144651546	MAIZ	N 5.109758 - W 72.219237	12/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
20	136	YOLMAN RODRIGUEZ	74753258	SAN RAFAEL	ALCARAVAN	3112713234	MAIZ	N 5.019148 - W 72.202169	12/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
21	137	RODOLFO ENRIQUE ROJAS CAMARGO	78959653	AGUALINDA	LA BENEDICION	3142154251	ADICUL TERRENOS	N 5.025448 - W 72.316752	14/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
22	138	IRUBA ESTHELA CONTRERAS	23467448	ISLA TURBAYISTA		3142703032	PASTO	N 5.029575 - W 72.410585	14/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
23	139	ALEXANDRA BECERRA VELAZQUEZ	1116548854	AGUALINDA	LA BENEDICION	3138160269	ADICUL TERRENOS	N 5.112545 - W 72.277159	14/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
24	140	LUGIA SALAMANCA SILVA	46362210	LA TURBIA	LAS GUACAMAYAS	3214581814	PLATANOS MAIZ Y PAPA	N 5.040203 - W 72.319875	14/10/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"																		
ITEM	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	CULTIVO A SEMBRAR	COORDENADAS	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR				N° HECTÁREAS MECANIZADAS	Horas Agro. Laboradas	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
									OPS	FECHA DE MECANIZACIÓN	SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANÍA A			DOCUMENTO - TENENCIA TIPO	ANTES	DURANTE	DESPUES
25	141	JEDUS ENRIQUE MENDOZA GARCIA	72001769	EL GUAMARO	GRANJA VILLA NINA	311784551	FRUTALES	N 5.102548 - W 72.190258	14/10/2025	15/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
26	142	GAMALIEL BURELANO ALTUBER	81107068	RIO CHQUITO	VILLA NUEVA	310021584	PASTO	N 5.018409 - W 72.304653	17/10/2025	18/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
27	143	PAULA XIMENA TRUJILLO VALENZUELA	1115914544	LA TURUA		3002307675	MAIZ	N 5.102548 - W 72.412465	17/10/2025	18/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
28	144	DUMAR NICOLAS BARRIOS CARDENAS	74750324	EL BUBUY	ATENEIA	3204683048	PASTO	N 5.10381 - W 72.418072	17/10/2025	18/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
29	145	ANDERSON MARVIN COLINA ALARCON	1116502286	EL BUBUY	ATENEIA	3160233863	PASTO	N 5.040912 - W 72.223467	17/10/2025	18/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
30	146	JIMMY YCIDO CACEDO CASTRO	1116548736	ALTAMIRA	LA CONCEPCIÓN	3233536801	PRADERAS	N 5.102492 - W 72.330271	17/10/2025	18/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
31	147	EFREN PUERTO URRUTIVE	1118530066	EL BUBUY	ATENEIA	3138600474	PASTO	N 5.110246 - W 72.253791	20/10/2025	21/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
32	148	MARTA CONSUELO VASQUEZ GOMEZ	52270236	EL BUBUY	ATENEIA	3124702282	PASTO	N 5.125593 - W 72.513420	20/10/2025	21/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
33	149	EME JOSE MELO ORTIZ	74755000	EL BUBUY	ATENEIA	3099007862	PASTO	N 5.102083 - W 72.449862	20/10/2025	21/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
34	150	JOSE ELIODORO PEREZ RODRIGUEZ	74752163	RIO CHQUITO	VILLA NUEVA	3228502083	PATILLA	N 5.088548 - W 72.255542	20/10/2025	21/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
35	151	ADRIAN LEONARDO SANTOS ROJAS	74754833	RIO CHQUITO	VILLANUEVA	3106746289	PASTO	N 5.110243 - W 72.249025	20/10/2025	21/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
36	152	BRAYHAM SMITH ROJAS CRUZ	1118503023	RIO CHQUITO	VILLANUEVA	3144572661	ADECUACION DE TERRENCOS	N 4.985468 - W 72.222000	22/10/2025	23/10/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

ITEM	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / IRT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	CULTIVO A SEMBRAR	GPS COORDENADAS	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR				N° HECTÁREAS MECANIZADAS	Mapa Área Laborativa	REGISTRO FOTOGRAFICO		
									FECHA DE MECANIZACIÓN	SOLICITUD	CEDULA DE CIUDADANÍA	DOCUMENTO - TENENCIA			ANTES	DURANTE	DESPUES
									INICIO	FINALIZÓ	A	TIPO					
37	153	MARIA INELDA SANABRIA PEREZ	2427473	RIO CHQUITO	VILLANUEVA	3128629805	ADICUACION DE TERRENOS	N 4.508462 - W 72.259927	22/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
38	154	MARCO ANTONIO MENDOZA FIGUEROA	4.088.407	RIO CHQUITO	VILLANUEVA	3219653281	MAIZ	N 4.559802 - W 72.401085	22/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
39	155	NURIELA MARTINEZ FONSECA	1116546686	RINCON DEL BUBUY	SANTA CECILIA	3215532154	PATILLA	N 5.148526 - W 72.228355	22/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
40	156	RODRIGO MOLANO RODRIGUEZ	8516653	RIO CHQUITO	VILLA NUEVA	3122359699	ADICU TERRENOS	N 4.482861 - W 72.288525	22/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
41	157	LINA KARINA VEDA SANABRIA	1116552423	SAN RAFAEL	EL GUINEAL	3234864664	MAIZ	N 5.108632 - W 72.273386	24/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
42	158	DANIEL GUTIERREZ PENABAZ	74243142	SAN RAFAEL	EL GUINEAL	3502137891	MAIZ	N 5.091872 - W 72.442587	24/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
43	159	LUZ MARINA CONCHA	52174439	EL GUIMARO	BUENOS AIRES	3212360786	PASTO MAZ	N 5.103251 - W 72.251882	24/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
44	160	ROSEFORD ORTIZ HERNANDEZ	9.654.125	PALO SOLO	LOS YOCOS	3125414810	GRASALES	N 4.402851 - W 72.288525	24/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
45	161	LUZ MARIA HERNANDEZ	32635745	EL GUAMARO	EL PARAISO	3164079476	PLATANO	N 4.402851 - W 72.288525	24/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
46	162	ADRIANA RICO VEDA AGUILAR	1116546803	LA GRACIELA	LAS DELICIAS	3104867893	MAIZ	N 5.103251 - W 72.288525	27/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
47	163	LUIS ANTONIO CHAMBERO AVELLA	1.026.674	LA GRACIELA	LAS DELICIAS	3165483489	MAIZ	N 5.103251 - W 72.288525	27/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
48	164	LEONIDAS MONTECARGO CASTAÑEDA	74753089	ALTAMIRA	LA CONCEPCION	3102018411	MAIZ Y PAPA	N 4.508462 - W 72.415249	27/10/2025	SI	SI	SI	5	16			

OBJETO: "REALIZAR FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TERRENOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LOS PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"																		
ITEM	N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA / NIT	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	CELULAR	SOPORTE DOCUMENTAL - UNIDADES PRODUCTIVAS A MECANIZAR						REGISTRO FOTOGRAFICO					
							CULTIVO A SEMBRAR	GPS COORDENADAS	FECHA DE MECANIZACIÓN		SOLICITUD	CEDULA DE CULTIVADOR A	DOCUMENTO - TENENCIA TIPO	N° HECTÁREAS MECANIZADAS	Horas Aprox. Laboradas	ANTES	DURANTE	DESPUES
									INICIO	FINALIZÓ								
49	165	MARLENY RODRIGUEZ JAMENEZ	33647032	LA GRACIELA	LAS DELICIAS	3214647962	MAIZ	N 5.096462 - W 72.451736	27/10/2025	28/10/2025	SI	SI	SI	5	3			
50	166	WALTER JHOVANY CUESTA MONTERO	7082351	ALTAMIRA	LA CONCEPCIÓN	3102541787	MAIZ	N 5.091152 - W 72.380739	27/10/2025	28/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
51	167	LUIS ENRIQUE MOYA SANABRIA	111654417		LAS DELICIAS	3213317983	MAIZ	N 5.102975 - W 72.205502	30/10/2025	31/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
52	168	ANA EDELMIRA GUTIERREZ FIGUEROA	2422796	LA GRACIELA	LAS DELICIAS	3116427619	MAIZ	N 4.402981 - W 72.385525	30/10/2025	31/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
53	169	ELDIER MENDOZA CASTRO	1116543224	LA VICTORIA	LAS FLORES	3173739426	MAIZ	N 4.403928 - W 72.311848	30/10/2025	31/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
54	170	HUGO MAURICIO VALDERRAMA	9533724	LA ESMERALDA	VILLA GLORIA	314424259	PRADERAS	N 5.096416 - W 72.454301	30/10/2025	31/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
55	171	GINNA ALEJANDRA CHACON VASQUEZ	1116553393	LA GRACIELA	LAS DELICIAS	3124986032	MAIZ	N 5.096812 - W 72.455395	30/10/2025	31/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
56	172	WILLIAM ERNESTO VEGA MONTAÑA	1116538225	LA GRACIELA	LAS DELICIAS	310241787	MAIZ - PASTO	N 5.093152 - W 72.380739	30/10/2025	31/10/2025	SI	SI	SI	5	16			
ÁREA TOTAL MECANIZADA OCTUBRE DE 2025											277		893					

6. SEGUIMIENTO POR PARTE DE INTERVENORÍA A LAS ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN DE TIERRAS

Durante el periodo del presente informe comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, se realizaron las siguientes labores por parte de la interventoría como seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato 613-2025, en el cual se han adelantado dentro de sus trabajos, **56 procesos** de mecanización para los siguientes beneficiarios del municipio:

1.

USUARIO: MARIELA MOLANO BARRERA		Fecha: 01/10/2025 – 02/10/2025
Vereda: La Victoria- Predio: Fortaleza		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha		Coordenadas: N 4.598364 - W 72.231546
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARIELA MOLANO BARRERA, ubicado en el predio Fortaleza en la vereda La Victoria del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización es realizada del 01/10/2025 – 02/10/2025, culminando labores.</p>		

2.

USUARIO: OLEGARIO GUTIERREZ		Fecha: 01/10/2025 – 02/10/2025
Vereda: Rincón Del Bubuy- Predio: Casa Linda		Horas: 16 hrs, Aprox
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha.		Coordenadas: N 5,023654 - W 72,262591
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de al señor OLEGARIO GUTIERREZ, ubicado en el predio Casa Linda en la vereda Rincón Del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 01/10/2025 – 02/10/2025, se culminan labores.</p>		

3.

USUARIO: RUPERTO CONTRERAS PAEZ		Fecha: 01/10/2025 – 02/10/2025
Vereda: La Victoria - Predio: Matepalma		Horas: 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Plátano - 5Ha.		Coordenadas: N 4.854564 - W 72.310245
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor RUPERTO CONTRERAS PAEZ, ubicado en el predio Matepalma en la vereda La Victoria del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 01/10/2025 – 02/10/2025, se culminan labores.</p>		

4.

USUARIO: MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ		Fecha: 01/10/2025 – 02/10/2025
Vereda: Rio Chiquito- Predio: Villanueva		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Adecua. Terrenos 5 Ha.		Coordenadas: N 5,113624 - W 72,539681
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div>    </div> <div> <p>Antes</p> <p>Durante</p> <p>Después</p> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno la señora MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ, ubicado en el predio Villanueva en la vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 01/10/2025 – 02/10/2025, se culminan labores.</p>		

5.

USUARIO: LILIANA ROCIO CUBIDES GALINDO		Fecha: 01/10/2025 – 02/10/2025
Vereda: Primavera- Predio: San Antonio		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 2 Ha.		Coordenadas: N 5,055924 - W 72,363891
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el LILIANA ROCIO CUBIDES GALINDO AUDELIS AVELLA CRUZ, ubicado en el predio San Antonio en la vereda Primavera del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 01/10/2025 – 02/10/2025 se culminan labores.</p>		

6.

USUARIO: YEISI BIVIANA CARDENAS SANABRIA		Fecha: 05/10/2025 - 06/10/2025
Vereda: Turúa - Pedio: Villa Flor		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.		Coordenadas: N 5,105985 - W 72,263921
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor YEISI BIVIANA CARDENAS SANABRIA, ubicado en el predio Villa Flor en la vereda Turúa del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 05/10/2025 - 06/10/2025 se culminan labores.</p>		

7.

USUARIO: AQUILINO BAUTISTA		Fecha: 05/10/2025 - 06/10/2025	
Vereda: Salitrico - Predio: El Progreso		Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha		Coordenadas: N 5,091523 - W 72,342385	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras			
			
Antes		Durante	
			
		Después	
Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor AQUILINO BAUTISTA, ubicado en el predio El Progreso en la vereda Salitrico del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.			
Observaciones: Tiempo de mecanización del 05/10/2025 - 06/10/2025, se culminan labores.			

8.

USUARIO: KELLYS JOHANNA BELTRAN ROYERO		Fecha: 05/10/2025 - 06/10/2025
Vereda: Bella Vista - Predio: Bella Vista		Horas: 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha		Coordenadas: N 4.658164 - W 72.179342
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
 <p>Antes</p>	 <p>Durante</p>	 <p>Después</p>
Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor KELLYS JOHANNA BELTRAN ROYERO, ubicado en el predio Bella Vista en la vereda Bella Vista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.		
Observaciones: Tiempo de mecanización del 05/10/2025 - 06/10/2025 se culminan labores.		

9.

USUARIO: LUZ MILA ARANGO OSMAN		Fecha: 05/10/2025 - 06/10/2025
Vereda: Isla Turbayista- Predio: Santa Inés		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Adecua. Terrenos - 5 Ha		Coordenadas: N 5,036947 - W 72,397801
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LUZ MILA ARANGO OSMAN, ubicado en el predio Santa Inés en la vereda Isla Turbayista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 05/10/2025 - 06/10/2025, se culminan labores.</p>		

10.

USUARIO: ADILIA CHAPARRO RIVAS	Fecha: 05/10/2025 - 06/10/2025
Vereda: La Graciela- Predio: Buenos Aires	Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Forrajes - Praderas – 5 Ha.	Coordenadas: N 4.701243 - W 72.351024
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>	
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ADILIA CHAPARRO RIVAS, ubicado en el predio Buenos Aires en la vereda La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>	
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 05/10/2025 - 06/10/2025, se culminan labores.</p>	

11.

USUARIO: RODRIGO ANDRES VEGA SANABRIA		Fecha: 08/10/2025 - 09/10/2025
Vereda: Agualinda - Predio: La Bendición		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.		Coordenadas: LA BENDICION
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor RODRIGO ANDRES VEGA SANABRIA, ubicado en el predio La Bendición en la vereda Agualinda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/10/2025 - 09/10/2025, se culminan labores.</p>		

12.

USUARIO: ELMA CONSTANZA JARRO NARANJO		Fecha: 08/10/2025 - 09/10/2025
Vereda: Agualinda - Predio:		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha.		Coordenadas: N 4,504951 - W 72,259015
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ELMA CONSTANZA JARRO NARANJO, ubicado en la vereda Agualinda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/10/2025 - 09/10/2025, se culminan labores.</p>		

13.

USUARIO: DIOCELINO GUTIERREZ LOPEZ		Fecha: 08/10/2025 - 09/10/2025
Vereda: Agualinda - Predio: La Bendición		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.		Coordenadas: N 5,012397- W 72,399305
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor DIOCELINO GUTIERREZ LOPEZ, ubicado en el predio La Bendición en la vereda Agualinda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/10/2025 - 09/10/2025, se culminan labores.</p>		

14.

USUARIO: EDILMA ALEXANDRA ACEVEDO PERILLA		Fecha: 08/10/2025 - 09/10/2025
Vereda: Agualinda Predio: La Bendición		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.		Coordenadas: N 5,097358 - W 72,554572
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
  		
<p style="text-align: center;">Antes Durante Después</p>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora EDILMA ALEXANDRA ACEVEDO PERILLA, ubicado en el predio La Bendición en la vereda Agualinda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/10/2025 - 09/10/2025, se culminan labores.</p>		

15.

USUARIO: ROBINSON MARTIN BERNAL		Fecha: 08/10/2025 - 09/10/2025
Vereda: Bellavista - Predio: El Ruby		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz- 5 Ha.		Coordenadas: N 4.601239 - W 72.200364
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
  		
<p>Antes Durante Después</p> <p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ROBINSON MARTIN BERNAL, ubicado en el predio El Ruby en la vereda Bellavista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 08/10/2025 - 09/10/2025, se culminan labores.</p>		

16.

USUARIO: DEISY CAROLINA MARTINEZ VARGAS		Fecha: 12/10/2025 - 13/10/2025
Vereda: Atalayas - Pedio:		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Forrajes y Praderas – 5 Ha.		Coordenadas: N 5,016489- W 72,304953
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora DEISY CAROLINA MARTINEZ VARGAS, ubicado en el en la vereda Atalayas del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones Tiempo de mecanización del 12/10/2025 - 13/10/2025, se culminan labores.</p>		

17.

Usuario: MARIA INES GOMEZ SALAMANCA		Fecha: 12/10/2025 - 13/10/2025
Vereda: Salitrico- Predio: La Bendición		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.		Coordenadas: N 5,092568 - W 72,343465
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
  		
<p style="text-align: center;">Antes Durante Después</p> <p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARIA INES GOMEZ SALAMANCA, ubicado en el predio La Bendición en la vereda Salitrico del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
Observaciones: Tiempo de mecanización del 12/10/2025 - 13/10/2025 se culminan labores.		

18.

USUARIO: EDY JOHANA MARTINEZ SANABRIA		Fecha: 12/10/2025 - 13/10/2025
Vereda: Agualinda Predio: La Bendición		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto- 5 Ha.		Coordenadas: N 5,066789 - W 72,364456
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Antes </div> <div style="text-align: center;">  Durante </div> <div style="text-align: center;">  Después </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora EDY JOHANA MARTINEZ SANABRIA, ubicado en el predio La Bendición en la vereda Agualinda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 12/10/2025 - 13/10/2025, y se culminan labores.</p>		

19.

USUARIO: LEONOR RODRIGUEZ GUARIN	Fecha: 12/10/2025 – 13/10/2025
Vereda: Rincon Del Bubuy - Predio: Santa Cecilia	Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha.	Coordenadas: N 5,109738 - W 72,219237
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Antes </div> <div style="text-align: center;">  Durante </div> <div style="text-align: center;">  Después </div> </div>	
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LEONOR RODRIGUEZ GUARIN, ubicado en el predio Santa Cecilia en la vereda Rincon Del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>	
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 12/10/2025 – 13/10/2025 se culminan labores.</p>	

20.

USUARIO: YOLMAN RODRIGUEZ		Fecha: 12/10/2025 – 13/10/2025
Vereda: San Rafael- Predio: Alcaraván		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - 5 Ha		Coordenadas: N 5,012436 - W 72,202159
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div> <p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor YOLMAN RODRIGUEZ, ubicado en el predio Alcaraván en la vereda San Rafael del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p> <p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 12/10/2025 – 13/10/2025 se culminan labores.</p>		


21.

USUARIO: RODOLFO EMIR ROJAS CAMARGO		Fecha: 14/10/2025 - 15/10/2025
Vereda: Agualinda Predio: La Bendición		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Adecu. Terrenos- 5 Ha		Coordenadas: N 5,025489- W 72,319752
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Antes Durante Después </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor RODOLFO EMIR ROJAS CAMARGO, ubicado en el predio La Bendición, vereda Agualinda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/10/2025 - 15/10/2025se culminan labores.</p>		

22.

USUARIO: NUBIA ESTHELA CONTRERAS		Fecha: 14/10/2025 - 15/15/2025
Vereda: Isla Turbayista Predio:		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5 Ha.		Coordenadas: N 5,029875 - W 72,410895
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora NUBIA ESTHELA CONTRERAS, ubicado en la vereda Isla Turbayista del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.		
Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/10/2025 - 15/15/2025, se culminan labores.		

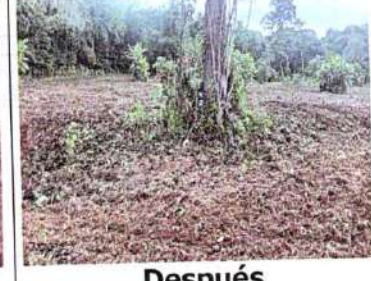23.

USUARIO: ALEJANDRA BECERRA VELASQUEZ		Fecha: 14/10/2025 - 15/10/2025
Vereda: Agualinda Predio: La Bendición		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Adecu. Terrenos- 5 Ha.		Coordenadas: N 5,112045 - W 72,272159
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ALEJANDRA BECERRA VELASQUEZ, ubicado en el predio La Bendición, vereda Agualinda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/10/2025 - 15/10/2025, se culminan labores.</p>		

24.

USUARIO: LIGIA SALAMANCA SILVA	Fecha: 14/10/2025 - 15/10/2025
Vereda: La Turua Predio: LasGuacamayas	Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Plátano, Maíz Y Piña- 5 Ha.	Coordenadas: N 5,040293 - W 72,319875
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	
<div>    </div> <div> <p>Antes Durante Después</p> </div>	
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LIGIA SALAMANCA SILVA, ubicado en el predio Las Guacamayas, vereda La Turua del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>	
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/10/2025 - 15/10/2025 se culminan labores.</p>	

25.

USUARIO: JESUS ENRIQUE MENDOZA GARCIA		Fecha: 14/10/2025 - 15/15/2025
Vereda: El Guáimaro - Predio: Granja Villa Mimi		Horas: 14 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Frutales - 5Ha.		Coordenadas: N 5,102549 - W 72,190256
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div>    </div> <div> Antes Durante Después </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JESUS ENRIQUE MENDOZA GARCIA, ubicado en el predio Granja Villa Mimi, vereda El Guáimaro del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 14/10/2025 - 15/15/2025 se culminan labores.</p>		

26.

USUARIO: GAMALIEL SUPELANO ALTUBER	Fecha: 17/10/2025 - 18/10/2025	
Vereda: Rio Chiquito- Predio: Villa Nueva	Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto - 5Ha	Coordenadas: N 5,016489- W 72,304953	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor GAMALIEL SUPELANO ALTUBER, ubicado en el predio Villa Nueva, vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/10/2025 - 18/10/2025, se culminan labores.</p>		

27.

USUARIO: PAULA XIMENA TRUJILLO VALENCIA	Fecha: 17/10/2025 - 18/10/2025	
Vereda: La Turua - Predio:	Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz — 5 Ha.	Coordenadas: N 5,102549 - W 72,412495	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora PAULA XIMENA TRUJILLO VALENCIA, ubicado en la vereda La Turua del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/10/2025 - 18/10/2025, se culminan labores.</p>		

28.

USUARIO: DUMAR NICOLAS BARRIOS CARDENAS	Fecha: 17/10/2025 - 18/10/2025	
Vereda: El Bubuy - Predio:	Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	Coordenadas: N 5.103891 - W 72.419072	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor DUMAR NICOLAS BARRIOS CARDENAS, ubicado en la vereda El Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/10/2025 - 18/10/2025, se culminan labores.</p>		

29.

USUARIO: ANDERSON MARWIN COLINA ALARCON		Fecha: 17/10/2025 - 18/10/2025
Vereda: El Bubuy Predio: Atenea 2		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.		Coordenadas: N 5,040912 -W 72,223497
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Antes Durante Después </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ANDERSON MARWIN COLINA ALARCON, ubicado en el predio Atenea 2, vereda El Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/10/2025 - 18/10/2025, se culminan labores.</p>		

30.

USUARIO: JIMMY YECID CAICEDO CASTRO		Fecha: 17/10/2025 - 18/10/2025
Vereda: Altamira- Predio: La Concepción		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas – 5 Ha.		Coordenadas: N 5,102492 - W 72,339271
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Antes Durante Después </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora JIMMY YECID CAICEDO CASTRO, ubicado en el predio La Concepción, vereda Altamira del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 17/10/2025 - 18/10/2025, se culminan labores.</p>		

31.

USUARIO: EFREN PUERTO URINTIVE	Fecha: 20/10/2025 - 21/10/2025
Vereda: El Bubuy – Predio:	Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	Coordenadas: N 5,110249 - W 72,253791
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>	
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor EFREN PUERTO URINTIVE, ubicado en la vereda El Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>	
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 20/10/2025 - 21/10/2025, se culminan labores.</p>	

32.

USUARIO: MARTA CONSUELO VASQUEZ GOMEZ		Fecha: 20/10/2025 - 21/10/2025
Vereda: El Bubuy Predio:		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.		Coordenadas: N 5,125593 - W 72,513420
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">Antes</div> <div style="text-align: center;">Durante</div> <div style="text-align: center;">Después</div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora MARTA CONSUELO VASQUEZ GOMEZ, ubicado en la vereda El Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 20/10/2025 - 21/10/2025 se culminan labores.</p>		

33.

USUARIO: EIME JOSE MELO ORTIZ	Fecha: 20/10/2025 - 21/10/2025
Vereda: El Bubuy Predio:	Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	Coordenadas: N 5.102963 - W 72.449682
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Antes Durante Después </div>	
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor EIME JOSE MELO ORTIZ, ubicado la vereda El Bubuy en el municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>	
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 20/10/2025 - 21/10/2025, se culminan labores.</p>	

34.

USUARIO: JOSE ELIODORO PEREZ RODRIGUEZ		Fecha: 20/10/2025 - 21/10/2025
Vereda: Río Chiquito Predio: Villa Nueva		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Patilla— 5 Ha.		Coordenadas: N 5,098546 - W 72,239542
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor JOSE ELIODORO PEREZ RODRIGUEZ, ubicado en el predio Villa Nueva, vereda Río Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 20/10/2025 - 21/10/2025, se culminan labores.</p>		

35.

USUARIO: ADRIAN LEONARDO SANTOS ROJAS	Fecha: 20/10/2025 - 21/10/2025	
Vereda: Rio Chiquito Predio: Villanueva	Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto – 5 Ha.	Coordenadas: N 5,119243 - W 72,249025	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ADRIAN LEONARDO SANTOS ROJAS, ubicado en el predio Villanueva, vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 20/10/2025 - 21/10/2025, se culminan labores.</p>		

36.

USUARIO: BRAYHAM SMITH ROJAS CRUZ		Fecha: 22/10/2025 - 23/10/2025
Vereda: Rio Chiquito Predio: Villanueva		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Adecuación De Terrenos – 5 Ha.		Coordenadas: N 4.582468 - W 72.222930
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div> <p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor BRAYHAM SMITH ROJAS CRUZ, ubicado en el predio Villanueva, vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p> <p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 22/10/2025 - 23/10/2025, se culminan labores.</p>		

37.

USUARIO: MARIA ISNELDA SANABRIA PEREZ	Fecha: 22/10/2025 - 23/10/2025	
Vereda: Rio Chiquito Predio: Villanueva	Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Adecuación De Terrenos — 5 Ha.	Coordenadas: N 5,098462 - W 72,250927	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor MARIA ISNELDA SANABRIA PEREZ , ubicado en el predio Villanueva, vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.		
Observaciones: Tiempo de mecanización del 22/10/2025 - 23/10/2025, se culminan labores.		


38.

USUARIO: MARCO ANTONIO MENDOZA FIGUEREDO	Fecha: 22/10/2025 - 23/10/2025	
Vereda: Rio Chiquito Predio: Villanueva	Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.	Coordenadas: N 4.958602 - W 72.401065	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor MARCO ANTONIO MENDOZA FIGUEREDO, ubicado en el predio Villanueva, vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 22/10/2025 - 23/10/2025, se culminan labores.</p>		

39..

USUARIO: NURELBA MARTINEZ FONSECA		Fecha: 22/10/2025 - 23/10/2025
Vereda: San Jose Del Bubuy Predio: Santa Cecilia		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Patilla – 5 Ha.		Coordenadas: N 5,049526 - W 72,220935
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
ANTES	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora NURELBA MARTINEZ FONSECA, ubicado en el predio Santa Cecilia, vereda San Jose Del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 22/10/2025 - 23/10/2025, se culminan labores.</p>		

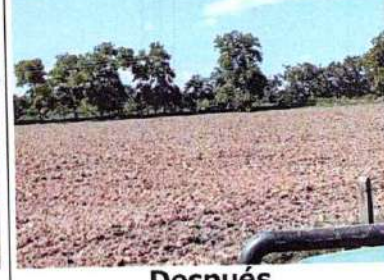40.

USUARIO: RODRIGO MOLANO RODRIGUEZ		Fecha: 22/10/2025 - 23/10/2025
Vereda: Rio Chiquito Predio: Villanueva		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Adecu. Terrenos – 5 Ha.		Coordenadas: N 4.402961 - W 72.286525
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
ANTES	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora RODRIGO MOLANO RODRIGUEZ, ubicado en el predio Villanueva, vereda Rio Chiquito del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 22/10/2025 - 23/10/2025, se culminan labores.</p>		

41.

USUARIO: LINA KARINA VEGA SANABRIA		Fecha: 24/10/2025 - 25/10/2025
Vereda: Turúa - Predio: Villa Flor		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz- 5 Ha.		Coordenadas: N 5,109852 - W 72,273396
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
  		
<p style="text-align: center;">Antes Durante Después</p>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LINA KARINA VEGA SANABRIA, ubicado en el predio Villa Flor, vereda Turúa del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 24/10/2025 - 25/10/2025, se culminan labores.</p>		

42.

USUARIO: DANIEL GUTIERREZ PENAGOS	Fecha: 24/10/2025 - 25/10/2025	
Vereda: Turúa - Predio: Las Brisas	Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz — 5 Ha.	Coordenadas: N 5.091572 - W 72.442587	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor DANIEL GUTIERREZ PENAGOS, ubicado en el predio Las Brisas, vereda Turúa del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.		
Observaciones: Tiempo de mecanización del 24/10/2025 - 25/10/2025, se culminan labores.		

43.

USUARIO: LUZ MARINA CONDIA		Fecha: 24/10/2025 - 25/10/2025
Vereda: El Guaimaro Predio: Buenos Aires		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Pasto-Maíz— 5 Ha.		Coordenadas: N 5,103821 - W 72,251092
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LUZ MARINA CONDIA, ubicado en el predio Buenos Aires, vereda El Guaimaro del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 24/10/2025 - 25/10/2025, se culminan labores.</p>		

44.

USUARIO: ROSENDO ORTIZ HERNANDEZ		Fecha: 24/10/2025 - 25/10/2025
Vereda: Palo Solo Predio: Los Yopos		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Girasoles – 5 Ha.		Coordenadas: N 4.402961 - W 72.286525
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ROSENDO ORTIZ HERNANDEZ, ubicado en el predio Los Yopos, vereda Palo Solo del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 24/10/2025 - 25/10/2025, se culminan labores.</p>		

45.

USUARIO: LUZ MARÍA HERNANDEZ		Fecha: 24/10/2025 - 25/10/2025
Vereda: El Guaimaro	Predio: El Paraiso	Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Platano – 5 Ha.		Coordenadas: N 4.402961 - W 72.286525
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Antes </div> <div style="text-align: center;">  Durante </div> <div style="text-align: center;">  Después </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora LUZ MARÍA HERNANDEZ, ubicado en el predio El Paraiso, vereda El Guaimaro del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 24/10/2025 - 25/10/2025, se culminan labores.</p>		

46.

USUARIO: ADRIANA ROCIO VEGA AGUILAR		Fecha: 27/10/2025 - 28/10/2025
Vereda: La Graciela- Predio: Las Delicias		Horas: 4 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5Ha.		Coordenadas: N 5,102549 - W 72,190256
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno de la señora ADRIANA ROCIO VEGA AGUILAR, ubicado en el predio Las Delicias , vereda La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 27/10/2025 - 28/10/2025, se culminan labores.</p>		

47.

USUARIO: LUIS ANTONIO CHAPARRO AVELLA		Fecha: 27/10/2025 - 28/10/2025
Vereda: La Graciela Predio: Las Delicias		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz — 5 Ha.		Coordenadas: N 5,120095 - W 72,274083
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LUIS ANTONIO CHAPARRO AVELLA, ubicado en el predio Las Delicias, La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó la prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.		
Observaciones: Tiempo de mecanización del 27/10/2025 - 28/10/2025, se culminan labores.		

48.

USUARIO: LEONIDAS MONTENEGRO CASTAÑEDA	Fecha: 27/10/2025 - 28/10/2025	
Vereda: Altamira- Predio: La Concepción	Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz Y Piña – 5 Ha	Coordenadas: N 4.946281 - W 72.410249	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LEONIDAS MONTENEGRO CASTAÑEDA, ubicado en el predio La Concepción, vereda Altamira del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.		
Observaciones: Tiempo de mecanización del 27/10/2025 - 28/10/2025, se culminan labores.		


49.

USUARIO: MARLENY RODRIGUEZ JIMENEZ		Fecha: 27/10/2025 - 28/10/2025
Vereda: La Graciela Predio: Las Delicias		Horas: 03 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.		Coordenadas: N 5.068462 - W 72.451739
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Antes Durante Después </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LILIA CRUZ DE MOLANO, ubicado en el predio Las Delicias, vereda La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 27/10/2025 - 28/10/2025, se culminan labores.</p>		

50.

USUARIO: WALTER JHIOVANY CUESTA MONTENEGRO		Fecha: 28/09/2025 - 29/09/2025
Vereda: Altamira - Predio: La Concepción		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.		Coordenadas: N 5.003152 - W 72.280139
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
  		
<p style="text-align: center;">Antes Durante Después</p>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor WALTER JHIOVANY CUESTA MONTENEGRO, ubicado en el predio La Concepción, vereda Altamira del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 27/10/2025 - 28/10/2025, se culminan labores.</p>		

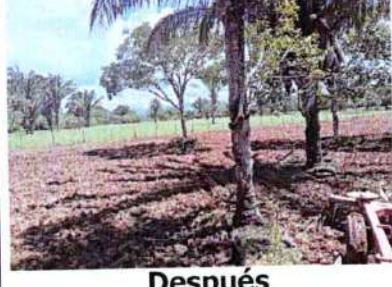51.

USUARIO: LUIS ENRIQUE MOYA SANABRIA		Fecha: 30/10/2025 - 31/10/2025
Vereda: La Graciela- Predio: Las Delicias		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.		Coordenadas: N 5,105975 - W 72,269582
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor LUIS ENRIQUE MOYA SANABRIA, ubicado en el predio Las Delicias, vereda La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 30/10/2025 - 31/10/2025, se culminan labores.</p>		

52.

USUARIO: ANA EDELMIRA GUTIERREZ FIGUEREDO		Fecha: 30/10/2025 - 31/10/2025
Vereda: La Graciela- Predio: Las Delicias		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.		Coordenadas: N 4.402961 - W 72.286525
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div>		
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ANA EDELMIRA GUTIERREZ FIGUEREDO, ubicado en el predio Las Delicias, vereda La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 30/10/2025 - 31/10/2025, se culminan labores.</p>		

53.

USUARIO: ELDHER MENDOZA CASTRO		Fecha: 30/10/2025 - 31/10/2025
Vereda: La Victoria - Predio: Las Flores		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.		Coordenadas: N 4.853658 - W 72.311648
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
  		
<p>Antes Durante Después</p> <p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor ELDHER MENDOZA CASTRO, ubicado en el predio Las Flores, vereda La Victoria del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p> <p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 30/10/2025 - 31/10/2025, se culminan labores.</p>		

54.

USUARIO: HUGO MAURICIO VALDERRAMA		Fecha: 30/10/2025 - 31/10/2025
Vereda: La Esmeralda - Predio: Villa Gloria		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Praderas – 5 Ha.		Coordenadas: N 5.084145 - W 72.454301
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Después</p> </div> </div> <p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor HUGO MAURICIO VALDERRAMA, ubicado en el predio Villa Gloria, vereda La Esmeralda del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p> <p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 30/10/2025 - 31/10/2025, se culminan labores.</p>		

55.

USUARIO: GINNA ALEJANDRA CHACON VASQUEZ		Fecha: 30/10/2025 - 31/10/2025
Vereda: La Graciela- Predio: Las Delicias		Horas: 16 hrs Aprox.
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz – 5 Ha.		Coordenadas: N 5.086812 - W 72.455395
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
  		
Antes		Durante
Después		
Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor GINNA ALEJANDRA CHACON VASQUEZ, ubicado en el predio Las Delicias, vereda La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.		
Observaciones: Tiempo de mecanización del 30/10/2025 - 31/10/2025, se culminan labores.		

56.

USUARIO: WUILLAM ERNESTO VEGA MONTAÑA	Fecha: 30/10/2025 - 31/10/2025	
Vereda: La Graciela - Predio: Las Delicias	Horas: 16 hrs Aprox.	
Tipo de Cultivo y Cant.: Maíz - Pasto – 5 Ha.	Coordenadas: N 5.003152 - W 72.280139	
Objetivo: Seguimiento al proceso de Mecanización de tierras		
		
Antes	Durante	Después
<p>Desarrollo: Se realiza visita de seguimiento y verificación durante todo el proceso a la práctica de mecanización al terreno del señor WUILLAM ERNESTO VEGA MONTAÑA, ubicado en el predio Las Delicias, vereda La Graciela del municipio de Aguazul Casanare, se verifica por parte de la interventoría que el personal contratista realizó las prácticas correspondientes a las actividades contratadas, al finalizar las labores se le indica al usuario sobre la culminación de las mismas y se recogen evidencias por parte del contratista y la interventoría como soporte de los trabajos realizados a satisfacción.</p>		
<p>Observaciones: Tiempo de mecanización del 30/10/2025 - 31/10/2025, se culminan labores.</p>		



CONCLUSIONES

- A corte del 31 de octubre del 2025 en el presente informe, se ostenta un avance financiero del proyecto por un valor de **\$ 399.144.999,00** correspondiente al **75,61%** y un acumulado por ejecutar de \$ 128.772.610,00 que equivale al 24,39% del valor total del contrato; cabe resaltar que del valor total de la bolsa agotable es decir de los \$280.000.000.00 se han utilizado \$232.630.920,00 para el MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, dejando un saldo por utilizar de \$ 47.369.080,00.
- Las pólizas que aseguran el contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025, se encuentran vigentes desde la fecha de acta de inicio, hasta el corte del presente informe.
- Durante el periodo del presente informe, se realizó la mecanización de predios de los diferentes usuarios que se encuentran en la base de datos por mecanizar; los trabajos de preparación de terreno se están haciendo con las 5 máquinas y sus respectivos implementos, para éste mes se reportado se presentaron únicamente mantenimientos de tipo preventivo dando cumplimiento a los mantenimientos correspondientes a las **250 horas** de uso, adicional a otros detalles presentados que fueron solucionados sin necesidad de movilizar los equipos.
- El presente documento contiene las actividades según contrato de prestación servicios, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, para su debida revisión y verificación por parte de interventoría contratada.

Atentamente,

Alexander Duarte S.

ALEXANDER DUARTE SIERRA

C.C 1.116.868.212 de Tame

Cto. de Interventoría No. 574 de 2025

Carrera 8 No. 14-34

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Aguazul - Casanare

ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO 2

REGISTRO SOPORTE MANTENIMIENTO 2

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO N° 613-2025 (250Hrs)

4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO							PLACA			TOTAL
	4.1 TRACTORES JOHN DEERE LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787							8789	8788	8787	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	V/R Unit antes de IVA	V/R total	IVA	V/R TOTAL				
4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	3	\$ 73.667,00	\$ 221.001,00	\$ 41.990,19	\$ 262.991,00	1	1	1	3
4.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	3	\$ 407.667,00	\$ 1.223.001,00	\$ 232.370,19	\$ 1.455.371,00	1	1	1	3
4.1.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	3	\$ 353.333,00	\$ 1.059.999,00	\$ 201.399,81	\$ 1.261.399,00	1	1	1	3
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	3	\$ 109.333,00	\$ 327.999,00	\$ 62.319,81	\$ 390.319,00	1	1	1	3
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	3	\$ 75.000,00	\$ 225.000,00	\$ 42.750,00	\$ 267.750,00	1	1	1	3
4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	3	\$ 270.000,00	\$ 810.000,00	\$ 153.900,00	\$ 963.900,00	1	1	1	3
4.1.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	15	\$ 244.000,00	\$ 3.660.000,00		\$ 3.660.000,00	5	5	5	15
								13883	13882		
4.2	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883										
4.2.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	2	\$ 81.000,00	\$ 162.000,00	\$ 30.780,00	\$ 192.780,00	1	1		2
4.2.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	2	\$ 420.667,00	\$ 841.334,00	\$ 159.853,46	\$ 1.001.187,00	1	1		2
4.2.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	2	\$ 378.333,00	\$ 756.666,00	\$ 143.766,54	\$ 900.433,00	1	1		2
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	2	\$ 109.333,00	\$ 218.666,00	\$ 41.546,54	\$ 260.213,00	1	1		2
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	2	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00	1	1		2
4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	UND	2	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00	1	1		2
4.2.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	15	\$ 244.000,00	\$ 3.660.000,00		\$ 3.660.000,00	7,5	7,5		15

DOPORTE FOTOGRÁFICO

4.1 TRACTORES JOHN DEERE LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787

4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR		
4.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO		
4.1.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO		

4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE		
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)		
4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO		
4.1.13	ACEITE MOTOR 15W40		

4.2		TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883	
4.2.1	FILTRO ACEITE MOTOR		
4.2.3	FILTRO PRIMARIO AIRE		
4.2.5	FILTRO SECUNDARIO AIRE		
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE		
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)		

4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO		
4.2.13	ACEITE MOTOR 15W40	 	

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO 574-2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116668212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 N 28 110	YOPAL-CASANARE	6393149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión 2025-10	9493400104	I	2025/11/06	2025/12/30	\$427,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tda	tae	tdp	tap	vep	cor	vet	sin	lge	lma	vac	avp	vet	lti	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
1	CC 1116668212	DUARTE SIERRA ALEXANDER																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	0	50	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	50	\$0	\$413,300
Total		Afiliados(1)																															\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 1116668212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 N 28 11D	YOPAL-CASANARE	6393149	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor		
2025-10	2025-10	2047643861	9493400104	I		2025/11/06	2025/12/30	BANCOLOMBIA	\$427,500		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$227,800	\$7,800	\$0	\$235,600
PORVENIR				230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$7,800	\$0	\$235,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$7,500	\$300	\$0	\$7,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS				14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$300	\$0	\$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$178,000	\$6,100	\$0	\$184,100
NUEVA E. P. S.				EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$6,100	\$0	\$184,100
TOTAL							1	\$413,300	\$14,200	\$0	\$427,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATACION	Carrera 8 N 14 34	AGUAZUL-CASANARE	313489057	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9495371768	9495371768	E	2025/11/06	2025/12/26	BANCO DE BOGOTA	50	\$1,132,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: CONTRATACION (2 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: CTO 574 (2 Afiliados)																								
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																								
1	CC 1116544552	AVILA WILSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300			
2	CC 1006443435	HUERTAS WILMER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS025	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300			
Total Afiliados(2)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$356,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$2,847,000	\$142,600			

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116868212		DUARTE SIERRA ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATACION	Carrera 8 N 14 34	AGUAZUL - CASANARE	3134489057	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-10	2025-11	9495371768	9495371768			2025/11/06	2025/12/26	BANCO DE BOGOTA	50

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$455,600	\$14,400	\$0	\$470,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600	\$14,400	\$0	\$470,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$29,800	\$1,000	\$0	\$30,800
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	2	\$29,800	\$1,000	\$0	\$30,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$114,000	\$3,600	\$0	\$117,600
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$114,000	\$3,600	\$0	\$117,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$356,000	\$11,200	\$0	\$367,200
CAPRESCOA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$178,000	\$5,600	\$0	\$183,600
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$5,600	\$0	\$183,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$85,600	\$2,700	\$0	\$88,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$85,600	\$2,700	\$0	\$88,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$57,000	\$1,800	\$0	\$58,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$57,000	\$1,800	\$0	\$58,800
TOTAL				2	\$1,098,000	\$34,700	\$0	\$1,132,700

PLANILLA NÓMINAS CONTRATO 574-2025

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 111668212-2

1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 30
DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA (Proceso de Selección Concurso de Méritos Abiertos No. MA-CMA-SDEA-003-2025) N° 0574 DE 2025-07-01

CONTRATO DE CONSULTORIA (Proceso de Selección Concurso de Méritos Abiertos No. 0074 DE 2023) N. 0074 DE 2023-01-07																	
Identificación	Nombre del empleado	DETALLE										RECIBI CONFORME					
		Salario Base Mensual	Días Trabajados	SALARIO	DETALLE				Base seguridad social	Salud	Pensión	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Retención en la		Total deducciones	NETO PAGADO	
					Subsidio de Transporte	Horas Extras y Recargas	Recargo Nocturno	Otras Ingresos Constituyentes de Salario					Otras Deducciones	A partir de 10/7/14			
1,110,544,552	WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	\$ 1,138,800.00	30	\$ 1,138,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,423,500.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 114,000.00	\$ 1,024,800.00	
1,006,443,435	WILMER ANDRES HUERTAS ALFONSO	\$ 427,050.00	30	\$ 427,050.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,423,500.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 114,000.00	\$ 313,050.00	
TOTAL		\$ 1,565,850.00		\$ 1,565,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,847,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 228,000.00	\$ 1,337,850.00	

Responsable Nomina

SEGURIDAD SOCIAL (APORTES EMPRESA)		VALOR
\$ 2,847,000.00		
SALUD	8.5%	242,000.00
PENSION	12%	341,600.00
RIESGOS PROFESIONALES	1.044%	29,800.00

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		VALOR
\$ 1,565,850.00		
CESANTIAS	8.33%	130,500.00
INT /CESANT	1%	15,700.00
PRIMA	8.33%	130,500.00
VACACIONES	4.17%	65,300.00

APORTES PARAFISCALES		VALOR
\$ 2,847,000.00		
SENA	2%	57,000.00
ICBF	3%	85,600.00
CAJA COMPENSACION	4%	114,000.00

Comprobante de Nómina

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212

Período de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/30**
Comprobante Número: **7**

Nombre: **WILSON JAVIER AVILA ZAMORA**
Identificación: **1116544552**
Cargo: **Ingeniero Agronomo**
Salario básico: **\$1,138,800.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,138,800.00	Fondo de salud	0.0	\$ 57,000.00
			Fondo de pensión	0.0	\$ 57,000.00
Total Ingresos		\$ 1,138,800.00	Total Deducciones		\$ 114,000.00
NETO A PAGAR					\$ 1,024,800.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212
CARRERA 8 N 14 34
Tel: 3134489057
Aguazul - Colombia
ingeniero.a.d@gmail.com



Periodo de Pago: **20251001 - 20251030**
Comprobante Número: **7**
Fecha y hora de generación: **04/11/2025 - 04:28 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/11/2025 - 04:30 PM**

Empleado: **WILSON JAVIER AVILA ZAMORA**
Ciudad: **Aguazul**
Identificación: **1116544552**
Cargo: **Ingeniero Agronomo**
Salario básico: **\$1.138.800**

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.138.800
Provisión de Cesantías*				0	\$ 94.900
Provisión de Intereses de cesantías*				0	\$ 11.400
Provisión de Prima*				0	\$ 94.900
Provisión de Vacaciones*				0	\$ 47.500
Total Ingresos					\$ 1.138.800

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4,0	\$ 57.000
Fondo de pensión	4,0	\$ 57.000
Total Deducciones		\$ 114.000

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.024.800

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 1.024.800

Soporte de pago: DNE7
CUNE:
4daba88b64ce040553511a886bff6a674122a43cb086b327c6ba5c9ec4b59cc7e18f956f754061c86d11a02c8448a6ae

Comprobante de Nómina

ALEXANDER DUARTE SIERRA
Nit 1116868212

Periodo de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/30**

Comprobante Número: **8**

Nombre: **WILMER ANDRES HUERTAS ALFONSO**

Identificación: **1006443435**

Cargo: **Técnico**

Salario básico: **\$427,050.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 427,050.00	Fondo de salud	0.0	\$ 57,000.00
			Fondo de pensión	0.0	\$ 57,000.00
Total Ingresos		\$ 427,050.00	Total Deducciones		\$ 114,000.00
NETO A PAGAR					\$ 313,050.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT 1116868212
CARRERA 8 N 14 34
Tel: 3134489057
Aguazul - Colombia
ingeniero.a.d@gmail.com



Periodo de Pago: **20251001 - 20251030**
Comprobante Número: **8**
Fecha y hora de generación: **04/11/2025 - 04:28 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/11/2025 - 04:31 PM**

Empleado: **WILMER ANDRES HUERTAS ALFONSO**
Ciudad: **Aguazul**
Identificación: **1006443435**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **\$427.050**

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 427.050
Provisión de Cesantías*				0	\$ 35.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	\$ 4.300
Provisión de Prima*				0	\$ 35.600
Provisión de Vacaciones*				0	\$ 17.800
Total Ingresos					\$ 427.050

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.0	\$ 57.000
Fondo de pensión	4.0	\$ 57.000
Total Deducciones		\$ 114.000

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 313.050

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 313.050

Soporte de pago: DNE8

CUNE:

0eafa9e18477794984180007f8448ecd323c620828b228ca0ffca0257b7e57d195075c5a68e1746651520392112256da

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 9B No. 40-19

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Yopal - Casanare



Aguazul, 01 de octubre de 2025

Señor:

R/L EDGAR ROJAS RINCÓN

ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega – Matriz de solicitud de usuarios de mecanización quincenal Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de solicitar la Matriz quincenal correspondiente al listado de beneficiarios a programar para las actividades de mecanización en los primeros (15) quince días del mes de octubre, con el cual se busca dar seguimientos a los procesos y al desarrollo de las actividades que hacen parte del contratado N°0613, con pro de dar cumplimiento al objeto contractual, el cual hace referencia al seguimiento y control de las actividades administrativas, técnicas, contables, financieras de orden legal y ambiental del contrato N° 0613 de 2025, cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Recibido
[Firma]
01-10-2025
9:45 AM



Aguazul, 12 de octubre de 2025

Señor:

R/L EDGAR ROJAS RINCÓN

ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S

Bdo
12-oct-2025
3:30PM

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega – 2da Matriz de usuarios de mecanización quincenal Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de solicitar la 2da Matriz quincenal correspondiente al listado de beneficiarios a programar para las actividades de mecanización en la segunda quincena del mes de octubre, con el cual se busca dar seguimientos a los procesos y al desarrollo de las actividades que hacen parte del contratado N°0613, con pro de dar cumplimiento al objeto contractual, el cual hace referencia al seguimiento y control de las actividades administrativas, técnicas, contables, financieras de orden legal y ambiental del contrato N° 0613 de 2025, cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUERTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare



ALCALDIA DE AGUAZUL
SEC. DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL

17 OCT 2025

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 10:02
RADICADO N°: *[Signature]* FOLIOS: *[Signature]*



ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

Aguazul, 17 de octubre de 2025

Ingeniero:

JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ

secretario de Desarrollo económico y ambiental

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Convocatoria a Comité, Entrega de elementos e insumos de maquinaria agrícola, 2do Mantenimiento preventivo (250 Hrs) Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a ustedes con el fin de convocar a comité para realizar la entrega de los insumos y elementos resultantes del segundo mantenimiento preventivo realizado a los vehículos pertenecientes al banco de maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio de Aguazul, toda vez que se dio cumplimiento a las 250 Hrs trabajadas, con las cuales hacen necesario el segundo mantenimiento requerido por parte del contrato N° 613 de 2025, el cual tiene por Objeto "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

TRACTORE JOHN DEERE - LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787
TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2


Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare

Aguazul, 17 de octubre de 2025

Señores:

ALMACEN MUNICIPAL

Aguazul Casanare



Consultoría de Asesoría
ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega de elementos e insumos de maquinaria agrícola Contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente con el fin de realizar la entrega de los siguientes insumos y elementos resultantes del segundo mantenimiento preventivo realizado a los siguientes vehículos pertenecientes al banco de maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio de Aguazul, los cuales hacen parte del contrato N° 613 de 2025 el cual tiene por Objeto "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

TRACTORE JOHN DEERE - LINEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787

TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19
Cel.: 3134489057
Ingeniero.a.d@gmail.com
Yopal - Casanare



ALEXANDER DUARTE-SERRA

NIT-1116.868.212-2

Aguazul, 23 de octubre de 2025



23 OCT 2025

Ingeniero:

JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZsecretario de Desarrollo Económico y Ambiental
La Ciudad.

RECIBIDO POR:

HORA:

RADICADO N°:

FOLIOS:



Referencia: Contrato de Interventoría No 574 de 2025 con objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Referencia: Contrato de obra No 0613 de 2025 con objeto "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

Asunto: Radicación de Informe 1 y 2 correspondiente al contrato No. 574 de 2025 y contrato 0613 de 2025.

Cordial Saludo,

Por medio del presente hago entrega de los Informes mensuales N° 1 y 2 correspondientes a los contratos de interventoría No. 574 de 2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"; y contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025 "FORTALECIMIENTO DE

Carrera 9B No. 40-19

Cel.: 3134489057

Ingeniero.a.d@gmail.com

Yopal - Casanare



NIT: 1.116.868.212-2

LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL que comprenden el periodo del 17 de julio al 31 de agosto de 2025.

Sin otro en particular

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Anexo 1: Dos (02) carpetas cuatro solapas mes de julio Informe de contrato de prestación de servicios, folios del 1 al 428.
Una (01) carpeta cuatro solapas mes de julio Informe de interventoría, folios del 429 al 582.

Anexo 2: Dos (02) carpetas cuatro solapas mes de Agosto Informe de contrato de prestación de servicios, folios del 1 al 616.
Una (01) carpeta cuatro solapas mes de Agosto Informe de interventoría, folios del 617 al 785.



ALCALDIA DE AGUAZUL
 SEC. DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL

ALEXANDER DUARTE SIERRA
 1-116-868-212-2

Aguazul, 23 de octubre de 2025

23 OCT 2025

Ingeniero:

JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ

secretario de Desarrollo Económico y Ambiental
 La Ciudad.

RECIBIDO POR:

HORA:

RADICADO N°:

FOLIOS:

Referencia: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025 con objeto "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

Asunto: Radicación de documento acta parcial No. 1 del contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de los documentos que soportan el acta parcial No. 1 del contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL" correspondiente al periodo de ejecución del 17 de Julio al 31 de Agosto de 2025, previa revisión y aprobación de la presente firma interventora, lo anterior para fines pertinentes.

Sin otro en particular

Alexander Duarte Sierra

ALEXANDER DUARTE SIERRA

NIT: 1.116.868.212-2

Anexo: Cinco (05) carpetas cuatro solapas, con 1200 folios.

Carrera 9B No. 40-19

Cel.: 3134489057

ingeniero.a.d@gmail.com

Yopal - Casanare



Aguazul, 27 de octubre de 2025

Señor:

R/L EDGAR ROJAS RINCÓN

ISMANT INGENIERIA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS S.A.S

Edgar Rojas Rincón
27-10-2025
3:44 PM

REF: Contrato de Consultoría No 574 de 2025 con objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".**

ASUNTO: Entrega – Informe 3 correspondiente al mes de septiembre, contrato N° 0613 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de solicitar la entrega del Informe N°3 correspondiente al avance del mes de septiembre, teniendo en cuenta que ya se cumplieron los tiempos de ejecución y como interventoría se requiere hacer la verificación en pro de dar cumplimiento al objeto contractual, el cual hace referencia al seguimiento y control de las actividades administrativas, técnicas, contables, financieras de orden legal y ambiental del contrato N° 0613 de 2025, cuyo Objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

Sin otro en particular y agradeciendo la atención prestada,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

Carrera 9B No. 40-19

Cel.: 3134489057

ingeniero.a.d@gmail.com

Yopal - Casanare

CORRESPONDENCIA RECIBIDA



ISMANT S.A.S

NIT: 901673633-8

Cra.16 No. 12-54 barrio el Centro

ismantmsas@gmail.com

Cel 3238055203

Aguazul - Casanare

Aguazul 01 de octubre de 2025

CPS-0613-2025 | 011A

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

Amo. 01 oct.
[Handwritten signature]

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: Entrega de matriz de solicitud de usuarios quincenal N° 6.

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el ingeniero Edgar Rojas Rincon, identificado con cedula de ciudadanía No-1.026.552.430 de Bogotá DC, por medio de la presente, me permito hacer entrega de la matriz de solicitudes de los usuarios quincenal para su respectiva revisión y poder dar cumplimiento del objeto contractual del presente contrato de prestación de servicios.

Se anexa:

Matriz de solicitudes. (____ folios)

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

[Handwritten signature of Edgar Rojas Rincon]

EDGAR ROJAS RINCON

R/L Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

MATRIZ DE SOLICITUDES DE MECANIZACION

ITEM	NOMBRE DEL USUARIO	NUMERO DE CEDULA	CELULAR	DIRECCION	VEREDA / BARRIO	TERRAZA A MECANIZAR (HA)	UTILIDAD
213	MARIA ADELIS AVELLA CRUZ	46377915	304846806	LA ESPERANZA	BELLAVISTA	5	PASTO
214	JOHN FREDY HIDALGO SANABRIA	1110547988	314843867	VILLA FLOR	TESORO DEL BUBUY	5	MAIZ
215	RUPERTO CONTRERAS PAEZ	74751189	3208527972	MATEPALMA	LA VICTORIA	5	PLATANO
216	MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ	47433488	3208599113	VILLANUEVA	RIO CHQUITO	5	ADECUACION DE TERRENOS
217	LILIANA ROCIO CUBIDES GALINDO	52114760	3142548033	SAN ANTONIO	PRIMAVERA	5	PASTO
218	YESI BIVIANA CARDENAS SANABRIA	1116544923	3105749289	VILLA FLOR	TESORO DEL BUBUY	5	PASTO
219	AQUILINO BAUTISTA	4193811	3214587540	EL PROGRESO	SALITRICO	5	PASTO
220	KELLYS JOHANNA BEATRIZ ROYERO	1122647086	3212149394	BELLA VISTA	BELLAVISTA	5	PASTO
221	LUZ VILA ARANGO OSMAN	37179206	3114775390	SANTA INES	ISLA TURBAYISTA	5	FORRAJES
222	ADILIA CHAPARRO RIVAS	47428717	3116726401	BUENOS DIAS	LA GRACIELA	5	ADECUACION DE TERRENOS
223	RODRIGO ANDRES VEGAS SANABRIA	1006442094	3142700390	VILLA FLOR	TESORO DEL BUBUY	5	ADECUACION DE TERRENOS
224	ELIMA CONSTANZA BARRON NARANJO	33646677	3204730561		AGUALINDA	5	MAIZ
225	DIOSCELYNO GUTIERREZ LOPEZ	74845489	3144687792	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	ATALAYAS	5	PASTO-MAIZ
226	EDILMA ALEXANDRA ACEVEDO PERILLA	1116545696	3115647785	LA ESMERALDA	RIO CHQUITO	5	MAIZ
227	ROBINSON MARTIN BERNAL	86084434	3115330323	EL RUBY	BELLAVISTA	5	ADECUACION DE TERRENOS
228	DEBY CAROLINA MARTINEZ VARGAS	33647117	3123507471		ATALAYAS	5	ADECUACION DE TERRENOS
229	MARIA INES GOMEZ SALAMANCA	24226324	3187546825	LA BENDICION	SALITRICO	5	MAIZ
230	EDY JOHANNA MARTINEZ SANABRIA	1116546499	3123204334	VILLA FLOR	TESORO DEL BUBUY	5	ADECUACION DE TERRENOS
231	LEONOR RODRIGUEZ AGUIARIN	24226630	3144551545	SANTA CECILIA	RINCON DEL BUBUY	5	PLATANO
232	YOLMAN RODRIGUEZ	74753258	3112713224	ALCARAVAN	SAN RAFAEL	5	MAIZ
233	JOJOI FOTEMIR ROMAS MARGO	79059093	3142154351		LAS ATALAYAS	5	PLATANO
234	NUBIA ESTHER CONTRERAS	23467448	3148200322		ISLA TURBAYISTA	5	PASTO
235	ALEJANDRA BECERRA VELASQUEZ	1116549654	3138160389	EL ALCARAVAN	TESORO DEL BUBUY	5	PRADERAS

Aguazul 15 de octubre de 2025

CPS-0613-2025 012

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

Handwritten signature and date: 15 de Julio de 2025

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0613 DEL 15 DE JULIO DE 2025.

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el ingeniero Edgar Rojas Rincon, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, por medio de la presente, me permito solicitar el ingreso de insumos y elementos necesarios para dar cumplimiento del objeto contractual **"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
4.1.3. UHON'DHERE							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	V/R Unit antes de IVA	V/R total	IVA	V/R TOTAL
4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	3	\$ 73.667,00	\$ 221.001,00	\$ 41.990,19	\$ 262.991,00
4.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	3	\$ 407.667,00	\$ 1.223.001,00	\$ 232.370,19	\$ 1.455.371,00
4.1.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	3	\$ 353.333,00	\$ 1.059.999,00	\$ 201.399,81	\$ 1.261.399,00
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	3	\$ 109.333,00	\$ 327.999,00	\$ 62.319,81	\$ 390.319,00
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	3	\$ 75.000,00	\$ 225.000,00	\$ 42.750,00	\$ 267.750,00
4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UND	3	\$ 270.000,00	\$ 810.000,00	\$ 153.900,00	\$ 963.900,00
4.1.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALON	15	\$ 244.000,00	\$ 3.660.000,00	\$ 703.200,00	\$ 4.363.200,00

"Ismant demostrando Calidad en nuestros servicios"



ISMANT S.A.S

NIT: 901673633-8

Cra. 16 No. 12-54 - Barrio el centro

ismanhmsas@gmail.com

Cel-3238055203

TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291 PLACAS 13882 Y 13883							
4.2.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	2	\$ 81.000,00	\$ 182.000,00	\$ 30.780,00	\$ 192.780,00
4.2.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	2	\$ 420.667,00	\$ 841.334,00	\$ 159.853,46	\$ 1.001.187,00
4.2.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	2	\$ 378.333,00	\$ 755.666,00	\$ 143.766,54	\$ 900.433,00
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	2	\$ 109.333,00	\$ 218.666,00	\$ 41.548,54	\$ 260.213,00
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	2	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00
4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UND	2	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00
4.2.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	15	\$ 244.000,00	\$ 3.660.000,00		\$ 3.660.000,00

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

Edgar Rojas Rincón

EDGAR ROJAS RINCÓN

R/L Ingenieria Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

"Ismant demostrando Calidad en nuestros servicios"

Aguazul 16 de octubre de 2025

CPS-0613-2025 013

Señor:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventoría contratada

RVO = *[Signature]*
16 Oct. 2025

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: Entrega de matriz de solicitud de usuarios quincenal N° 7.

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el ingeniero Edgar Rojas Rincon, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, por medio de la presente, me permito hacer entrega de la matriz de solicitudes de los usuarios quincenal para su respectiva revisión y poder dar cumplimiento del objeto contractual del presente contrato de prestación de servicios, es de aclarar que, con las solicitudes recibidas a la fecha se pretende cumplir a cabalidad la meta propuesta, por tal motivo no se continuara con la recepción de solicitudes.

Se anexa:

Matriz de solicitudes. (11 folios)

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

Edgar Rojas R.

EDGAR ROJAS RINCON

R/L Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"

MATRIZ DE SOLICITUDES DE MECANIZACION

ITEM	NOMBRE DE USUARIO	NUMERO DE CEDULA	CELULAR	PRECIO / DIRECCION	VEREDA / BARRIO	TERRENO A MECANIZAR (HA)	UTILIDAD
239	LIGIA SALAMANCA SILVA	46362210	3214691614	LAS GUACAMAYAS	LA TURJA	5	PASTO
240	JESUS ENRIQUE MENDOZA GARCIA	72001769	3112645551	GRANJA VILLA MIMI	EL GUAMARO	5	FRUTALES
241	GAMALIEL SUPELANO ALTUBER	91107068	3103021584		LAS ATALAYAS	5	ADECUACION DE TERRENOS
242	PAULA XIMENA TRUJILLO VALENCIA	1115914544	3202307575		ISLA TURBAYISTA	5	MAIZ
243	DUIVAR NICOLAS BARRIOS CARDENAS	74755234	3204893048	LAS BRISAS	LA ESMERALDA	5	MAIZ
244	ANDERSON MARWIN COLINA ALARCON	1116552266	3163233883	ATENEA 2	RINCON DEL BUBUY	5	MAIZ
245	JIMMY YECID CAICEDO CASTRO	1116549738	3223035801	LA CEIBA	SAUTRICO	5	PRADERAS
246	EFREN PUERTO URINTIVE	1116530066	3138800474	TRES MATAS	EL GUAMARO	5	ARROZ RIEGO
247	MARTA CONSUELO VASQUEZ GOMEZ	52270236	3124702282	LAS TRES	GUADUALES	5	PREPARACION TERRENO
248	EIME JOSE MELO ORTIZ	74755000	3209007662	LA PRIMAVERA	LA ESMERALDA	5	PLATANO
249	JOSE ELIODORO PEREZ RODRIGUEZ	74752163	3222850283	SANTA CECILIA	RINCON DEL BUBUY	5	PATILLA
250	ADRIAN LEONARDO SANTOS ROJAS	74754933	3105748289	VILLA FLOR	TESORO DEL BUBUY	5	PASTO
251	BRAYHAM SMITH ROJAS CRUZ	1116553623	3144572961	PIÑALITO	BELLAVISTA	5	ADECUACION DE TERRENOS
252	MARIA ISNELDA SANABRIA PEREZ	24227473	3126829905	LA PRIMAVERA	TESORO DEL BUBUY	5	ADECUACION DE TERRENOS
253	WILSON ORLANDO PERILLA	74660017	3216633281	EL TRIUNFO	ALTAMIRA	5	MAIZ
254	NURELBA MARTINEZ FONSECA	1116546866	3212053254	SANTA CECILIA	SAN JOSE DEL BUBUY	5	PATILLA
255	RODRIGO MOLANO RODRIGUEZ	9516653	3123235999	EL PALMAR	PALO SOLO	5	ADECUACION DE TERRENOS
256	LINA KARINA VEGA SANABRIA	1116552433	3234654884	VILLA FLOR	TESORO DEL BUBUY	6	MAIZ
257	DANIEL GUTIERREZ PERAGOS	74343142	3502137991	LAS BRISAS	LA ESMERALDA	5	MAIZ
258	LUZ MARINA CONDA	52174439	3212390786	BUENOS AIRES	EL GUAMARO	5	PASTO-MAIZ
259	ROSENDO ORTIZ HERNANDEZ	9.654.125	3125414510	LOS YOPOS	PALO SOLO	5	PLATANO
260	GINNA ALEJANDRA CHACON VASQUEZ	1.118.553.083	3124680632	EL RECUERDO	SABANALES	5	MAIZ
261	ADRIANA ROCIO VEGA AGUILAR	1116549903	3104967093		EL GUAMARO	5	CACAO

MATRIZ DE SOLICITUDES DE MECANIZACION

ITEM	NOMBRE DE USUARIO	NUMERO DE CÉDULA	CÉDULA	PREDIO / DIRECCION	VEREDA / BARRIO	TERRENO MECANIZAR (HA)	UTILIDAD
262	LUIS ANTONIO CHAPARRO AVELLA	1.026.674	3168649349	EL PORVENIR	EL GUINEO	5	CACAO
263	LEONIDAS MONTENEGRO CASTAÑEDA	74753089	3102019441	LA VALENTINA	ALTAMIRA	5	CACAO
264	MARLENY RODRIGUEZ JIMENEZ	33847032	3214947982	LAS BRISAS	LA ESMERALDA	5	MAIZ
265	WALTER JHONYAN CUESTA MONTENEGRO	7062351	3102941797	PARATEBUENO	SABANALES	5	MAIZ
266	LUIS ENRIQUE MOYA SANABRIA	1116554417	3213317983	EL ALCARAVAN	TESORO DEL BUBUY	5	PRADERAS
267	ANA EDELMIRA GUTIERREZ FIGUEROA	24227766	3118472619	LA COLINA	PALO SOLO	5	CACAO
268	ELDIER MENDOZA CASTRO	1116543224	3112129428	LAS FLORES	LA VICTORIA	5	PASTO
269	HUGO MAURICIO VALDERRAMA	9833724	3144424559	VILLA GLORIA	LA ESMERALDA	5	ADECUACION DE TERRENOS
270	JOSE OLIVEROS CUTHA ROJAS	74859706	3202611223	CAÑAVERAL	LA ESMERALDA	5	MAIZ
271	WILLIAM ERNESTO VEGA MONTAÑA	1118539225	3102941797	PARATEBUENO	SABANALES	5	MAIZ - PASTO
272	SOFIA DOLORES CHAPARRO GONZALES	24.227.407	3112158189	SAN FELIPE	SALITRICO	2,5	MAIZ
273	ACEVEDO MONTAÑEZ CLAUDIA CONSUELO	24.228.454	3202300051	EL COROZO	SAN JOSE DEL BUBUY	5	MAIZ
274	IBÁÑEZ ARIAS ILDEFONSO	7.222.008	3003666668	EL GRACERO	TURUA	5	MAIZ
275	NUÑEZ ARIAS JOSE IGNICIO	9.506.259	3112058039	LA ILUSION	PALO SOLO	5	MAIZ
276	RIVERA PABON VICTOR LEANDRO	1.030.598.413	3123725028	LA CEIBA	PALO SOLO	5	PASTO
277	MARYURY FERNANDA PAEZ LOPEZ	1.118.545.040	3202075843	LOS CEDRITOS	LA TURUA	5	MAIZ
278	LOPEZ LOPEZ JORGE ELIECER	9.523.093	3108025484	BUENOS AIRES	SALITRICO	5	PASTO
279	CASTRO CUELLAR MARIA CRISTINA	23.275.777	3102948416	GALERON	SAN JOSE DEL BUBUY	5	PASTO
280	EDELMIRA PASACHOA TORRES	24.099.975	3150403929	EL RETIRO	EL TRIUNFO	5	PASTO
281	GEORGINA MARTINEZ AFRICANO	33.646.757	3123633105	LOS SITIOS	LA TURUA	5	PASTO
282	FONSECA RUIZ AGUSTIN	4.076.955	3118239208	EL FUNDITO	VICTORIA	5	PASTO
283	MARIA DOLORES MORALES DE CAMARGO	23.861.733	3108825434	EL RECUERDO	SAN LORENZO	5	PASTO
284	MAGNA XIMENA ARANGO SANTANA	52.742.741	3125078227	EL DIAMANTE	PALO SOLO	5	PASTO
285	JOSUE CARRILLO SERRANO	91.275.001	3124876448	EL MANANTIAL	LA ESMERALDA	5	PASTO
286	TUMAY VELANDIA AIMER	74.880.281	3204001421	LA TALITA	GUAIMARO	5	MAIZ



MATRIZ DE SOLICITUDES DE MECANIZACIÓN

ITEM	NOMBRE DE USUARIO	NÚMERO DE CEDULA	CELULAR	PREPIO / DIRECCIÓN	VEREDA / BARRIO	TERRENO A MECANIZAR (HA)	UTILIDAD
287	DIAZ DIAZ DORANCY	46.351.326	3112176818	SALITRICO	PIÑALITO/ SALITRICO	5	MAIZ
288	ALVARO ALFONSO BELTRAN BARAHONA	74.324.815	3112629884	EL OROCONOCO	PRIMAVERA	5	ADEACUAR TERRENO
289	LUIS GUILLERMO MOLINA DIMAS	74.558.491	3132719342	EL LAGUITO	PALO SOLO	5	PASTO
290	BOADA GRIMALDOS EDGAR IGNACIO	4.053.349	3125300741	EL GUAMAR	SAN RAFAEL	5	PASTO
291	CRUZ MORENO ESAU	7.361.077	3204348242	LA PRIMAVERA	SALITRE	5	MAIZ
292	PEREZ DE CORREDOR MYRIAM	23.543.966	3103040514	VILLA LORENA	PALO SOLO	5	MAIZ
293	NELLY AGRIPINA ZUBIETA HERNANDEZ	40.023.599	3124486929	LA ROMANA	RIO CHIQUITO	5	PASTO
294	GARCIA GOMEZ KEVIN ANDRES	74.754.384	3228114048	LA LIBERTAD	SAN RAFAEL	5	PASTO
295	MURILLO DUARTE MARIA EUGENIA	21.950.325	3203623818	LAGUITO	LA ESPERANZA	5	ADEACUAR TERRENO
296	GUTIERREZ RODRIGUEZ JAIME JOSE	74.347.140	3118414459	LA PORFIA	LA ESMERALDA	5	MAIZ
297	RODRIGUEZ BURGOS ANA BLANCA	51.874.337	3209036233	SAN ANDRESITO	SAN JOSE DEL BUBUY	5	MAIZ
298	OLAYA CACERES EDINSON	81.424.853	3204940649	LA COLINA	LA ESMERALDA	5	MAIZ
299	CARLOS ALIRIO INFANTE RODRIGUEZ	1.118.546.769	3102176095	LOS MALAVARES	RINCON DEL BUBUY	5	MAIZ
300	MORALES CEDENO HENRY ADOLFO	74.811.486	3102176095	LA PALMIRA	GUADUALES	5	MAIZ
301	GUERRERO CAMPOS LINA PAOLA	37.861.460	3208081839	VILLA GUERRERO	RINCON DE LA ESMERALDA	5	PASTO
302	OSCAR IVAN TORRES SALAMANCA	1.116.544.459	3214710582	SADARIA	ISLA TURBAYISTA	5	MAIZ
303	OSPITIA ARGENIS	21.237.168	3144872234	RENACER	GUADUALITO	5	MAIZ
304	LUIS GEOVANE GORDILLO LOPEZ	74.382.270	3112976060	EL GUINEAL	SAN RAFAEL	5	MAIZ
305	ANGELA NEIDA OCAÑO VEGA	80.386.111	3123325861	LLANO ROJO	GUAIMARO	5	MAIZ
306	PEDRO MIGUEL CARDENAS CABALLERO	9.505.674	3004894918	LAS DELICIAS	RIO CHIQUITO	5	PLATANO
307	LIBARDO BERNAL SANDOVAL	74.761.637	3204157940	EL ZAMURO	RIO CHIQUITO	5	PASTO
308	DIAZ NAVARRO LUIS ALBERTO	7.362.659	3133015563	EL CHAPARRAL	SAN LORENZO	5	PASTO
309	GUTIERREZ HERNANDEZ VICENTE	4.158.486	3228753675	LA ISLA	RIO CHIQUITO	5	PASTO



MATRIZ DE SOLICITUDES DE MECANIZACION

ITEM	NOMBRE DE USUARIO	NÚMERO DE CEDULA	CELULAR	PREDIO/DIRECCION	VEREDA / BARRIO	TERRENO A MECANIZAR (HA)	UTILIDAD
310	AVELLA NOSSA ANDRES HERNAN	9.529.885	3112049538	EL OPALMAR	SAN JOSE DEL BUBUY	5	PASTO
311	AREVALO AVELLA RICARDO	1.116.547.166	310281315	LAS MANITAS	PRIMAVERA	5	PASTO
312	GONZALEZ VILLALOBOS ANGEL ANDRES	1.022.328.948	3103490944	MATA PALOS	PALO SOLO	5	MAIZ
313	CLAVIJO GARCIA ANA TERESA	62.211.291	3106133484	LA LEYENDA	BELLAVISTA	5	MAIZ
314	VILLEGAS BERMUDEZ JOSE ARTURO	6.667.719	3112881451	LA LIBERTAD	SAN RAFAEL	5	PLATANO
315	BELLO ARIAS MISAEL	74.750.252	3229126758	EL DIAMANTE	SAN RAFAEL	2	PASTO
316	LOPEZ HOLGUIN GUNDISALVO	4.154.878	3103417022	RANCHO SANTA ANA	GUINEO	5	PASTO
317	JIMENEZ TAMAYO LUZ MARINA	28.428.593	31808041240	EL DESENGAÑO	TURUA	2	MAIZ
318	ERIKA CARMENZA RAMOS GUARNIZO	40.043.393	3143326578	PEDAGITO DE CIELO	GUAIMARO	3	MAIZ
319	LILIANA MILEC VARGAS CORONADO	33.645.581	3105881395	VILLA LIRIO	LA ESMERALDA	5	MAIZ
320	YNEC ALEXANDRA RONDON	33.460.114	3125135536	LA PRIMAVERA	LA ESMERALDA	5	PLATANO
321	FABIO VARGAS CAMARGO	4.211.539	3123468725	LOS LAGOS	GUAIMARO	5	PLATANO
322	VERONICA RAMIREZ	24.227.441	3208355914	LAS PALMERAS	SAN JOSE DEL BUBUY	5	MAIZ
323	RENAN GONZALES CRISTIANCHO	74.751.203	3103378227	LA ENVIDIA	LA ESMERALDA	5	MAIZ
324	ELOISA CARO OBALLE	66.301.502	3207321612	LA BENDICION	ISLA TURBAYISTA	5	PASTO
325	DORIS MARCELA GARCIA ROJAS	46.355.214	3108599751	PIÑALITO	SALITRICO	5	PASTO
326	JOHAN STEVEN HOLGUIN GALINDO	1.116.542.387	3123508719	QUINTAS DEL LLANO	ATALAYAS	4	PASTO
327	SANTOS ROLDAN LOPEZ CARDENAS	74.752.456	3138899585	EL RECREO	RIO CHIQUITO	5	PASTO
328	JILMAR DARIO LOPEZ MONROY	74.753.654	3109316406	EL POTRILLO	GUADUALES	2	MAIZ
329	OVIDIO CABALLERO AREVALO	1.118.531.932	3132880952	VISTA HERMOSA	VICTORIA	5	MAIZ
330	RAUL JAIMES GALINDO	74.750.365	3133440191	LOS COROZITOS	CERRITO	5	MAIZ
331	ARQUIMEDES PULIDO MORENO	3.275.526	3115038117	HATO COROZA	ISLA TURBAYISTA	5	MAIZ
332	LADY JOHANA ROSAS MORENO	33.646.057	3143328178	EL ALGARROBO	TESORO DEL BUBUY	5	PASTO
333	JOSE JACINTO BRICEÑO	9.506.022	3134084346	BRISAS DEL LLANO	SAN RAFAEL	5	PASTO
334	REINALDO PALACIOS	9.656.328	3022735551	LA ILUSION	RIO CHIQUITO	5	PASTO
335	REINIER PEREZ CRUZ	74.750.630	3115553381	AGUA BLANCA	EL SALITRE	5	PASTO



ISMANT S.A.S

NIT: 901673633-8

Cra 16 No. 12-54 barrio el Centro

ismanhmsas@gmail.com

Cel 3238055203

Aguazul - Casanare

Aguazul 17 de octubre de 2025

CPS-0613-2025

014

Señor:

ALEXANDER DUARTE SIERRA

Interventoría contratada

RECIBIDO
17-10-2025
Eduardo

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025-07-15 cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

ASUNTO: Solicitud de cobro Parcial N° 1 contrato de prestación de servicios N° 0613 de 2025

Cordial saludo,

La empresa Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT", con NIT 901.673.633-8, representada legalmente por el Ingeniero Edgar Rojas Rincon, identificado con cedula de ciudadanía No 1.026.552.430 de Bogotá DC, me dirijo a usted de manera formal con el propósito de realizar solicitud formal para aprobación del cobro parcial N° 1 del contrato de prestación de servicios N° 0613 de 2025.

Se anexa:

- Sabana acta parcial N°1
- INFORME PARCIAL N°1

Sin otro particular agradezco su colaboración y atención prestada.

Cordialmente,

Edgar Rojas Rincon

EDGAR ROJAS RINCON

R/L Ingeniería Suministros y Mantenimientos SAS "ISMANT"



NIT: 1.116.868.212-2

ACTAS GENERADAS

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	ACTA	
	Código: A-GDAC-F-11	Versión: 01
	Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022	

Nº: 004

FECHA: 17 | 10 | 2025

HORA: 10:00 AM a 12:00 AM

LUGAR: Alcaldía Municipal de Aguazul

TEMA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 250 HORAS

OBJETIVO: AVALAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 250 HORAS

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de las listas de chequeo del control de horas máquina en el que cada operador registro las horas diarias trabajadas con los equipos.
2. Determinar la aprobación y aval administrativo del mantenimiento preventivo a las 250 horas
3. Determinar compromisos y responsabilidades
4. Firma del acta por delegados.

DESARROLLO

Siendo las 10:00 a.m. del día 17 de octubre de 2025, en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio de Aguazul, se reunieron las siguientes personas:

- Dr. JULIÁN RINCÓN HERNÁNDEZ, en calidad de Supervisor del Contrato y Secretario de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental.
- Ing. OCTAVIO ANDRÉS CASTILLO SILVA, en calidad de profesional de apoyo a la supervisión.
- Sr. EDGAR ROJAS RINCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.552.430, en calidad de representante legal del contratista.
- Ing. ALEXANDER DUARTE SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.868.212, en calidad de representante de la interventoría contratada.

El Dr. JULIAN RINCON HERNANDEZ, en su calidad de Secretaria de Desarrollo Económico Ambiental, presenta un cordial saludo a los asistentes y concede la palabra al Ing. ALEXANDER DUARTE SIERRA en calidad de representante de la interventoría contratada del contrato N° 613 de 2025:



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



ACTA



Código: A-GDAC-F-11

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

El Ing. Duarte manifiesta que, en cumplimiento de las funciones propias de la interventoría, le corresponde verificar, supervisar y controlar la correcta ejecución del contrato, velando por el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en los documentos contractuales, así como por la adecuada utilización de los recursos públicos.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que es responsabilidad del contratista ejecutar y garantizar los mantenimientos preventivos de los tractores, conforme a lo estipulado en el presupuesto contractual y en las especificaciones técnicas del contrato, la interventoría realizó la revisión de los registros preoperacionales, hojas de vida de los equipos y controles de horas máquina diligenciados por los operadores de cada tractor.

Como resultado de dicha verificación, se constató que los equipos han alcanzado las 250 horas de operación, lo que hace procedente y necesario la ejecución del segundo mantenimiento preventivo (250 horas), conforme a lo establecido contractualmente y a las recomendaciones técnicas de los fabricantes, con el fin de garantizar la correcta operación, conservación y prolongación de la vida útil de la maquinaria.

En virtud de lo anterior, la interventoría solicita y sustenta la aprobación de los insumos necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo a las 250 horas, a efectos de realizar el correspondiente ingreso y salida de almacén municipal, derivados del segundo mantenimiento preventivo, para los siguientes equipos:

- Tractores marca John Deere – Línea 6403, placas 8789, 8788 y 8787.
- Tractores marca Massey Ferguson 291, placas 13882 y 13883.

La interventoría deja constancia de que la presente solicitud se formula en cumplimiento de sus funciones de seguimiento, validación técnica y control, y que la ejecución del mantenimiento preventivo es coherente con el objeto contractual, el cual consiste en el "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS PRODUCTORES, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

1. CANTIDADES QUE SE VAN A EJECUTAR CONFORME AL PRESUPUESTO CONTRACTUAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 250 HORAS DE LOS EQUIPOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO								PLACA			TOTAL
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	VR Unit antes de IVA	VR total	IVA	VR TOTAL	8789	8788	8787	
4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	3	\$ 73.667,00	\$ 221.001,00	\$ 41.990,19	\$ 262.991,00	1	1	1	3

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (608) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
 Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
 contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
 Aguazul Casanare



SC-2001123

SC-2001130

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



ACTA



Código: A-GDAC-F-11

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

4.1.3	FILTRO PRIMARIO AIRE	UND	3	\$ 407.667,00	\$ 1.223.001,00	\$ 232.370,19	\$ 1.455.371,00	1	1	1	3
4.1.5	FILTRO SECUNDARIO AIRE	UND	3	\$ 353.333,00	\$ 1.059.999,00	\$ 201.399,81	\$ 1.261.399,00	1	1	1	3
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	3	\$ 109.333,00	\$ 327.999,00	\$ 62.319,81	\$ 390.319,00	1	1	1	3
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	3	\$ 75.000,00	\$ 225.000,00	\$ 42.750,00	\$ 267.750,00	1	1	1	3
4.1.11	FILTRO HIDRÁULICO ACEITE	UND	3	\$ 270.000,00	\$ 810.000,00	\$ 153.900,00	\$ 963.900,00	1	1	1	3
4.1.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	15	\$ 244.000,00	\$ 3.660.000,00		\$ 3.660.000,00	5	5	5	15
4.2	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883										
4.2.1	FILTRO MOTOR ACEITE	UND	2	\$ 81.000,00	\$ 162.000,00	\$ 39.780,00	\$ 192.780,00	1	1		2
4.2.3	FILTRO PRIMARIO AIRE	UND	2	\$ 420.667,00	\$ 841.334,00	\$ 159.853,46	\$ 1.001.187,00	1	1		2
4.2.5	FILTRO SECUNDARIO AIRE	UND	2	\$ 378.333,00	\$ 756.666,00	\$ 143.766,54	\$ 900.433,00	1	1		2
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	2	\$ 109.333,00	\$ 218.666,00	\$ 41.546,54	\$ 260.213,00	1	1		2
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	2	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00	1	1		2
4.2.11	FILTRO HIDRÁULICO ACEITE	UND	2	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00	1	1		2
4.2.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	15	\$ 244.000,00	\$ 3.660.000,00		\$ 3.660.000,00	7,5	7,5		15



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



ACTA

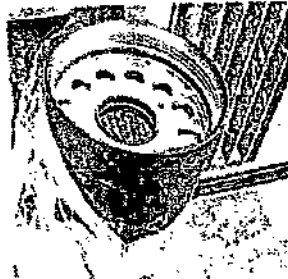




Código: A-GDAC-F-11

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

2. REGISTRO FOTOGRAFICO

4.1.1	FILTRO MOTOR	ACEITE	 	
4.1.3	FILTRO PRIMARIO	AIRE		



ISO 9001

ISO 14001

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO





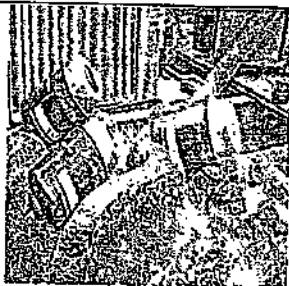
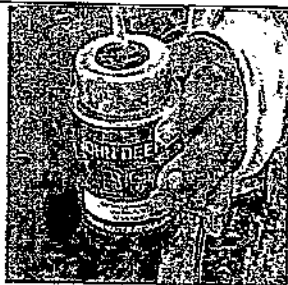
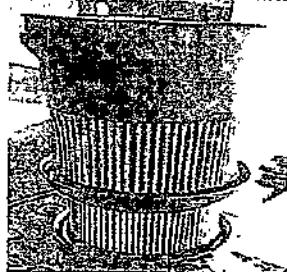
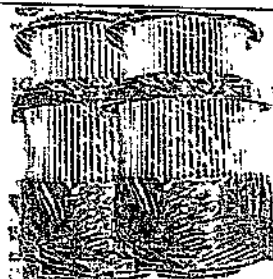
ACTA



Código: A-GDAC-F-11

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

4.1.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO		
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE		
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)		
4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO		



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



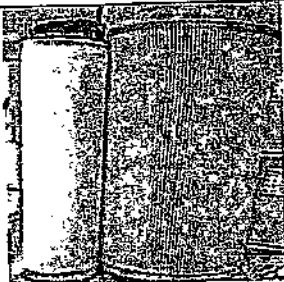
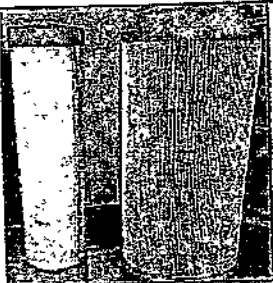
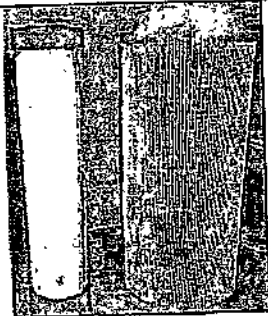
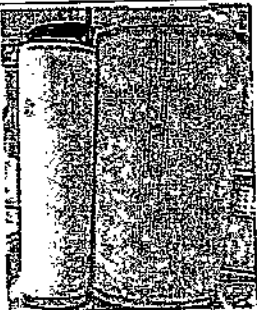
ACTA



Código: A-GDAC-F-11

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

4.1.13	ACEITE 15W40	MOTOR		
4.2				
4.2.1	FILTRO MOTOR	ACEITE		
4.2.3	FILTRO PRIMARIO	AIRE		
4.2.5	FILTRO SECUNDARIO	AIRE		



50-20011-20

50-20011-20

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



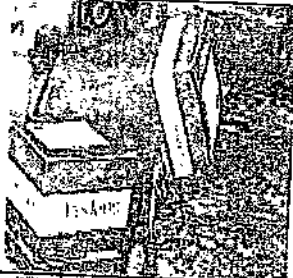
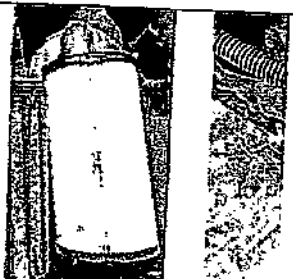
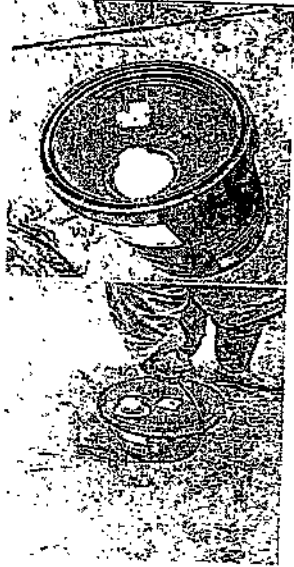
ACTA



Código: A-GDAG-F-11

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE		
4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)		
4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO		
4.2.13	ACEITE MOTOR 15W40		



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	ACTA	
	Código: A-GDAC-F-11	Versión: 01
	Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022	

En consecuencia, y una vez verificada la procedencia técnica y contractual, se aprueba la utilización de los insumos requeridos para la realización del mantenimiento preventivo a las 250 horas de los equipos relacionados, dejando constancia de que la interventoría continuara ejerciendo el seguimiento y control a la correcta ejecución de dichas actividades y al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

El contratista, haciendo uso de la palabra durante la reunión manifiesta que:

Reconoce que los tractores relacionados han cumplido las 250 horas de operación conforme a los registros de horas maquina diligenciados por los operadores y verificados por la interventoría y confirma su disponibilidad técnica, operativa y logística para ejecutar el mantenimiento preventivo a las 250 horas, de acuerdo con el cronograma establecido y sin afectar la operación del banco de maquinaria agrícola. Finalmente, el contratista deja constancia de su compromiso con el cumplimiento del contrato, reiterando su disposición para atender oportunamente las observaciones o requerimientos que formule la interventoría o la entidad contratante-

El Ing. Octavio Castillo manifiesta que, una vez revisada la información presentada por la interventoría y los documentos técnicos aportados incluidos los registros preoperacionales, hojas de vida de los equipos, controles de horas máquina y demás soportes, respalda administrativamente el análisis y las conclusiones emitidas por la interventoría, en cuanto a la necesidad de ejecutar el mantenimiento preventivo correspondiente a las 250 horas de operación.

Por otra parte, resalta que el seguimiento técnico y la verificación documental realizada por la interventoría constituyen la base técnica y objetiva sobre la cual se emite el presente concepto, teniendo en cuenta que esta instancia es la encargada de validar y certificar el cumplimiento de las actividades contractuales y el estado operativo de la maquinaria, como lo establece el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 es la encargada de emitir los conceptos técnicos, hacer seguimiento especializado y certificar la conformidad técnica y operativa de las actividades ejecutadas por el contratista.

Así mismo, se considera que la ejecución oportuna de este mantenimiento es necesaria para garantizar la continuidad operativa de la maquinaria, prevenir fallas que puedan generar mayores costos al municipio y asegurar el cumplimiento del objeto contractual relacionado con el fortalecimiento del Banco de Maquinaria Agrícola

Se deja constancia de que la solicitud presentada por la interventoría, así como la ejecución del mantenimiento preventivos a las 250 horas, no generan afectación económica alguna al contrato ni al rubro presupuestal asignado, toda vez que las actividades y los insumos requeridos para este mantenimiento se encuentran incluidos debidamente contemplados en el presupuesto oficial del contrato N° 613 de 2025.

Se precisa que tanto el contratista como la interventoría deberán garantizar que la ejecución del mantenimiento preventivo se realice sin ocasionar incrementos, modificaciones, ampliaciones

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



ACTA



Código: A-GDAC-F-11

Versión: 01

Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

presupuestales ni sobrecostos, de conformidad con los valores previstos en el presupuesto contractual, la matriz de insumos y los documentos técnicos aprobados desde el inicio del proceso contractual

El supervisor deja constancia de que su concepto (avala administrativamente) se fundamenta en el trabajo de seguimiento, control y verificación efectuado por la interventoría y se emite en áreas de garantizar la adecuada operación, conservación y prolongación de la vida útil de la maquinaria agrícola municipal.

Para finalizar se autoriza, con base en dicho aval técnico previo de la interventoría, la gestión administrativa del ingreso y salida de los insumos ante almacén municipal.

COMPROMISOS:

Contratista e Interventoría

- Coordinar y presentar la documentación y soportes a la dependencia de Almacén Municipal para el ingreso y salida formal de los repuestos e insumos aprobados para el mantenimiento de las 250 horas.

ASISTENTES:

Nombre y Apellidos	Empleo/Rol que desempeña	Dependencia	Firma
Julián Rincón Hernández	Secretario de Despacho	Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental	
Octavio Andrés Castillo	Profesional Contratado SDEA	Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental	
Alexander Duarte Sierra	Interventoría	Control de Consultoría N° 574 de 2025	
Edgar Rojas Rincón	Contratista	R/L Ingeniería Suministros & Mantenimientos S.A.S.	

Proyecto: Octavio Andrés Castillo S.
Profesional Contratado – Contrato N° 0503 SDEA



PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS



ACTA DE RECIBO/ENTREGA DE BIENES

Código: A-GRF-F-01

Versión: 01



Vigente: Resolución No. 071 del 27 de febrero del 2023

Contrato No:

613

De:

2025

ACTA DE:

FINAL: _____

PARCIAL: _____

Fecha: 17 | 10 | 2025

NATURALEZA DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIO

OBJETO:

FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

En las instalaciones del Almacén Municipal se reunieron, LUZ CENELIA VEGA ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 463.684.410 expedida en SOGAMOSO Técnico Administrativo, Código 367 Grado 02 nombrado mediante decreto 6 de ene-07 de 2020

INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S "ISMANT S.A.S."

, NIT 901673633-8

R/L EDGAR ROJAS RINCON

identificado (a) con cédula de ciudadanía 1.026.552.430 expedida en BOGOTA con el fin de RECIBIR por parte del almacenista los elementos relacionados a continuación:

ITEM	CANT.	UND	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
4.1	TRACTORES JHON DHERE LINEA 8789-8788 Y 8787					
4.1.1	3	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	FILTRO ACEITE MOTOR	\$ 87.663,73	\$ 262.991,00
4.1.3	3	UND	FILTRO AIRE PRIMARIO	FILTRO AIRE PRIMARIO	\$ 485.123,73	\$ 1.455.371,00
4.1.5	3	UND	FILTRO AIRE SECUNDARIO	FILTRO AIRE SECUNDARIO	\$ 420.466,27	\$ 1.261.399,00
4.1.7	3	UND	FILTRO COMBUSTIBLE	FILTRO COMBUSTIBLE	\$ 130.106,27	\$ 390.319,00
4.1.9	3	UND	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	\$ 89.250,00	\$ 267.750,00
4.1.11	3	UND	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	\$ 321.300,00	\$ 963.900,00
4.1.13	15	GALON	ACEITE MOTOR 15W40	ACEITE MOTOR 15W40	\$ 244.000,00	\$ 3.660.000,00
4.2	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13382 Y 13383					
4.2.1	2	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	FILTRO ACEITE MOTOR	\$ 96.390,00	\$ 192.780,00
4.2.3	2	UND	FILTRO AIRE PRIMARIO	FILTRO AIRE PRIMARIO	\$ 500.593,73	\$ 1.001.187,00
4.2.5	2	UND	FILTRO AIRE SECUNDARIO	FILTRO AIRE SECUNDARIO	\$ 450.216,27	\$ 900.433,00
4.2.7	2	UND	FILTRO COMBUSTIBLE	FILTRO COMBUSTIBLE	\$ 130.106,27	\$ 260.213,00
4.2.9	2	UND	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	\$ 95.200,00	\$ 190.400,00
4.2.11	2	UND	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	FILTRO ACEITE HIDRÁULICO	\$ 357.000,00	\$ 714.000,00



4.2.13	15	GALON	ACEITE MOTOR 15W40	ACEITE MOTOR 15W40	\$ 244.000,00	\$ 3.660.000,00
TOTAL					TOTAL	\$ 15.180.743,00

SON: QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Con la firma de la presente acta, el Almacén Municipal de Aguazul y (el/la) supervisor (a) manifiesta que el contratista, cumplió con la calidad y obligaciones adquiridas en cuanto al (suministro/bien/CTO 613-2025). Así mismo declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:


QUIEN RECIBE


LUZ CENELIA VEGA ALARCON
Técnico Administrativo Código 367, Grado 02
Almacenista Municipal

QUIEN ENTREGA


INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS S.A.S "ISMANT
S.A.S."
R/L EDGAR ROJAS RINCON


DIEGO JAVIER NIÑO FONSECA
Código 472 Grado 03
Ayudante Almacen


ALEXANDER DUARTE SIERRA
Interventor cto No. 574-2025


JULIAN RINCON HERNANDEZ
Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Economico y Ambiental

MUNICIPIO DE AGUAZUL

Nít. 891.855.200-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

AGUAZUL - CASANARE





ECE- ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONT. PRESTACION DE SERVICIOS
No. 202500139

PROVEEDOR(ES): INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS SAS			NIT/C.C: 901673633			
MOD. SELECCIÓN:			FECHA ENTRADA: 2025-10-17			
DOC. SOPORTE:			FECHA DOC: 2025-10-17			
No RP:			TEL: 3108589523			
DIR: CL 15 5A 04			Objeto: CTO 0613-2025 OBJETO: " FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PRESTACION, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.			
CÓDIGO	NOMBRE	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% Iva	TOTAL
010001100586	Kit De Mantenimiento		1	15.180.743,00		15.180.743,00

COMPRA TOTAL	15.180.743,00
IVA	0,00
NETO A PAGAR	15.180.743,00


LUZ CENELIA VEGA ALARCON
ALMACENISTA


INGENIERIA SUMINISTROS &
MANTENIMIENTOS SAS
PROVEEDOR


SUPERVISOR

MUNICIPIO DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

AGUAZUL - CASANARE

MUNICIPIO DE AGUAZUL



SCE-SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 202500574

P. EMISOR: BODEGA ALMACEN		FECHA SALIDA: 2025-10-17		
P. DESTINO: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL		NIT/C.C: 74753643		
		CIUDAD: AGUAZUL		
DESCRIPCIÓN	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Kit De Mantenimiento		1	\$15.180.743,00	\$15.180.743,00
Por concepto de: CTO 0613-2025 OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PRESTACION, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.				

TOTAL	\$15.180.743,00
NETO	\$15.180.743,00


 LUZ CENELIA VEGA ALARCON

 TECNICO ADMINISTRATIVO
 ALMACENISTA MUNICIPAL


 JULIAN RINCON HERNANDEZ

 SUPERVISOR
 2

QUIÉN RECIBIO

C.C.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


 Alcalde de Aguazul	ACTA PARCIAL	
---	---------------------	---

ACTA No. 2 PARCIAL 1- 2025-10-23

PUBLICADO
SECOP
S.I.A. OBSERVA

NUMERO CONTRATO : 0613 de 2025-07-15
MODALIDAD : LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROCESO : MA-LE-SDEA-003-2025
CONTRATISTA : INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S.
NIT : 901679683-8
OBJETO : FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

VALOR : \$527.917.609,00 MCTE
VALOR ADICION : \$0,00 MCTE
VALOR FINAL : \$527.917.609,00 MCTE
PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA INICIO : 2025-07-17
FECHA TERMINACION INICIAL : 2025-12-26
FECHA TERMINACIÓN FINAL : 2025-12-26
PERÍODO DEL ACTA : 17/07/2025 hasta 31/08/2025



Se suscribe la presente acta para dejar constancia de la ejecución parcial del contrato en 60.67%, conforme el informe de actividades presentado y revisado por supervisor.

NOVEDADES DEL CONTRATO

Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICATORIOS:

Novedad	Tiempo	Fecha
Modificadorio N° 1 (Cláusula Novena - Forma de Pago)	N/A	19/08/2025

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:

Acta No.	Tiempo
	20 OCT 2025

GARANTÍAS. Fecha de aprobación

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:34 PM
RADICADO N°:
FOLIOS:

CONCEPTO DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44-101241049	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA PARCIAL

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44- 101241049	17-07-2025	27-12-2025	\$ 26.395.886,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-44- 101241049	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	65-40- 101082931	17-07-2025	27-12-2025	\$ 284.700.000,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	NO. PLANILLA	IBC	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN	VALOR ARL	VALOR TOTAL APORTES
JULIO	7981509973	\$3.271.060,00	\$134.500,00	\$524.900,00	\$131.300	\$144.600,00	\$392.360
AGOSTO	7987118976	\$12.811.500,00	\$515.700,00	\$2.060.800,00	\$515.600	\$378.800,00	\$3.470.900

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$527.917.609,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$527.917.609,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$320.272.866,00	\$0,00	\$320.272.866,00
POR EJECUTAR	\$207.644.743,00		
TOTAL	\$527.917.609,00	\$0,00	\$320.272.866,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS \$320.272.866,00 MCTE.

OTROS DATOS ADICIONALES

N° ENTRADA ALMACEN	N° SALIDA ALMACEN	FECHA	VALOR
202500094	202500382	2025-08-04	\$251.296.426,19



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



ACTA PARCIAL

El Recibo por parte de la supervisión no exime al contratista, de su responsabilidad ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el veintitrés (23) días del mes de octubre del 2025.

Edgar Rojas R.
EDGAR ROJAS RINCÓN
R/L INGENIERIA SUMINISTROS &
MANTENIMIENTO S.A.S
Contratista.

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT 1116868212-2
Contrato de Interventoría N° 574/2025
Interventoría

Julian Rincón Hernández
JULIAN RINCÓN HERNÁNDEZ
Supervisor(a)

Yudy Estrit Galeano
Elaboró:
YUDY ESTRIT GALEANO CORREDOR
Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista





CERTIFICACIÓN

Código: A-GBAC-F-24 Versión: 01
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022

EL SUSCRITO SECRETARIO(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

CERTIFICA:



Que, EDGAR ROJAS RINCON, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1026552430 de BOGOTÁ, representante legal, de INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S con NIT 901673633-8, de acuerdo al ACTA No. 2 PARCIAL 1 - 2025-10-23, dio cumplimiento al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0613 de 2025-07-15, cuyo objeto contractual es "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL", se realizó la verificación del informe de actividades y demás documentos de soporte adjuntados por el contratista, de acuerdo a la forma de pago.

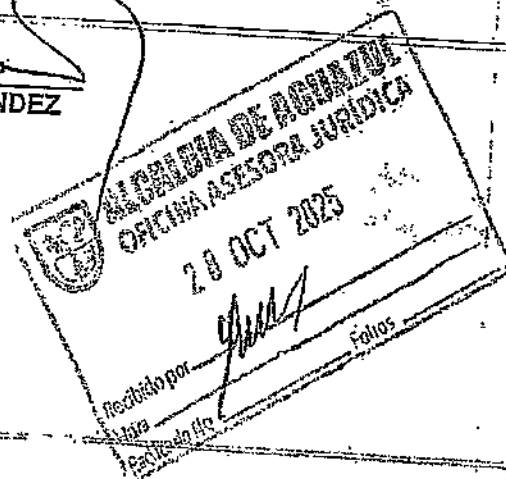
El contratista declara bajo gravedad de juramento que se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscales; como constancia de ello, anexó copia de la planilla de pago correspondiente al periodo del acta 17/07/2025 hasta 31/08/2025.

Dado a los veintitres (23) días del mes de octubre del 2025.

JULIAN RINCON HERNANDEZ
Supervisor

Revisó: OCTAVIO ANDRÉS BASTIEN
Profesional Contrato Cto. 507/2025

Elaboró: YUDY ESTRIN SALGADO CORREDOR
SECRETARIA



SC-2021149

SC-2021149



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0613 DE 2025

El suscrito ALEXANDER DUARTE SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.868.212 de Tame (Arauca), en mi condición de representante legal CONSULTORIAS Y ASESORIAS ALEXANDER DUARTE SIERRA, identificada con Nit. 1.116.868.212-2, dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de interventoría No. 0574 de 2025, me permito certificar que esta firma interventora ha revisado, verificado y aprobado el Informe para pago parcial No. 1, que comprende el período del 17/07/2025 al 31/08/2025.

Dicho informe contempla todos y cada uno de los requisitos exigidos por la entidad contratante dentro de las obligaciones que adquirió el Contratista del Contrato de prestación de servicios No. 0613 de 2025 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."


Que el contratista se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscales; como constancia de ello, anexó copia de la planilla de pago correspondiente a los meses de julio y agosto.

Se firma el presente documento a los veintitrés (23) días del mes de Octubre 2025.

Atentamente

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTAS DE SEGUIMIENTO



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"


VEREDA LA VICTORIA PREDIO FORTALEZA
OBJETIVO VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4.598364 - W 72.231546

DESARROLLO:

En el predio llamado FORTALEZA de la vereda LA VICTORIA
del la beneficiaria MARIELA MOLANO BARRERA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a MAÍZ Este proceso fue realizado desde
1/10/2025 hasta 2/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIELA MOLANO BARRERA	PROPIETARIO (A)	304846806	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RINCÓN DEL BUBUY

PREDIO

SAN RAFAEL

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,023654 - W 72,262591


DESARROLLO:

En el predio llamado SAN RAFAEL de la vereda RINCÓN DEL BUBUY
del beneficiario OLEGARIO GUTIERREZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
1/10/2025 hasta 2/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
OLEGARIO GUTIERREZ	PROPIETARIO (A)	3215487541	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA
OBJETIVO

LA VICTORIA - CERRITO PREDIO MATEPALMA
VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4.854564 - W 72.310245

DESARROLLO:

En el predio llamado MATEPALMA de la vereda LA VICTORIA - CERRITO
del la beneficiaria RUPERTO CONTRERAS PAEZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcts destinadas a #IREFI Este proceso fue realizado desde
1/10/2025 hasta 2/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
RUPERTO CONTRERAS PAEZ	PROPIETARIO (A)	3208527972	Ruperto Contreras
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	_____
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	_____



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RIO CHIQUITO

PREDIO

VILLANUEVA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,113624 - W 72,539681

DESARROLLO:

En el predio llamado VILLANUEVA de la vereda RIO CHIQUITO
del la beneficiaria MARIA RUBIELA ORTIZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a ADECUA. TERRENOS Este proceso fue realizado desde
1/10/2025 hasta 2/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA RUBIELA ORTIZ	PROPIETARIO (A)	3208599113	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 2/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA PRIMAVERA

PREDIO

SAN ANTONIO

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,055924 - W 72,363891

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
1/10/2025

SAN ANTONIO
LILIANA ROCIO CUBIDES
PASTO
hasta 2/10/2025

de la vereda LA PRIMAVERA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LILIANA ROCIO CUBIDES	PROPIETARIO (A)	3142548033	<i>Liliana Cubides</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>[Firma]</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>[Firma]</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 6/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

TURÚA

PREDIO

VILLA FLOR

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,105985 - W 72,263921

DESARROLLO:

En el predio llamado VILLA FLOR de la vereda TURÚA
del la beneficiaria YEISI BIVIANA CARDENAS se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
5/10/2025 hasta 6/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
YEISI BIVIANA CARDENAS	PROPIETARIO (A)	3105749289	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 6/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

SALITRICO

PREDIO

EL PROGRESO

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,091523 - W 72,342385

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
5/10/2025

EL PROGRESO
AQUILINO BAUTISTA
PASTO
hasta 6/10/2025

de la vereda SALITRICO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
AQUILINO BAUTISTA	PROPIETARIO (A)	3214587540	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 6/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

SALITRICO

PREDIO

BUENOS AIRES

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4.658164 - W 72.179342

DESARROLLO:

En el predio llamado
de la beneficiaria
5 hcta destinadas a
5/10/2025


BUENOS AIRES
KELLYS JOHANNA BELTRAN
MAÍZ
hasta 6/10/2025

de la vereda SALITRICO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
KELLYS JOHANNA BELTRAN	PROPIETARIO (A)	3212149394	Kellys Beltran
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	_____
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	_____



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 6/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

ISLA TURBAYISTA

PREDIO

SANTA INES

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,036947 - W 72,397801

DESARROLLO:

En el predio llamado SANTA INES de la vereda ISLA TURBAYISTA
del la beneficiaria LUZ MILA ARANGO OSMAN se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a ADECUA. TERRENOS Este proceso fue realizado desde
5/10/2025 hasta 6/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LUZ MILA ARANGO OSMAN	PROPIETARIO (A)	3114775390	LUZ MILA ARANGO
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 6/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA GRACIELA

PREDIO

BUENOS AIRES

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4.701243 - W 72.351024

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
5/10/2025

BUENOS AIRES
ADILIA CHAPARRO RIVAS
FORRAJES - PRADERAS
hasta 6/10/2025

de la vereda LA GRACIELA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ADILIA CHAPARRO RIVAS	PROPIETARIO (A)	3116726401	Adilia Chaparro Rivas
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 9/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIÓ PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

AGUALINDA

PREDIO

LA BENDICIÓN

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,079361 - W 72,193465

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
8/10/2025

LA BENDICIÓN
RODRIGO ANDRÉS VEGA
PASTO
hasta 9/10/2025

de la vereda AGUALINDA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
RODRIGO ANDRÉS VEGA	PROPIETARIO (A)	3142700390	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 9/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

AGUALINDA

PREDIO

LA BENDICION

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4,504951 - W 72,259015

DESARROLLO:

En un predio de ubicación rural en la vereda AGUALINDA del la beneficiaria ELMA CONSTANZA JARRO se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde 8/10/2025 hasta 9/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ELMA CONSTANZA JARRO	PROPIETARIO (A)	3204730561	<i>Elma Constanza Jarro</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORIA		<i>[Firma]</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		<i>[Firma]</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 9/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

AGUALINDA

PREDIO

LA BENDICION

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,012397- W 72,399305

DESARROLLO:

En el predio llamado
de la beneficiaria
5 hcta destinadas a
8/10/2025

LA BENDICION
DIOCELINO GUTIERREZ LOPEZ
PASTO
hasta 9/10/2025

de la vereda AGUALINDA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
DIOCELINO GUTIERREZ LOPEZ	PROPIETARIO (A)	3144687792	<i>[Firma]</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>[Firma]</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>[Firma]</i>



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTOFECHA: 9/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

AGUALINDA

PREDIO

LA BENDICION

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,097358 - W 72,554572

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
8/10/2025

LA BENDICION
EDILMA ALEXANDRA ACEVEDO
PASTO
hasta 9/10/2025

de la vereda AGUALINDA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
EDILMA ALEXANDRA ACEVEDO	PROPIETARIO (A)	3115641785	<i>Edilma Alexandra</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>Wilson Javier Avila Zamora</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>Wilmer Andrés Huertas Alfonso</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 9/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

BELLAVISTA

PREDIO

EL RUBY

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

#REFI

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
8/10/2025

EL RUBY
ROBINSON MARTIN BERNAL
MAÍZ
hasta 9/10/2025

de la vereda BELLAVISTA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ROBINSON MARTIN BERNAL	PROPIETARIO (A)	3115330323	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA
OBJETIVO

CHARAMENA PREDIO LOTE 1
VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: FORRAJES Y PRADERAS

DESARROLLO:

En un predio de ubicación rural en la vereda CHARAMENA
del la beneficiaria DEISY CAROLINA MARTINEZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a FORRAJES Y PRADERAS Este proceso fue realizado desde
13/10/2025 hasta 13/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
DEISY CAROLINA MARTINEZ	PROPIETARIO (A)	3123507471	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/10/2025

TEMA:


SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA SALITRICO PREDIO LOS DOS POTRILLOS
 OBJETIVO VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,092568 - W 72,343465

DESARROLLO: En el predio llamado LOS DOS POTRILLOS de la vereda SALITRICO
 del la beneficiaria MARIA INES GOMEZ se llevó a cabo la mecanización de
 5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
 12/10/2025 hasta 13/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA INES GOMEZ	PROPIETARIO (A)	3187546625	<i>Maria Ines Gomez</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>Wilson Javier Avila Zamora</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>Wilmer Andrés Huertas Alfonso</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

AGUALINDA

PREDIO

LA BENDICION

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS: N 5,025489- W 72,319752

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
12/10/2025

LA BENDICION
EDY JOHANA MARTINEZ
PASTO
hasta 13/10/2025

de la vereda AGUALINDA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
EDY JOHANA MARTINEZ	PROPIETARIO (A)	3123204334	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL."

VEREDA

SALITRICO

PREDIO

BUENOS AIRES

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,109738 - W 72,219237

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
12/10/2025

BUENOS AIRES
LEONOR RODRIGUEZ GUARIN
MAÍZ
hasta 13/10/2025

de la vereda SALITRICO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LEONOR RODRIGUEZ GUARIN	PROPIETARIO (A)	3144551545	<i>Leonora Rodriguez</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>Wilson Avila</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>Wilmer Huertas</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 13/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIÓ PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

SAN RAFAEL

PREDIO

ALCARAVAN

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,012436 - W 72,202159

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
12/10/2025


ALCARAVAN
YOLMAN RODRIGUEZ
MAIZ
hasta 13/10/2025

de la vereda SAN RAFAEL
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
YOLMAN RODRIGUEZ	PROPIETARIO (A)	3112713224	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

AGUALINDA

PREDIO

LA BENDICION

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,025489- W 72,319752

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
14/10/2025


LA BENDICION
RODOLFO EMIR ROJAS
ADECU. TERRENOS
hasta 15/10/2025

de la vereda AGUALINDA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
RODOLFO EMIR ROJAS	PROPIETARIO (A)	3142154351	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

ISLA TURBAYISTA

PREDIO

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,029875 - W 72,410895

DESARROLLO:

En un predio de ubicación rural en la vereda ISLA TURBAYISTA del la beneficiaria NUBIA ESTHELA CONTRERAS se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 15/10/2025 hasta 15/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
NUBIA ESTHELA CONTRERAS	PROPIETARIO (A)	3148200322	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

AGUALINDA

PREDIO

LA BENDICION

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS: N 5,112045 - W 72,272159

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
14/10/2025

LA BENDICION
ALEJANDRA BECERRA
ADECU. TERRENOS
hasta 15/10/2025

de la vereda AGUALINDA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ALEJANDRA BECERRA	PROPIETARIO (A)	3138160369	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

VEREDA

LA TURÚA

PREDIO

LAS GUACAMAYAS

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,040293 - W 72,319875

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
14/10/2025

LAS GUACAMAYAS
LIGIA SALAMANCA SILVA
PLATANO, MAIZ Y PIÑA
hasta 15/10/2025

de la vereda LA TURÚA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LIGIA SALAMANCA SILVA	PROPIETARIO (A)	3214591814	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 15/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIÓ PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA
OBJETIVO

EL GUAIMARO

PREDIO

GRANJA VILLA MIMI

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS: N 5,102549 - W 72,190256

DESARROLLO:


En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
14/10/2025


GRANJA VILLA MIMI
JESUS ENRIQUE MENDOZA
FRUTALES
hasta 15/10/2025

de la vereda EL GUAIMARO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JESUS ENRIQUE MENDOZA	PROPIETARIO (A)	3112645551	<i>[Firma]</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>[Firma]</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>[Firma]</i>





ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIÓ PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RIO CHIQUITO

PREDIO

VILLA NUEVA

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,016489- W 72,304953

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
18/10/2025

VILLA NUEVA
GAMALIEL SUPELANO ALTUBER
PASTO
hasta 18/10/2025

de la vereda RIO CHIQUITO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
GAMALIEL SUPELANO ALTUBER	PROPIETARIO (A)	3103021584	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIÓ PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA TURUA

PREDIO

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS: N 5,102549 - W 72,412495


DESARROLLO:


En un predio de ubicación rural en la vereda LA TURUA
del la beneficiaria PAULA XIMENA TRUJILLO
5 hcta destinadas a MAÍZ
17/10/2025 hasta 18/10/2025

se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
PAULA XIMENA TRUJILLO	PROPIETARIO (A)	3202307675	Paula Ximena Trujillo
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		





ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA
OBJETIVO


EL BUBUY
VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN
PREDIO
ATENEA
COORDENADAS: N 5.103891 - W 72.419072


DESARROLLO:

En un predio de ubicación rural en la vereda EL BUBUY
del la beneficiaria DUMAR NICOLAS BARRIOS se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
17/10/2025 hasta 18/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
DUMAR NICOLAS BARRIOS	PROPIETARIO (A)	3204893048	Dumar Barrios
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

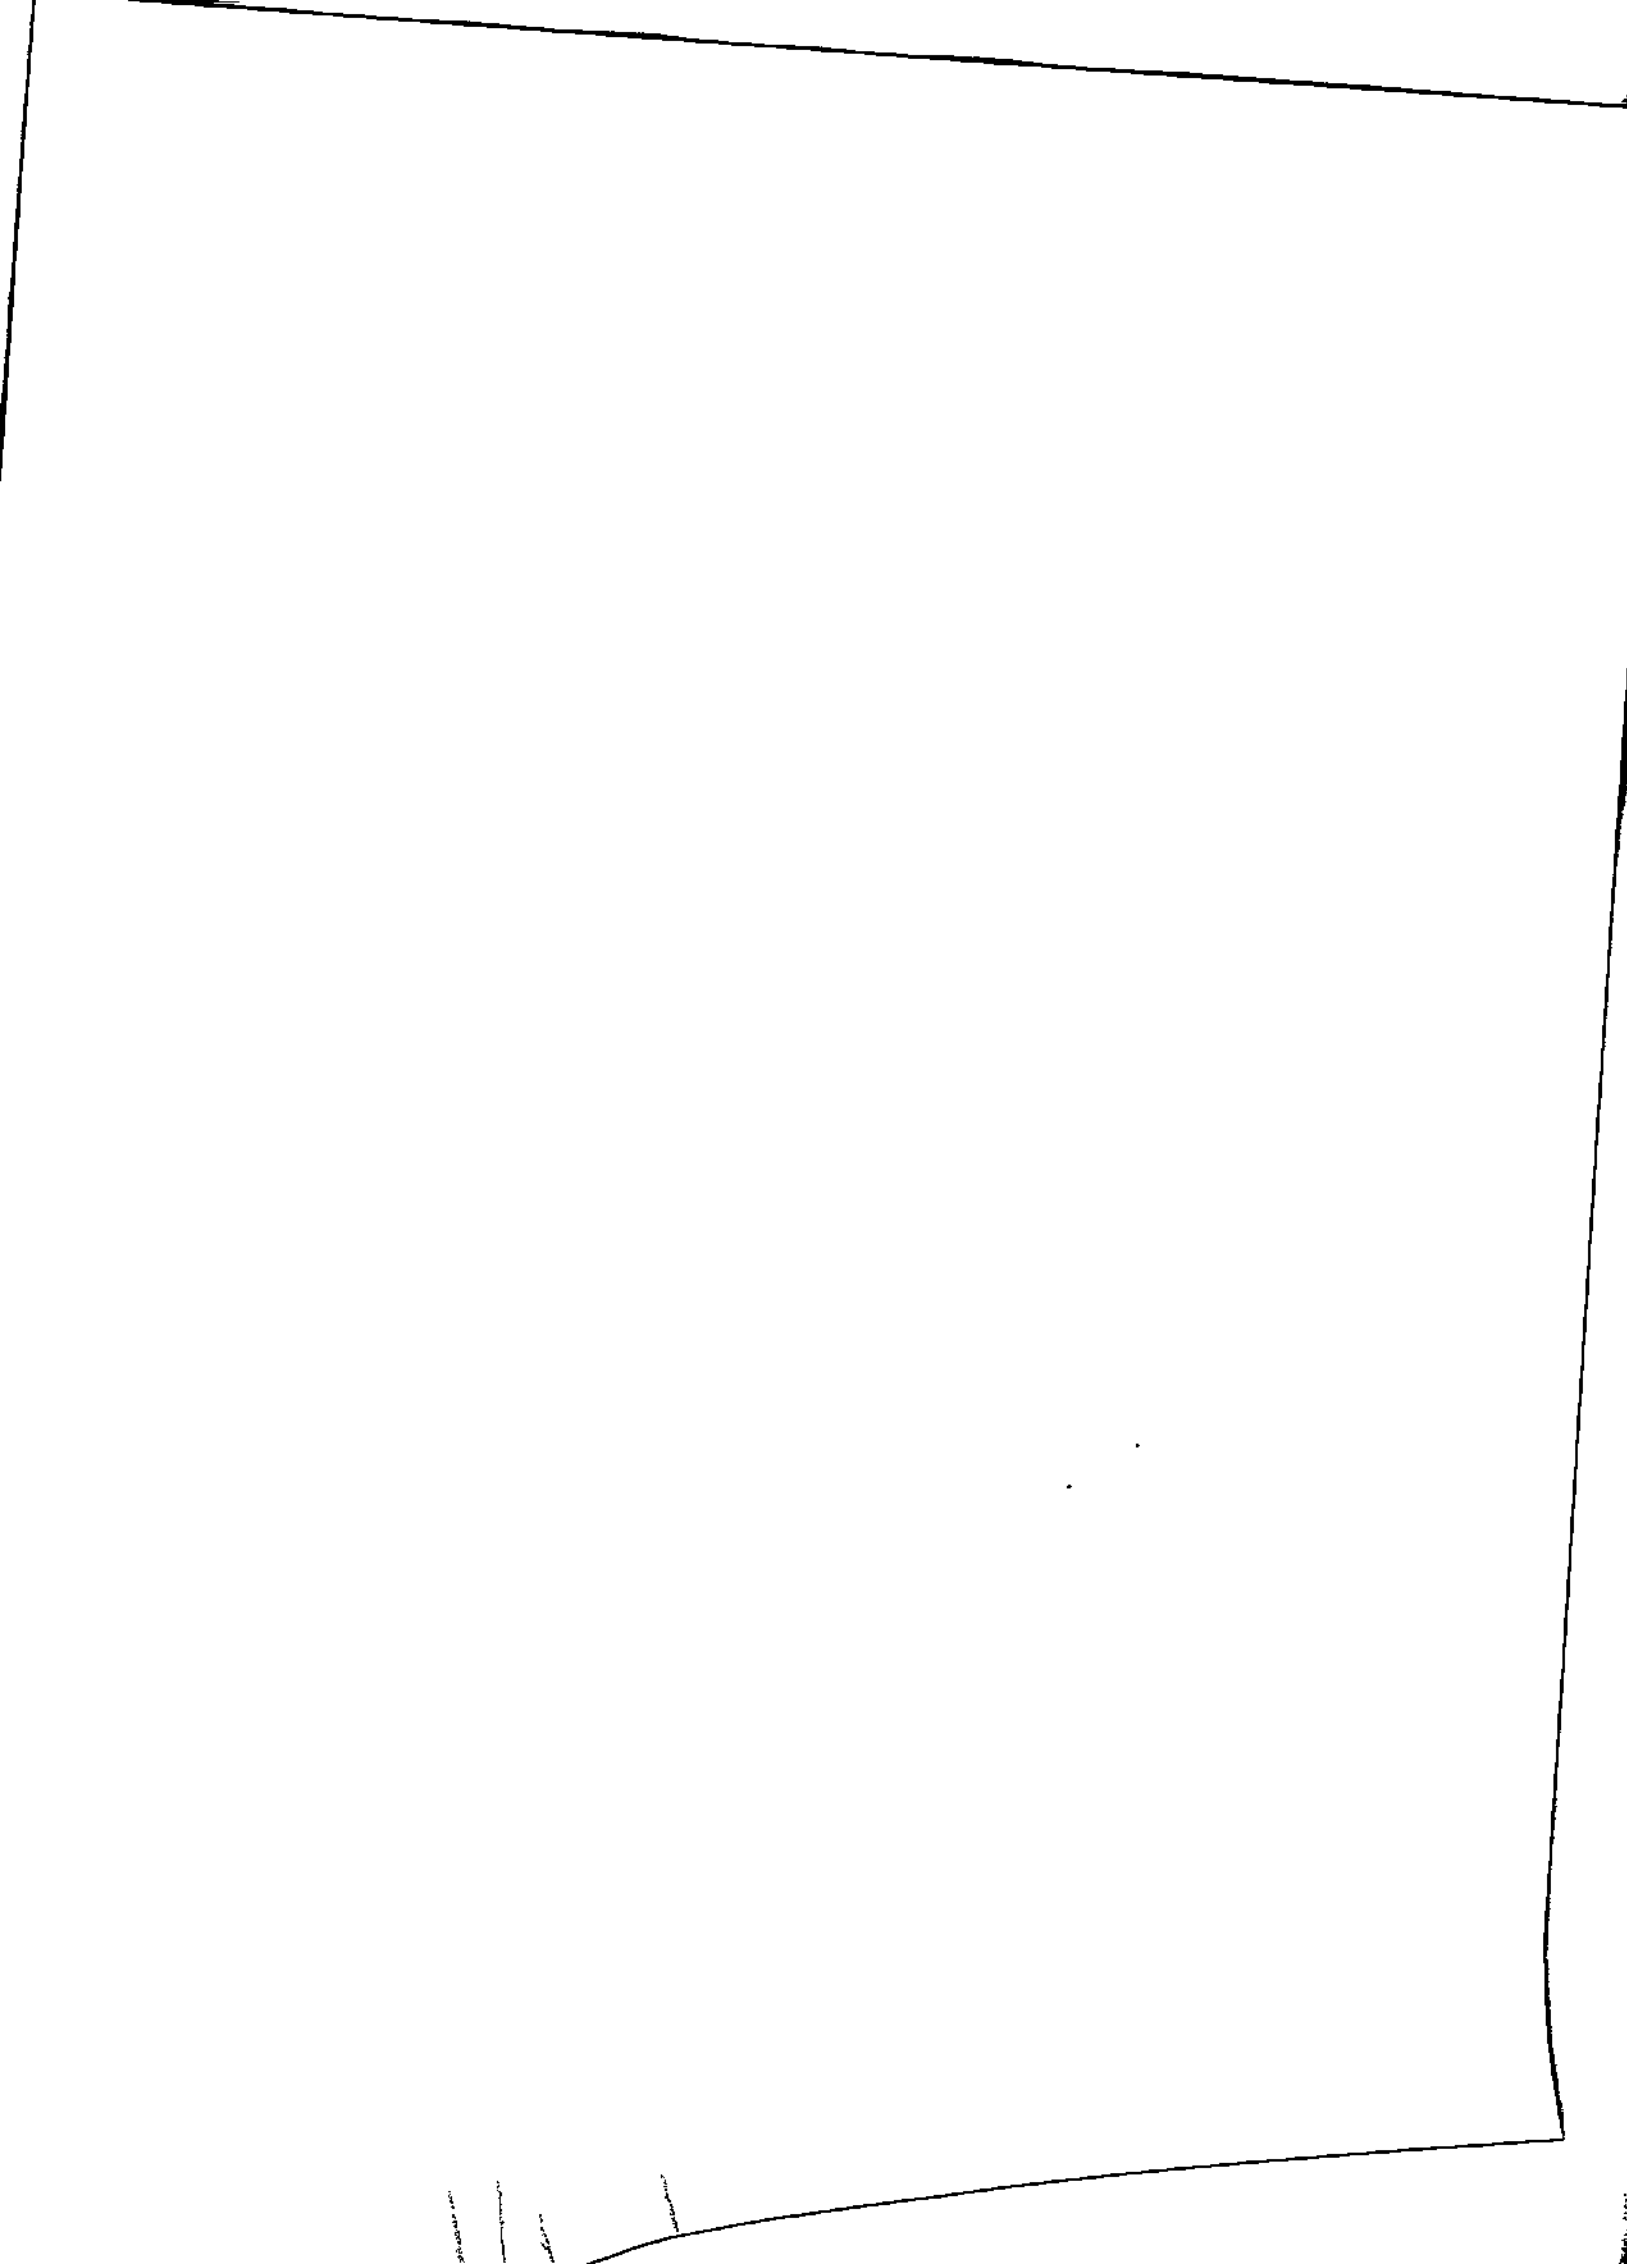



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA:

EL BUBUY

PREDIO

ATENEA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,040912 - W 72,223497

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
17/10/2025

ATENEA
ANDERSON MARWIN COLINA
PASTO
hasta 18/10/2025

de la vereda
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

EL BUBUY

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ANDERSON MARWIN COLINA	PROPIETARIO (A)	3163233883	Anderson
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		





NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 18/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIÓ PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

ALTAMIRA

PREDIO

LA CONCEPCIÓN

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,102492 - W 72,339271

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
17/10/2025


LA CONCEPCIÓN
JIMMY YECID CAICEDO
PRADERAS
hasta 18/10/2025

de la vereda ALTAMIRA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JIMMY YECID CAICEDO	PROPIETARIO (A)	3502137991	<i>Jimmy Caicedo</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		<i>[Firma]</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		<i>[Firma]</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 21/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

EL BUBUY

PREDIO

ATENEA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,110249 - W 72,253791

DESARROLLO:

En un predio de ubicación rural en la vereda EL BUBUY del la beneficiaria EFREN PUERTO URINTIVE se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 20/10/2025 hasta 21/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
EFREN PUERTO URINTIVE	PROPIETARIO (A)	3138800474	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 21/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

EL BUBUY

PREDIO

ATENEA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,125593 - W 72,513420


DESARROLLO:

En un predio de ubicación rural en la vereda EL BUBUY del la beneficiaria MARTA CONSUELO VASQUEZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 20/10/2025 hasta 21/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARTA CONSUELO VASQUEZ	PROPIETARIO (A)	3124702282	Marta C. Vasquez
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	_____
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	_____



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 21/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

EL BUBUY

PREDIO

ATENEA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5.102963 - W 72.449682

DESARROLLO:

En un predio de ubicación rural en la vereda EL BUBUY del la beneficiaria EIME JOSE MELO ORTIZ se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde 20/10/2025 hasta 21/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
EIME JOSE MELO ORTIZ	PROPIETARIO (A)	3209907662	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	
_____	_____	_____	_____



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 21/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RÍO CHIQUITO

PREDIO

VILLA NUEVA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,098546 - W 72,239542

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
20/10/2025

VILLA NUEVA
JOSE ELIODORO PEREZ
PATILLA
hasta 21/10/2025

de la vereda **RÍO CHIQUITO**
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
JOSE ELIODORO PEREZ	PROPIETARIO (A)	3222850283	<i>Jose Perez</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		<i>[Firma]</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		<i>[Firma]</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 21/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RIO CHIQUITO

PREDIO

VILLANUEVA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N° 5,119243 - W 72,249025

DESARROLLO:

En el predio llamado VILLANUEVA de la vereda RIO CHIQUITO
del la beneficiaria ADRIAN LEONARDO SANTOS se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO Este proceso fue realizado desde
20/10/2025 hasta 21/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ADRIAN LEONARDO SANTOS	PROPIETARIO (A)	3105749289	<i>Adrian Leonardo Santos</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>Wilson Javier Avila Zamora</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>Wilmer Andrés Huertas Alfonso</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 23/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RIO CHIQUITO

PREDIO

VILLANUEVA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4.582468 - W 72.222930

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
22/10/2025

VILLANUEVA
BRAYHAM SMITH ROJAS CRUZ
ADECUACION DE TERRENOS
hasta 23/10/2025

de la vereda RIO CHIQUITO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
BRAYHAM SMITH ROJAS CRUZ	PROPIETARIO (A)	3144572961	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 23/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RIO CHIQUITO

PREDIO

VILLANUEVA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,098462 - W 72,250927

DESARROLLO:

En el predio llamado VILLANUEVA de la vereda RIO CHIQUITO
del la beneficiaria MARIA ISNELDA SANABRIA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a ADECUACION DE TERRENOS Este proceso fue realizado desde
22/10/2025 hasta 23/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARIA ISNELDA SANABRIA	PROPIETARIO (A)	3125829905	<i>Maria Isnela</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>Wilson</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>Wilmer</i>



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 23/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RIO CHIQUITO

PREDIO

VILLANUEVA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4.958602 - W 72.401065

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
22/10/2025

VILLANUEVA
MARCO ANTONIO MENDOZA
MAIZ
hasta 23/10/2025

de la vereda RIO CHIQUITO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARCO ANTONIO MENDOZA	PROPIETARIO (A)	3219683281	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 23/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RINCON DEL BUBUY

PREDIO

SANTA CECILIA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS: N 5,049526 - W 72,220935

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
22/10/2025

SANTA CECILIA
NURELBA MARTINEZ FONSECA
PATILLA
hasta 23/10/2025

de la vereda RINCON DEL BUBUY
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
NURELBA MARTINEZ FONSECA	PROPIETARIO (A)	3212053254	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 23/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

RIO CHIQUITO

PREDIO

VILLA NUEVA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4.402961 - W 72.286525

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
22/10/2025


VILLA NUEVA
RODRIGO MOLANO RODRIGUEZ
ADECU. TERRENOS
hasta 23/10/2025

de la vereda RIO CHIQUITO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
RODRIGO MOLANO RODRIGUEZ	PROPIETARIO (A)	3123235999	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 25/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

SAN RAFAEL

PREDIO

EL GUINEAL

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,109852 - W 72,273396

DESARROLLO:

En el predio llamado
de la beneficiaria
5 hcta destinadas a
24/10/2025

EL GUINEAL
LINA KARINA VEGA SANABRIA
MAIZ
hasta 25/10/2025

de la vereda SAN RAFAEL
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LINA KARINA VEGA SANABRIA	PROPIETARIO (A)	3234864864	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 25/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

SAN RAFAEL

PREDIO

EL GUINEAL

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5.091572 - W 72.442587

DESARROLLO:

En el predio llamado EL GUINEAL de la vereda SAN RAFAEL
del la beneficiaria DANIEL GUTIERREZ PENAGOS se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
24/10/2025 hasta 25/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
DANIEL GUTIERREZ PENAGOS	PROPIETARIO (A)	3502137991	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 25/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA EL GUIMARO PREDIO BUENOS AIRES
OBJETIVO VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5,103821 - W 72,251092

DESARROLLO:

En el predio llamado BUENOS AIRES de la vereda EL GUIMARO
del la beneficiaria LUZ MARINA CONDIA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PASTO-MAIZ Este proceso fue realizado desde
24/10/2025 hasta 25/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LUZ MARINA CONDIA	PROPIETARIO (A)	3212390786	Luz Marina Conda
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 25/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

PALO SOLO

PREDIO

LOS YOPOS

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4.402961 - W 72.286525

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
24/10/2025

LOS YOPOS
WILSON ORLANDO PERILLA
GIRASOLES
hasta 25/10/2025

de la vereda PALO SOLO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
WILSON ORLANDO PERILLA	PROPIETARIO (A)	3125414510	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 25/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

EL GUAIMARO

PREDIO

EL PARAISO

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4.402961 - W 72.286525

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
24/10/2025

EL PARAISO
LUZ MARÍA HERNANDEZ
PLATANO
hasta 25/10/2025

de la vereda EL GUAIMARO
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LUZ MARÍA HERNANDEZ	PROPIETARIO (A)	3164079476	<i>Luz María Hernández</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>[Firma]</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>[Firma]</i>



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 28/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA GRACIELA

PREDIO

LAS DELICIAS

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,102549 - W 72,190256

DESARROLLO:

En el predio llamado LAS DELICIAS de la vereda LA GRACIELA
del la beneficiaria ADRIANA ROCIO VEGA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAÍZ Este proceso fue realizado desde
27/10/2025 hasta 28/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ADRIANA ROCIO VEGA	PROPIETARIO (A)	3104967093	<i>Adriana Rocio Vega</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>Wilson Javier Avila Zamora</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>Wilmer Andrés Huertas Alfonso</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 28/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA GRACIELA

PREDIO

LAS DELICIAS

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,120095 - W 72,274083

DESARROLLO:

En el predio llamado LAS DELICIAS de la vereda LA GRACIELA
del la beneficiaria LUIS ANTONIO CHAPARRO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAÍZ
27/10/2025 hasta 28/10/2025
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LUIS ANTONIO CHAPARRO	PROPIETARIO (A)	3168549349	<i>Luis Chaparro</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>Wilson Avila</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>Wilmer Huertas</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 28/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIÓ PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

ALTAMIRA

PREDIO

LA CONCEPCIÓN

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4.946281 - W 72.410249

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
27/10/2025

LA CONCEPCIÓN
LEONIDAS MONTENEGRO
MAÍZ Y PIÑA
hasta 28/10/2025

de la vereda ALTAMIRA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LEONIDAS MONTENEGRO	PROPIETARIO (A)	3102019441	LEONIDAS MONTENEGRO
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 28/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA GRACIELA

PREDIO

LAS DELICIAS

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5.068462 - W 72.451739


DESARROLLO:

En el predio llamado LAS DELICIAS de la vereda LA GRACIELA
del la beneficiaria MARLENY RODRIGUEZ JIMENEZ se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
27/10/2025 hasta 28/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
MARLENY RODRIGUEZ JIMENEZ	PROPIETARIO (A)	3214947982	<i>Marleny Rodriguez</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		<i>Wilson Avila</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		<i>Wilmer Huertas</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 28/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

ALTAMIRA

PREDIO

LA CONCEPCIÓN

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5.003152 - W 72.280139

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
27/10/2025

LA CONCEPCIÓN
WALTER JHIOVANY CUESTA
MAIZ
hasta 28/10/2025

de la vereda ALTAMIRA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
WALTER JHIOVANY CUESTA	PROPIETARIO (A)	3102941797	Walter Cuesta
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 31/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA GRACIELA

PREDIO

LAS DELICIAS

OBJETIVO

VERIFICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5,105975 - W 72,269582

DESARROLLO:

En el predio llamado LAS DELICIAS de la vereda LA GRACIELA del la beneficiaria LUIS ENRIQUE MOYA se llevó a cabo la mecanización de 5 hcta destinadas a MAÍZ Este proceso fue realizado desde 30/10/2025 hasta 31/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
LUIS ENRIQUE MOYA	PROPIETARIO (A)	3213317963	<i>[Firma]</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		<i>[Firma]</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		<i>[Firma]</i>



NIT: 1.116.868.212-2

ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 31/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA GRACIELA

PREDIO

LAS DELICIAS

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 4.402961 - W 72.286525

DESARROLLO:

En el predio llamado
del la beneficiaria
5 hcta destinadas a
30/10/2025

LAS DELICIAS
ANA EDELMIRA GUTIERREZ
MAÍZ
hasta 31/10/2025

de la vereda LA GRACIELA
se llevó a cabo la mecanización de
Este proceso fue realizado desde

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ANA EDELMIRA GUTIERREZ	PROPIETARIO (A)	3118472619	Ana Edelmir G.
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 31/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA LA VICTORIA PREDIO LAS FLORES
OBJETIVO VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 4.853658 - W 72.311648

DESARROLLO: En el predio llamado LAS FLORES de la vereda LA VICTORIA
del la beneficiaria ELDHER MENDOZA CASTRO se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a LAS FLORES Este proceso fue realizado desde
30/10/2025 hasta 31/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
ELDHER MENDOZA CASTRO	PROPIETARIO (A)	3112129426	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 31/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA ESMERALDA

PREDIO

VILLA GLORIA

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS: N 5.084145 - W 72.454301

DESARROLLO:

En el predio llamado VILLA GLORIA de la vereda LA ESMERALDA
del la beneficiaria HUGO MAURICIO VALDERRAMA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a PRADERAS Este proceso fue realizado desde
30/10/2025 hasta 31/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
HUGO MAURICIO VALDERRAMA	PROPIETARIO (A)	3144424559	<i>Hugo Valderrama</i>
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	<i>Wilson Avila</i>
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	<i>Wilmer Huertas</i>



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 31/10/2025

TEMA:


SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA LA GRACIELA PREDIO LAS DELICIAS
OBJETIVO VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN COORDENADAS: N 5.086812 - W 72.455395

DESARROLLO: En el predio llamado LAS DELICIAS de la vereda LA GRACIELA
del la beneficiaria GINNA ALEJANDRA CHACON se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ Este proceso fue realizado desde
30/10/2025 hasta 31/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
GINNA ALEJANDRA CHACON	PROPIETARIO (A)	3124680632	
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA	_____	
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO	_____	



ACTA DE SEGUIMIENTO

FECHA: 31/10/2025

TEMA:

SEGUIMIENTO EN MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 0574 de 2025 , cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA: "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA REPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL"

VEREDA

LA GRACIELA

PREDIO

LAS DELICIAS

OBJETIVO

VERICAR PROCESOS DE MECANIZACIÓN

COORDENADAS:

N 5.003152 - W 72.280139

DESARROLLO:

En el predio llamado LAS DELICIAS de la vereda LA GRACIELA
del la beneficiaria WUILLAM ERNESTO VEGA se llevó a cabo la mecanización de
5 hcta destinadas a MAIZ - PASTO Este proceso fue realizado desde
31/10/2025 hasta 31/10/2025

Esta labor se realizó con el apoyo de la maquinaria del banco de maquinaria municipal.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Contacto	Firma
WUILLAM ERNESTO VEGA	PROPIETARIO (A)	3102941797	Wuillam Ernesto
WILSON JAVIER AVILA ZAMORA	ING INTERVENTORÍA		
WILMER ANDRÉS HUERTAS ALFONSO	TÉCNICO DE CAMPO		

DOCUMENTOS VEHICULO INTER

405

SEGURO
R.C. CONTRACTUAL

PÓLIZA
AB000234

FACTURA
AB002492



NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Renovación
CERTIFICADO AB002479
AGENCIA FRANQUICIA PROMOTORA DE SEGUROS SANTAMARIA

PRODUCTO R.C. CONTRACTUAL

FORMA DE PAGO Con. Cuota a 30, 60 y 90 días

TELÉFONO 3214646245

ORDEN 232
USUARIO GCOBA19

FECHA DE EXPEDICIÓN

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

FECHA DE IMPRESIÓN

31	03	2025	DESDE	DD	07	MM	04	AAAA	2025	HORA	24:00	01	04	2025
DD	MM	AAAA	HASTA	DD	07	MM	04	AAAA	2026	HORA	24:00	DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES


TOMADOR ACA TOURS S.A.S.
DIRECCIÓN CLL 46A N 46 65

EMAIL acatoursoperaciones@gmail.com

NIT/CC 900874702
TEL/MOVL 3176675867

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 30/04/2021-1501-P-03-GALUTA00006011602-D001, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop


FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

SEGURO R.C. CONTRACTUAL

PÓLIZA
AB000234

FACTURA
AB002492



NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL
DOCUMENTO Renovación
CERTIFICADO AB002479
AGENCIA FRANQUICIA PROMOTORA DE SEGUROS SANTAMARIA

PRODUCTO R.C. CONTRACTUAL
FORMA DE PAGO Con Cuota a 30, 60 y 90 días
DIRECCIÓN CARRERA 22 # 12 - 07

ORDEN 232
USUARIO GCOBA19

FECHA DE IMPRESIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN		VIGENCIA DE LA PÓLIZA		HORA		HORA		FECHA DE IMPRESIÓN	
31	03	2025	DESDE	01	07	04	24:00	01	04
01	03	2025	HASTA	01	07	04	24:00	01	04
		AAAA				AAAA			2025

DATOS GENERALES

TOMADOR ACA TOURS S.A.S.
DIRECCIÓN CLL 48A N 48 65
ASEGURADO PERILLA ROJAS JOSE ALBERTO
DIRECCIÓN CLL
BENEFICIARIO PASAJEROS AFECTADOS
DIRECCIÓN

EMAIL acatoursoperaciones@gmail.com

EMAIL notiene@notiene.com

EMAIL notiene@notiene.com

NIT/CC 800674702
TEL/MOVL 3176576367
NIT/CC 1118539147
TEL/MOVL 7105421
NIT/CC 123111111
TEL/MOVL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE

CIUDAD
DEPARTAMENTO
LOCALIDAD
DIRECCIÓN
TIPO DE VEHÍCULO
VIA SEGURO POR PUESTO/PERSONA
CAPACIDAD DE PASAJEROS
PLACA ÚNICA
CANAL DE VENTA

YOPAL
CASANARE
YOPAL
CRA 23 #36-09
CAMPEROS/ CAMIONETAS
100 SMMIV
5.00
LIT465
Franquicia

DESCRIPCIÓN

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
Muerte Accidental	smmiv 500.00	.00%		\$0.00
Incapacidad Total y Permanente	smmiv 500.00	.00%		\$0.00
Incapacidad Total Temporal	smmiv 500.00	.00%		\$0.00
Gastos Médicos	smmiv 500.00	.00%		\$0.00
Protección Patrimonial	smmiv 500.00	.00%		\$0.00
Asistencia Jurídica en Proceso Penal	smmiv 500.00	.00%		\$0.00
RUNT		.00%		\$2,900.00

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
\$711,760,000.00				

COASEGURO		INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA	
COMPANÍA	PARTICIPACIÓN %	CÓDIGO	NOMBRE
		9432806	DEYBY ADIAM VARGAS NINO

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar. Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad <http://www.laequidadseguros.coop>, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

Handwritten signature

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (801) 7450382.
En otras ciudades del país consulte línea gratuita al 01800 891 9538 opción servicio al cliente.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
EQUIDAD SEGUROS es una marca de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.
Y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. COMPAÑÍAS DE SEGUROS



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NT. 860.009.876-6


CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
TIPO DE PÓLIZA INDIVIDUAL

SUO	RAMO	POLIZA NO.
37	48	101149680


CLASE DE DOCUMENTO	N° ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	VIAJEN A								NÚMERO DE VAS
			DESDE				HASTA				
EMISION ORIGINAL	0	DIA MES AÑO 15 11 2024	DIA MES AÑO 30 11 2024	PCRA 24:00	DIA MES AÑO 30 11 2025	PCRA 24:00			365		
TOMADOR: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS DIRECCIÓN: VEREDA CUIAGUA Ciudad: AGUAZUL						CC 1.118.535.147 TELEFONO 3132588432					
ASEGURADO: DIRECCIÓN:						TELEFONO					
BENEFICIARIO: DIRECCIÓN:						TELEFONO					
EXPELIDO EN: BOGOTA, D.C.		SUCURSAL INTEGRA		N° GRUPO		NINGUNO PUNTO DE VENTA					
DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL											

PAGUESTADO
PARCIAL EN BANCOS

PAGINA WEB



CORRESPONSABLES BANCARIOS



Pagos con convenio. No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA RESERVA COMIS	AJUSTE A PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
	\$ *****3,592,066.00		\$ *****0.00	\$ *****682,492.00	\$ *****0.00	\$ *****4,274,558.00

PLAN DE PAGO CONTADO

* TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A. DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN EL LA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 15/122016-1329-P-02-PAU001A, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CALLE 96 NO. 43A 31, TELEFONO: 7421444-BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11007608040367 (3900) 000004274557 (96) 20261230

REFERENCIA
PAGO:
1100760804034-7

DISTRIBUCIÓN DEL COSEGURO

COSEGURO	COMPENSA	N° PARTICIPACION PRIMA	COSEGURO	INTERVENIENDO	N° PARTICIPACION
1	ESTADO	0.00	0.00	184472 AGENCIA	SERVISEGUROS MYA COLOMBIA L 100.00

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NT: 860.009.576-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
TIPO DE PÓLIZA INDIVIDUAL

SUS.	RAMO	FOLIA N°
37	48	101149680

CLASES COBERTURA	N° VEHIC.	FECHA EXPIRACIÓN		DESDE				HASTA				N° SEGURO	
		DIA	MESES	AÑO	DIA	MESES	AÑO	HORA	DIA	MESES	AÑO		HORA
EMISION ORIGINAL	0	15	11	2024	30	11	2024	24:00	30	11	2025	24:00	365
TOMADOR: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS										CC		1.118.535.147	
DIRECCIÓN: VEREDA CUIAGUA Ciudad: AGUAZUL										TELEFONO		3132588432	
ADECUADO: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS										CC		1.118.535.147	
DIRECCIÓN: VEREDA CUIAGUA Ciudad: AGUAZUL										TELEFONO		3132588432	
BENEFICIARIO: JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS										CC		1.118.535.147	
DIRECCIÓN: VEREDA CUIAGUA Ciudad: AGUAZUL										TELEFONO		3132588432	
EXPIRACIÓN: BOGOTÁ, D.C.										N° GRUPO		NINGUNO	
SUCURSAL: INTEGRAL										FUNTO DEVENTA			

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL
OTROS COND. MEN A 25 AÑOS: ESTADO CIVIL: UNIÓN LIBRE ACTIVIDAD:

GENERO: F. NACIMIENTO: EDAD:
MASCULINO 15/05/1987 37

PRODUCTO: 2-GENIO COMERCIAL

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO RIESGO 1:
Codigo Fasecolida: 09021083
Tipo Vehicular: HILUX (8) [2 PL 2.4L MT 2400
Placas: 4UT465
Chasis o Serie: 8ATK83CD9N1641070
Capacidad de Carga: 2.00

Marca: TOYOTA
Carrocería o Remolque: DOBLE CABINA
Color: SUPER BLANCO
Localizador:
Zona de Operación: AUTOS ZONA 03

Class: CAMIONETA PICK UP
Modelo: 2022
Motor: 2000G308749
Servicio/Trayecto: PUBLICO
Descuento por NO reclamación: 0.00%

ANEXOS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES & MINIMO
- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	700,000,000.00	10% 1.00\$MILV
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	700,000,000.00	
MUERTE O LESION UNA PERSONA	1,400,000,000.00	
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	SI AMPARA	
ASISTENCIA JURIDICA	165,900,000.00	10% 0.00\$MILV
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL	165,900,000.00	10% 0.00\$MILV
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA	SI AMPARA	
PROTECCION PATRIMONIAL	165,900,000.00	10% 2.00\$MILV
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA	165,900,000.00	10% 0.00\$MILV
HURTO DE MAYOR CUANTIA	165,900,000.00	10% 2.00\$MILV
HURTO DE MENOR CUANTIA	SI AMPARA	
TERRORISMO	SI AMPARA	
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION AL VEHIC	SI AMPARA	
ASISTENCIA EN VIAJES VEHICULOS COMERCIAL	\$50,000.000	
* (AP) ACCIDENTES PERSONALES	SI AMPARA	
* ORIENTACION MEDICA GENERAL		

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PAGO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
\$ **2,265,900,000.00	\$ *****3,592,068.00		\$ *****0.00	\$ *****682,492.00	\$ *****0.00	\$ *****4,274,559.00

PLAN DE PAGO CONTADO

- TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1056 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 19/12/2018 - 1529 - P - 02 - EAU001A, ANEXA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CALLE 98 NO. 45A 51, TELEFONO: 7421444 - BOGOTÁ, D.C.
(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A. las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidaestado.com. Clausulado general forma (15/04/2020 1449P31000000E-VAP033ABR01), que se adjunta.

Unidad puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com



REFERENCIA
PAGO:
1100780804034-7

(415) 7709998021167 (8020) 11007608040347 (3900) 000004274559 (96) 20241230

DISTRIBUCIÓN DEL CONSEGURO				ENTIDAD		INTERMEDIARIOS		PARTICIPACIÓN	
ORDEN	COMPANIA	4 PARTES/ORDEN	PRIMA	CÓDIGO	TEP	NOMBRE			
1	ESTADO	0.00	0.00	184472	AGENCIA	SERVISEGUROS MYA COLOMBIA I.	100.00		

IMPRESO: LUISASABABRIA 15/11/2024 07:03:11
Recuerde que información referente a cláusulas y demás la podrá encontrar en nuestra página WEB <https://www.segurosdelestado.com/producos/producos/1041>
Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 80, PISO 5 Telefono: 601-2188977, 601-6019330

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inmediato para la seguridad del vehículo o de las personas ocupantes. In de los elementos

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que aplican un peligro inmediato a la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

83364

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

[Signature]
SENNY LORENA ALVAREZ GOMEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Jhonatan David Bejarano Abreo [Tercera plaza], Nayra Leonel Moya Jimenez [Alineación de ejes], Jhonatan David Bejarano Abreo [Profundidad de labrado], Jhonatan David Bejarano Abreo [Alineación, peso, suspensión y frenos], Nayra Leonel Moya Jimenez [Foto delantera], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial interior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Foto trasera], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial interior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial exterior], Jhonatan David Bejarano Abreo [Inspección sensorial motor].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnoing Ingenieros S.A.S. - TecnoRTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

GaSol
NIT: 900084748-5
320 322 2281

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

GASOL GASSOL GNV SAS, NIT: 900084748-5
Calle 38 # 20 - 20, YOPAL (CASANARE)
C.O.A. TEL: 3203222281 - 3202710186

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-08-28	Nombre o razón social JOSE ALBERTO PERILLA ROJAS	Documento de identidad CC (X) NI () CE () No. 1118535147
Dirección YOPAL CASANARE	Teléfono 3132588432	Ciudad Yopal
		Departamento Casasare

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa LIT465	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2022	No. de licencia de tránsito 10026110802	Fecha Matrícula 2022-06-17	Cefer Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJKB3C09N1541670
No. Motor 2GD-G309749	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2393	Kilometraje 130980	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Espejo SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad Inclinación de las luces bajas						todas las Luces			
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha	31.90	2.5	klux/m	0.94	0.5-3.5	%	104.00	225	klux/m
			Baja Izquierda	35.70	2.5	klux/m	1.50	0.5-3.5	%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	71.50		78.00		73.70		70.89	40	%

8. Frenos

Eficacia total			Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Máximo	Unidad
57.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	3053.00	5604.00	N	Eje 1 Derecho	3320.00	5865.00	N	7.14	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3239.00	4982.00	N	Eje 2 Derecho	3105.00	5023.00	N	5.85	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
28.20	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
			Desbalance lateral										

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad mil/m
-0.05	-0.80						

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Humedad (como Hexano) HC	Óxido nítrico NO
		CO	CO2	O2	HC	NO
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
		%	%	%	%	%
		Relentf	Relentf	Relentf	Relentf	Relentf
		%	%	%	%	%
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero
		%	%	%	%	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			%



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

**CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

No. 181859702

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA GASSOL LTDA

NIT: 900084748

No. de Certificado de
Acreditación: 13-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2025/06/18

Fecha de vencimiento: 2026/06/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: LT465

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2393

NRO. MOTOR: 2GD-G308749

NRO. CHASIS: 8AJKB3CD9N1641070

VIN: 8AJKB3CD9N1641070

LÍNEA: HILUX

COLOR: SUPER BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE A. PERILLA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEYBER ALBEIRO RAMOS MORA

SOAT

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HAZLA	HAZLA	HAZLA
AÑO MES DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO MES DÍA
2025 06 13	2025 06 16	2026 06 15		

No. DE PÓLIZA 1500111140702		PLACA No. LJT465	CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	SERVICIO PÚBLICO	CILINDRAJE/VARIOS 2393	MODELO 2022																		
PASAJEROS 5	MARCA TOYOTA	LÍNEA VEHÍCULO HILUX	CARROCERÍA 346 - DOBLE CABINA CON PLATON																					
No. MOTOR 2GD-G308749	No. CHASIS o No. SERIE 8AJKB3CD9N1641070	No. VIN 8AJKB3CD9N1641070	CAPACIDAD TON. .55																					
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR JOSE ALBEIRO PERILLA ROJAS			TELÉFONO DEL TOMADOR 3132588432	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR CC	NÚMERO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 1118535147	CUIDAD RESIDENCIA TOMADOR AGUAZUL																		
CÓDIGO DE ASSEGURODORA 45268	CÓD. SUCCURSAL EXPEDIDORA 9310	CLAVE PRODUCTOR 45268	No. FOMULARIO 1500111140702	CUIDAD EXPEDICIÓN BOGOTÁ																				
TARIFA 910	PRIMA SOAT \$414,900.00	CONTRIBUCIÓN FOSSYA \$215,700.00	TASA RUNT \$2,400.00	<table border="1"> <tr> <th>AMPAROS POR VÍCTIMA</th> <th>HASTA</th> <th>UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)</th> </tr> <tr> <td>A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS</td> <td>263,13¹</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS</td> <td>701,68²</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. INCAPACIDAD PERMANENTE</td> <td>180</td> <td>SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES</td> </tr> <tr> <td>D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS</td> <td>750</td> <td></td> </tr> </table>			AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13¹		B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68²			8,77		C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)																						
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13¹																							
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68²																							
	8,77																							
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES																						
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750																							
TOTAL A PAGAR \$633,000.00																								

Handwritten signature

FIRMA AUTORIZADA

*Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 240, 910, 920.
Decreto 2844 de 2022.
*Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una fácil portabilidad y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.



- Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
 - Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
 - Esté atento al momento en que deba renovar su póliza, no tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
 - Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito, (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habas data

"Alceda" a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulta de todas las funciones que directa o indirectamente se las haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



TARJETA DE OPERACIÓN
No.432838

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	LJT465	AÑO MODELO:	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	MARCA:	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CON COMBUSTIBLE:		DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	SENTADOS: 5	DE PIE:	
CARGA:		MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	ACA TOURS S.A.S
NIT:	900874702
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Calle 30 Norte # 2BN 42 OFICINA 411 CALI VALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:	SEVILLA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	27-05-2024
VIGENCIA:	DESDE: 30-06-2024 HASTA: 30-06-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL VALLE

FIRMA DEL FUNCIONARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10026410602

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LJT465	TOYOTA	HILUX	2022
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
2.593	SUPER BLANCO	PÚBLICO	
CLASE DE VEHICULO	VINTAJA	CILINDROS	CAPACIDAD Kwh
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	554 - 5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	REC
PCD-4308749	N	8AJKB3CD9N1641070	N
NÚMERO DE CHASIS	REG	NÚMERO DE CHASIS	REC
8AJKB3CD9N1641070	N	8AJKB3CD9N1641070	N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES	CONFIRMACIÓN		
PERILLA ROJAS JOSE ALFREDO	C.C. 1118535147		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482022000326219

FECHA IMPORT
1 26/05/2022

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE BOGOTA

FECHA MATRÍCULA
17/06/2022

FECHA EXP. LIC. TIO
17/06/2022

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT03005150046

