

 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

CÓDIGO TRD: 2120				
ACTA No. CO_AE4_002	LUGAR: Virtual Microsoft Teams	FECHA: 29/08/2024	HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 11:00 am

OBJETO DE LA REUNIÓN
Adelantar COMITÉ OPERATIVO DEL AE4 - ITX – FUTIC - ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) – con corte al mes de Agosto de 2024 .

ORDEN DEL DÍA
1. Alcance Acuerdo Especifico N. 4 2. Hitos Alcanzados 3. Varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Programación de la citación para el Kickoff para AE4, Presencial	Culminado Citación 31/07/2024 - Kickoff AENo.4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia el Comité Operativo del Acuerdo Especifico N. 4, entre Internexa y el equipo del MinTic, El propósito de este comité es revisar el avance de las actividades acordadas, abordar los temas pertinentes a la ejecución del acuerdo, y coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos de acuerdo con la agenda planteada. Internexa realiza presentación general sobre las generalidades del Acuerdo, iniciando con los hitos internos alcanzados hasta la fecha: 1. Alcance Acuerdo Especifico N. 4 Internexa presenta resumen ejecutivo y alcance del Proyecto del AE4, donde se impactarán 32 Municipios de 4 Departamentos (Antioquia, Choco, Cauca y Nariño), se pretende impactar más de 62mil hogares.







TIC

ACTA DE REUNIÓN



- ✓ **Generación de Orden de Compra:** Internexa confirma que se ha avanzado con las respectivas generaciones de la Orden de compra de Fibra Óptica para la ruta de Quibdó – Tadó, se estima que a finales de octubre se encuentre la FO en Colombia.
- ✓ **Generación de Orden de Compra Consultas Previas:** Internexa confirma que desde la parte de Gestión Socioambiental se generó la respectiva Orden Compra y se estima que a finales de esta semana se realice la respectiva radicación y contar con la respuesta tanto para el AE2 como el AE4.

Sobre la ruta Tadó – Quibdó - Choco, se identifican comunidades afro e indígenas donde se planea el paso de la Fibra Óptica, aun no se ha realizado acercamiento con dichas comunidades hasta no contar con el resultado de las consultas previas.

Internexa confirma que todas las áreas internas están con el compromiso de avance en pro del Proyecto, realizando las actividades correspondientes desde cada frente y así lograr avanzar de acuerdo con los hitos establecidos, teniendo en cuenta uno de los hitos más relevantes contemplados y se logre la facturación del primer pago asociado al concepto de expansión proyectado en el mes de Noviembre de 2024.

Internexa consulta la posibilidad de que se puedan realizar dos pagos, este segundo en el mes de Diciembre de 2024.

CONVOCATORIAS ISP's AE4

Internexa confirma su disposición para avanzar y agilizar en las convocatorias correspondientes. Por su parte MinTic menciona su compromiso de apoyar el proceso para incentivar a los ISP's a postularse a las convocatorias. Se dejará abierta la posibilidad de utilizar diversas tecnologías, garantizando así que la cobertura se extienda a todas las áreas del municipio. Así mismo, se anunciará el lanzamiento de la convocatoria para el AE2, seguido de la del AE4.

MinTIC solicita a Internexa apoyo en la provisión de estadísticas de las lecciones aprendidas que permitan determinar un techo en el número de accesos disponibles, así como establecer un piso mínimo de accesos entregados, con el fin determinar la convocatoria y poder contar con una flexibilidad.

3. VARIOS

Internexa confirma al equipo de apoyo de supervisión que en la plataforma de SECOP el Acuerdo específico aún no se cuenta con el estado de Ejecución del Acuerdo lo que impide contar con la respectiva fecha de inicio de este, teniendo en cuenta que la aceptación de pólizas se dio el 26 de Julio de 2024. La Supervisión realizará las respectivas validaciones al interno y confirmará a InterNexa el resultado.

Internexa confirma que se está proyectando el borrador de Otrosí, correspondiente a modificación de **desembolso de recursos a la Fiducia**, revisado con CMS, adicionalmente se incluirá en este otrosí la modificación sobre la cantidad de nodos a construir, donde en el anexo técnico se evidencia construcción de 2 nodos que no requieren construcción y adicionalmente ajustar el valor de **la resistividad** que en el anexo técnico quedo menor a 1 ohm y el valor debe ser menor a 10 ohm, estos dos puntos generados por un error tipográfico.



	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--


COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A

REGISTRO DE ASISTENCIA


NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Denice Bibiana Acero	Directora Infraestructura	MinTic
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	MinTic
Luis Fernando Roncancio	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Andres Felipe Carrillo G.	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
John Jairo Gonzalez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Angel Alberto Ramírez O.	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Ariel de Jesús Moreno	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Rafael Alberto Negrete	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Jurídicos	MinTic
Fabian Yanquen	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
Valery Sangregorio	Asesora de Despacho	MinTic
José Ferney Mora	Especialista Socioambiental	Internexa
Erika Johana Ferro	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Diana Milena Jaramillo	Directora Proyecto Plan Nacional de ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas - ISP's	Internexa
Juan Diego Bedoya	Analista Administrativo Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Luis Carlos Páez	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Melisa Lozano	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Roger García	PMO - Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
John Fredy Chía	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Paola Ruiz González	Analista Administrativo Plan Nacional Conectividad	Internexa

REGISTRO DE FIRMAS

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... Inicial:  
Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	Firmado por:  6AAA3F2A9BB14AE... Inicial: 



 	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

Juan Manuel Guerrero	Subdirectora de Estructuración	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A...
----------------------	--------------------------------	--

Anexos
• Presentación Comité Operativo 29082024





Una Empresa ISA

Comité Operativo Proyecto Conectividad Para Cambiar Vidas

!Juntos hacemos que pase!

D

Disminuir Brecha Digital

Acuerdo Específico 2



Una Empresa ISA

Timeline Habilitación Nodos

Nariño

Dic/23

Entrega efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado.

Guajira

Mar/24

Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado.

Cauca

Mar/24

Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado

Valle del Cauca

Feb/24

Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado.

Chocó

Mar/24

Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado.

Antioquia


15/Jun/24

▶ Turbo


Entrega Efectiva de Nodos del departamento en operación.

- Estado: Aprobado y facturado

Timeline Expansión de Red

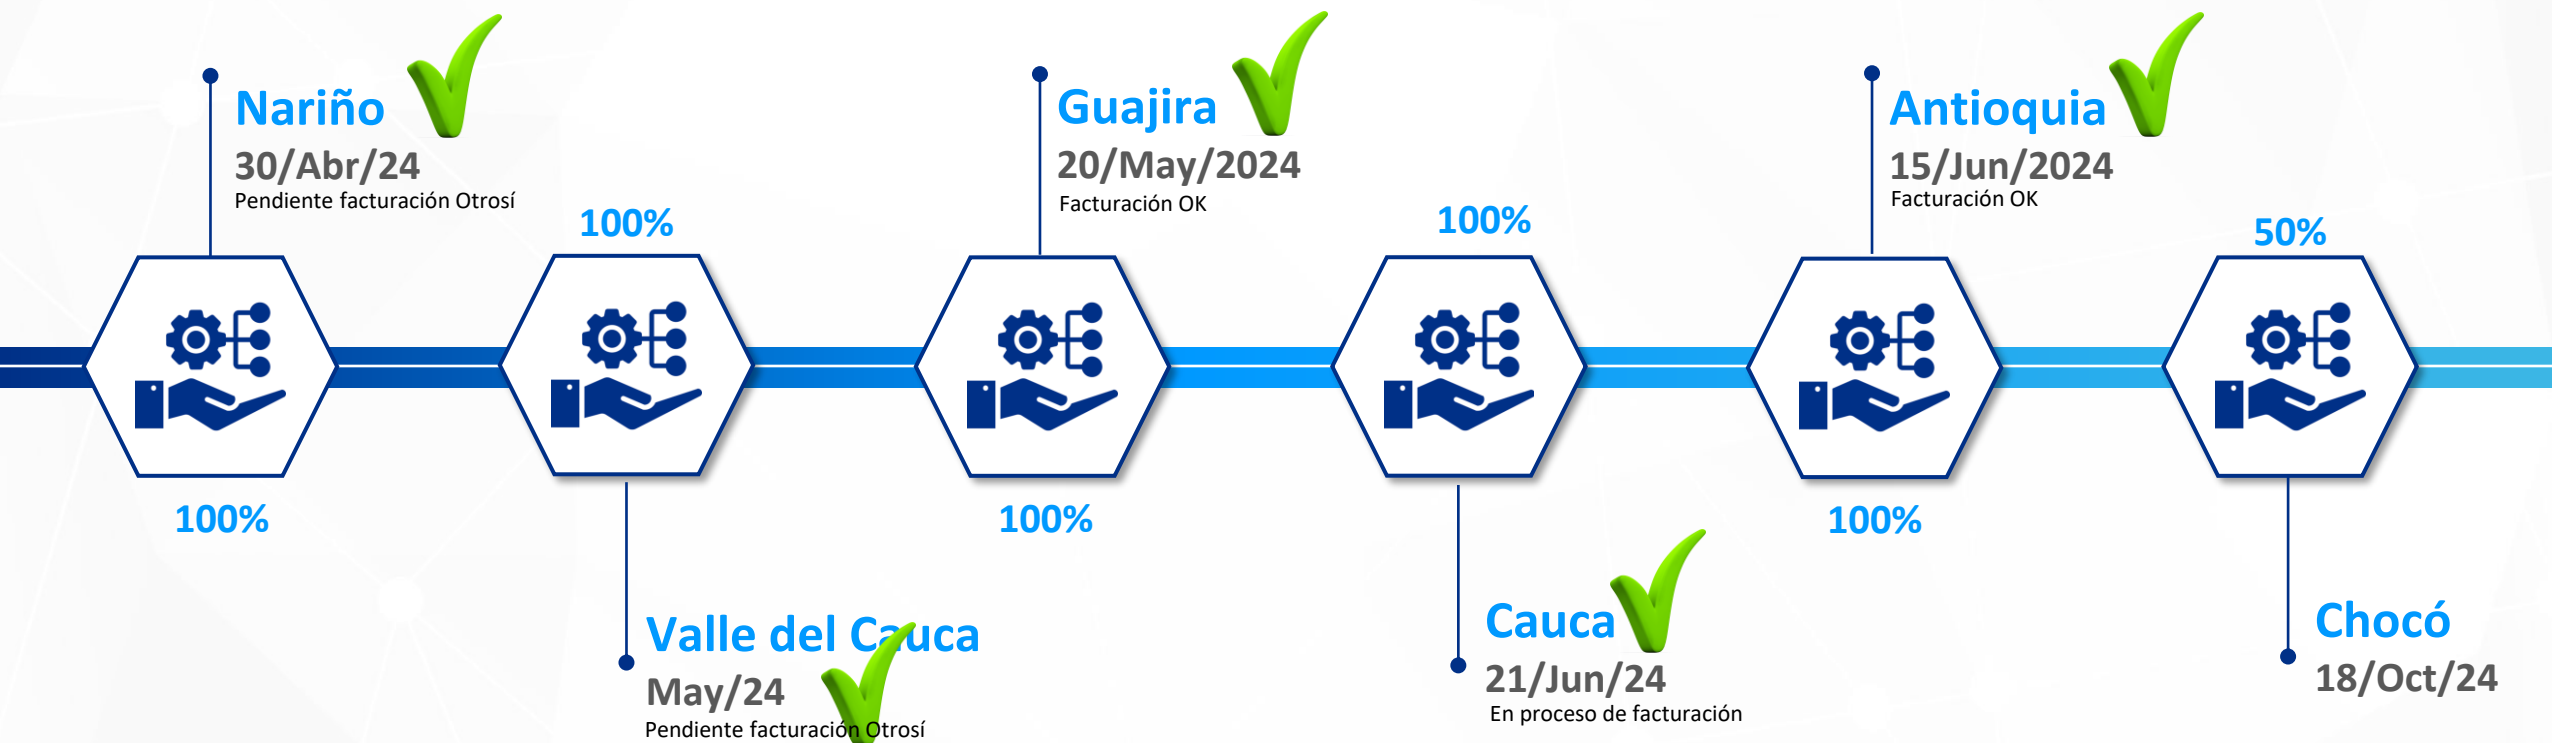


Avance ejecución Chocó

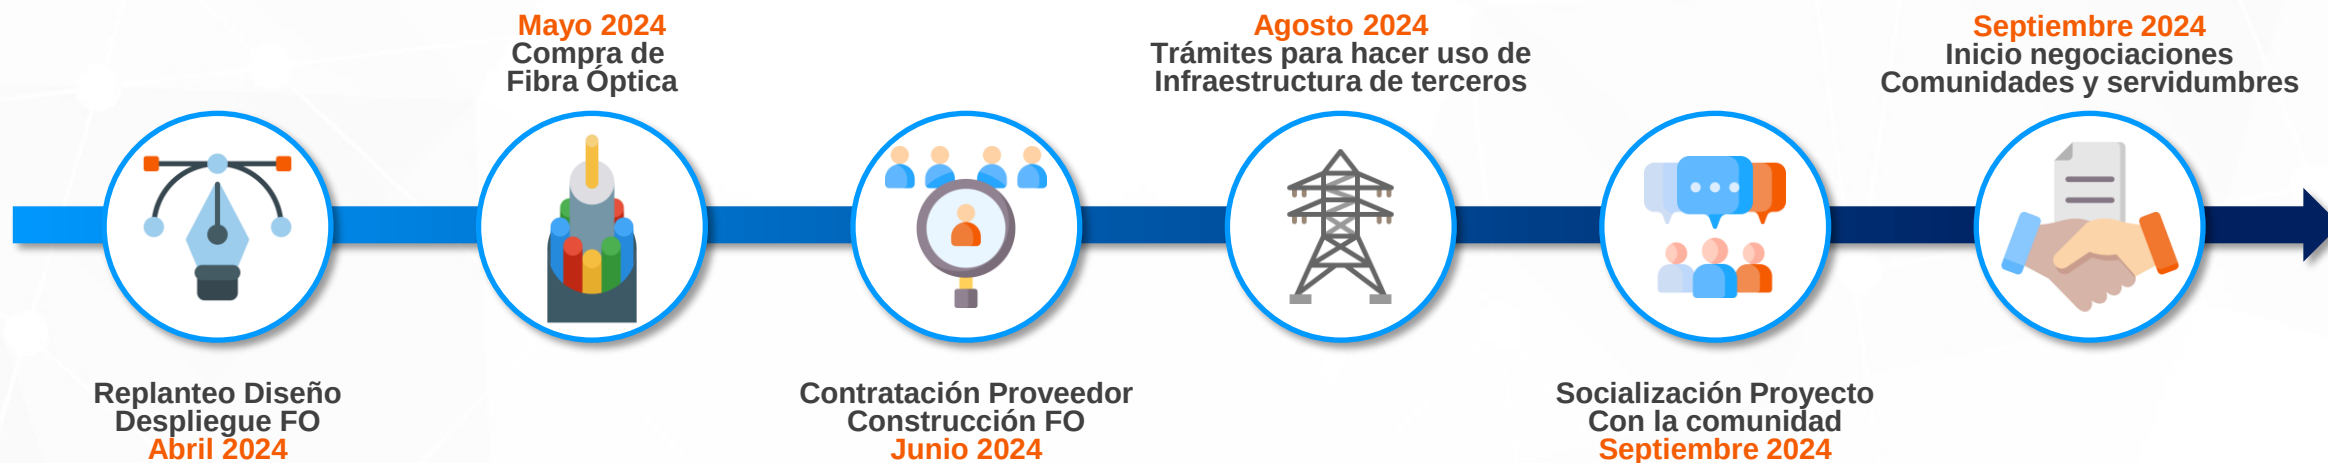

- ✓ Implementación de la FO se iniciará la primera semana de septiembre en el tramo Medellín – Peñalisa, Peñalisa - Carmen de Atrato
- ⚠ Tramo Carmen de Atrato – Quibdó, iniciará despliegue una vez se cuente con el concepto de consultas previas

Avance ejecución Chocó

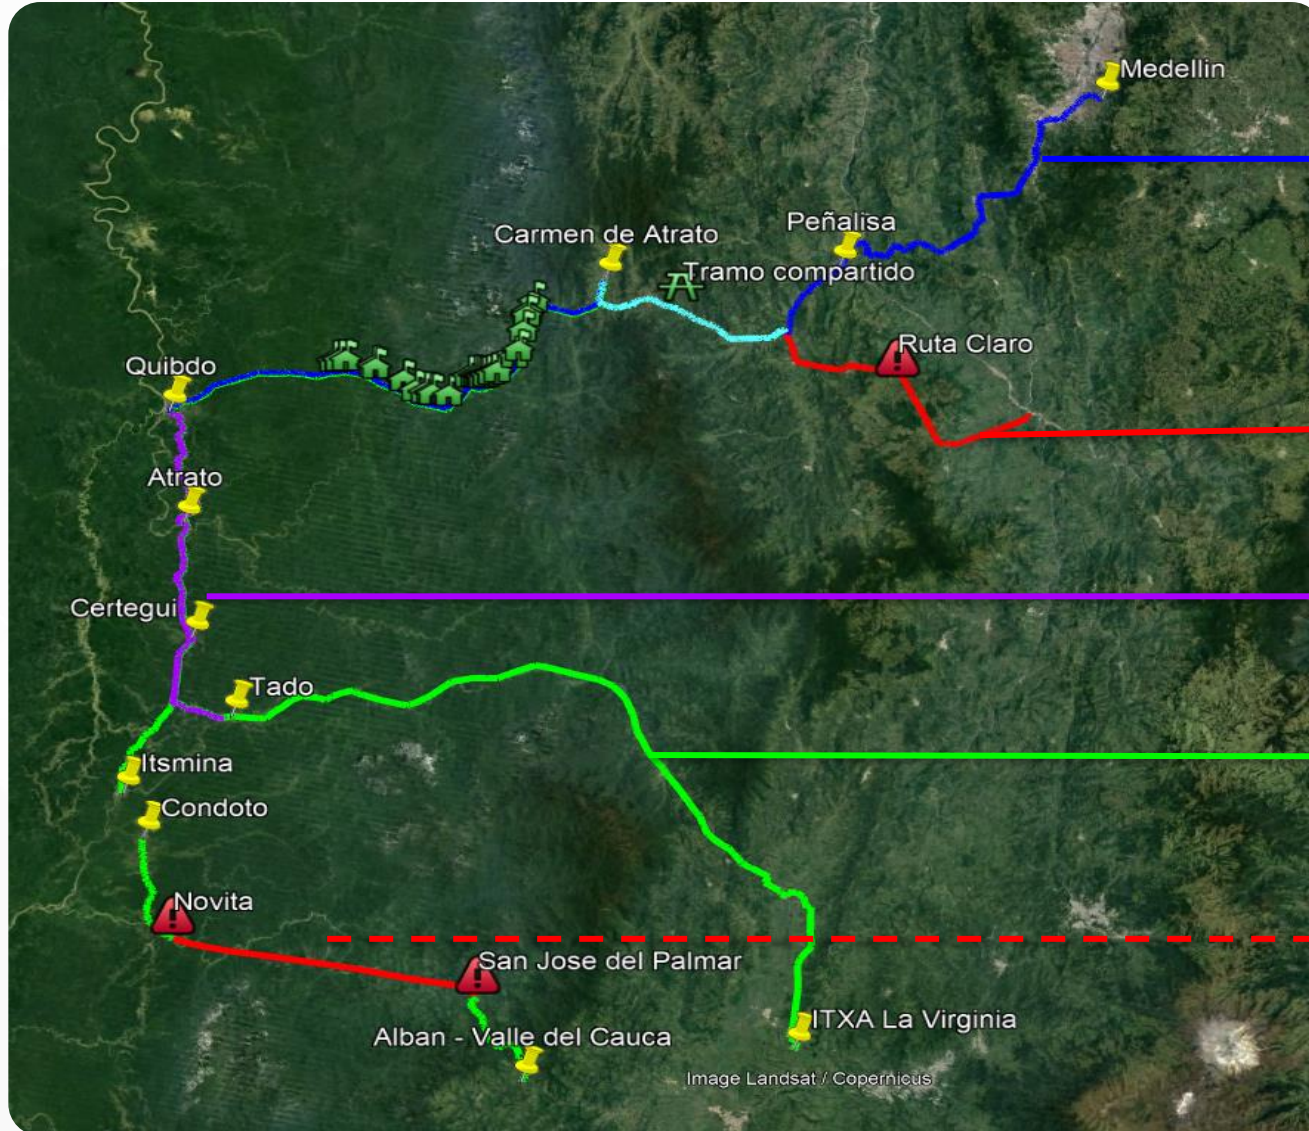

Ruta AE2 – Internexa

Tramo Medellín – Peñalisa
Peñalisa – Carmen de Atrato

Ruta Claro

La Pintada – Carmen de Atrato

Ruta AE4 – Internexa

Tramo Quibó – Tado

Red Azteca

La Virginia – Carmen de Atrato

Novita – San José de Palmar

- ▶ Reserva forestal del Pacífico
- ▶ En el AE4 se incluyen con solución satelital

Ejecución Financiera

VALOR TOTAL DEL AE2 \$ 270,588,385,506

RECURSOS DESEMBOLSADOS A ITX \$ 42,107,543,688

16%

FACTURAS EMITIDAS \$ 4,742,886,762

- Capacidad Fija Julio
- Capacidad variable junio y julio

PENDIENTE FACTURACIÓN \$ 14,134,893,504

- Expansión Nariño
- Expansión Cauca y Valle del Cauca

Informes de seguimiento

No.	Mes de reporte	Radicado MINTIC	Observaciones supervisión	Estado conformidad
1	Febrero	241017622 del 07/03/2024 241045630 del 11/06/2024	242062473 del 05/06/2024	Aprobado en comité operativo del 05 de julio
2	Marzo	241025608 del 05/04/2024 241034383 del 02/05/2024 241045634 del 11/06/2024	242041937 del 25/04/2024 242062473 del 05/06/2024	Aprobado en comité operativo del 05 de julio
3	Abril	241036024 del 08/05/2024 241045619 del 11/06/2024	242062473 del 05/06/2024	Aprobado en comité operativo del 05 de julio
4	Mayo	correo electrónico del 12/06/2024 241046808 del 18/6/2024 241051661 del 02/07/2024 241054783 del 11/07/2024	242070007 del 24/06/2024	Aprobado en comité operativo del 25 de julio
5	Junio	241054667 del 08/07/2024	242099177 del 16/08/2024 (informe enviado el 27/08/2024)	En subsanación ITX
6	Julio	241063846 del 08/08/2024	242103339 del 26/08/2024 (informe enviado el 27/08/2024)	En subsanación ITX

Riesgo Alto

R1 – Riesgo Reputacional derivado de la administración de los recursos por parte de actores diferentes a internexa

R2 – Dificultades para lograr la sostenibilidad en el mediano y largo plazo

R3 – Impactos por situaciones sociales, orden público y ambientales

Riesgo Medio

R4 – Falta de alineación en los acuerdos y comunicaciones entre los grupos de interés del proyecto

R5 – Desfase o desviaciones en el diseño / implementación de la red

R6 – Fallas en la integración del modelo operativo con JSPs

R7 – Distorsión de mercado y afectación de competencia

Riesgo Bajo

R8 – Dificultades de gestión derivadas del principio de anualidad en el proyecto

R9 – Dificultades para realizar una planeación adecuada del proyecto

R10 – No disponer oportunamente de personal con competencias y capacidades requeridas

R11 – Riesgo de liquidez

Acompañamiento ISP's

Convocatoria

Convocatoria 001 de 2023



Antioquia

Cauca

Chocó

La Guajira

Nariño

Valle del Cauca

Integración ISP

ISP	Municipio	Integrado	Adjudicados	Aprobados
GRUPO SERVINET S.A.S	Andalucía	✓	2,100	0
CIRTEL COMUNICACIONES.	Buenaventura	✓	8,000	0
SERPRONET SAS.	Buenaventura	✓	4,000	0
CIRTEL COMUNICACIONES.	Bugalagrande	✓	828	0
FIBRANETPLUS S.A.S.	Bugalagrande	✓	665	0
TIERRANET S.A.S.	Caloto	✓	1,211	0
INTERNET Y TELEVISIÓN S.A.S	Corinto	✓	1,304	0
TIERRANET S.A.S.	Corinto	✓	1,188	0
ERC EXPLORER REDES Y COMUNICACIONES SAS	La Florida	✓	210	0
SAN MIGUEL TELECOMUNICACIONES SAS	La Unión	✓	1,000	0
WAYIRA NET S.A.S.	Maicao	✓	17,848	0
ERC EXPLORER REDES Y COMUNICACIONES SAS	Nariño	✓	387	0
TIERRANET S.A.S.	Padilla	✓	1,200	0
TIERRANET S.A.S.	Puerto Tejada	✓	6,182	0
TIERRANET S.A.S.	Santander De Quilichao	✓	2,061	0
VIVE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	Santander De Quilichao	✓	2,432	0



144,225

Hogares Objetivo



53,490

Hogares Adjudicados



10,927

Hogares Instalados



7.6 %


% Avance Objetivo



20.4 %

% Avance Adjudicado

Avance ISP

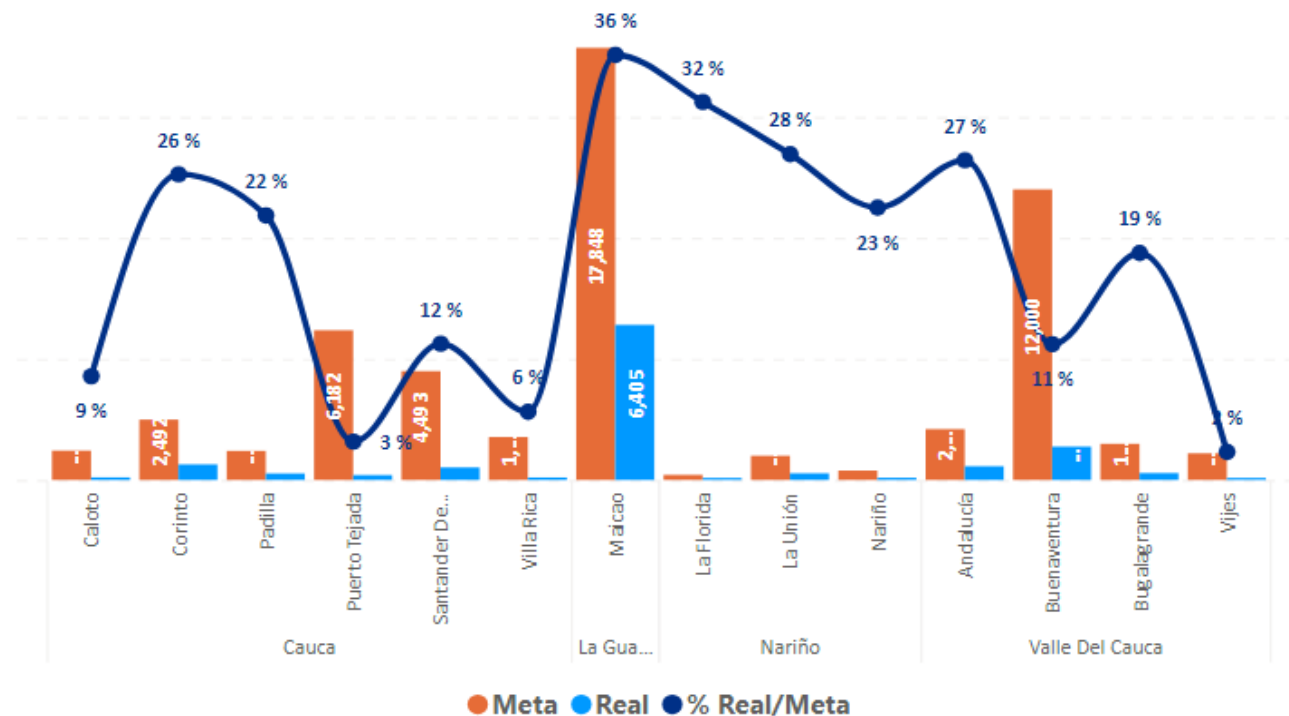

¡Juntos hacemos que pase!

Acompañamiento ISP's

AVANCE DE CONEXIONES

Total: 53.490
Hogares: 10.927
20,6 %

VALIDACION HOGARES

ITX: 5652
En proceso: 1400
ISP: 7


DESARROLLO DE CAPACIDADES

- Responsabilidad de los ISP Ante los entes regulatorios de Colombia
- Estrategias de mercadeo y comerciales


NUEVOS ISP

- Visitas virtuales ISP
- Seguimiento nuevo contrato fomento
- Seguimiento SST


Convocatoria 1 2023
HOGARES META VS CONECTADO

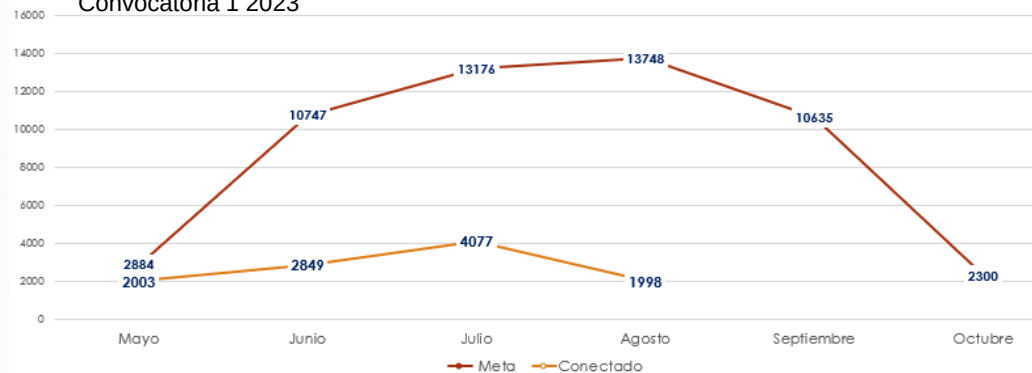

SEMANAS DE INSTALACION

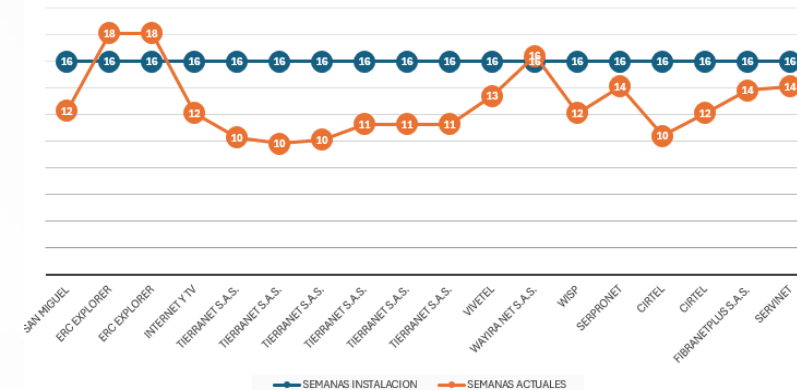

SOPORTES REVISADOS

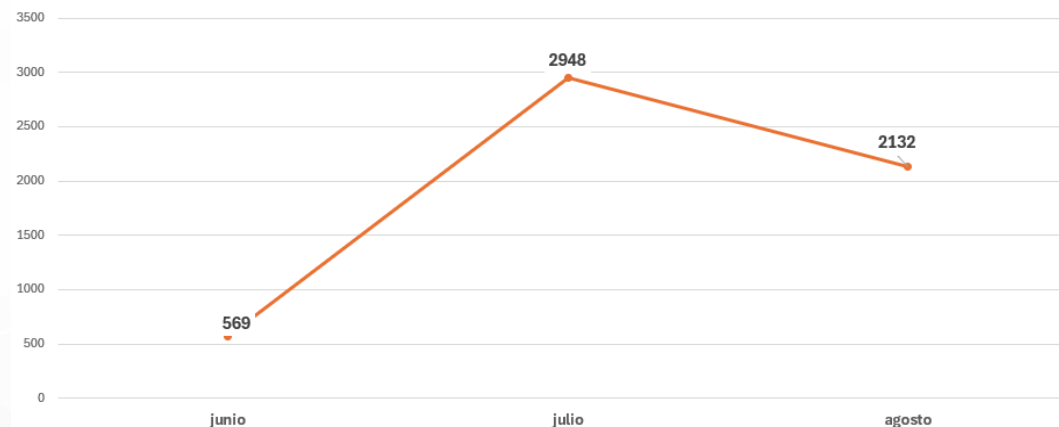

Acuerdo Específico 4




Una Empresa ISA

Alcance Acuerdo Específico 4

Cifras en COP

32
Municipios

Valor Total del
Acuerdo
+ \$ 210 MM COP
IVA Incluido

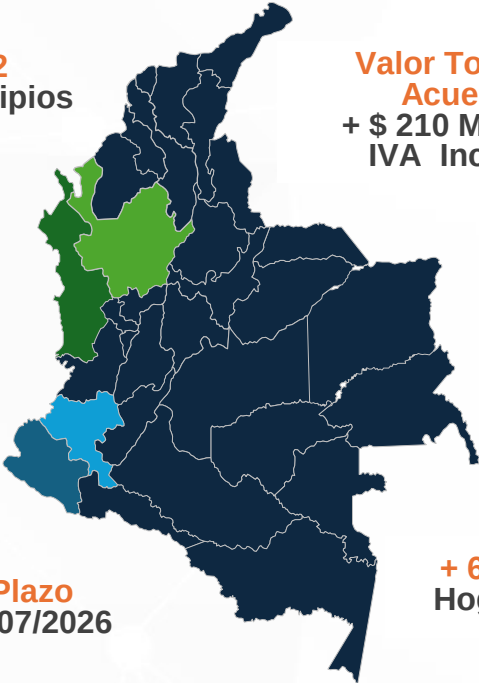

Plazo
31/07/2026

+ 62 Mil
Hogares

Departamento	Cant. Municipios
Antioquia	1
Cauca	1
Chocó	28
Nariño	2
Total General	32

CHOCÓ	
ACANDÍ	1.732
ALTO BAUDÓ	861
ATRATO	838
BAGADÓ	594
BAHÍA SOLANO	1.601
BAJO BAUDÓ	1.772
BOJAYÁ	237
CARMEN DEL DARIÉN	559
CÉRTEGUI	947
CONDOTO	2.682
EL CANTÓN DEL SAN PABLO	825
EL LITORAL DEL SAN JUAN	386
ISTMINA	5.109
JURADÓ	640
LLORÓ	909
MEDIO ATRATO	224
MEDIO BAUDÓ	571
MEDIO SAN JUAN	713
NÓVITA	1.008
NUQUÍ	283
RÍO IRÓ	414
RÍO QUITO	423
RIOSUCIO	4.268
SAN JOSÉ DEL PALMAR	336
SIPÍ	195
TADÓ	3.092
UNGUÍA	1.092
UNIÓN PANAMERICANA	828
TOTAL HOGARES	33139

NARIÑO	
FRANCISCO PIZARRO	1.713
SAN ANDRÉS DE TUMACO	24.470
TOTAL HOGARES	26.183


CAUCA	
TIMBIQUÍ	1.888

ANTIOQUIA	
VIGÍA DEL FUERTE	1.099

	AE2	AE4
Municipios	38	32
Municipios de Paso o Tránsito	2	5
Departamentos	6	4
Cantidad Hogares	144.225	62.309
Troncales Satelital Lineal	0	15
Troncales con Respaldo Satelital	0	10
Municipios con Nuevo Tendido FO	11	4
KM FO Nueva a Tender	327	74
KM FO Red Propia Existente	609	70
% Satelitales Lineales	0%	46%
% Satelitales Respaldo	0%	31%
BW (Mbps)*	25	25

Hitos Alcanzados

- ✓ Kick Off Interno.
- ✓ Trámite de pólizas.
- ✓ Alineación con Fiducoldex.
- ✓ Elaboración de Anexos técnicos.
- ✓ Asignación cuenta de ahorros para Acuerdo 4.
- ✓ Reunión Kick Off con MINTIC.
- ✓ Generación de SOLPED para la compra de 75km de FO.
- ✓ Generación de SOLPED para la compra asesoría consultas previas.
- ✓ Reunión con revisoría fiscal.
- ✓ Mesa de trabajo con MINTIC sobre anexo técnico satelital (se recibieron recomendaciones)
- ✓ Próxima radicación de concepto consulta previa

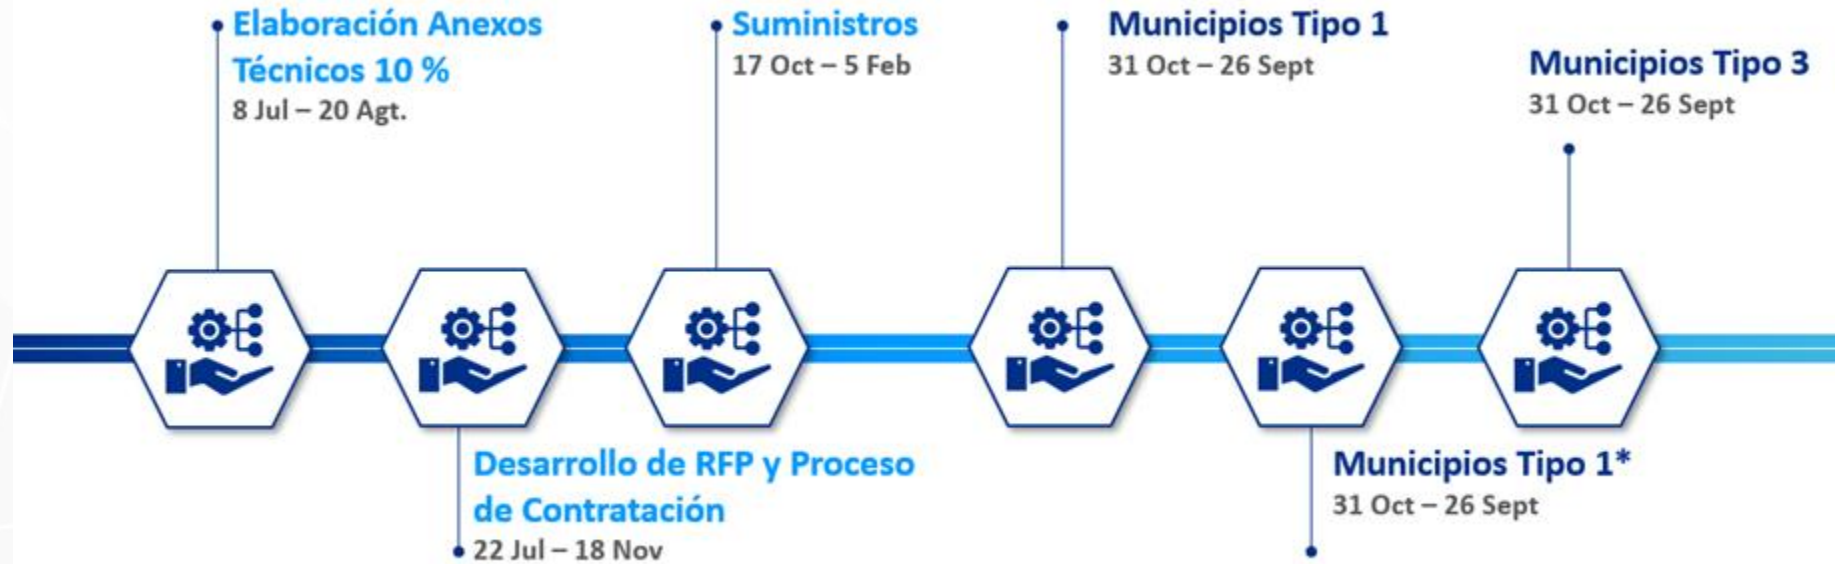

Juntas de Internet

Comunidades de Conectividad




Una Empresa ISA

Escenario 1



Escenario 2

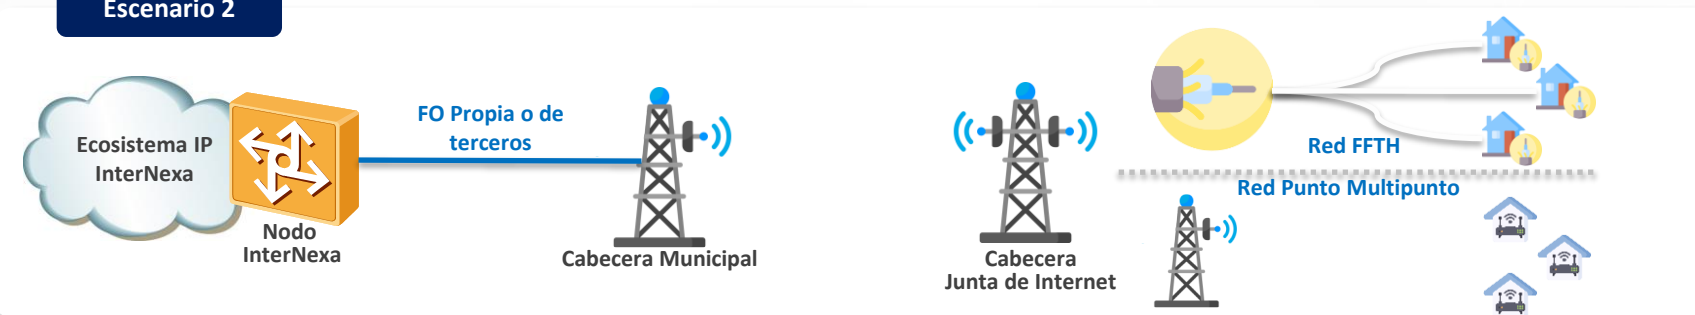

Escenario 3





Presupuesto Estimado

190.000 M


Juntas Internet

~570

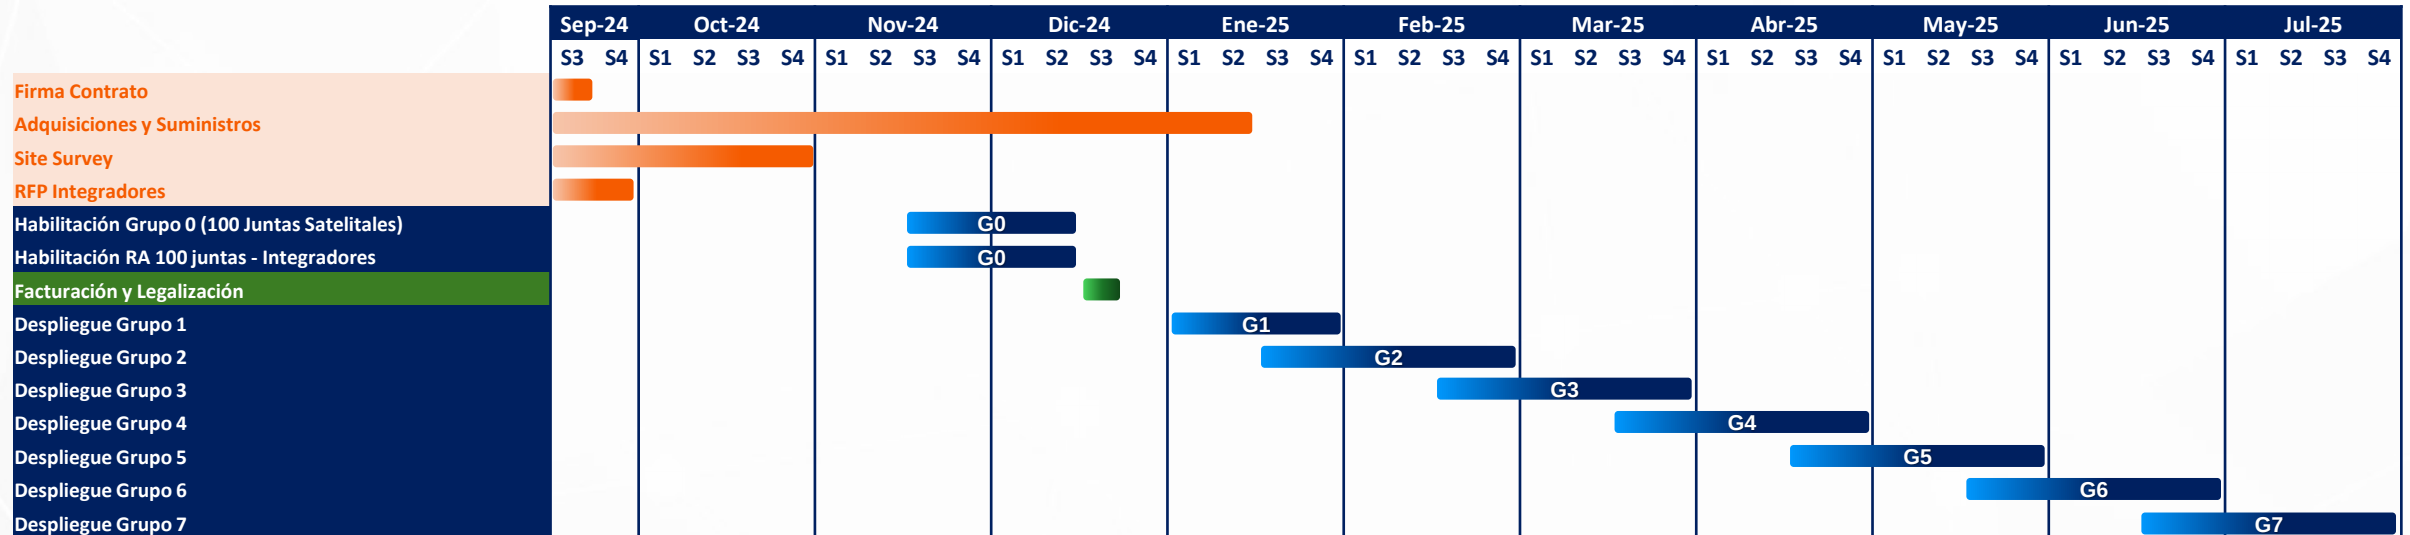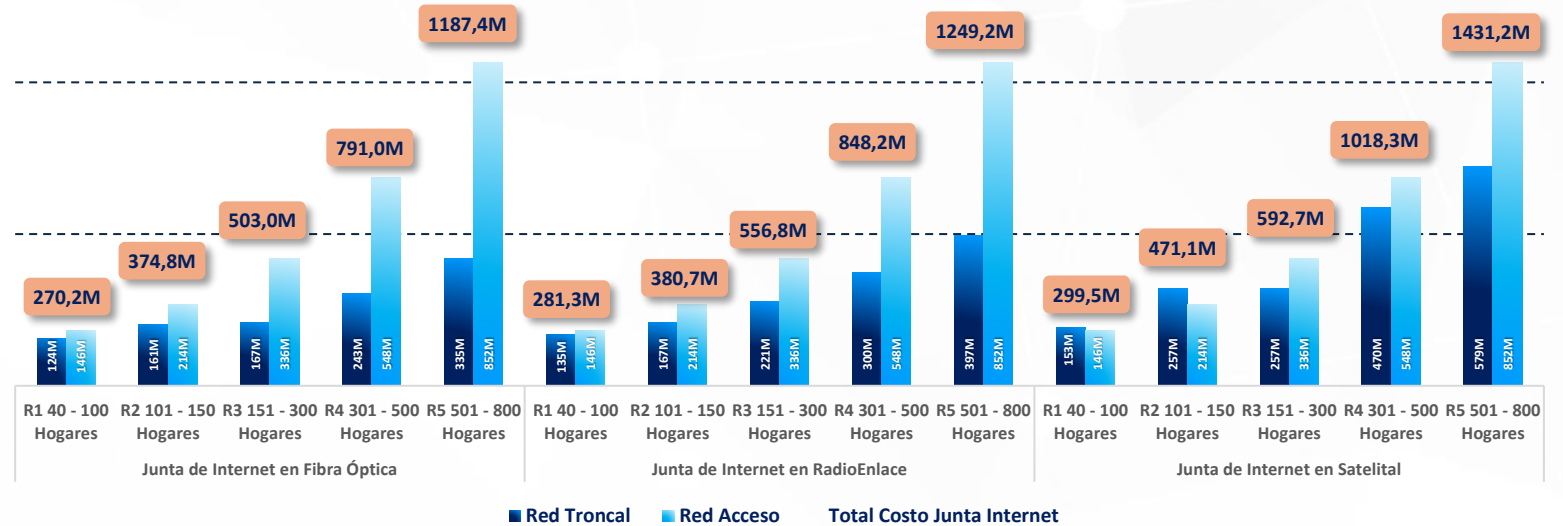

¡Gracias!

¡Juntos hacemos que pase!



I N T E R N E X A

Una Empresa ISA

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 1CC3A2E7-1F2B-4DAD-9A90-1F9428A9BC58
Asunto: GDOTICFM007 Acta CO_AE4_002- PNC- Comite Operativo 20240829 + Anexo
A. Número de contrato:
B. Tipo:
C. Número de cláusula:
D. Correo del ordenador de gastos:
Sobre de origen:
Páginas del documento: 23
Páginas del certificado: 5
Firma guiada: Activado
Sello del identificador del sobre: Activado
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Estado: Completado

Autor del sobre:
PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ
Calle 12 sur 18 - 168, Bloque 5
Medellín, Bogota 00000
pruiz@internexa.com
Dirección IP: 152.202.76.82

Seguimiento de registro

Estado: Original
05/12/2024 23:55:38
Titular: PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ
pruiz@internexa.com
Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante

JOHN FREDY CHIA RAMIREZ
jchia@internexa.com
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firma

Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 186.102.2.207
Firmado con un dispositivo móvil

Fecha y hora

Enviado: 06/12/2024 0:01:42
Visto: 06/12/2024 5:57:13
Firmado: 06/12/2024 5:58:55

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
Aceptado: 06/12/2024 5:57:13
ID: bc807d5f-ff95-44cb-9d48-65b333bef9f2

LUIS FERNANDO RONCANCIO
lfroncancio@mintic.gov.co
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 161.18.218.239

Enviado: 06/12/2024 0:01:43
Visto: 06/12/2024 7:53:48
Firmado: 06/12/2024 7:54:23

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
Aceptado: 06/12/2024 7:53:48
ID: 5452306f-5b9e-4a1b-bcef-7d2c9e7b4b3b

MELISSA LOZANO
klozano@internexa.com
PMO
COLOMBIA
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 161.18.157.30

Enviado: 06/12/2024 0:01:43
Visto: 06/12/2024 8:50:04
Firmado: 06/12/2024 8:50:19

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
No se ofreció a través de DocuSign


DENICE BIBIANA ACERO
dacero@mintic.gov.co
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado por:

6AAA3F2A9BB14AE...

Adopción de firma: Imagen de firma cargada
Utilizando dirección IP: 181.59.2.127

Enviado: 06/12/2024 8:50:22
Reenviado: 10/12/2024 16:58:32
Visto: 13/12/2024 8:41:00
Firmado: 13/12/2024 8:42:10

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 13/12/2024 8:41:00 ID: 933dc178-b8eb-41bf-a4bc-44747b3f7638		
DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO djaramillo@internexa.com DIRECTOR PNC COLOMBIA Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 190.71.242.10	Enviado: 06/12/2024 8:50:22 Visto: 06/12/2024 9:26:27 Firmado: 06/12/2024 9:29:04
Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign		
JUAN MANUEL GUERRERO jguerrero@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A... Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 190.145.189.98	Enviado: 06/12/2024 8:50:23 Reenviado: 10/12/2024 16:58:33 Visto: 12/12/2024 14:50:31 Firmado: 12/12/2024 14:50:50
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 12/12/2024 14:50:31 ID: 077d2fb9-3388-4e75-9bfb-018d41e2ab1a		
Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
ANDRES FELIPE CARRILLO acarrillo@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Copiado	Enviado: 13/12/2024 8:42:12
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 18/10/2024 15:13:51 ID: c1414812-ebfa-4063-82a9-7d422cb74299		
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	06/12/2024 0:01:43
Certificado entregado	Seguridad comprobada	12/12/2024 14:50:31
Firma completada	Seguridad comprobada	12/12/2024 14:50:50
Completado	Seguridad comprobada	13/12/2024 8:42:12
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
Divulgación de firma y Registro electrónicos		

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, Internexa (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Internexa:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: dalvarez@internexa.com

To advise Internexa of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.

To request paper copies from Internexa

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Internexa

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X
Browsers:	Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above (Mac only)
PDF Reader:	Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files
Screen Resolution:	800 x 600 minimum

Enabled Security Settings:	Allow per session cookies
----------------------------	---------------------------

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and browsers are not supported.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify Internexa as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by Internexa during the course of my relationship with you.
