




MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 7	Vigencia: 27/06/2023	Código: F-E-SIG-25



ACTA DE REUNIÓN N° 35	FECHA DE LA REUNIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	05	02	2026
	HORA DE INICIO		PM
REUNIÓN INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPARTAMENTO / CIUDAD	Bogotá
REUNIÓN EXTERNA	<input type="checkbox"/>	DEPENDENCIA QUE PRESIDE	

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN	
TEMA	Avances Proyecto #83489349 GIZ
OBJETIVO	Reunión de Seguimiento de Proyecto

ORDEN DEL DÍA / AGENDA		
No.	TEMA	RESPONSABLE
1	Línea de tiempo del proyecto	Richard Ardila-3DStudio
2	Actividades Ejecutadas	Richard Ardila- 3DStudio
3	Próximas Actividades	Richard Ardila-3DStudio
4	Compromisos	Richard Ardila-3DStudio
5	Riesgos	Richard Ardila-3DStudio
6	Métricas	Richard Ardila-3DStudio

ASISTENTES					
No.	NOMBRE	FIRMA	ASISTENCIA		ENTIDAD/ DEPENDENCIA
			PRESENCIAL	VIRTUAL	
1	Angie Roncancio			X	MinAmbiente
2	Richard Ardila			X	3DStudio
3	Mónica Legizamo			X	3DStudio

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

4	Felipe Beltran			X	3DStudio
5	Katherin García			X	3DStudio

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES <i>(Si los hay)</i>					
No.	TEMA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Envío de link de Grabaciones de sesiones del proyecto	Francisco Moreno/MinAmbiente	100	Se tiene programado un envío masivo al finalizar cada mes.	Mensual
2	Agendamiento de reunión con lideres de MinAmbiente	Angie Roncancio/MinAmbiente	0	Se pospone para el 19 de febrero del 2026	Pendiente
3	Angie solicita programar una sesión para revisar el manual de usuario.	Angie Roncancio/MinAmbiente	100	Se realiza 04/02/2026	Finalizado
4	Evaluar la viabilidad de un ambiente local de 3DStudio para que Angie realice pruebas funcionales.	Felipe Beltran-3DStudio	0	N/A	Pendiente

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La profesional del equipo MinAmbiente Angie Roncancio da un breve saludo y cede la palabra al ingeniero Richard del equipo 3DStudio quien presenta los avances del proyecto a hoy.

Avances reportados:

1- Línea de Tiempo:

- El proyecto se encuentra en sus dos últimas fases: la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales, y posteriormente la salida a producción.

2- Actividades ejecutadas:

- El día de hoy, 05 de febrero, se realizó la socialización del Manual de Usuario con la profesional Angie, del equipo de MinAmbiente.
- Se analizó el acceso funcional al ambiente de pruebas por parte de 3DStudio para MinAmbiente, identificando que aún no es posible habilitar un enlace de acceso, dado que la infraestructura se encuentra en proceso de evaluación por parte de 3DStudio.
- Se están revisando y realizando ajustes a los informes de casos de prueba.
- Durante la socialización del Manual de Usuario se revisaron la HU 9 y el prototipo 9, concluyendo que la visualización de grafos e índices no aplica en esta sección y que estos solo se mostrarán cuando el usuario final consulte la ficha técnica de cada bien o servicio.

3- Actas de Reunión

- Se cuenta con treinta y tres (33) actas aprobadas, esta pendiente el acta 34 de la sesión anterior.

4- Próximas actividades

- Configurar e Instalar ambientes según manual de despliegue entregado por 3DStudio, Angie toma la palabra y manifiesta que el personal necesario de parte del Ministerio ya se encuentra contratado y esta en etapa de capacitación.
- Realizar las pruebas funcionales, ligada a la actividad del ítem anterior.
- Una vez se disponga del ambiente de pruebas del Ministerios se ejecutaran las Pruebas no funcionales programadas en cronograma.

5- Compromisos

- Se realizo despliegue decimo (10) de Cambios al GITLAB para el ambiente previsto para aplicativo por parte de 3DStudio.
- Falta la retroalimentación de la aprobación del documento de arquitectura cargado en la wiki por parte del Ministerio.


- Se continua en el análisis y viabilidad de entregar un link del ambiente de prueba de 3DStudio para que la funcional del Ministerio pueda ejecutar las pruebas de recorrido del aplicativo.

6- Riesgos

- Riesgo asociado al no despliegue oportuno de cambios (frontend y backend) del Ministerio, requeridos para la fase de desarrollo y pruebas.

7- Métricas

- El indicador SPI para el día de hoy arroja un resultado del 80% lo que representa un atraso en la ejecución del proyecto

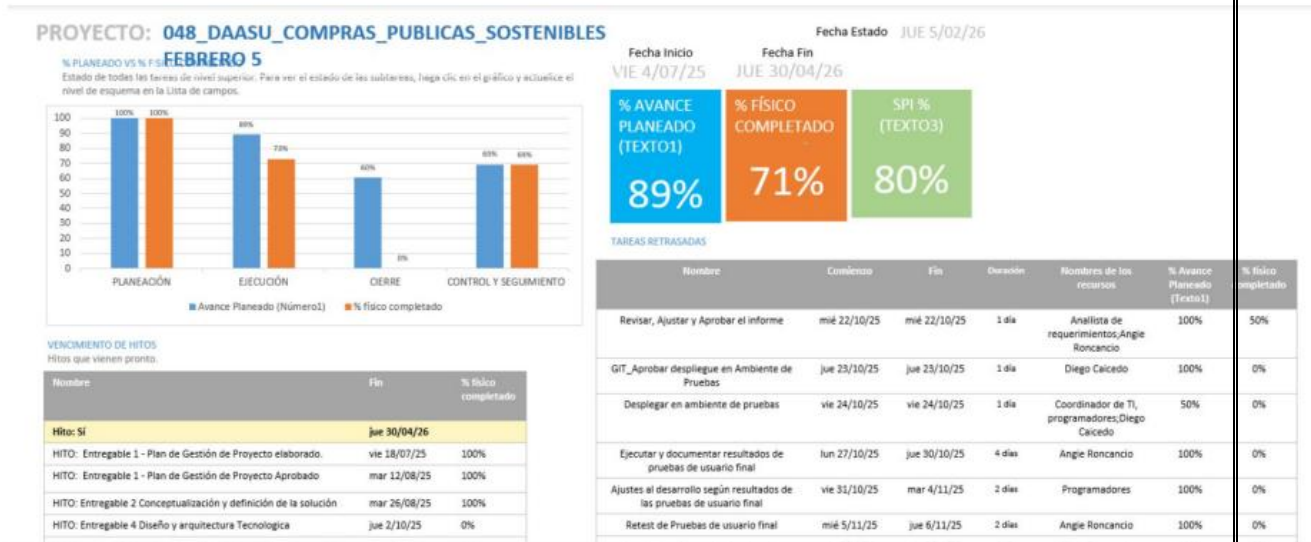

Conclusiones

- 1- Con respecto al riesgo identificado desde el 18 de diciembre, el retraso en el despliegue de cambios en los ambientes del Ministerio, la persona encargada de esta actividad en MinAmbiente ya se encuentra contratada, está en inducción; esto con el fin de mitigar el riesgo materializado. Sin embargo, se sigue buscando la viabilidad de obtener un link de acceso desde el ambiente de pruebas de 3DStudio y con esto solucionar el avance de las pruebas funcionales y de recorrido.
- 2- El indicador SPI arroja un porcentaje de 80%, lo cual refleja un atraso a la fecha dado por actividades que aun se encuentran en proceso.

LISTA DE EVIDENCIAS

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros)

The screenshot displays a meeting interface with five participant cards. Each card features a circular profile icon and a name label at the bottom. The cards are arranged in a grid: two in the top row, two in the middle row, and one centered in the bottom row. The card for 'Richard's Notetaker (Otter.ai) (No comprobado)' is highlighted with a blue border. The other cards are for 'Katherin Garcia-3DStudio', 'Angie Katherine Roncancio Sanchez', 'Richard Ardila (No comprobado)', and 'Leguizamo Perez, Monica (No comprobado)'.

COMPROMISOS *(Si los hay)*

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Revisión y aprobación del documento de Arquitectura FINAL en la WIKI	MinAmbiente	05/02/2026	12/02/2026
2	Envío de link para acceso al ambiente de pruebas-	3DStudio	05/02/2026	12/02/2026
3	Ajustes y aprobación del manual de usuario	MinAMbiente	05/02/2026	12/02/2026

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica):	DIA	MES	AÑO
	12	02	2026

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	FECHA	DIA	MES	AÑO
Katherin Garcia		05	02	2026



3DStudio

W E B C O M M U N I C A T I O N

BIENVENIDOS

Conceptualización, diseño, levantamiento de requerimientos, desarrollo, pruebas funcionales y no funcionales, despliegue y acompañamiento en la implementación de una herramienta tecnológica enfocada en compras públicas sostenibles con énfasis en análisis costo beneficio.

05/02/2026



3DStudio
WEB COMMUNICATION

giz

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Ambiente



Agenda



Línea de tiempo del proyecto- Timeline



Actividades ejecutadas



Próximas actividades



Compromisos




Riesgos




Métricas

Timeline

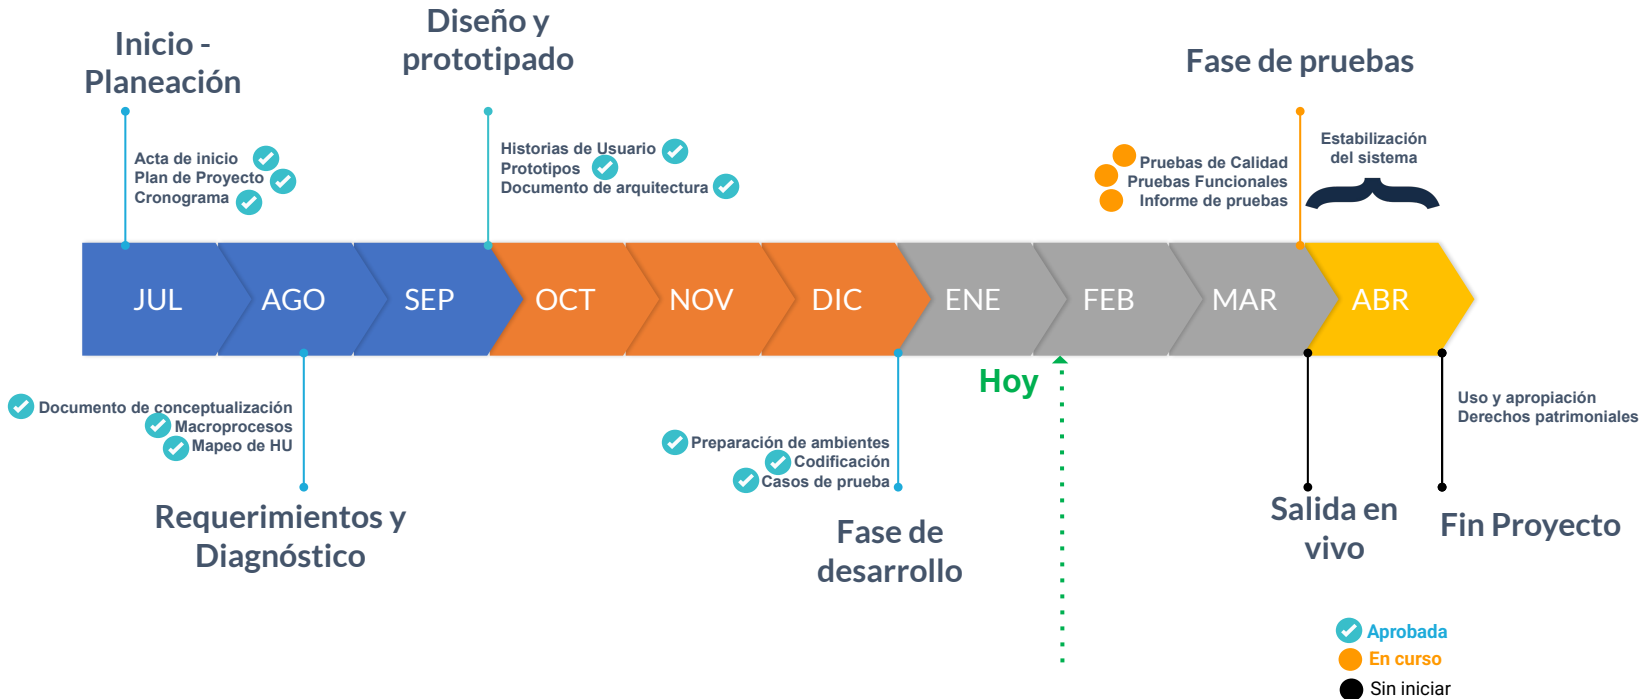

Actividades Ejecutadas

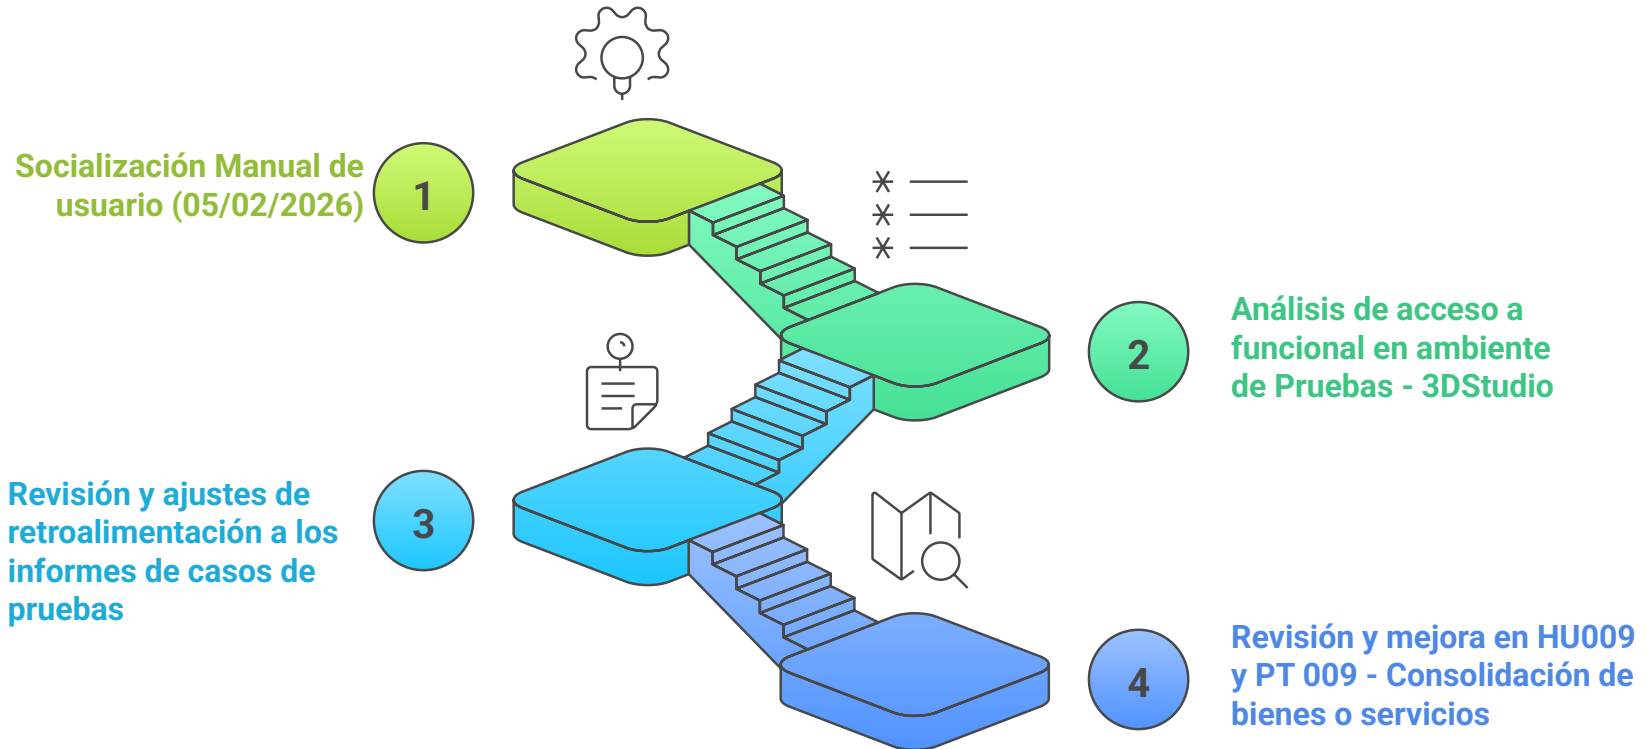

Actividades Ejecutadas

Asunto de la sesión	Estado	Fecha sesión	Enviado por 3DS	Medio de envío
Reunión Funcional - Validación de tabla de costos	Aprobada	07/11/2025	07/11/2025	Correo
Reunión de Seguimiento al proyecto No. 27	Aprobada	13/11/2025	18/11/2025	Correo
Reunión de Seguimiento al proyecto No. 28	Aprobada	20/11/2025	25/11/2025	Correo
Reunión Funcional - Tabla de Costo y otros temas	Aprobada	26/11/2025	27/11/2025	Correo
Reunión de Seguimiento al proyecto No. 30	Aprobada	27/11/2025	28/11/2025	Correo
Reunión de Seguimiento al proyecto No. 31	Aprobada	05/12/2025	11/12/2025	Correo
Reunión de Seguimiento al proyecto No. 32	Aprobada	11/12/2025	17/12/2025	Correo
Reunión de Seguimiento al proyecto No. 33	Aprobada	18/12/2025	23/12/2025	Correo
Reunión de Seguimiento al proyecto No. 34	Revisión MinAmbiente	29/01/2026	29/01/2026	Correo

TOTAL ACTAS : 34

TOTAL APROBADAS : 33

TOTAL PENDIENTES : 1

Próximas actividades

**Configurar e
Instalar
ambientes según
manual de
despliegue**

MinAmbiente

**Realizar Pruebas
Funcionales**


MinAmbiente

**Ajustes y
aprobación de
Manual de usuario**

MinAmbiente

**Realizar pruebas
de seguridad,
calidad en código,
carga y estrés e,
integrales**

**MinAmbiente
3DStudio**



Compromisos

Tema	Responsable	% de Avance	Observaciones	Fecha de cumplimiento
Cargue de cambios al GITLAB	3DStudio	100%	Cambio frontend y backend	04/02/2026
Despliegue de Cambios al ambiente previsto para aplicativo	MinAmbiente	0%	1-Despliegue 20/11/2025 2-Despliegue 27/11/2025 3. Despliegue 05/12/2025 4. Despliegue 11/12/2025 5. Despliegue 18/12/2025 6. Despliegue 26/12/2025 7. Despliegue 22/01/2026 8. Despliegue 27/01/2026 9. Despliegue 29/01/2026 10. Despliegue 04/02/2026	Pendiente
Documento de arquitectura FINAL	MinAmbiente	0%	Falta revisión y aprobación de Documento cargado en al WIKI	Pendiente
Acceso ambiente de pruebas 3DStudio - Pruebas funcionales	3DStudio - MinAmbiente	80%	Se validó y se espera enviar link de acceso a la funcional	Pendiente
Ajustes y aprobación de Manual de usuario	3DStudio - MinAmbiente	0%	Se realizó socialización 05/02/2026	Pendiente

Riesgos

Id Riesgo	Descripción Riesgo	Causa Raíz	Fecha identificación	Tipo de Riesgo (Amenaza/Oportunidad)	Tipo de Impacto (Directo, Indirecto)	Objetivo del proyecto afectado (Tiempo, costo, alcance, calidad)
1	No despliegue de cambios (Frontend y Backend) para la fase de desarrollo.	<p>Dependencia del equipo TIC del Ministerio para la habilitación del despliegue de cambios.</p> <p>Retrasos en los procesos internos del Ministerio para el despliegue y/o baja priorización de las actividades asociadas al proyecto.</p>	18/12/2025	Amenaza	Directo	Alcance


Id Riesgo	Probabilidad Rara vez (1) Improbable (2) Posible (3) Probable (4) Casi seguro (5)	Impacto Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófico (5)	Valor	Estrategia Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.	Plan de respuesta a los riesgos	
					Actividades	Responsables
1	3	5	Zona de riesgo alta	Mitigar	Definir y acordar con el equipo TIC del Ministerio un cronograma de habilitación y despliegue con responsables claros.	MinAmbiente / GIZ

PROYECTO: 048_DAASU_COMPRAS_PUBLICAS_SOSTENIBLES

Fecha Estado JUE 5/02/26

% PLANEADO VS % FÍSICO FEBRERO 5

Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtarefas, haga clic en el gráfico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.

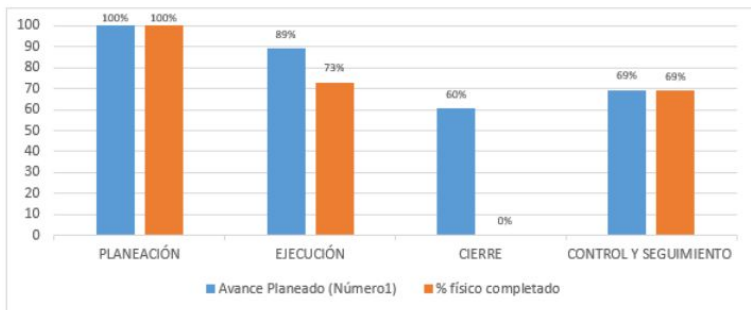

Fecha Inicio
VIE 4/07/25

Fecha Fin
JUE 30/04/26



TAREAS RETRASADAS

VENCIMIENTO DE HITOS

Hitos que vienen pronto.

Nombre	Fin	% físico completado
Hito: Sí	jue 30/04/26	
HITO: Entregable 1 - Plan de Gestión de Proyecto elaborado.	vie 18/07/25	100%
HITO: Entregable 1 - Plan de Gestión de Proyecto Aprobado	mar 12/08/25	100%
HITO: Entregable 2 Conceptualización y definición de la solución	mar 26/08/25	100%
HITO: Entregable 4 Diseño y arquitectura Tecnologica	jue 2/10/25	0%

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	Nombres de los recursos	% Avance Planeado (Texto1)	% físico completado
Revisar, Ajustar y Aprobar el informe	mié 22/10/25	mié 22/10/25	1 día	Analista de requerimientos;Angie Roncancio	100%	50%
GIT_Aprobar despliegue en Ambiente de Pruebas	jue 23/10/25	jue 23/10/25	1 día	Diego Caicedo	100%	0%
Desplegar en ambiente de pruebas	vie 24/10/25	vie 24/10/25	1 día	Coordinador de TI, programadores;Diego Caicedo	50%	0%
Ejecutar y documentar resultados de pruebas de usuario final	lun 27/10/25	jue 30/10/25	4 días	Angie Roncancio	100%	0%
Ajustes al desarrollo según resultados de las pruebas de usuario final	vie 31/10/25	mar 4/11/25	2 días	Programadores	100%	0%
Retest de Pruebas de usuario final	mié 5/11/25	jue 6/11/25	2 días	Angie Roncancio	100%	0%

iGracias!



3DStudio
WEB COMMUNICATION

giz

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Ambiente

