



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 7	Vigencia: 27/06/2023	Código: F-E-SIG-25

ACTA DE REUNIÓN N° 37	FECHA DE LA REUNIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	19	02	2026
	HORA DE INICIO		
	03	00	PM
REUNIÓN INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPARTAMENTO / CIUDAD	Bogotá
REUNIÓN EXTERNA	<input type="checkbox"/>	DEPENDENCIA QUE PRESIDE	

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN	
TEMA	Avances Proyecto #83489349 GIZ
OBJETIVO	Reunión de Seguimiento de Proyecto

ORDEN DEL DÍA / AGENDA		
No.	TEMA	RESPONSABLE
1	Línea de tiempo del proyecto	Felipe Beltran-3DStudio
2	Actividades Ejecutadas	Felipe Beltran-3DStudio
3	Próximas Actividades	Felipe Beltran-3DStudio
4	Compromisos	Felipe Beltran-3DStudio
5	Riesgos	Felipe Beltran-3DStudio
6	Métricas	Felipe Beltran-3DStudio – Francisco Moreno- MinAmbiente

ASISTENTES					
No.	NOMBRE	FIRMA	ASISTENCIA		ENTIDAD/ DEPENDENCIA
			PRESENCIAL	VIRTUAL	
1	Angie Roncancio			X	MinAmbiente
2	Francisco Moreno			X	MinAmbiente

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

3	Mónica Legizamo			X	3DStudio
4	Felipe Beltran			X	3DStudio
5	Katherin García			X	3DStudio

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay)					
No.	TEMA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Envío de link de Grabaciones de sesiones del proyecto	Francisco Moreno/MinAmbiente	100	Se tiene programado un envío masivo al finalizar cada mes.	Mensual
2	Agendamiento de reunión con líderes de MinAmbiente	Angie Roncancio/MinAmbiente	0	Se pospone para el 19 de marzo del 2026	Pendiente
3	Evaluar la viabilidad de un ambiente web de 3DStudio para que Angie realice pruebas funcionales.	Felipe Beltran-3DStudio	80%	N/A	Pendiente
4	Ajustes y aprobación final de Manual de usuario	MinAmbiente	80%	N/A	Pendiente

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El ingeniero Francisco del equipo MinAmbiente da un breve saludo y cede la palabra al ingeniero Felipe del equipo 3DStudio quien presenta los avances del proyecto al día de hoy.

Avances reportados:

1- Línea de Tiempo:

- Actualmente se está refinando el informe de casos de pruebas.
- Se esta gestionando un ambiente web para hacer pruebas.

2- Actividades ejecutadas:

- Se esta revisando y mejorando el informe de casos de prueba, se está trabajando en la sección 3
- Se está haciendo el alistamiento de un ambiente web, solo falta una aprobación de la gerencia de 3DStudio, hoy se tuvo una primera mesa de trabajo con MinAmbiente de despliegue de ambiente.
- Se han estado haciendo pruebas de recorrido, con data real, en las fichas de café y baldosas.
- Se esta revisando y ajustando el manual de usuario, como retoques gráficos, la idea es que la otra semana (final de febrero) esté listo el manual.

3- Actas de Reunión

- Se cuenta con treinta y cinco (35) actas aprobadas, pendiente por aprobación y firma el acta treinta y seis (36).

4- Próximas actividades

- Cerrar las secciones 2 y 3 (ajustes y aprobación de informes de casos de prueba)
- Configurar e instalar ambientes según manual de despliegue, ya se tuvo una primera mesa de trabajo.
- Realizar pruebas funcionales, tan pronto este el ambiente disponible se podrán hacer pruebas funcionales.
- Ajustes y aprobación del manual de usuario.
- Hacer pruebas de calidad y código por parte de 3DStudio, pruebas de carga y estrés.

Compromisos

- Se realizó el doceavo despliegue el día 16/02/2026 de Cambios al GITLAB para ambiente previsto para el aplicativo; por parte de 3DStudio.
- Aún está pendiente el acceso a una IP pública para acceso a la funcional de MinAmbiente a realizar pruebas.
- Se socializó el manual de usuario el 05/02/2026, no está aprobado.
- Pendiente aprobar sección 1 y 4; en curso sección 3 y 2.
- Pendiente plantilla para uso y apropiación de la herramienta ACB.

5- Riesgos

- Riesgo asociado al no despliegue oportuno de cambios (frontend y backend) del Ministerio, requeridos para la fase de desarrollo y pruebas. El ingeniero Francisco confirma que la parte técnica aun se encuentra trabajando en el tema, indica confirmar cuando tengan avances concretos.

Temas varios

- Angie, Profesional Funcional de MinAmbiente interviene y dice que la sección 4 ya se encuentra aprobada, dejó un comentario de la sección 1 en la Wiki.
- El ingeniero Francisco interviene y dice que ya fue enviado correo con los ajustes de gráficos y diseños.

6- Métricas


- El indicador SPI para el día de hoy arroja un resultado del 78% lo que representa un atraso en la ejecución del proyecto.

PROYECTO: 048_DAASU_COMPRAS_PUBLICAS_SOSTENIBLES

Fecha Estado **JUE 19/02/26**

% PLANEADO VS % FISICO COMPLETADO

Listado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el grafico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.



Fecha Inicio **VIE 4/07/25** Fecha Fin **JUE 30/04/26**

% AVANCE PLANEADO (TEXTO1) 93%	% FISICO COMPLETADO 73%	SPI % (TEXTO3) 78%
---	--	-------------------------------------

TAREAS RETRASADAS

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	Nombrados de los recursos	% Avance Planeado (Texto1)	% Físico completado
Ejecutar y documentar resultados de pruebas de usuario final	lun 27/10/25	jue 30/10/25	4 días	Angie Roncancio	100%	0%
Ajustes al desarrollo según resultados de las pruebas de usuario final	vie 31/10/25	mar 4/11/25	2 días	Programadores	100%	0%
Retest de Pruebas de usuario final	mié 5/11/25	jue 6/11/25	2 días	Angie Roncancio	100%	0%
Aprobación de pruebas funcionales	vie 7/11/25	vie 7/11/25	1 día	Angie Roncancio	100%	0%
Ajustes al manual de usuario	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1 día	Analista de requerimientos	100%	80%
Revision final y Aprobación de Manual de usuario	mar 4/11/25	mié 5/11/25	2 días	Angie Roncancio	100%	0%
Revisar, Ajustar y Aprobar el informe	lun 2/12/25	lun 1/12/25	1 día	Analista de requerimientos:Angie Roncancio	100%	80%

VENGIMIENTO DE HITOS
Hitos que vienen pronto.


Nombre	Fin	% Físico completado
Hito: SI	jue 30/04/26	
HITO: Entregable 1 - Plan de Gestión de Proyecto elaborado.	vie 18/07/25	100%
HITO: Entregable 1 - Plan de Gestión de Proyecto Aprobado	mar 12/08/25	100%
HITO: Entregable 2 Conceptualización y definición de la solución	mar 26/08/25	100%
HITO: Entregable 4 Diseño y arquitectura Tecnológica	jue 2/10/25	0%
HITO: aprobación Funcional Módulo 1 (Información de entrada)	vie 7/11/25	0%

Conclusiones

- 1- El indicador SPI arroja un porcentaje de 78%, lo cual refleja un atraso a la fecha dado por actividades que aun se encuentran en proceso.
- 2- Para final del mes de febrero se espera tener revisado y ajustado el manual de usuario.
- 3- Se esta trabajando en la aprobación de un ambiente web para la realización de pruebas, por parte de 3DStudio y MinAmbiente.

LISTA DE EVIDENCIAS

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros)

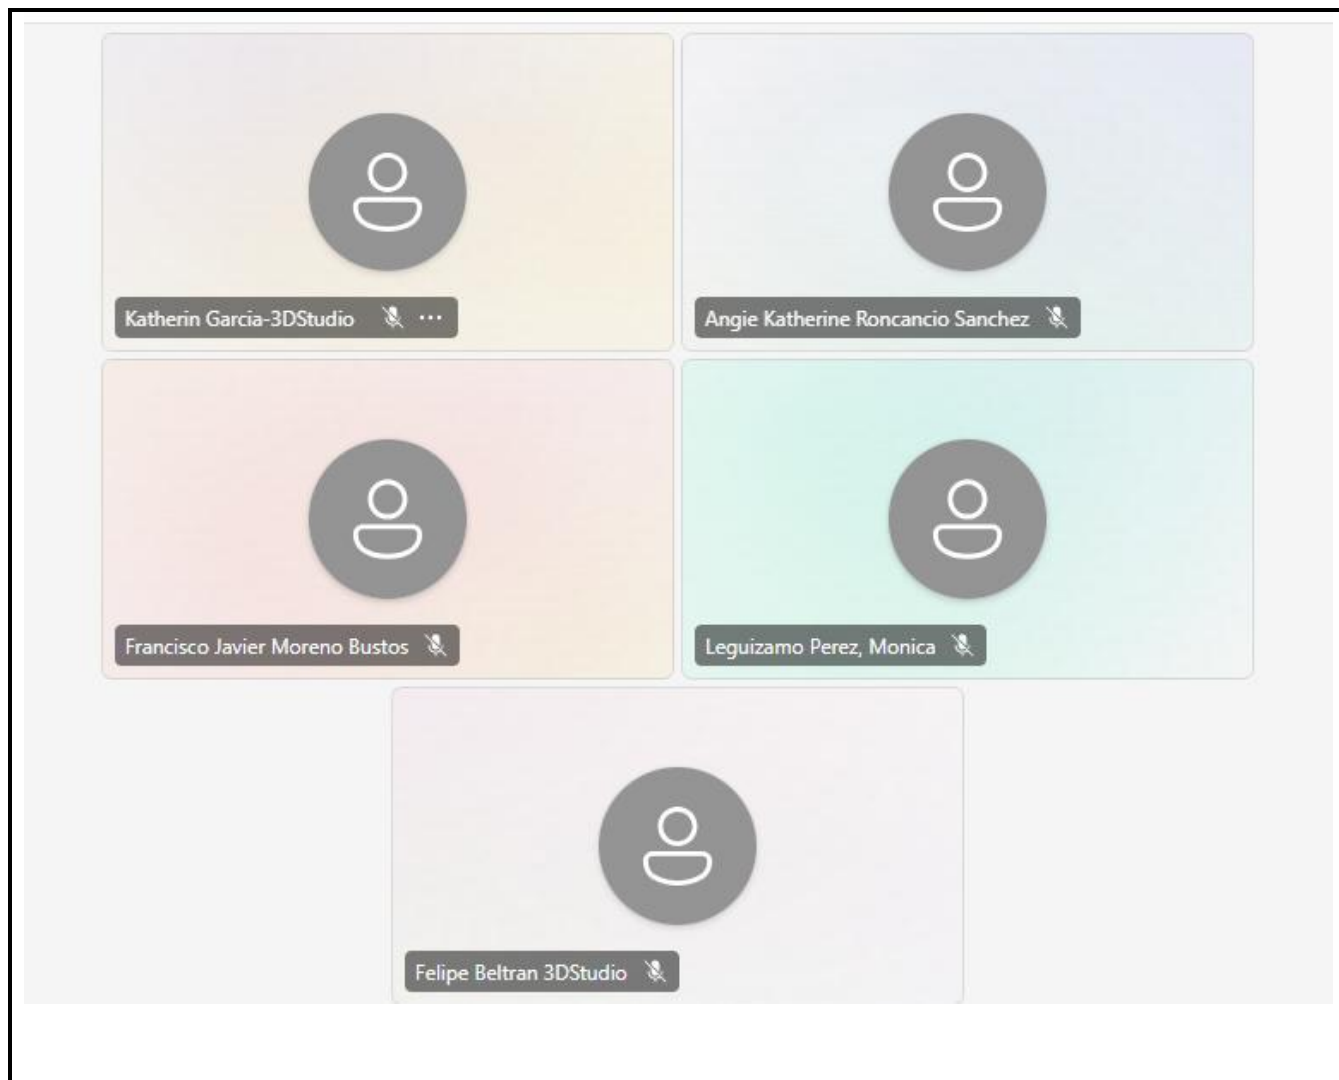

COMPROMISOS *(Si los hay)*

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	Validar la posibilidad crear web para acceso al ambiente de pruebas.	3DStudio	05/02/2026	N/A	
2	Ajustes y aprobación del manual de usuario	MinAmbiente	05/02/2026	27/02/2026	
3	Envío de plantilla para uso y apropiación de la herramienta ACB.	MinAmbiente	19/02/2026	27/02/2026	
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN <i>(Si aplica):</i>			DIA	MES	AÑO
			26	02	2026

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	FECHA	DIA	MES	AÑO
Katherin Garcia		19	02	2026

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
