

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 551 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO
SOCIAL - FONPACIFICO**

QUINTO INFORME TÉCNICO.

OCTUBRE 2025



Tabla de contenido

1. Introducción	4
2. Resumen.....	5
2.1 Avance en tiempo (%)	5
2.2 Avance técnico (%).....	5
2.3 Desembolsos.....	7
3. Componente Administrativo	8
4. Componente 1 (iniciativas de inversión)	14
5. Componente 2 (entidades aliadas - ETH)	16
1. Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	16
2. Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	17
6. Componente 3 (corporaciones autónomas)	29
Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental	30
7. Componente Acciones complementarias.....	40
8. Contrapartida.....	44
9. Documentos de referencia	46

Ilustraciones

Ilustración 1. Componentes Convenio 551 2025	5
Ilustración 2. Avance en tiempo (%)	5
Ilustración 3. Avance técnico (%)	7
Ilustración 4. Desembolsos	7
Ilustración 5. Componente Administrativo	8
Ilustración 6. Actividades Componente Administrativo	9
Ilustración 7. Contratación ETH	11
Ilustración 8 Contratación CAR	12
Ilustración 9 Contratos jurídicos	13
Ilustración 10 Componente 1	14
Ilustración 11. Componente 2	16
Ilustración 12 Actividades Componente 2	16
Ilustración 13 Componente 3	29
Ilustración 14 Actividades Componente 3	30
Ilustración 15 Acciones Complementarias	40
Ilustración 16 Contrapartida	45

Tablas

Tabla 1 Contratación ETH	11
Tabla 2 Contratación CAR	12
Tabla 3 Contratos jurídicos	13
Tabla 4 Iniciativas	15
Tabla 5. Plan de Trabajo ANH	19
Tabla 6 Plan de Trabajo Ministerio de Minas y Energía	21
Tabla 7 Plan de Trabajo ANLA	22
Tabla 8 Plan de Trabajo DANCP	24
Tabla 9 Plan de Trabajo MinInterior	25
Tabla 10 Plan de Trabajo Servicio Público de Empleo	27
Tabla 11 Plan de Trabajo Ministerio del Trabajo	28
Tabla 12. Plan de Trabajo Corpoamazonía	32
Tabla 13. Plan de Trabajo Cormacarena	34
Tabla 14. Plan de Trabajo Corpocesar	35
Tabla 15. Plan de Trabajo Corpomojana	36
Tabla 16. Plan de Trabajo Corponor	37
Tabla 17. Plan de Trabajo CVS	38
Tabla 18. Plan de Trabajo Corpoguajira	40

Quinto Informe de ejecución técnica del Convenio Interadministrativo 551 de 2025

1. Introducción

El presente informe de ejecución técnica, relaciona los avances que a corte 31 de octubre de 2025 desde este ámbito se han realizado en el marco del desarrollo del Convenio Interadministrativo 551 de 2025 llevado a cabo entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social (FONPACIFICO), con el **Objeto** de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa".

Este convenio suscrito el 17 de junio de 2025 y con fecha de acta de inicio del día 20 de junio hasta el 31 de diciembre de 2025, pactado por un valor total correspondiente a CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$54.398.565.225) producto de la suma de los aportes de la partes, discriminados así: Por parte de la ANH (ANH) será de CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$40.295.233.500) M/CTE, por su parte el aporte del asociado FONPACIFICO la suma de CATORCE MIL CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$14.103.331.725).

Es de destacar que, según lo comprometido, la ANH hará el desembolso de los recursos del convenio de la siguiente manera:

- A) Un primer desembolso equivalente al 20% del valor del aporte de la ANH, por la suma de OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 8.059.046.700).
- B) Un segundo desembolso equivalente al 30% del valor del aporte de la ANH, por la suma de DOCE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$12.088.570.050).
- C) Un tercer desembolso equivalente al 40% del valor del aporte de la ANH por la suma de DIECISÉIS MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$16.118.093.400).
- D) Un cuarto y último desembolso equivalente al 10% del valor del aporte de la ANH por la suma de CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 4.029.523.350).

Así, la ejecución de este convenio se establece sobre el desarrollo de actividades y subactividades con sus entregables comprometidos en torno a cinco (5) componentes a saber; 1) Componente Administrativo, 2) Componente 1 (iniciativas de inversión), 3) Componente 2 (entidades aliadas), 4) Componente 3 (Corporaciones autónomas) y 5)

Componente de Acciones Complementarias. Adicionalmente, cuenta con compromisos asociados a los productos del rubro de contrapartida.

2. Resumen

Este informe hace parte integral de la carpeta digital denominada "001Convenio551", la cual contiene las subcarpetas y documentos de referencia que soportan los diferentes reportes aquí realizados.

Como bien se ha comentado, el desarrollo del convenio se da, a través de cinco (5) componentes con pesos porcentuales diferenciados, según la complejidad y relevancia de su cumplimiento, así:

Componentes Convenio 551 2025




Ilustración 1. Componentes Convenio 551 2025

2.1 Avance en tiempo (%)

A la fecha de presentación de este informe, temporalmente se tiene un avance del **68,72%**, como se evidencia en la siguiente figura.



Ilustración 2. Avance en tiempo (%).

El avance del proyecto se mide con base en un total de 195 días calendario, que corresponden a la duración establecida en el convenio. Sobre esta base, se evalúa la ejecución en términos de tiempo. A la fecha del presente informe, se han ejecutado 134 días calendario.

2.2 Avance técnico (%)

De conformidad con el periodo establecido para la presentación del informe técnico correspondiente al mes de octubre de 2025, fueron desarrolladas actividades que tienen como base propuesta técnico-económica, Plan Operativo y cronograma de actividades; documentos aprobados durante la realización del primer comité técnico del presente convenio interadministrativo.

Durante el mes de octubre se llevó a cabo el Comité Técnico No. 4, en el cual fueron aprobados el informe técnico y el informe financiero correspondientes al mes de septiembre. La realización de estos comités reviste gran importancia, ya que permiten garantizar el adecuado desarrollo del convenio y establecer parámetros fundamentales para su correcta implementación.


Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "[001ActaComitéN°5.pdf](#)"


Durante este periodo se avanzó en la organización y alistamiento para la implementación y ejecución de las iniciativas de inversión correspondientes al Componente 1 del Plan de Trabajo, las cuales fueron aprobadas en su totalidad en el mes de septiembre. La ejecución de dichas iniciativas inició en el mes de octubre.

En el marco del presente informe, se desarrollan una a una las acciones realizadas en el mes de octubre, de acuerdo con sus avances en relación con la totalidad de lo demarcado por el plan de trabajo.

En el marco del presente informe se describen, de manera detallada, las acciones ejecutadas durante el mes de octubre, de acuerdo con los avances registrados frente a las actividades establecidas en el plan de trabajo.

A la fecha de presentación de este informe, se tiene un avance de ejecución técnica equivalente al **73,53%**, el cual se discrimina así:

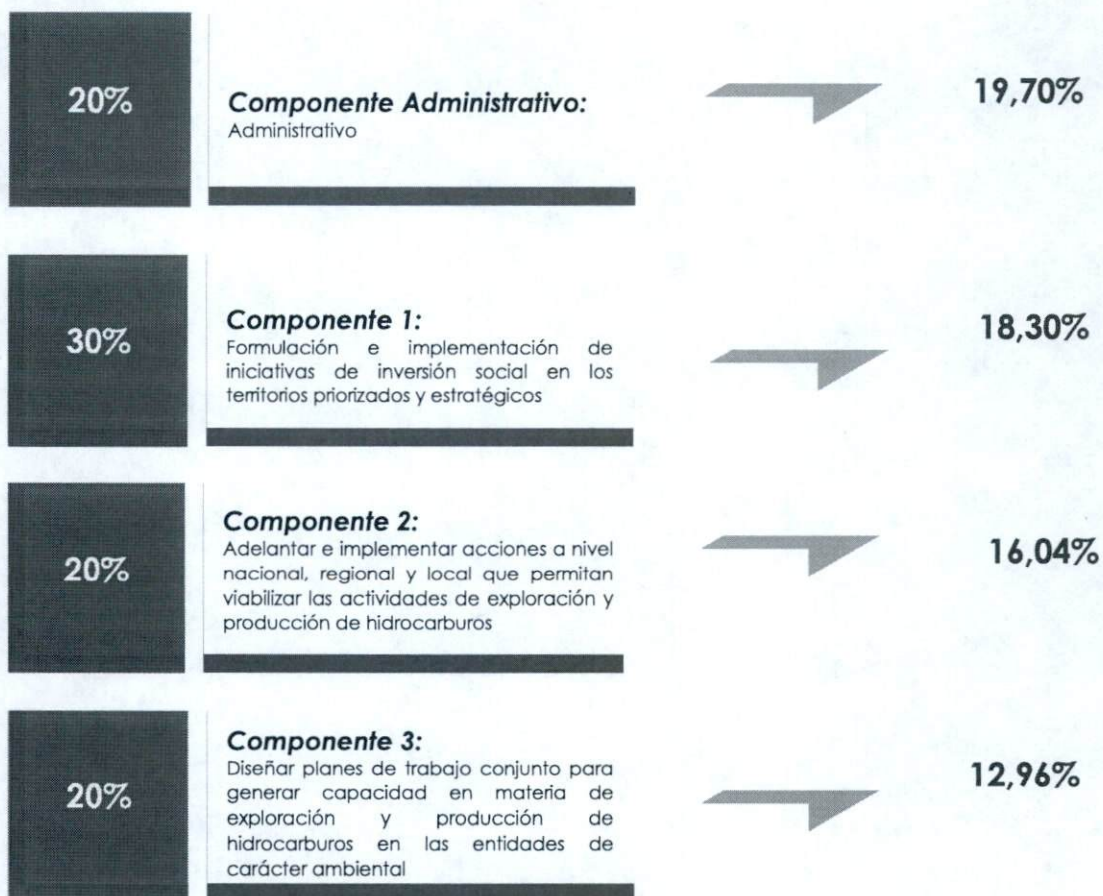

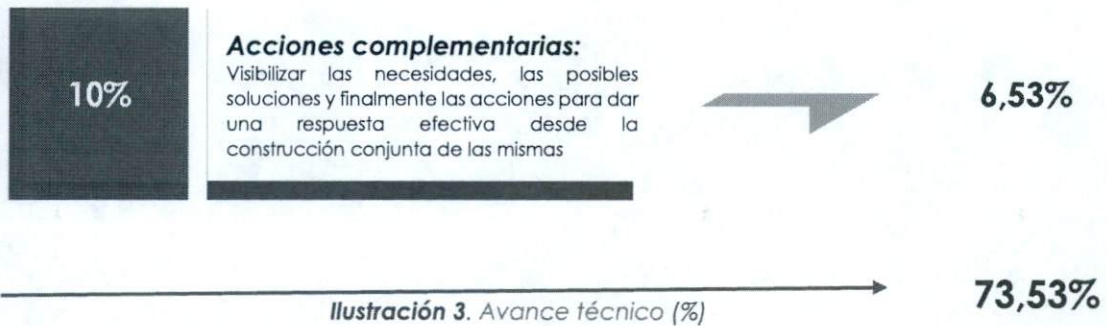

2.3 Desembolsos

La relación de pagos realizados por la ANH se establece de la siguiente forma:


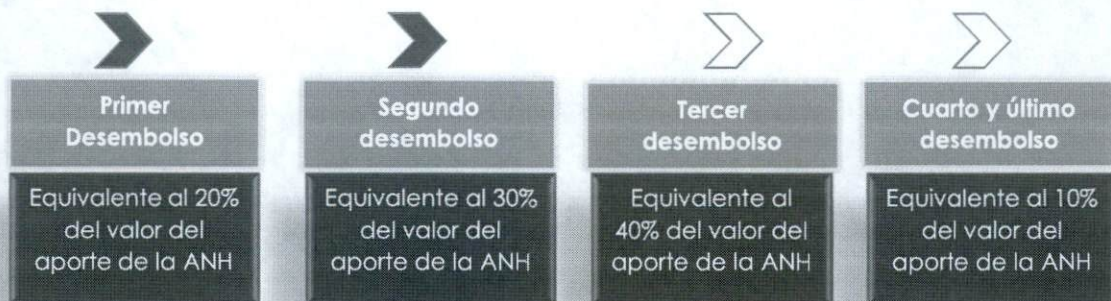


Ilustración 4. Desembolsos

Es de resaltar que, a la fecha de presentación de este informe, fue realizado el segundo desembolso el día 16 de octubre, toda vez que, fueron cumplidos los criterios establecidos en la cláusula quinta del convenio interadministrativo 551 de 2025, en el marco de la realización del comité técnico número cuatro.

Dicho desembolso fue realizado en la cuenta única de ahorros generada para el manejo de recursos del convenio.

3. Componente Administrativo

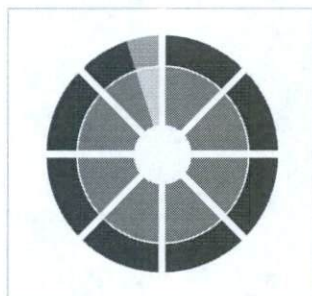

19,70%

Ilustración 5. Componente Administrativo

Nota: El componente administrativo tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio y se conforma por siete (7) subactividades.

- Las actividades correspondientes al Componente Administrativo se encuentran representadas en el bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad.

Componente Administrativo (subactividades)				
1	Elaboración Propuesta Técnico-económica para la implementación de los diferentes componentes y temáticas del convenio.	3%	→	3%
2	Presentar y actualizar permanentemente el Plan Operativo del convenio.	3%	→	3%
3	Presentar y actualizar permanentemente el Cronograma de actividades	3%	→	3%
4	Presentar a la ANH el documento (manual, guía, estatuto) que establezca el proceso de selección para el personal humano.	3%	→	3%
5	Realizar de forma regular el proceso de selección y contratación del equipo mínimo requerido, echo	2%	→	2%
6	Celebrar los acuerdos contractuales que deban suscribirse para la ejecución del presente convenio.	3%	→	2,85 %
7	Brindar y apoyar las acciones de formación y establecimiento de capacidades necesarias para el personal contratado humano.	3%	→	2,85 %

Ilustración 6. Actividades Componente Administrativo.

En referencia al componente administrativo, en lo correspondiente al período de presentación de este informe, de acuerdo con cada subactividad fueron desarrolladas las siguientes gestiones para el avance e inicio de las actividades operativas.

3.1 Planificar y gestionar los requerimientos básicos para el desarrollo del convenio.

3.1.1 Elaborar una propuesta Técnico-económica para la implementación de los diferentes componentes y temáticas del convenio, que incluya metodología técnica, financiera y operativa para la implementación de cada una de las temáticas a desarrollar en el marco del convenio bajo criterios éticos, sociales, de respeto por el medio ambiente y los derechos humanos.

La propuesta técnico-económica fue aprobada el día 15 de julio en el marco del primer comité de seguimiento del convenio 551 de 2025.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "001PropuestaTecnicoEconomica.doc".

3.1.2 Presentar y actualizar permanentemente el Plan Operativo del convenio que desarrolle la propuesta técnica presentada por el asociado.

Para el presente informe, se realiza la actualización del Plan Operativo con referencia a los avances correspondientes hasta el mes de octubre, de acuerdo con las subactividades que tuvieron avance en dicho período.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "004PlanOctubre.xlsx"

- 3.1.3 Presentar y actualizar permanentemente el Cronograma de actividades para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Operativo.

Para el presente informe, se realiza la actualización del cronograma de actividades con referencia a los avances correspondientes hasta el mes de octubre, de acuerdo con las actividades y subactividades del Plan Operativo en ejecución.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "004CronogramaOctubre.xls".

- 3.1.4 Presentar a la ANH el documento (manual, guía, estatuto) que establezca el proceso de selección para el personal que integrará el equipo de trabajo para la ejecución del convenio.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "004ProcesodeSelección.pdf".

- 3.1.5 Realizar de forma regular el proceso de selección y contratación del equipo mínimo requerido, de acuerdo con las calidades exigidas en los fundamentos contractuales del convenio.

El equipo mínimo del convenio fue presentado de acuerdo con los perfiles estipulados en el marco de la propuesta de FONPACÍFICO y fueron validados en el marco del primer comité de seguimiento realizado el día 15 de julio del presente año.

Durante el mes de octubre, no se presentaron modificaciones en la contratación del equipo mínimo respectivo.

- 3.1.6 Celebrar de forma regular los acuerdos contractuales que deban suscribirse para la ejecución del presente convenio y que permita operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas, en especial los relacionados con las situaciones de hecho y de derecho en el territorio evidenciando una reacción inmediata del asociado dirigida a minimizar el impacto de los conflictos socioambientales en los territorios. Dichos acuerdos contractuales deberán ser socializados previamente al supervisor del convenio para su conocimiento y seguimiento.

Con corte a la fecha de este informe, se presentan las contrataciones realizadas en el marco de los componentes 2 y 3, conforme al desarrollo de los Planes Operativos de las entidades aliadas y de las Corporaciones Autónomas Regionales, respectivamente, y previa autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "005Octubre".

Dichas contrataciones corresponden a lo siguiente:

- Componente 2: Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH.)
 - ✓ **Agencia Nacional de Hidrocarburos:** 170 profesionales de los cuales 4 se encuentran en estado pendiente de firma, 3 profesionales en estado de renuncia y 1 contrato cancelado.

- ✓ **Ministerio de Minas y Energía:** 44 profesionales de los cuales 3 se encuentran pendiente de firma y la novedad de 1 contrato cancelado y 1 contrato en estado de renuncia.
- ✓ **Ministerio del Interior:** 10 profesionales.
- ✓ **Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP):** 18 profesionales de los cuales 1 se encuentra cancelado.
- ✓ **Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA):** 17 profesionales.
- ✓ **Servicio Público de Empleo (SPE):** 14 profesionales con la novedad de 1 renuncia.
- ✓ **Ministerio del Trabajo:** 15 Profesionales.

Entidad	Cancelado	Renuncia	Pendiente	Firmado	Total
ANH	1	3	4	162	170
ANLA				17	17
DANCP	1			17	18
MIN INTERIOR				10	10
MIN MINAS	1	1	3	39	44
MIN TRABAJO				15	15
SPE		1		13	14
Total, General	3	5	7	273	288

Tabla 1 Contratación ETH

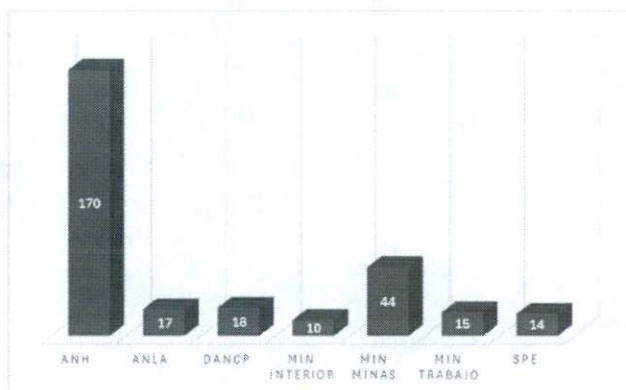


Ilustración 7. Contratación ETH

Es decir que fueron celebrados 288 contratos de prestación de servicios con el fin de operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas al mes Octubre.

- *Componente 3: Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos.*

Contratos Personas Naturales:

- ✓ **CAZ:** 16 profesionales de los cuales se encuentran 4 minutos pendiente de firma.

- ✓ **Cormacarena:** 23 profesionales de los cuales se encuentran 2 minutos pendiente de firma y la novedad de 1 contrato cancelado.
- ✓ **Corpocesar:** 7 profesionales de los cuales 1 se encuentra pendiente de firma.
- ✓ **Corpomojana:** 12 profesionales de los cuales se encuentra 1 pendiente de firma.
- ✓ **Corponor:** 11 profesionales.
- ✓ **CVS:** 12 profesionales.

Entidad	Cancelado	Pendiente	Firmado	Total
CAZ			16	16
Cormacarena	1	2	20	23
Corpocesar		1	6	7
Corpomojana			12	12
Corponor			11	11
CVS			12	12
Total	1	3	77	81

Tabla 2 Contratación CAR

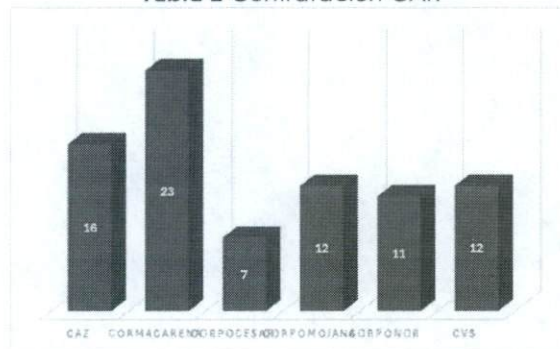


Ilustración 8 Contratación CAR

Es decir que fueron celebrados 81 contratos de prestación de servicios con el fin de operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas al mes octubre.

Contratos Personas jurídicas:

- ✓ **Corpocesar:** 1 Contrato persona jurídica
- ✓ **Corpoguajira:** 1 Contrato persona jurídica

Entidad	Firmados
Corpocesar	1
Corpoguajira	1
Total	2

Tabla 3 Contratos jurídicos

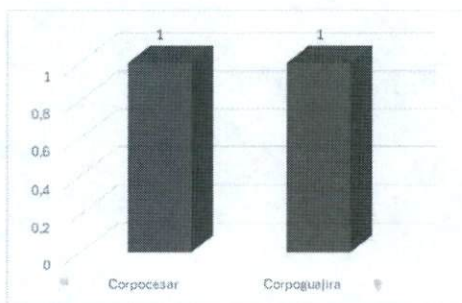


Ilustración 9 Contratos jurídicos

- 3.1.7 Brindar y apoyar las acciones de formación y establecimiento de capacidades necesarias para el personal contratado en la ejecución del convenio, en aras de establecer factores de calidad en torno al cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos.


De conformidad con esta actividad durante el mes de Octubre se realizó un (1) espacio de acciones de formación al personal contratado:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "001ActasDeInducciónOct"

- Fecha: 20 de Octubre de 2025.
Asistentes: FONPACÍFICO-Equipo de ANH-ETH MinTrabajo.

Temática: Desarrollar una jornada de inducción dirigida al equipo de Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) – ANH, en el marco del Convenio 551 de 2025, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y financieras, así como contextualizar el alcance, los objetivos y la articulación institucional del proyecto.

4. Componente 1 (iniciativas de inversión)



18,30%

Ilustración 10 Componente 1

Nota: Este componente tiene un peso porcentual de un 30% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio, y se conforma por tres (3) actividades:

- Las actividades correspondientes al Componente 1 se encuentran representadas en bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 30% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.

En relación con este componente, a la fecha se presentó la metodología a implementar para la formulación de las iniciativas que serán desarrolladas en el marco del presente convenio. Asimismo, se presentaron 60 iniciativas de inversión, resultado del trabajo articulado con las entidades territoriales vinculadas a actividades del sector de hidrocarburos.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "[002MetodologiaIniciativas.pdf](#)"

La formulación de estas iniciativas incluye la presentación de fichas técnicas que contienen información detallada de los proyectos susceptibles de ejecución en el marco del convenio, especificando valores, cantidades, población beneficiaria e información demográfica.

No.	Departamento	Municipio	Producto	Cant	Fecha Entrega
1	Santander	Bolívar	Pupitre Universitario	1000	31 de octubre de 2025
2	Huila	Villa vieja	Pupitre Universitario	1000	31 de octubre de 2025
3	Huila	Aipe	Estufa Ecoeficiente	200	31 de octubre de 2025
4	Huila	Villa vieja	Kit Escolar	1000	31 de octubre de 2025
5	Huila	Aipe	Kit Escolar	1500	31 de octubre de 2025
6	Huila	Paicol	Kit Escolar	1000	31 de octubre de 2025

7	Huila	Tesalia	Kit Escolar	1000	31 de octubre de 2025
8	Guajira	Manaure	Kit Escolar	3327	31 de octubre de 2025
9	Guajira	Uribia	Kit Escolar	4000	31 de octubre de 2025
10	Sucre	Corozal	Kit Escolar	1500	31 de octubre de 2025
11	Sucre	San Marcos	Kit Escolar	1500	31 de octubre de 2025
12	Huila	Aipe	Pupitre Universitario	1000	31 de octubre de 2025
13	Huila	Palermo	Pupitre Universitario	800	31 de octubre de 2025
14	Huila	Tesalia	Estufa Ecoeficiente	150	31 de octubre de 2025
15	Huila	Paicol	Estufa Ecoeficiente	150	31 de octubre de 2025
16	Córdoba	Planeta Rica	Kit Escolar	3000	31 de octubre de 2025
17	Córdoba	Canalete	Kit Escolar	1500	31 de octubre de 2025
18	Sucre	El roble	Kit Escolar	1500	31 de octubre de 2025
19	Sucre	Tolú	Kit Escolar	3000	31 de octubre de 2025
20	Santander	Bolívar	Kit Escolar	1500	31 de octubre de 2025
21	Santander	Rionegro	Pupitre Universitario	1000	31 de octubre de 2025

Tabla 4 Iniciativas

Es decir que, en una distribución total de entregas, se tiene la siguiente relación:


- Cinco (5) iniciativas de pupitres escolares entregadas (4.800 unidades).
- Tres (3) iniciativas de estufas ecoeficientes entregadas (500 unidades).
- Trece (13) iniciativas de kits escolares entregados (25.327 unidades).

Nota: Se relaciona carpeta de referencia "002FormulaciónInic"

Durante este periodo se avanzó en la organización e implementación de las iniciativas de inversión correspondientes al Componente 1, las cuales fueron aprobadas en el mes de agosto y de septiembre en su totalidad por la supervisión del convenio. La ejecución de dichas iniciativas inició en el presente mes de octubre.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia "003ImplementaciónInic"

5. Componente 2 (entidades aliadas - ETH)



16,04%

Ilustración 11. Componente 2

Nota: Este componente tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio, y se conforma por dos (2) actividades:

- Las actividades correspondientes al Componente 2 se encuentran representadas en bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad, se evidencia en los porcentajes de color naranja.

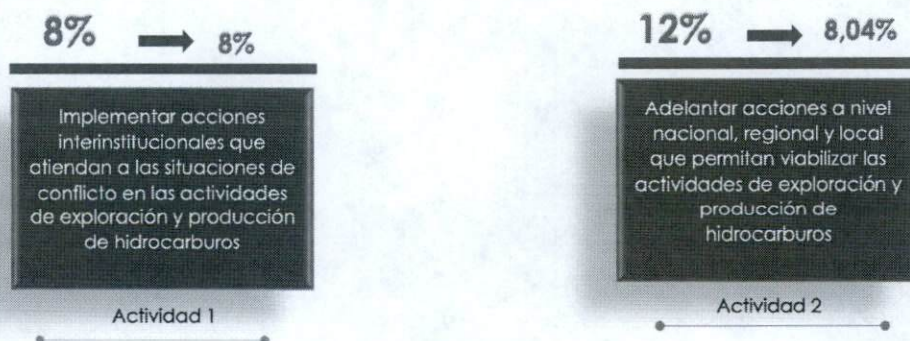


Ilustración 12 Actividades Componente 2

1. Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, durante los meses de agosto y septiembre se presentaron avances en la actividad 1 con la realización de las seis (6) Mesas Departamentales como espacios de diálogo que se organizarán a nivel territorial reportados previamente.

Las jornadas contaron con el liderazgo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en calidad de mediadora y participante, logrando recoger diversos puntos de vista y establecer compromisos orientados a fortalecer e impulsar el sector en cada territorio.

Nota: Carpetas de referencia. "002MesaDepartamentalArauca04-09-2025", "003MesaDepartamentalRiohacha09-09-2025", "004MesaDepartamentalesSincelejo16-09-2025" y "005MesaDepartamentalesNeiva23-09-2025".

Así mismo, se presentaron avances en la actividad 2 denominada "Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos", en referencia a los planes de trabajo de las entidades aliadas.

Durante el mes de octubre, en el marco del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementan las entidades aliadas de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, en concordancia con las líneas de Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo, se realizaron seguimientos a las entidades con el fin de validar los avances correspondientes a la ejecución de sus planes de trabajo, así mismo durante los espacios fueron revisados aspectos logísticos, jurídicos o técnicos.

2. Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos

En relación con la actividad 2 del componente 2 se presenta el siguiente avance en el periodo del presente informe:

- En referencia a los avances reportados por la ANH en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 72,43%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la entidad ANH denominada "001EjecuciónPlanAnh".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Articular y participar en espacios de diálogo que permitan atender las alertas tempranas y vías de hechos que afecten las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos.	1%	Informe de seguimiento de alertas y vías de hecho atendidas, con registro de espacios de diálogo, actores involucrados, acuerdos y compromisos alcanzados.	10,71
2	Organizar y atender espacios de articulación y análisis institucional con las entidades aliadas de la ETH y otras que se requieran	1%	Actas de los espacios de articulación y análisis institucional.	5,71

3	Implementar espacios de capacitación y fortalecimiento con actores clave del territorio para mejorar su comprensión y participación en los procesos asociados a los contratos de exploración y producción de hidrocarburos	24	Informe que dé cuenta de la capacitación y fortalecimiento de actores que contenga el diseño metodológico, territorios priorizados, actores y contratos	9,49
4	Liderar y acompañar la formulación e implementación de las iniciativas de inversión social, ambiental, económico, tecnológico, técnico, institucional o legal en los territorios con actividades de exploración y producción de hidrocarburos priorizados por la ANH.	20	Informe que dé cuenta de la implementación de iniciativas de inversión (Actas de entrega, listado de beneficiarios y registro fotográfico)	8,50
5	Desarrollar las actividades que aporten a normalizar los contratos suspendidos por conflictividad social y orden público.	1%	Documento con las actividades realizadas que aporten a la normalización de los contratos suspendidos por conflictividad social y orden público.	7,14
6	Monitorear y registrar la conflictividad social (alertas tempranas y vías de hecho) en el Sistema de Información Geográfica de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos – SIGETH.	20	Reporte semanal e informe final de conflictividad social de la ETH SIGETH.	6,00
7	Hacer seguimiento y acompañamiento semanal a las acciones realizadas y a los compromisos establecidos en los espacios de diálogo desarrollados con actores en territorio.	20	Actas y listados de asistencia de los espacios de seguimiento semanales.	4,27
8	Recopilar, sistematizar y documentar las acciones desarrolladas en cada uno de los territorios priorizados, en el marco de las líneas de acción del proyecto.	8	Informe final de gestión de cada uno de los territorios priorizados que contenga las acciones implementadas en el marco de las líneas de acción y recomendaciones.	5,0

9	Diseñar y producir piezas gráficas informativas y pedagógicas como parte de la estrategia de comunicación, con el fin de fortalecer la difusión de mensajes clave y facilitar la comprensión de las acciones del proyecto por parte de las comunidades y actores institucionales.	1%	Piezas gráficas diseñadas.	4,28
10	Desarrollar espacios de diálogo, capacitación, intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades, las cuales están encaminadas a prevenir, atender, transformar y monitorear las diferentes problemáticas.	6	Informe que, de cuenta del desarrollo de espacios de diálogo, capacitación, intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades.	11,33

Tabla 5. Plan de Trabajo ANH

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por el Ministerio de Minas y Energía en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 65,57%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la entidad Ministerio de Minas y Energía denominada "002MinMinasyEnergia".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Elaborar un mapa de actores conforme a las instrucciones establecidas por la dirección de la OAAS, en cada uno de los territorios.	1	Documento descriptivo analítico	4,68
2	Preparar un documento descriptivo sobre la conflictividad en cada territorio asignado, de las fuentes que determine la dirección de la OAAS.	1	Documento descriptivo analítico	5,23

3	Realizar un informe quincenal alusivo al sector de hidrocarburos dirigido al observatorio de conflictividad de la OAAS.	7	Documento descriptivo analítico	14,28
4	Diseñar un instrumento didáctico para la realización de los espacios de diálogo y concertación que defina la OAAS.	1	Herramienta didáctica	5,26
5	Apoyar las actividades de capacitación e información a los diferentes actores del territorio, en la Política de Transición Energética Justa, con enfoque diferencial étnico y de género.	1%	Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de los espacios acompañados.	5,23
6	Estructurar estrategia de prevención de la conflictividad en los territorios donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	1	Documento descriptivo analítico que dé cuenta de una propuesta de estrategia de prevención	3,14
7	Diseñar piezas comunicacionales (Vídeos, impresos y audios) que permitan la divulgación de las políticas y acciones del gobierno para la promoción de la transición energética justa	3	Piezas comunicacionales	7,85
8	Acompañar desde las competencias del Ministerio de Energía y la OAAS, los espacios de diálogo y concertación que se establezcan para la prevención y atención de la conflictividad generada por la exploración y producción de hidrocarburo que se	1%	Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de los espacios acompañados.	16,66

	presenta en los territorios.			
9	Apoyar la convocatoria, desarrollo y seguimiento de la estrategia de Pactos Sociales en Zonas de Explotación de Hidrocarburos conforme a lo establecido por la dirección de la OAAS.	9	Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de los espacios acompañados en el marco de los Pactos Sociales en Zonas de Explotación de Hidrocarburos	3,24

Tabla 6 Plan de Trabajo Ministerio de Minas y Energía

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por ANLA en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 72,69%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la entidad ANLA "003ANLA".

Ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso octubre
1	Realizar la caracterización de los territorios en donde se desarrollan en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos	8	Documento sobre la caracterización de los territorios en donde se desarrollan en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos	21,87
2	Aplicar el Sistema de Transformación de la Conflictividad (STC) atendiendo situaciones de conflictividad y alertas tempranas en los territorios con proyectos de exploración y producción de hidrocarburos	1%	Documento de los eventos de conflictividad en donde se aplique el Sistema de Transformación de la Conflictividad	17,50

3	Fortalecer la gestión ambiental en el proceso de aprendizaje y territorialización para facilitar la articulación de la ANH con otras autoridades con competencias ambientales	1	Documento de las actividades desarrolladas en los territorios con exploración y producción de hidrocarburos en torno a los procesos de aprendizaje y territorialización	16,66
4	Atender las PQRS asociadas a la exploración y producción de hidrocarburos	1%	Informe que dé cuenta de las PQRS atendidas a la exploración y producción de hidrocarburos	6,66
5	Adelantar acciones que contribuyan a la normalización de los contratos suspendidos en el marco de la normatividad ambiental	1	Informe de las acciones que contribuyan a la normalización de los contratos suspendidos asociados a la normatividad ambiental	10

Tabla 7 Plan de Trabajo ANLA

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por DANCP en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 71,04%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la entidad DANCP "004Dancp".

Ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Programar y planear reuniones de consulta previa para los proyectos asignados del sector hidrocarburos, lo que permite planificar con anticipación las jornadas de trabajo y diálogo, optimizando tiempos y garantizando la participación oportuna de todos los actores, lo que favorece el avance ordenado de los procesos.	6	Cronogramas de actividades mensuales de reuniones del sector de hidrocarburos.	5,33
2	Consolidar y mantener actualizada la información de proyectos sujetos a consulta previa, lo cual facilita la toma de decisiones informadas y la priorización de procesos.	1	Base de datos actualizada de proyectos del sector de hidrocarburos.	7,44
3	Elaborar fichas técnicas del estado de los procesos de consulta previa, mediante el cual se facilita la revisión de las últimas actuaciones en el marco de los procesos consultivos.	109	Relación de las fichas técnicas realizadas de los proyectos del sector de hidrocarburos.	7,63
4	Reportar reuniones ejecutadas de consulta previa permitiendo la participación efectiva de las comunidades étnicas afectadas directamente por los POA del sector hidrocarburos.	1%	Matriz de seguimiento de reuniones de consulta de los proyectos del sector de hidrocarburos. Carpeta con acta de reunión cargadas.	9,33
5	Proyectar y reportar los cierres formales de los procesos de consulta por cumplimiento de acuerdos o desistimiento de los procesos.	1%	Actos administrativos de cierre de procesos consultivos de los proyectos del sector de hidrocarburos.	5,33
6	Solicitar y verificar información actualizada a los ejecutores sobre el avance del proceso de consulta previa de proyectos activos, suspendidos y en etapa de seguimiento.	1	Informe de requerimientos a los ejecutores de proyectos para identificar el estado real del proceso.	5,33

7	Gestionar, atender y reportar solicitudes o inquietudes PQRSD sobre los procesos consultivos en el marco de los procesos del sector hidrocarburos.	1%	Informe de las solicitudes y peticiones atendidas relativas a proyectos del sector de hidrocarburos allegadas a través de Control Doc.	5,33
8	Emitir actos administrativos que determinen la procedencia y oportunidad de la consulta.	1%	Informe de los actos administrativos de determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa del sector hidrocarburos.	9,33
9	Registrar y actualizar el estado de las solicitudes visitas de verificación asociadas con las solicitudes de procedencia y oportunidad de los proyectos de hidrocarburos.	1%	Informe de las visitas de verificación programadas y ejecutadas para proyectos del sector hidrocarburos.	5,33
10	Realizar acompañamiento a la ANH en los espacios que se requiera para atención de vías de hecho y alertas tempranas.	1%	Informe de comisión de los espacios atendidos por al DANCP.	5,33
11	Atender requerimientos de ANH en materia de generación de e material pedagógico y formación en consulta previa.	1%	Insumos generados y listados de asistencia de espacios de formación atendidos.	5,33

Tabla 8 Plan de Trabajo DANCP

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por Ministerio del Interior en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 63,47%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la entidad MinInterior "Q05MinInterior".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Establecer el mapeo y consolidación de una herramienta de lectura de actores sociales del territorio para avanzar en aspectos preventivos	1	Documento técnico de actualización permanente	23,33
2	Articular con las diferentes direcciones del Ministerio del Interior y las entidades del orden nacional, departamental y local	1%	Actas e invitaciones interinstitucionales	3,33
3	Realizar espacios exploratorios de trabajo con diferentes actores de la industria de hidrocarburos en territorio	30	Actas de reunión	3,66
4	Diseñar y ejecutar planes de tratamiento para conflictividades que afecten al sector de hidrocarburos dentro del territorio asignado.	1%	Actas de mesas preparatorias y de compromisos en mesas en espacio de diálogo.	16,66
5	Adaptar de forma permanente los protocolos de tratamiento a la conflictividad.	1%	Documento técnico de actualización permanente	3,33
6	Vincular actores institucionales para el fomento y actualización de sectores de la economía que alivianen la conflictividad del sector de los hidrocarburos	30	Actas de reuniones de articulación con entes públicos y privados	6,50
7	Relacionar y actualizar de las matrices de seguimiento a compromisos de los espacios y mesas de diálogo relacionadas con el sector de hidrocarburos.	1%	Repositorio de matrices de seguimiento	6,66

Tabla 9 Plan de Trabajo MinInterior

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por Servicio Público de Empleo en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 67,74%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la entidad Servicio Público de Empleo "006ServicioPúblicoEmpleo".

Ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Propiciar espacios, en los que puedan converger diferentes actores claves de los territorios tales como: Prestadores autorizados, directores e inspectores territoriales del Ministerio del Trabajo y empresas operadoras del sector.	30	Informe sobre las acciones de articulación realizadas. (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	13,33
2	Fortalecer a la red de prestadores mediante capacitaciones y/o asistencias técnicas en lineamientos normativos en temas de hidrocarburos.	20	Informe sobre las acciones de fortalecimiento y asistencias técnicas a prestadores. (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	8,40
3	Acompañar espacios de diálogo y sensibilización con enfoque territorial que permitan la divulgación de los servicios de gestión y colocación de empleo en los territorios.	35	Informe final de los espacios de diálogo realizados en territorio, con lecciones aprendidas y recomendaciones *Anexos y evidencias (Actas, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	18,18
4	Brindar acompañamiento a la atención de alertas tempranas o vías de hecho que se presenten en territorios donde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en contratos activos o suspendidos	1%	*Informe de los acompañamientos realizados * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	1,33
5	Promover mediante articulación, capacitación y fortalecimiento espacios para la dinamización de los empleos verdes en territorio y/o desafíos en la transición energética justa.	12	*Informe de los acompañamientos realizados * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	5,0
6	Realizar mesas de cierre de vacantes, en municipios en los que identifique mayor cantidad de vacantes pendientes por cerrar por parte del potencial empleador, lo cual permitirá	2	*Informe de actividad del espacio con balance de las jornadas. * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	6,0

	mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo.			
7	Realizar encuentros de experiencias regionales que cuenten con la participación de prestadores y empresas del sector hidrocarburos. (Sujeto a disponibilidad de recursos financieros)	2	Informe de los espacios de experiencias regionales en territorio * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	6,0
8	Realizar Encuentro de empleos verdes - Socialización de avances de la estrategia de empleos verdes con diferentes actores (gremios, empresas, prestadores) (Sujeto a aprobación)	1	Informe del encuentro de empleos verdes * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	5,0
9	Entregar Insumos técnicos ABC preguntas frecuentes del servicio público de empleo en el sector hidrocarburos	1	Documento con los insumos técnicos de las preguntas frecuentes del SPE en el sector hidrocarburos.	4,50

Tabla 10 Plan de Trabajo Servicio Público de Empleo

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por Ministerio del Trabajo en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 55,91%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la entidad Ministerio del trabajo "007MinTrabajo".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Acompañar los escenarios de diálogo en los cuales se dé una participación de los asesores (centrales y territoriales) de la ETH Min. Trabajo con relación a la conflictividad socio laboral en los territorios donde se adelanten proyectos de exploración y producción de hidrocarburos durante el 2025.	1%	Documento (s) - ayudas de memoria sobre los escenarios de diálogo en los cuales se dé una participación de los asesores (centrales y territoriales) de la ETH Min. Trabajo con relación a la conflictividad socio laboral en los territorios donde se adelanten proyectos de exploración y producción de hidrocarburos durante el 2025.	6,35
2	Atender la conflictividad socio laboral y las acciones de la ETH Min. Trabajo durante el 2025 donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	1%	Documento descriptivo analítico que dé cuenta de la conflictividad socio laboral y las acciones de la ETH Min. Trabajo durante el 2025 en cada una de las regiones donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	6,34


3	Realizar la articulación institucional e interinstitucional durante el 2025 por la ETH Min. trabajo en relación con la materialización de la política de transición justa para una diversificación y reconversión laboral en los territorios en los cuales se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	1%	Documento descriptivo – analítico que dé cuenta de la articulación institucional e interinstitucional adelantada durante el 2025 por la ETH Min. trabajo en relación con la materialización de la política de transición justa para una diversificación y reconversión laboral en los territorios en los cuales se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	6,34
4	Desarrollar el proceso de formación en donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el marco de la Escuela de Diálogo Social propuesta por el Ministerio del Trabajo como herramienta de prevención y atención en la conflictividad socio laboral.	1	Documento descriptivo del proceso de formación en donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el marco de la Escuela de Diálogo Social propuesta por el Ministerio del Trabajo como herramienta de prevención y atención en la conflictividad socio laboral.	6,34
5	Adelantar monitoreo por parte de la ETH Min Trabajo sobre la conflictividad socio laboral presente en el sector hidrocarburos (exploración y producción).	15	Documento descriptivo semanal por territorio del monitoreo que se realiza por parte de la ETH Min Trabajo sobre la conflictividad socio laboral presente en el sector hidrocarburos (exploración y producción).	5,18
6	Presentar propuestas de inclusión con enfoque diferencial desde la ETH Min. Trabajo en la contratación de mano de obra en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción) durante el 2025.	1	Documento descriptivo – analítico – propositivo con relación a las propuestas de inclusión con enfoque diferencial que se presenten desde la ETH Min. Trabajo en la contratación de mano de obra en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción) durante el 2025.	6,34
7	Desarrollar acciones de apoyo técnico por la ETH Min. Trabajo a la dirección de IVC del Ministerio del Trabajo durante el 2025 en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)	1%	Documento descriptivo sobre las acciones de apoyo técnico realizado por la ETH Min. Trabajo a la dirección de IVC del Ministerio del Trabajo durante el 2025 en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)	6,34
8	Establecer propuestas por la ETH Min. Trabajo durante el 2025 y el seguimiento sobre los posibles cambios en la normatividad vigente en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción) para la contratación de mano de obra (decreto 1668 de 2016) (ley de 1636 de 2013)	1	Documento descriptivo – analítico sobre las propuestas realizadas por la ETH Min. Trabajo durante el 2025 y el seguimiento sobre los posibles cambios en la normatividad vigente en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción) para la contratación de mano de obra (decreto 1668 de 2016) (ley de 1636 de 2013)	6,34
9	Producir material pedagógico que contribuya al entendimiento de la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)	1	Material pedagógico que contribuya al entendimiento de la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)	6,34

Tabla 11 Plan de Trabajo Ministerio del Trabajo.

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente. El total de los avances en términos

porcentuales de los planes de trabajo de las entidades aliadas a la fecha de presentación del informe corresponde a un 66,93%.

6. Componente 3 (corporaciones autónomas)

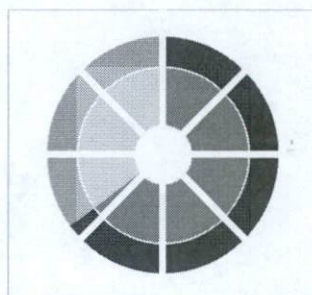

12,96%

Ilustración 13 Componente 3

Nota: Este componente tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio, y se conforma por tres (3) actividades:

- Las actividades correspondientes al Componente 3 se encuentran representadas en bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad, se evidencia en los porcentajes de color naranja.

14% → **8,36%**

Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementen las Corporaciones Autónomas en concordancia con las líneas de estratégicas.

Actividad 1

3% → **2,3%**

Estudio de lineamientos técnicos que dé cuenta de la capacidad técnica de la ANH y de las autoridades locales fortalecidas, con la participación institucional.

Actividad 2

3% → 2,3%

Documento de lineamientos técnicos que contengan la información del sector hidrocarburos integrada en los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial priorizados.

Actividad 3

Ilustración 14 Actividades Componente 3.

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, se presentaron avances en la actividad 1 denominada "Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementen las Corporaciones Autónomas en concordancia con las líneas de; Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo." durante el mes de octubre se avanzó en la realización de los seguimientos a los planes de trabajo de las corporaciones autónomas regionales.

Durante los seguimientos realizados a las corporaciones, se validaron los avances correspondientes a la ejecución de sus planes de trabajo. Asimismo, en estos espacios se revisaron aspectos logísticos, jurídicos y técnicos pertinentes.

Para el periodo que abarca el presente informe, hacen parte de este componente siete (7) corporaciones, las cuales se relacionan a continuación. Cada una de ellas presentó ante la ANH su respectivo plan de trabajo, el cual fue evaluado y recibió la viabilidad para su ejecución: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía); Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena); Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar); Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira); Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana); Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS); y Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "001PlandeTrabajoCAR.xlsx"

Para el mes de octubre, el avance en la ejecución de los planes de trabajo de este componente alcanzó el 59,70%, correspondiente a las actividades desarrolladas durante dicho periodo, lo cual equivale a un peso total de 8,36% dentro de la respectiva subactividad.

Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental

- En referencia a los avances reportados por CORPOAMAZONÍA en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 58,06%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la CAR Corpoamazonia denominada "001EjecuciónCorpoamazonia".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre
1	Evaluar solicitudes de trámites ambientales relacionados con licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, requeridas por los usuarios para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Evaluación de solicitudes de trámites ambientales allegadas por VITAL y SISA. Se emitirán Autos de inicio de trámite ambiental, Autos de cierre, Conceptos técnicos de evaluación y resoluciones de otorga o niega	2,66
2	Realizar control y seguimiento ambiental a los trámites de licenciamiento otorgados a las diferentes empresas que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Seguimiento y control a los trámites de licenciamiento ambiental otorgados. Se emitirán Conceptos técnicos de Seguímentos, oficios de requerimiento y resoluciones de modificación o cierre	6,60
3	Realizar control, seguimiento y atención a contingencias, pasivos o quejas generadas por Derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas durante el desarrollo de proyectos de exploración, explotación, producción y transporte de hidrocarburos	1%	Atención y seguimiento a contingencias, pasivos o quejas generadas por Derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Se emitirán oficios de requerimientos y conceptos técnicos de verificación y/o seguimiento	6,60
4	Apoyar en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias ambientales por afectación a los recursos naturales de los proyectos, obras y/o actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se ejecuten en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Atención y resolución de quejas o solicitudes de información en el marco de los PQR's radicados a Corpoamazonia. Se emitirán Oficios de respuesta y/o informes técnicos de visitas, así como acta de reunión en caso de requerirse	6,60
5	Proyectar y realizar seguimiento a las acciones judiciales y constitucionales (Acciones de tutela, acciones populares, acciones de nulidad y restablecimiento de derecho, acciones de revocatoria directa, acciones de reparación directa, entre otras) que se tramiten en la jurisdicción de Putumayo y Caquetá, y que estén en el	1%	Seguimiento a las acciones judiciales y constitucionales que se tramiten en la jurisdicción de Putumayo y Caquetá, y que estén en el marco de la ejecución de proyectos de hidrocarburos	4,00

	marco de la ejecución de proyectos de hidrocarburos			
6	Realizar verificación y evaluación técnica en el marco del establecimiento y/o seguimiento de las medidas de compensación e inversión no menos del 1 % de proyectos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Establecimiento y/o seguimiento de las medidas de compensación e inversión no menos del 1 % de proyectos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA Se emitirán Conceptos técnicos de Seguimientos y/o establecimiento, oficios de remisión al usuario o ANLA cuando aplique	6,60
7	Apoyar en la gestión de recaudo de la entidad, por concepto de cobro por servicios de seguimiento, evaluación, tasa retributiva, tasa por uso de agua, tasación de multas y demás cobros, referentes a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Oficios y liquidaciones, por concepto de cobro por servicios de seguimiento, evaluación de tramites ambientales	3,30
8	Fortalecer el archivo y gestión documental de los proyectos objeto de licenciamiento ambiental en el marco de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA	1%	Crear Archivo digital y físico, en el que se consolide los proyectos objeto de licenciamiento ambiental con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. - (exploración, explotación y Transporte de hidrocarburos) en jurisdicción de CORPOAMAZONIA	3,30
9	Promover el Ordenamiento Ambiental Territorial en el municipio de Puerto Guzmán	1%	Documento técnico ajustado de determinantes Ambientales del municipio de Puerto Guzmán.	13,40
10	Realizar ajuste técnico de las determinantes ambientales del municipio diferenciadas por zonificación	1%	Proyección del acto administrativo y entrega oficial a la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental de CORPOAMAZONIA para su revisión, validación técnica y posterior proceso de adopción institucional.	3
11	Brindar asistencia técnica al municipio en la actualización del ordenamiento territorial en aplicación de las determinantes ambientales y enfoques de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial	1%	Actas, listados de asistencia de los espacios de socialización y/o concertación del ordenamiento ambiental del territorio y la gestión del riesgo en el municipio de Guzmán, departamento del Putumayo.	2
12	Revisión y organización final de los productos del proyecto	1%	Documento técnico y cartografía, que contiene la actualización de las determinantes Ambientales del municipio de Puerto Guzmán.	0

Tabla 12. Plan de Trabajo Corpoamazonia

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORMACARENA en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 60,05% :

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la CAR Cormacarena denominada "002EjecuciónCormacarena".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Generar conceptos técnicos de evaluación, control, seguimiento de trámites ambientales solicitados para proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	1%	Informe que contenga la relación de pronunciamientos técnicos generados en atención a los trámites ambientales de evaluación, control y seguimiento para el desarrollo de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta.	6,30
2	Generar actos administrativos y oficios de impulso procesal trámites ambientales de evaluación, control, seguimiento de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	1%	Documento que contenga la relación de los actos administrativos generados para atender los trámites requeridos en la operación de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta.	6,80
3	Atender PQRSD correspondientes a actividades de exploración y producción del sector hidrocarburos	1%	Oficios de respuesta a PQRSD del sector hidrocarburos y energía, así como la atención a solicitudes de la ANH sobre proyectos localizados en el Dpto. del Meta	6,20
4	Actualizar la base de datos de las medidas de compensación e inversión del 1% de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	1%	Documento con reporte que contenga la base de datos con un estado de arte sobre el estado de las compensaciones, municipio en el cual se encuentran localizados, limitaciones de ejecución y la formulación de propuestas y/o acciones que favorezcan la materialización de las obligaciones de compensación e inversión del 1% desde la competencia de la Corporación.	5,17

5	Revisar los expedientes con mayor interés técnico ambiental para llevar a cabo los pronunciamientos técnicos y las visitas de campo en los casos que de a lugar en el componente de compensaciones e inversión del 1%	1%	Informe de conceptos técnicos de evaluación, control y seguimiento a obligaciones de compensación o inversión del 1% en los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Meta	5,30
6	Generar el análisis cartográfico que plasmen el estado de las medidas de compensación e inversión del 1%, y los aspectos ambientales de su localización a través de shappes, mapas y salidas gráficas necesarias	1%	Documento con reporte que compile el análisis cartográfico en el cual se evidencie el estado de las medidas de compensación e inversión del 1%, y los aspectos ambientales de su localización a partir de los mapas y salidas gráficas generadas	5,50
7	Generar actos administrativos y oficios de impulso procesal de evaluación, control, seguimiento de las obligaciones de compensación e inversión del 1% de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	1%	Documento con relación de las decisiones administrativas y de oficio despachadas referente a las obligaciones de compensación e inversión del 1% de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	5,68
8	Actualizar la base de contingencias móviles y fijas presentadas el sector hidrocarburos en la vigencia 2020-2025	1%	Documento que presente el contexto de contingencias generadas en el sector petrolero y compile la base de datos actualizada las contingencias fijas y móviles del sector hidrocarburos presentadas en el departamento del Meta y la atención sobre la misma.	5,80
9	Revisar los expedientes con contingencias de mayor interés técnico ambiental para llevar a cabo los pronunciamientos técnicos y las visitas de campo en los casos que dé a lugar	1%	Informe que presente una relación de las contingencias priorizadas para atención y que incluya los pronunciamientos técnicos de evaluación, control y seguimiento a contingencias y las obligaciones relacionadas con la atención de dichos eventos.	6,50
10	Generar actos administrativos y oficios de impulso procesal de evaluación, control, seguimiento de las contingencias presentadas en el sector petrolero en el departamento del Meta	1%	Documento con la relación de las decisiones administrativas y de oficio despachadas sobre las contingencias presentadas en el sector petrolero en el departamento del Meta	6,80

Tabla 13. Plan de Trabajo Cormacarena

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPOCESAR en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 60,03%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la CAR Corpocesar denominada "003EjecuciónCorpocésar".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Digitalizar expedientes físicos con escáneres especializados y protocolos de bioseguridad.	400	Documentos expedientes ambientales históricos digitalizados	13,80
2	Extraer datos geospaciales mediante (OCR avanzado y geoparsing semántico).	1	Documento con la relación de datos geospaciales extraídos	13,33
3	Desarrollar plataforma IDE interoperable con estándares OGC (WMS/WFS) y conexión SINA.	1%	Plataforma IDE interoperable con estándares OGC (WMS/WFS) y conexión SINA.	14,00
4	Publicar capas geospaciales prioritarias con metadatos ISO 19115.	1%	Publicación de una Plataforma IDE 100% compatible con servicios web geospaciales con estándares OGC WMS y WFS integración del 100% de expedientes digitalizados con capacidad de búsqueda semántica y vinculación automáticamente de información geoespacial con expedientes originales.	7,50
5	Capacitar al personal técnico en operación y mantenimiento de la IDE.	1	Capacitación sobre la Plataforma IDE 100% compatible con servicios web geospaciales con estándares OGC WMS y WFS integración del 100% de expedientes digitalizados con capacidad de búsqueda semántica y vinculación automáticamente de información geoespacial con expedientes originales.	3,40
6	Establecer comité de gobernanza de datos para sostenibilidad y actualización continua.	1	Establecimiento del comité de gobernanza para la sostenibilidad y actualización continua	8,00

Tabla 14. Plan de Trabajo Corpocesar

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPOMOJANA en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 57,90%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la CAR Corpomojana denominada "005EjecuciónCorpomojana".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Elaborar un (1) plan de manejo ambiental correspondiente al área propuesta a declarar en el SINAP en jurisdicción del municipio de San Benito Abad – Sucre, con enfoque ecosistémico, incorporando la participación de comunidades locales y actores institucionales, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 2372 de 2010 y la Resolución de Min Ambiente 1125 de 2015	1	Plan de Manejo Ambiental: El cual contendrá como mínimo los siguientes acápite: Introducción, Localización, Caracterización biofísica, socioeconómica y cultural, Presiones, Objetivos específicos de conservación, Justificación, Delimitación, Categoría propuesta, Resultados de los compromisos y acuerdos del proceso de consulta previa, Acciones estratégicas prioritarias, Bibliografía y Anexos.	30,0
2	Generar cartografía temática (cobertura vegetal, uso de suelo, zonificación) mediante herramientas SIG para un (1) relicto boscoso (60 Ha aproximadamente), escala 1:5.000.	1	Geodatabase (GDB) para el relicto boscoso (60 Ha aproximadamente) con cartografía temática consolidada (cobertura vegetal, uso de suelo, zonificación)	6,0
3	Caracterizar y diagnosticar el estado actual de los ecosistemas presentes en las 60 hectáreas, incluyendo su biodiversidad, servicios ecosistémicos y presiones ambientales.	1	Documento diagnóstico del estado actual de los ecosistemas presentes en las 60 hectáreas, incluyendo su biodiversidad, servicios ecosistémicos y presiones ambientales.	11,40
4	Recolectar, sistematizar y actualizar la información técnica, ambiental, jurídica y geoespacial de los siete (7) proyectos de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOMOJANA, integrando: (1) datos documentales de fuentes oficiales (ANLA, ANH) y titulares (licencias, PMA, informes); (2) capas geográficas actualizadas en el SIG corporativo (contratos, áreas de exclusión ANLA, zonas de interés ambiental); para estructurar un sistema de información unificado que soporte los procesos de seguimiento y cumplimiento ambiental de la Corporación.	3	Dos (2) informes de avance y uno (1) final que corresponde a los resultados obtenidos en el componente de revisión, análisis y actualización jurídica de los proyectos de hidrocarburos licenciados en la jurisdicción de CORPOMOJANA, soportados de la siguiente manera: - Registro fotográfico - Plan de trabajo - Matriz de avance de obligaciones - Diagnósticos parciales de los expedientes licenciados. - La entrega se realizará de manera física y digital	10,50

Tabla 15. Plan de Trabajo Corpomojana

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPONOR en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 78,50%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la CAR Corponor denominada "006EjecuciónCorponor".

Ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Realizar un análisis de las normas de orden nacional generadas a partir del año 2018 y las nuevas disposiciones en materia ambiental que se ha generado en el departamento Norte de Santander para ser incorporadas como determinantes ambientales.	1%	Documento de Informe consolidado de normativa ambiental vigente (nacional y territorial, post 2018), con cuadro comparativo y propuesta de incorporación como determinantes.	20
2	Especializar las determinantes ambientales como complemento esencial de los POT's para facilitar la superposición en el modelo de ocupación.	1%	GDB de Mapas temáticos georreferenciados por municipio con capas superpuestas de determinantes ambientales.	18,75
3	Incorporar a escalas 1:25.000 o menos, las nuevas directrices generadas como estrategias de conservación en las fichas ambientales para cada uno de los municipios del departamento Norte de Santander como determinantes ambientales.	1%	Documento de Fichas ambientales actualizadas por determinante a nivel Norte De Santander, con componentes de conservación georreferenciados a escala 1:25.000 o inferior.	17,75
4	Agrupar las determinantes ambientales en cada uno de los ejes temáticos relacionados con el Medio Natural; Medio Transformado; Densidades de Ocupación en suelo rural; y la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	1%	Documento de categorización temática de determinantes ambientales, agrupadas por: 1. Medio Natural 2. Medio Transformado 3. Densidad de Ocupación Rural 4. Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	17,50
5	Expedir un nuevo acto administrativo que recopile la actualización de las determinantes ambientales individualizadas por municipios para el departamento Norte de Santander.	1%	Propuesta de acto administrativo oficial con sustento técnico y jurídico para la adopción de las determinantes ambientales individualizadas por municipio	4,50

Tabla 16. Plan de Trabajo Corponor

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CVS en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 68,33%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la CAR CVS denominada "007EjecuciónCVS".

Ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Octubre.
1	Caracterizar el estado actual de los humedales Arcial Porro y Cintura y Las Marías, evaluando su funcionalidad ecológica, las presiones existentes y su importancia en el ordenamiento ambiental del territorio.	1	Documento final que dé cuenta de estado actual de los humedales Arcial Porro y Cintura y Las Marías, evaluando su funcionalidad ecológica, las presiones existentes y su importancia en el ordenamiento ambiental del territorio.	25,0
2	Actualizar la información cartográfica y documental sobre las condiciones ecológicas, ambientales y de uso del suelo de los humedales Arcial Porro y Cintura, y seguimiento al plan de manejo ambiental del humedal Las Marías	1	Geodatabase (GDB) con la información cartográfica y documental sobre las condiciones ecológicas, ambientales y de uso del suelo de los humedales Arcial Porro y Cintura, y seguimiento al plan de manejo ambiental del humedal Las Marías	30,0
3	Fortalecer el seguimiento y la gestión de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).	1%	Informe que evidencie las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)	3,33
4	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de compensaciones ambientales por parte de las empresas del sector hidrocarburos de la compensación no menor del 1%	1%	Informe que contenga el diagnóstico del estado actual de la ejecución de la ejecución del 1% en el departamento de Córdoba.	10,0

Tabla 17. Plan de Trabajo CVS

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPOGUAJIRA en su plan de trabajo del mes de octubre se tiene que corresponde a 35,04%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre por la CAR Corpoguajira denominada "004EjecuciónCorpoguajira".

Ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso
------	--------------	------	------------	----------

Octubre.

1	Recopilar información biofísica y socioeconómica disponible proveniente de estudios ambientales previos y de fuentes actualizadas existentes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA, entre otros. Además, se revisará la información cartográfica existente de las áreas declaradas como de protección, conservación u otra categoría en el departamento de la Guajira, que se encuentren declarada como tal, a nivel regional como nacional.	1	Mapa final de compensaciones del componente biótico para la jurisdicción de CORPOGUAJIRA, a escala 1:100.000	5,01
2	Organizar comisiones especializadas (abiótica, biótica y social) que realizarán visitas de verificación en campo una vez se obtenga la versión preliminar del mapa de compensaciones, con el fin de garantizar que los ecosistemas allí planteados sean los establecidos en terreno.	1	Documento que contiene el Portafolio de áreas prioritarias para la conservación, con los soportes y anexos	16,70
3	Elaborar el portafolio de áreas prioritarios de conservación y compensación de la biodiversidad en el departamento de La Guajira.	1	Listado de los factores de compensación del componente biótico para el departamento de La Guajira	1,67
4	Elaborar el listado de factores de compensación que serán aplicados en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA, acorde a los establecidos en la resolución No. 0256 de 2018, emitida por el MADS.	1	Documento que contiene el procedimiento compensatorias, con los soportes y anexos	6,68
5	Elaborar los procedimientos generales para establecer las medidas de compensación del componente biótico en jurisdicción del CORPOGUAJIRA.	1	GDB del proyecto para establecer las medidas	1,66
6	Generar documento, guías, procesos y procedimientos técnicos estandarizados para definir y aplicar las medidas compensatorias de lineamientos para la adopción, implementación y seguimiento del mapa como instrumento de planificación ambiental. Este producto permitirá formalizar el uso del mapa dentro de los procedimientos internos de la corporación, definir responsables, establecer protocolos de actualización periódica y articular el instrumento con otros mecanismos de financiación y conservación, como el uso del 1% ambiental, los Planes de Manejo Ambiental (PMA), y la articulación con el Sistema Regional de Áreas Protegidas. Sistematización de la información:	1%	Documento, guías, procesos y procedimientos técnicos estandarizados para definir y aplicar las medidas compensatorias de lineamientos para la adopción, implementación y seguimiento del mapa como instrumento de planificación ambiental. Este producto permitirá formalizar el uso del mapa dentro de los procedimientos internos de la corporación, definir responsables, establecer protocolos de actualización periódica y articular el instrumento con otros mecanismos de financiación y conservación, como el uso del 1% ambiental, los Planes de Manejo Ambiental (PMA), y la articulación con el Sistema Regional de Áreas Protegidas.	3,32

Luego de finalizar la fase de verificación en campo, se realizará la sistematización y organización adecuada de la información cartográfica obtenida en las diferentes capas temáticas y consolidará la información final a presentar.			
--	--	--	--

Tabla 18. Plan de Trabajo Corpoguajira

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.


En referencia a la subactividad denominada "Estudio de lineamientos técnicos que dé cuenta de la capacidad técnica de la ANH y de las autoridades locales fortalecidas, con la participación institucional", en el mes de octubre fue presentado un documento de avance correspondiente.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre denominada "002EstudioLinTec".

En referencia a la subactividad denominada "Documento de lineamientos técnicos que contengan la información del sector hidrocarburos integrada en los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial priorizados", en el mes de octubre fue presentado un documento de avance correspondiente.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de octubre denominada "003DocumentoLinTec".

7. Componente Acciones complementarias

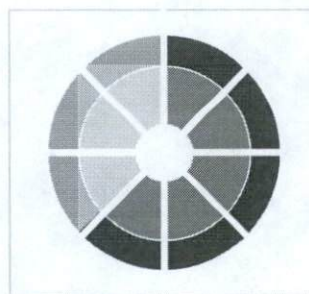

6,53%

Ilustración 15 Acciones Complementarias

Nota: El componente de acciones complementarias tiene un peso porcentual de un 10% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio y se conforma por nueve (9) subactividades.

En relación con este componente, a la fecha del presente informe se relacionan los avances detallados por subactividad como se evidencia a continuación:

a. Subactividad 1.

Documento del apoyo técnico, jurídico, administrativo, operativo, contable y financiero en la ejecución y seguimiento de los planes de trabajo con las entidades involucradas en la ejecución del convenio.

1% → 0,70%

Para el mes de octubre, como parte del soporte técnico, jurídico y administrativo, se relaciona documento de referencia que permite evidenciar el avance en la ejecución del Convenio No. 551 de 2025 y refleja las acciones realizadas durante ese período, en articulación con las entidades que participan en su desarrollo.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "004SoporteTécnicoOctubre".

b. Subactividad 2.

Apoyar logísticamente con el suministro de transporte, alojamiento, refrigerio, sonido y demás actividades requeridas por la ANH para la planeación, estructuración y ejecución de las diversas reuniones, eventos y demás espacios de interlocución o diálogo interinstitucional o con las comunidades que se presenten en el desarrollo del convenio.

1% → 0,75%

Durante el mes de octubre fueron apoyadas diferentes actividades logísticas, las cuales contaron con la previa aprobación de la ANH para su gestión.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "004ApoyoLogisticoOctubre".

c. Subactividad 3.

Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe detallado de la ejecución financiera (de los recursos destinados por la ANH y los recursos de contrapartida) anexando los soportes específicos de cada concepto y adicionando extracto (con la fecha de presentación del informe) de los recursos disponibles en la cuenta bancaria creada con ocasión del convenio.

1% → 0,70%

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "004InformeFinancieroOctubre".

d. Subactividad 4.

Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe de ejecución técnica (con las evidencias específicas de lo reportado) que, dé cuenta del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo, incluidas las actividades y entregables comprometidos con los recursos de contrapartida

2% → 1,33%

Nota: se relaciona carpeta de referencia denominada " 005InformeTécnicoOctubre".

e. Subactividad 5.

Presentar al finalizar el convenio, el archivo físico y digital de la totalidad de los entregables comprometidos, estos deben soportarse con recibidos a satisfacción, incluyendo información financiera, técnica, administrativa, jurídica y toda aquella que se genere durante la ejecución del convenio.

1% → 0,20%

Esta actividad será presentada al finalizar el convenio.

f. Subactividad 6.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de seguridad Social – EPS, Pensión y ARL - y de los Aportes Parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de Compensación – y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos los empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por Revisor Fiscal o su Representante Legal, según el caso.

1% → 0,70%

Se adjunta certificado de seguridad social correspondiente al mes de octubre.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado " 004CertificadoPazySalvoOctubre.pdf".

Adicionalmente, lo relacionado con el pago de honorarios, salarios y prestaciones sociales se encuentra soportado en el documento remitido en la subactividad 1 de este mismo componente.

g. Subactividad 7.

Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documento que forman parte

integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio.

1% → 0.75%

En referencia al cumplimiento de esta actividad, durante el mes de octubre fueron realizados y presentados informes semanales correspondientes a la información financiera del mes de octubre, de acuerdo con compromisos que se derivaron en la articulación con la ANH y su apoyo a la supervisión en esta área, con el fin de mantener la información actualizada y organizada de manera previa a la presentación del informe para su aprobación.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada: "005Octubre".

h. Subactividad 8.

Garantizar las calidades de los requerimientos técnicos y tecnológicos necesarios para la ejecución del convenio (correos, almacenamiento en la nube, entre otros).

1% → 0,70%

Durante el mes de octubre se garantizó el funcionamiento del sistema de almacenamiento en la nube como repositorio documental digital, con el fin de mantener actualizada la información generada en el marco del presente convenio. Asimismo, se gestionaron y asignaron cuentas de correo electrónico de uso exclusivo para el convenio a cada uno de los profesionales del Componente 2 ETH.

Estas cuentas cuentan con un dominio propio y acceso a las diferentes herramientas de Microsoft Outlook y su ecosistema (calendario, OneDrive, SharePoint, Forms, entre otras aplicaciones), lo que permite una ejecución más eficiente del convenio y un manejo adecuado de la información.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada: "004RequerimientosOctubre".

i. Subactividad 9.

Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la ANH a través del supervisor del Convenio.

1% → 0,70%

Durante el mes de octubre se acataron las directrices dadas por la ANH por medio del supervisor del convenio.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "004DirectricesOctubre".



8. Contrapartida

En relación con este apartado se relacionan avances por valor de SIETE MIL CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 7.120.571.989) en el mes de octubre de 2025; los cuales se distribuyeron proporcionalmente entre las líneas presupuestales del convenio de la siguiente manera:

ACTIVIDAD DE CONTRAPARTIDA	ACTIVIDADES A EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR EJECUCIÓN PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	% EJE	OBSERVACIONES
Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto.	Diagnóstico de la situación en los territorios y levantamiento de necesidades.	\$ 650.000.000	\$ 650.000.000	\$ 650.000.000	100%	002FormulaciónInic
	Acompañamiento y seguimiento de la implementación de los proyectos productivos.	\$ 980.000.000	\$ 127.400.000	\$ 127.400.000	13%	003ImplementaciónInic
	Fortalecimiento de los proyectos productivos en bienes y/o servicios.	\$ 3.500.000.000	\$ 450.120.000	\$ 450.120.000	13%	003ImplementaciónInic
	Revisión de planes de inversión de los proyectos productivos identificadas.	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	100%	002FormulaciónInic
	Identificación y viabilidad técnica y económica, de los proyectos productivos a fortalecer en cada uno de los territorios.	\$ 1.200.000.000	\$ 0	\$ 1.200.000.000	100%	002FormulaciónInic
Apoyo institucional complementario.	Servicios logísticos, jurídicos, financieros y técnicos requeridos para el cumplimiento del convenio.	\$ 499.105.425	\$ 299.463.255	\$ 299.463.255	60%	
Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés.	Plataforma https://www.fonpacificocursos.com/ con 10 cursos activos.	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	100%	Enlace con la información
Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)	24 piezas audiovisuales producidas y difundidas en medios digitales y comunitarios.	\$ 500.000.000	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	50%	Enlace con la información
Formación en competencias digitales y tecnología cívica.	Capacitación de líderes comunitarios en herramientas digitales, gestión de datos abiertos y veeduría tecnológica. https://www.fonpacificocursos.com/	\$ 1.500.000.000	\$ 495.000.000	\$ 495.000.000	33%	Enlace con la información

Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente.	Desarrollo e implementación de una plataforma digital de participación ciudadana, con integración de tecnologías de georreferenciación, tableros dinámicos de seguimiento (dashboards), alertas comunitarias, consulta pública de avances y canales de reporte ciudadano en tiempo real sobre la ejecución del convenio y sus impactos territoriales.	\$ 1.203.331.725	\$ 541.499.276	\$ 541.499.276	45%	Enlace con la información
Sistematización y evaluación de impactos del proyecto.	Informe de lecciones aprendidas, memoria técnica y recomendaciones de política pública.	\$ 1.070.894.575	\$ 107.089.458	\$ 107.089.458	10%	
TOTAL		\$ 14.103.331.725	\$ 5.920.571.989	\$ 7.120.571.989	50%	

Ilustración 16 Contrapartida

9. Documentos de referencia

1. 001 Acta Comité No. 5.pdf
2. 001PropuestaTecnicoEconomica.doc
3. 004PlanOctubre.xlsx
4. 004CronogramaOctubre.xls
5. 004ProcesodeSelección.pdf
6. 005Octubre
7. 001ActasDelInducciónOct
8. 002MetodologiaIniciativas.pdf
9. 002FormulaciónInic
10. 003InplementaciónInic
11. 002MesaDepartamentalArauca04-09-2025
12. 003MesaDepartamentalRiohacha09-09-2025
13. 004MesaDepartamentalesSincelejo16-09-2025
14. 005MesaDepartamentalesNeiva23-09-2025
15. 001EjecuciónPlanAnh
16. 002MinMinasyEnergia
17. 003ANLA
18. 004Dancp
19. 005MinInterior
20. 006ServicioPúblicoEmpleo
21. 007MinTrabajo
22. 001PlandeTrabajoCAR.xlsx
23. 001EjecuciónCorpoamazonía
24. 002EjecuciónCormacarena
25. 003EjecuciónCorpocésar
26. 005EjecuciónCorpomojana
27. 006EjecuciónCorponorr
28. 007EjecuciónCVS
29. 004EjecuciónCorpoguajira
30. 002EstudioLinTec
31. 003DocumentoLinTec
32. 004SoporteTécnicoOctubre
33. 004ApoyoLogisticoOctubre
34. 004InformeFinancieroOctubre
35. 005InformeTécnicoOctubre
36. 005Octubre
37. 004RequerimientosOctubre
38. 004DirectricesOctubre

Convenio Interadministrativo No. 551-2025 Suscrito entre la Fondo Mixto De Etnocultura y Desarrollo Social - FONPACIFICO y la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de Octubre de 2025

PERIODO: Desde 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1. Generalidades

Convenio No.	551 DE 2025			
Objeto	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa"			
Valor Inicial del Convenio	\$ 54.398.565.225			
Aportantes	Valor		Registro Presupuestal	
ANH	\$ 40.295.233.500		80625 del 18/06/2025	
FONPACIFICO	\$ 14.103.331.725			
Valor actual del Convenio	\$54.398.565.225			
Fecha Suscripción	17/06/2025			
Fecha de Inicio	20/06/2025	Plazo de Ejecución Inicial	Hasta 31 de diciembre de 2025 inclusive	
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025			
Prórroga	No. meses	Del ____ Al ____		Fecha
(1)				
Fecha de terminación Actual	31/diciembre/2025			
Estado del Convenio	Vigente X	Suspendido	Terminado	En liquidación
Descripción estado del Convenio	El convenio se encuentra en ejecución			

1.2. Supervisión

Por parte de Fonpacífico la supervisión será ejercida por Jhon Jairo Echeverri Marín, Supervisor de Contratos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante memorando No. 1888762, del 20/06/2025, designo la supervisión del convenio al Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

1.3. Manejo de Recursos del Convenio

1.3.1. Giros de la ANH a FONPACIFICO

DESCRIPCIÓN	VALOR	REGISTRO No.	FECHA	OBSERVACIONES
Primer desembolso	\$ 8.059.046.700	OP 251193425	18/07/2025	
Segundo desembolso	\$12.088.570.050	OP 390745425	16/10/2025	
Tercer desembolso	\$16.118.093.400			
Cuarto desembolso	\$ 4.029.523.350			

Nota: En el período reportado, se radicó solicitud de desembolso por parte de FONPACIFICO correspondiente al 30% de acuerdo con lo establecido en el Convenio 551 de 2025.

1.3.2. Reporte Ejecución Contrapartida

1.3.2.1. Ejecución Acumulada Periodo Anterior

Ejecutado Acumulado al Periodo Anterior	VALOR	PORCENTAJE (%)
	\$ 1.200.000.000	9%
Observaciones: El valor acumulado corresponde a la ejecución en el rubro de la contrapartida correspondiente a fortalecer iniciativas identificada por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto.		

1.3.2.2. Ejecución del Período

DESCRIPCION PRESENTE PERÍODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERÍODO (%)	SUBTOTAL
Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto	\$ 2.727.520.000	35%	\$ 7.830.000.000
Apoyo institucional complementario	\$ 299.463.255	60%	\$ 499.105.425
Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés	\$ 1.500.000.000	100%	\$ 1.500.000.000

Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)	\$ 250.000.000	50%	\$ 500.000.000
Formación en competencias digitales y tecnología cívica	\$ 495.000.000	33%	\$ 1.500.000.000
Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente	\$ 541.499.276	45%	\$ 1.203.331.725
Sistematización y evaluación de impactos del proyecto	\$ 107.089.458	10%	\$ 1.070.894.575
TOTAL	\$ 5.920.571.989	41%	\$14.103.331.725
Observaciones:			

Nota: Para el período se reporta ejecución de la Contrapartida correspondiente al avance de la formulación e implementación de 21 iniciativas.

1.3.2.3. Ejecución Acumulada (con corte al 31 de Octubre 2025)

Total Acumulado a la Fecha de Corte	VALOR TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO (%)
	\$ 7.120.571.989	50%
Observaciones:		

1.4. Rendimientos Financieros

De acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales se apertura la Cuenta de Ahorros No. 728-000088-41, del banco Bancolombia, exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio 551 de 2025.

Periodo Reportado	Valor	Acumulado al Presente Periodo
Junio 2025	\$ 0	\$ 0
Julio 2025	\$ 776.360,31	\$ 776.360,31
Agosto 2025	\$ 35,96	\$ 776.396,27
Septiembre 2025	\$ 34,80	\$ 776.431,07
Octubre 2025	\$ 633.442,80	\$ 1.409.873,87

Nota: A la fecha de corte del presente informe se recibió desembolso, se anexa extracto bancario correspondiente al mes de Octubre 2025.

2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

2.1.1. Información Básica

Proceso de Selección No.	Contratación Directa, numeral 4 artículo 10 Manual de Contratación FONPACIFICO
Número del contrato	PS0162025
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO
Supervisor	John Jairo Echeverri Marín – FONPACIFICO

Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE No. 2 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA			
Valor	\$ 533.966.667		MESES: 1	
Fecha de Inicio	Fecha de terminación inicial	22/06/2025	Fecha de Terminación Final	23/07/2025
Inicial	\$ 533.966.667			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 533.966.667			

2.1.2. Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Forma de pago	\$ 0	\$ 533.966.667	0%	0%
Total				

2.1.3 Actividades

Las actividades correspondientes al contrato derivado fueron ejecutadas y cumplidas a cabalidad, conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.

2.2.1 Información Básica

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios			
Número del contrato	PS0182025			
Contratista	FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA			
Supervisor	John Jairo Echeverri Marín – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU			

	CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA".			
Valor	\$ 21.490.791.200		MESES: 5 MESES Y 8 DIAS	
Fecha de Inicio: 23/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	31/12/2025
Inicial	\$ 21.490.791.200			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 21.490.791.200			

2.2.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado 20% - Fecha: 29/07/2025	\$ 4.298.158.241	\$ 17.192.632.959	20%	20%
Segundo Desembolso 30%	\$ 6.447.237.360	\$ 10.745.395.601	30%	30%
Total	\$ 10.745.395.601	\$ 10.745.395.601		

2.2.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240
Calidad del Servicio	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 2.149.079.120
Prestaciones Sociales	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 1.074.539.560
Pago Anticipado	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240

2.2.4 Actividades

A continuación, se relacionan los gastos correspondientes al mes de Octubre de 2025.

Iniciativas C1	Total
3.290.000.000	\$ 3.290.000.000

Nota: Este valor corresponde a **pagos parciales**, destinado a garantizar la ejecución material y financiera de las iniciativas aprobadas, así como a respaldar la adquisición de los bienes y servicios indispensables para el desarrollo del objeto contractual.

2.3.1 Información Básica

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios			
Número del contrato	PS0192025			
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO			
Supervisor	John Jairo Echeverri Marín – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 2 y 3 PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA."			
Valor	\$ 18.270.475.633		MESES:	
Fecha de Inicio: 24/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	31/12/2025
Inicial	\$ 18.270.475.633			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 18.270.475.633			

2.3.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado 20% Fecha: 29/07/2025	\$ 3.760.888.460	\$ 14.509.587.173	20%	20%
Segundo Desembolso 30%	\$ 5.641.332.690	\$ 8.868.254.483	30%	30%
Total	\$ 9.402.221.150	\$ 8.868.254.483		

2.3.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 1.888.444.230
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 940.222.115
Devolución Pago Anticipado	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460

2.4 Actividades

Durante el periodo correspondiente se realizaron los siguientes contratos de prestación de servicios de ETH, entidades aliadas y corporaciones. A continuación, se relacionan los contratos.

- ETH

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
1	Lina Maria Losada Perez	CPS-ETH-ANH-164-2025	\$ 17.500.000	1/10/2025	15/12/2025	ANH
2	Laura Florez Tamayo	CPS-ETH-ANH-166-2025	\$ 12.500.000	1/10/2025	15/12/2025	ANH
3	Luisa Fernanda Garcia Garcia	CPS-ETH-MT-010-2025	\$ 17.500.000	1/10/2025	15/12/2025	MIN TRABAJO
4	Helmer Andres Ariza Saray	CPS-ETH-MT-011-202	\$ 17.500.000	1/10/2025	15/12/2025	MIN TRABAJO
5	Marcela Villada Hernandez	CPS-ETH-MT-012-2025	\$ 22.500.000	1/10/2025	15/12/2025	MIN TRABAJO
6	Darinel Villamizar Ruiz	CPS-ETH-MT-013-2025	\$ 20.000.000	1/10/2025	15/12/2025	MIN TRABAJO
7	Alfonso Suárez Moreno	CPS-ETH-MT-014-2025	\$ 17.500.000	1/10/2025	15/12/2025	MIN TRABAJO
			\$ 125.000.000			

- CORPORACIONES

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
1	Steffanya del Pilar Ladino Acero	CPS-ETH-CMC-022-202	\$ 9.750.000	10/10/2025	15/12/2025	Cormacarena
			\$ 9.750.000			

Así mismo, se relacionan los gastos correspondientes al mes de Octubre de 2025.

RESUMEN DE PAGOS OCTUBRE									
Viajes	Hospedaje	Eventos	Tiquetes	Transporte Terrestre	Gastos Adicionales	Honorarios ETH	Honorarios Corporaciones	Honorarios Equipo Mínimo	Total
51.440.000	29.798.018	76.483.891	57.345.493	285.946.989	3.707.000	2.674.750.000	553.025.440	160.314.315	3.892.811.146
				Nota N° 1		Nota N° 2	Nota N° 3	Nota N° 4	

Nota 1: El valor correspondiente al transporte terrestre del mes de octubre asciende a \$197.266.357,80. Adicionalmente, se incluye el valor de \$88.680.632, correspondiente a servicios de transporte terrestre ejecutados en zonas diferentes a las establecidas en el valor mensual acordado. Estos valores se relacionan de acuerdo con los requerimientos realizados por la Agencia, en cumplimiento de las necesidades operativas del periodo mencionado.

Nota 2: Los soportes fueron enviados y están disponibles cargados en la carpeta de Honorarios ETH del Drive.

Nota 3: Los soportes fueron enviados y están disponibles en la carpeta de Honorarios Corporaciones del Drive.

Nota 4: Los soportes fueron enviados y están disponibles en la carpeta de Honorarios Equipo Mínimo del Drive.

3. Consolidación de Información de los Contratos

No. Contrato	Objeto	Valor	% de Ejecución	% por Ejecutar
PS0162025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar acciones relacionadas con componente no. 2 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa	\$ 533.966.667	0%	100%
PS0182025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 1 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de Exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa.	\$ 21.490.791.200	50%	50%
PS0192025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 2 y 3 para ejecutar el	\$ 18.270.475.633	50%	50%

	proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la Articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la Generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa."			
--	--	--	--	--

4. Resumen de Ejecución de Recursos (Con corte al 31 de octubre de 2025)

Componente	Actividad	Valor (Cadena de Valor)	Compromisos			Saldo
			Coagropuerto	Flora y Fauna	Coagropuerto	
Iniciativas de inversión socioambiental	Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 5.587.605.712	\$ 0	\$ 5.587.605.712	\$ 0	\$ 0
	Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 15.903.185.488	\$ 0	\$ 15.903.185.488	\$ 0	\$ 0
Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH)	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 2.041.625.164	\$ 85.866.667	\$ 0	\$ 1.955.758.497	\$ 0
	Implementar acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 14.076.468.236	\$ 448.100.000	\$ 0	\$ 13.628.368.236	\$ 0
Documentos de lineamientos técnicos (Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos)	Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental.	\$ 537.269.780	\$ 0	\$ 0	\$ 537.269.780	\$ 0
	Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en las entidades de carácter ambiental.	\$ 2.149.079.120	\$ 0	\$ 0	\$ 2.149.079.120	\$ 0
Total		\$ 40.295.233.500	\$ 533.966.667	\$ 21.490.791.200	\$ 18.270.475.633	\$ 0

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
CONVENIO ANH 511 - 2025
AUXILIAR CONTRAPARTIDA ACUMULADA A OCTUBRE 2025

ACTIVIDAD DE CONTRAPARTIDA	ACTIVIDADES A EJECUTAR	VALOR UNITARIO	EJECUCIÓN ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	VALOR EJECUCIÓN PERIODO	TOTAL EJECUTADO	% EJE
Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto	Diagnóstico de la situación en los territorios y levantamiento de necesidades.	\$ 650.000.000		\$ 650.000.000	\$ 650.000.000	100%
	Acompañamiento y seguimiento de la implementación de los proyectos productivos.	\$ 980.000.000		\$ 127.400.000	\$ 127.400.000	13%
	Fortalecimiento de los proyectos productivos en bienes y/o servicios.	\$ 3.500.000.000		\$ 450.120.000	\$ 450.120.000	13%
	Revisión de planes de inversión de los proyectos productivos identificadas.	\$ 1.500.000.000		\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	100%
	Identificación y viabilidad técnica y económica, de los proyectos productivos a fortalecer en cada uno de los territorios.	\$ 1.200.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ 0	\$ 1.200.000.000	100%
Apoyo institucional complementario	Servicios logísticos, jurídicos, financieros y técnicos requeridos para el cumplimiento del convenio.	\$ 499.105.425		\$ 299.463.255	\$ 299.463.255	60%
Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés	Plataforma https://www.fonpacificocursos.com/ con 10 cursos activos y 1.000 beneficiarios inscritos.	\$ 1.500.000.000		\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	100%
Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)	24 piezas audiovisuales producidas y difundidas en medios digitales y comunitarios.	\$ 500.000.000		\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	50%
Formación en competencias digitales y tecnología cívica	Capacitación de 2.000 líderes comunitarios en herramientas digitales, gestión de datos abiertos y veeduría tecnológica. https://www.fonpacificocursos.com/	\$ 1.500.000.000		\$ 495.000.000	\$ 495.000.000	33%
Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente	Desarrollo e implementación de una plataforma digital de participación ciudadana, con integración de tecnologías de georreferenciación, tableros dinámicos de seguimiento (dashboards), alertas comunitarias, consulta pública de avances y canales de reporte ciudadano en tiempo real sobre la ejecución del convenio y sus impactos territoriales.	\$ 1.203.331.725		\$ 541.499.276	\$ 541.499.276	45%
Sistematización y evaluación de impactos del proyecto	Informe de lecciones aprendidas, memoria técnica y recomendaciones de política pública.	\$ 1.070.894.575		\$ 107.089.458	\$ 107.089.458	10%
TOTAL		\$ 14.103.331.725	\$ 1.200.000.000	\$ 5.920.571.989	\$ 7.120.571.989	50%
