

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN (SEGUIMIENTO AVANZAME)

Ciudad: Bogotá.

Lugar: Virtual a través de la aplicación de Microsoft teams:
<https://teams.microsoft.com/meet/21411515657401?p=DR3uoEqYY0kUiD5Gg1>

Fecha: 13 de marzo de 2026.

Hora: De las 8:30 am a las 9:30 am.

Asistentes:

Ministerio de Minas y Energía – MME

- Nickolay Steve Jiménez Barrera
- Jorge Eliécer Lozano Ospina
- Tania Pinzón
- Diana Erika Ramírez Ramírez
- Efraín Baracaldo Romero
- Jorge Alberto (FENOGE)
- Yamile Angélica Medina Walteros

Interkont

- Jhon Eduard Ortiz Sánchez
- Cristian Correa

Periodicidad: Semanal

Día: Viernes

Horario: 8:30 a. m. – 9:00 a. m.

Durante estas sesiones se abordarán los siguientes temas:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180



	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

- Estado de uso y apropiación (cifras).
- Seguimiento a la ejecución de la bolsa de horas (historias de usuario).
- Seguimiento a compromisos y tareas asignadas.
- Definición de acciones y próximos pasos

RESUMEN DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión tuvo como propósito revisar métricas operativas de Avanzame, el estado de tickets y el avance de desarrollos e incidencias para coordinar los siguientes pasos hacia producción. Tras verificaciones de acceso se presentó un tablero con cifras globales de recursos, contenidos, transacciones y disponibilidad, incluyendo datos por 2026 y promedios mensuales que muestran áreas con actividad por debajo del promedio; además se detectó que los proyectos cargados por "Cargue Masivo" carecen de fecha de creación y se propuso actualizar esa columna para que aparezcan en la línea de tiempo.

Se revisó la gestión de soporte con 877 tickets totales y un tiempo promedio de atención de 29 minutos (en marzo predominó atención por correo y chat con 10 tickets y 19 minutos promedio). En desarrollo, OEMs tienen ~50% de ajustes resueltos, RENOJET está en ~80% con ajustes finales, Argo avanza en interoperabilidad pero depende de permisos y la historia AOM para hidrocarburos fue priorizada con un plan de trabajo próximo. Se discutieron causas de retraso vinculadas a coordinación y contratación con NEON, y dependencias externas como Megasoft para la historia 82 e inventarios. Diana documenta el retraso en Taiga y se acordó crear usuarios de prueba y capacitar nuevos usuarios con Cristian y Diana; la expectativa es entregar los ajustes finales la próxima semana.

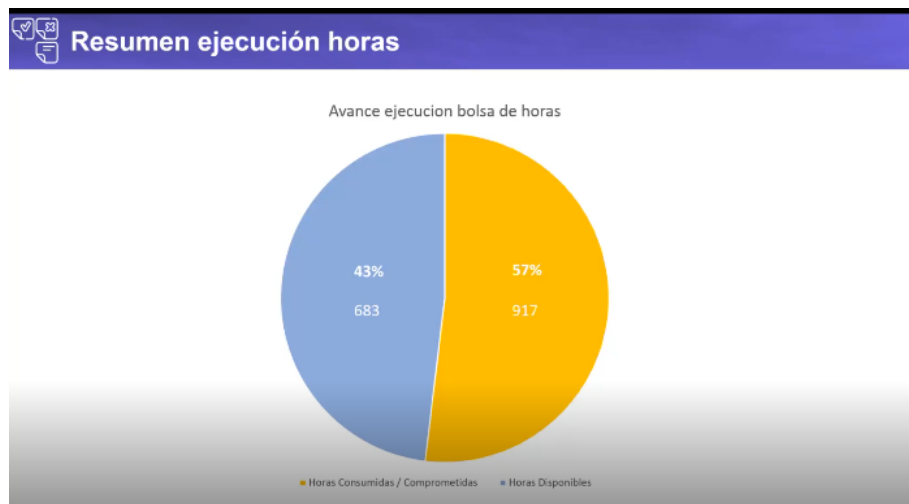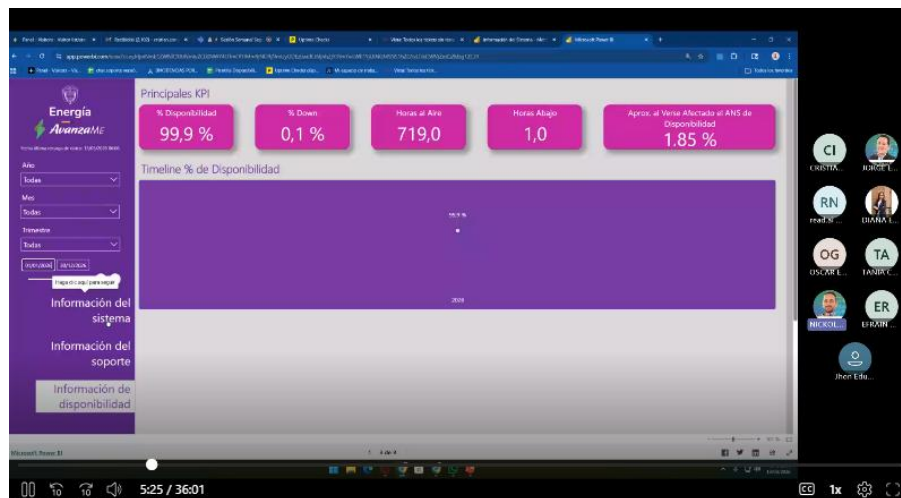


Resumen ejecución horas: HU en producción

Código Historia de Usuario	Descripción	# de horas estimadas	Estado	Horas consumidas (se cuenta el consumo una vez se implemente en producción)
AVM-284	Creación nueva unidad de medida para el activo módulo AOM	45	Producción	45
AVM-292	Nueva Tableros BI proyectos 6G y Trámites	44	Producción	44
AVM-301	HU reporte ficha por proyectos 6g	23	Producción	23
AVM-263	Módulo basado en el módulo pines con nuevos campos en el formulario de creación de proyecto, consulta y actualización	199	Producción	199
AVM-273	Con base a la multiplicación de dos indicadores surge este indicador calculado de tipo impacto	10	Producción	10
AVM-287	HU Reporteador de tramites proyectos 6G	16	Producción	16
AVM-286	HU nuevo reporteador de proyectos 6G	23	Producción	26
AVM-284	Nuevo ajustes estallido 6G	18	Producción	18
AVM-315	Valor Total de crudo y gas - Gestión Solar	10	Producción	10
AVM-270	PNR - Módulo basado en proyectos normal el cual al seleccionar una determinada tipificación de proyectos este muestra un formulario en Datos	100	Producción	100

Plan de trabajo: ARGO Fase 1

Fase	Tareas	Descripción	Hrs	Avance	P. Inicio	P. Fin
Analisis	Revisión de documentación API v1.3	Analisis detallado de cambios en documentación, identificación de campos eliminados y nuevos servicios	1,00	1,00	11/02/2026	11/02/2026
Backend	Refactorizar método radicar(Documento)	Extraer lógica de radicación base a método separado, preparar para flujo en 3 pasos	3,00	3,00	11/02/2026	11/02/2026
Backend	Implementar flujo paso 1: Radicar base	Crear método radicar(DocumentoBase()) que radica sin tipoDocumental ni expediente	2,00	2,00	12/02/2026	12/02/2026
Backend	Implementar flujo paso 2: Asociar Tipo Documente	Integrar llamada a TRGService después de radicación exitosa, manejo de respuesta	4,00	4,00	12/02/2026	12/02/2026
Backend	Ajustar flujo paso 3: Asociar Expediente	Modificar bloque existente para ejecutarse después de TRD	2,00	2	13/02/2026	13/02/2026
Backend	Agregar campos Serie/Subserie a Request	Agregar códigoSerie y códigoSubserie a Radicar(DocumentoParamRequest) y Radicar(DocumentoParamRequest)	1,00	1	16/02/2026	16/02/2026
Backend	Implementar logging detallado	Agregar logs en cada paso del flujo para troubleshooting	1,00	1	16/02/2026	16/02/2026
Backend	Manejo de excepciones específicas	Crear excepciones custom para cada tipo de error (RadicacionException, TRGException, etc)	2,00	2	16/02/2026	16/02/2026
Testing	Pruebas unitarias de radicación base	Test del flujo completo con 3 pasos, validar orden de llamadas	2,00	1	17/02/2026	17/02/2026
QA	Implementación de pruebas de Calidad	Test de flujo completo de radicación con TRD y Expediente en ambiente de pruebas	4,00		18/02/2026	18/02/2026
QA	Implementación de pruebas de Aceptación	Implementación de pruebas de aceptación realizadas por el cliente para autorización de paso a producción			19/02/2026	23/02/2026
QA	Implementación de ajustes de calidad	Implementación de ajustes de calidad de hallazgos reportados por el cliente si aplica			24/02/2026	24/02/2026
QA	Despliegue en ambiente de producción				1/03/2026	1/03/2026
TOTAL GENERAL			27,00	77,77%		

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

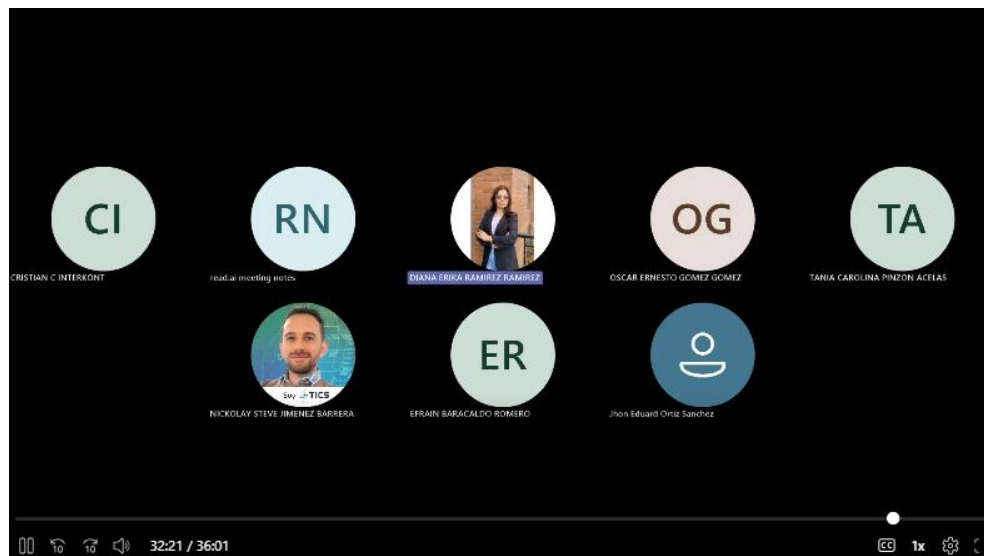

Elaboró acta: Tania Carolina Pinzón Acelas – Contratista Secretaría General

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180
