

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

1. INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN									
Fecha de elaboración del informe	10	MAYO	2026	Periodo de seguimiento	1 al 30	ABRIL	2026	Informe número	53
Nombre del supervisor	Carolina Otilia Montealegre Castillo			Documento delegación			Correo electrónico		
Cargo	Supervisor Proyectos SGR			Resolución 0477 del 15 de julio de 2025			drq-supervisorsgr@minciencias.gov.co		
Profesional de apoyo a la supervisión	Diana Patricia Padilla Cabrera			Correo electrónico			dppadilla@minciencias.gov.co		
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
BPIN	Nombre del proyecto						Nombre de la entidad ejecutora		
2020000100190	Desarrollo e implementación a escala in vitro y ex vivo de un prototipo de parche bioactivo cardiaco como estrategia terapéutica en el tratamiento de alteraciones en la conducción eléctrica cardiaca producto de enfermedades isquémicas para Antioquia.						Universidad Pontificia Bolivariana		
Convocatoria de la cual deriva el proyecto	Convocatoria 3 "convocatoria del sgr – fondo de cti - para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios, en el marco de la celebración del bicentenario"	Acuerdo aprobatorio	No.	Fecha	Valor aprobado conforme Acuerdo de Aprobación			Fe de erratas Acuerdo aprobación	
					SGR (ACTeI)	Contrapartida	Total		
			07	07/07/2021	\$4.160.979.824,40	\$1.242.619.635,60	\$5.403.599.460,00	N. A	
Plazo Inicial (meses)	Fecha de inicio del proyecto	Fecha de inicio reportada en GESPROY	Fecha final Inicial reportada en GESPROY	Ampliación de Horizonte (meses) (En caso de que se presente durante la ejecución del proyecto)		Fecha Final del proyecto			
48	03-12-2021	03-12-2021	30-11-2025	N. A		30-11-2025			
Descripción Alcance del Proyecto: El proyecto tiene como propósito el desarrollo de un parche bioactivos de polímero natural con propiedades electromecánicas como estrategia terapéutica para la intervención de alteraciones de contractilidad cardiaca derivadas de enfermedades isquémicas., para esto se pretende generar una estructura tridimensional nano bioactiva que exhiba propiedades electro conductoras y mecánicas, y a su vez interactúe adecuadamente en un ambiente biológico específico. Dicho parche será generado mediante proteínas de seda obtenidas a partir de residuos celulosos colombianos para mitigar la prevalencia de las enfermedades isquémicas del corazón como estrategia terapéutica para intervención de alteraciones de contractilidad cardiaca dentro del campo de la ingeniería de tejidos cardiovascular y medicina regenerativa. Para la ejecución de esta alternativa, se propone como uso de materia prima residuos fibrosos de la seda, permitiendo así generar un valor agregado de este residuo, el cual dentro de la cadena textil no representa un subproducto para su comercialización. Dentro de las propiedades fisicoquímicas y biológicas de esta proteína, se tiene que este presenta un comportamiento eléctrico, el cual puede potencializarse mediante modificaciones estructurales con nanopartículas mecánicas. Al ser una proteína de origen natural, ésta presenta en su estructura una serie de aminoácidos que favorecen su acoplamiento bioactivo con el tejido miocárdico. Favoreciendo la bio integración y la excito conducción con el área isquémica del corazón. Por otro lado, al provenir de una fuente renovable de residuos sericola colombianos, la implementación dentro del desarrollo del parche bioactivo, permite el aprovechamiento de estos, disminuyendo su carga al medio ambiente y generación de nuevos subproductos diversificando el mercado de la seda en Colombia. *Tomado de la MGA – Análisis técnico de la Alternativa.									
2. OBJETIVOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO									
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar un prototipo de un parche bioactivo de polímero natural con propiedades electromecánicas como estrategia terapéutica para Antioquia en la intervención de alteraciones de contractilidad cardiaca derivadas de enfermedades isquémicas.				Indicador del Objetivo General – Número de prototipos de parche Bioactivo Meta:1				
Objetivo Especifico 1	Desarrollar un biocompuesto electrolilado con arquitectura definida (parche bioactivo) a partir de residuos sericolos colombianos, reforzado con estructuras electroconductoras.				Producto del Especifico 1: Servicio de apoyo para la transferencia del conocimiento y la tecnología				

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

			Medido a través de: Número de organizaciones Meta: 1						
Objetivo Especifico 2	Desarrollar un modelo in vitro de alteraciones isquémicas y disquinesia de las paredes cardiacas		Producto del Especifico 2: Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación- Medido a través de: Número de proyectos Meta: 1						
Objetivo Especifico 3	Evaluar el perfil de expresión génica y de proteínas en cultivos de células cardiacas, y el proteoma del efluente coronario del modelo ex vivo en interacción con el parche bioactivo.		Producto del Especifico 3: Servicio de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad- Medido a través de: Número de estrategias Meta: 1						
Objetivo Especifico 4	Validar el comportamiento Biocompatible, bioeléctrico y biomecánico del prototipo de parche cardiaco bioactivo en un modelo in vitro de células cardiacas y ex vivo de pared cardiaca		Producto del Especifico 4: Servicio de fomento a la vigilancia y prospectiva tecnológica. Medido a través de: Número de estudios Meta:1						
Licencias o permisos									
Nombre de licencia o permiso			Fecha de expedición		Vigencia	Entidad que expide			
De acuerdo con el certificado expedido por el representante legal de la entidad ejecutora “no se requiere contar con permiso o licencias para su ejecución...”			29 de noviembre de 2021		N. A	Universidad Pontificia Bolivariana			
Localización	Departamento	Antioquia	No. de beneficiarios	Cumplimiento de requisitos de pre-ejecución					
	Municipio	Medellín							
	Localización específica de la alternativa de solución	Universidad Pontificia Bolivariana Sede Ecocampus Medellín, Bloque de Laboratorios piso 6 - Laboratorio de Bioingeniería	4.745	Fecha del certificado de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	Fecha del acto de apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados	Fecha de publicación SPGR del acta de apertura o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados	Fecha de publicación SECOP del acta de apertura o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados	No. fecha del CDP	No. y fecha del CRP
				07-01-2021	03-12-2021	03-12-2021	09-12-2021	3921 del 30-11-2021	3421 del 30-11-2021
3. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO									
4.2 FUENTES DE FINANCIACION APROBADAS OCAD									
Fuentes Financiación Aprobadas OCAD		Valor Aprobado SGR		Valor Aprobado Otras Fuentes			Valor Total		
Departamentos – ANTIOQUIA SGR – Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación – cronograma MGA -2021.		\$1.071.645,011.19		\$0			\$1.071.645,011.19		
Departamentos – ANTIOQUIA SGR – Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación – cronograma MGA -2022.		\$1.430.216.520.64		\$0			\$1.430.216.520.64		
Departamentos – ANTIOQUIA SGR – Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación – cronograma MGA -2023.		\$917.207.742.49		\$0			\$917.207.742.49		
Departamentos – ANTIOQUIA SGR –		\$741.910.568.08		\$0			\$741.910.568.08		

**INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN
PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA**

Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación – cronograma MGA -2024.			
Empresas públicas – Centro de Investigación en Materiales Avanzados 2021.	\$0	\$26.071.551.22	\$26.071.551.22
Empresas públicas – Centro de Investigación en Materiales Avanzados 2022.	\$0	\$26.071.551.22	\$26.071.551.22
Empresas públicas – Centro de Investigación en Materiales Avanzados 2023.	\$0	\$13.071.551.22	\$13.071.551.22
Empresas públicas – Centro de Investigación en Materiales Avanzados 2024.	\$0	\$13.071.551.22	\$13.071.551.22
Privadas – Corporación para el Desarrollo de la Sericultura 2021.	\$0	\$3.950.000.00	\$3.950.000.00
Privadas – Corporación para el Desarrollo de la Sericultura 2022.	\$0	\$3.950.000.00	\$3.950.000.00
Privadas – Corporación para el Desarrollo de la Sericultura 2023.	\$0	\$3.950.000.00	\$3.950.000.00
Privadas – Corporación para el Desarrollo de la Sericultura 2024.	\$0	\$2.250.000.00	\$2.250.000.00
Privadas – Universidad CES 2022	\$0	\$98.064.086.67	\$98.064.086.67
Privadas – Universidad CES 2023	\$0	\$114.936.018.67	\$114.936.018.67
Privadas – Universidad CES 2024	\$0	\$98.064.085.67	\$98.064.085.67
Privadas – Universidad Pontificia Bolivariana 2021	\$0	\$201.458.977.59	\$201.458.977.59
Privadas – Universidad Pontificia Bolivariana 2022	\$0	\$218.125.643.47	\$218.125.643.47
Privadas – Universidad Pontificia Bolivariana 2023	\$0	\$213.292.309.33	\$213.292.309.33
Privadas – Universidad Pontificia Bolivariana 2024	\$0	\$206.292.309.03	\$206.292.309.03
TOTAL	\$ 4.160.979.824,40	\$ 1.242.619.635,60	\$ 5.403.599.460,00

4.2 CONSOLIDADO FUENTES EJECUCION FUENTES DE FINANCIACIÓN

ENTIDAD	VALOR FINANCIADO SGR	VALOR FINANCIADO POR OTRAS FUENTES	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Universidad Pontificia Bolivariana	\$ 3.752.931.854,40	\$ 839.169.239,42	\$ 4.592.101.093,82
Entidad encargada de adelantar el seguimiento: MINCIENCIAS.	\$ 408.047.970,00	\$0	\$ 408.047.970,00
Centro de investigación en Materiales Avanzados	\$0	\$ 78.286.204,88	\$ 78.286.204,88
Corporación para el desarrollo de la Sericultura	\$0	\$ 14.100.000,00	\$ 14.100.000,00
Universidad CES	\$0	\$ 311.064.191,30	\$ 311.064.191,30
Ajustes en valores APROBADOS por OCAD ACTeI- SGR	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$ 4.160.979.824,40	\$ 1.242.619.635,60	\$ 5.403.599.460,00

4. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Avance de ejecución	% de avance físico del periodo	% de avance físico del periodo	% de avance acumulado GESPROY SGR	Tipología de Alerta Alertas no subsanadas (GESPROY SGR)
---------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

	reportado por la entidad	validado por la supervisión	92,28% (% consultado el 10 de mayo de 2026)			
Físico	0,0%	0,0%	% de avance acumulado Avalado Supervisión	NRI-No reporte Información	N/A	Para el periodo reportado el proyecto no presenta alertas
			99,27%			
Financiero	Valor Total Desembolsado	Valor Total Certificado Contrapartida (Avalado supervisión)	% de avance acumulado del proyecto SGR + Contrapartida (-Supervisión)	IC- Información Inconsistente	N/A	Para el periodo reportado el proyecto no presenta alertas
	\$ 3.744.222.194	\$1.242.619.634	99,83%			

6. SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN

6.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO

6.1.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCIÓN

Objetivos específicos	Actividad MGA	Entregables	Evidencias o soportes de ejecución del periodo reportado No. Expediente virtual (Minciencias) del proyecto: 20200170691200178E		Fecha evidencia	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en Informe Técnico	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en POA
			Descripción de la evidencia Por parte de la EE	Radicado AZ Minciencias			
El proyecto finalizó el horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025.	N/A	N/A	El proyecto finalizó el horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025.	N/A	N/A	00%	00%
El proyecto finalizó el horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025.	N/A	N/A	El proyecto finalizó el horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025.	N/A	N/A	00%	00%
Avance total en el periodo: No hubo reporte de ejecución.						00%	00%


6.2. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RELACIONADA POR EL EJECUTOR

ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
No hubo reporte de ejecución	No hubo reporte de ejecución	No hubo reporte de ejecución


CONCEPTO DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PERIODO ABRIL DE 2026.

El proyecto BPIN 2020000100190 finalizó su horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025. No obstante, el presente informe de supervisión se realiza para continuar el seguimiento del proyecto hasta tanto la entidad ejecutora pase a estado "TERMINADO" en el aplicativo GESPROY SGR. En ese orden de ideas, el porcentaje avalado para el periodo es de 0%.

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

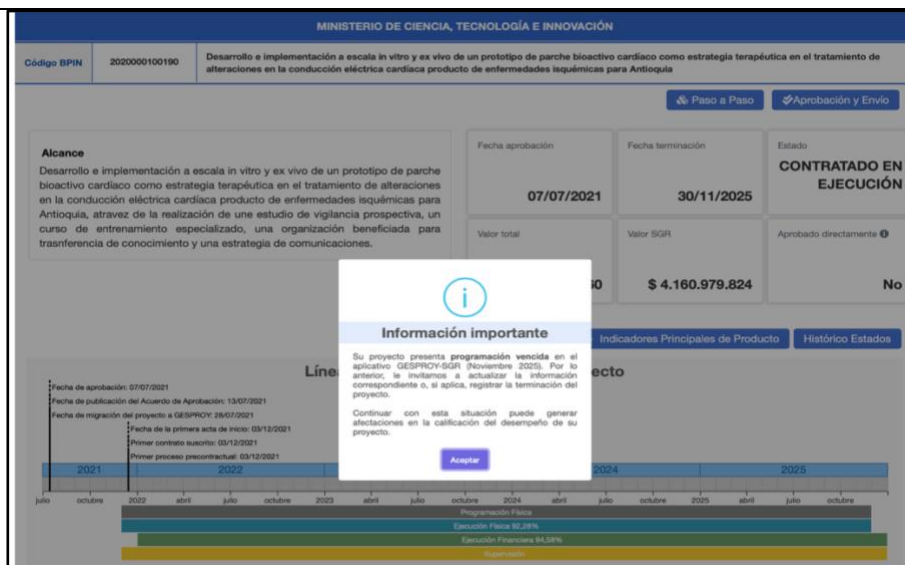

Nota: Tomado de Gesproy (Fecha de consulta 10 mayo 2026)

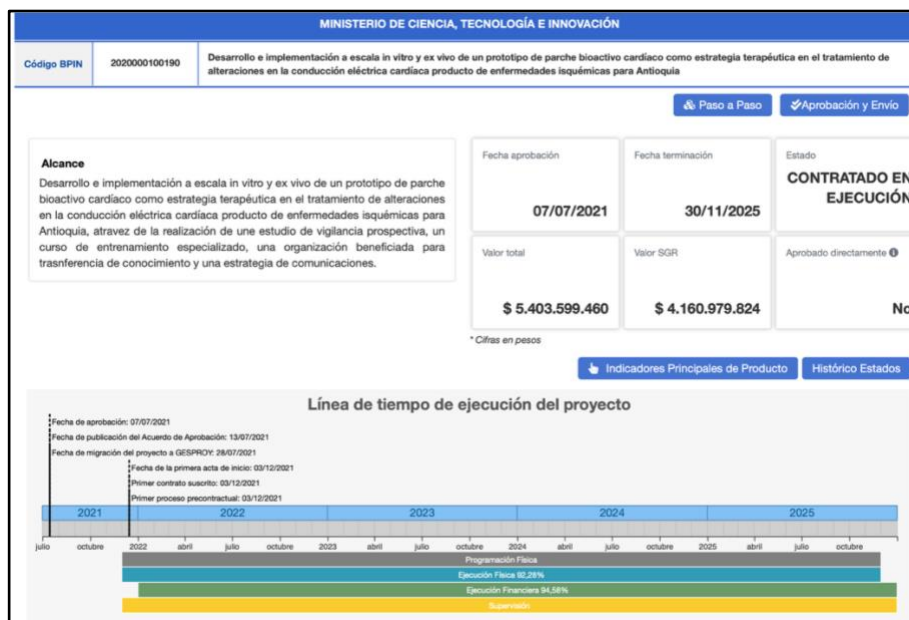

Nota: Tomado de Gesproy (Fecha de consulta 10 mayo 2026)

El proyecto BPIN 202000100190, aprobado el 07/07/2021 y con fecha de terminación contractual al 30/11/2025, registra en el aplicativo GESPROY-SGR un avance de ejecución física del 92,28 % y una ejecución financiera del 94,58% frente a un valor SGR de \$4.160.979.824, lo que evidencia un nivel de cumplimiento alto y técnicamente consistente entre el progreso de productos y la apropiación de recursos, con una leve mayor ejecución financiera asociada probablemente a compromisos ya causados en fase de cierre; no obstante, la alerta generada por el DNP indicando "programación vencida (noviembre 2025)" revela un rezago en la actualización administrativa del cronograma o en el registro formal de la terminación, situación que, de no ser subsanada

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

oportunamente, puede afectar la calificación de desempeño del proyecto y la trazabilidad de la información reportada, por lo que se hace necesario que la entidad ejecutora ajuste de inmediato la programación vigente o registre el cierre correspondiente, garantizando coherencia entre estado contractual, ejecución acumulada y reporte oficial en el sistema.

6.3 DATOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE AVANCE EN GESPROY

ACEPTA EL AVANCE REPORTADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA	SI	NO	N/A
Inconsistencia en el reporte			X
Incumplimiento del contratista			X
Deficiencias en estudios y/o diseños			X
Deficiencias Técnicas			X
Trámite de licencias y/o permisos			X
Pruebas técnicas y ensayos no satisfactorios			X

CONCEPTO

No aplica para este informe.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

Resumen de reunión de seguimiento de 30 de ABRIL de 2026:

En el marco de la reunión del proyecto, se realizó seguimiento al proceso de cierre de un proyecto cuyo horizonte de ejecución culminó el 30 de noviembre de 2025, pero que aún permanece en estado de ejecución en la plataforma GESPROY SGR. Durante la sesión se analizaron las inconsistencias presentadas en el registro de información, particularmente en el avance físico, el cargue de datos históricos y la gestión contractual. Asimismo, se revisaron las limitaciones técnicas de la plataforma y las implicaciones normativas que han impedido la actualización completa de la información, definiendo acciones para mitigar los impactos en la medición del desempeño del proyecto.

Compromisos adquiridos:

- Verificar Gesproy para armonizar las cifras y completar datos (UPB).
- Subsanan las observaciones realizadas en plataforma GESPROY (UPB).

Enlace de grabación: https://drive.google.com/file/d/1Vla_DurG4kcR2YQhtq_HRLzHbUEOXxSu/view?usp=gmail

Mesas Técnicas:	No.1	Orientaciones en ajustes al proyecto	No. 0	Orientaciones en cierre de proyectos	No. 0	Otros	No. 0	Visitas a Campo	No. 0
-----------------	------	--------------------------------------	-------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-----------------	-------

En caso de la realización de Otros:

Una vez revisada la información disponible en el aplicativo GESPROY, se evidencia que, a la fecha, la entidad ejecutora aún no ha realizado el cambio de estado del proyecto de "Contratado en Ejecución" a "Terminado", pese a que el proyecto registra como fecha de finalización el 30 de noviembre de 2025. En este contexto, se reitera a la entidad ejecutora la responsabilidad de adelantar de manera oportuna las gestiones necesarias para la actualización del estado del proyecto en el aplicativo, así como para la culminación del cierre técnico, financiero, administrativo y jurídico, e informar formalmente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación cualquier situación que esté generando retrasos o impedimentos en dicho trámite, en el marco de las acciones de supervisión y conforme a la normatividad vigente aplicable a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Análisis de seguimiento a indicadores y metas de producto

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Metas de Productos								
Mostrar 10 registros por página					Buscar			
	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
1	Desarrollar un modelo in vitro de alteraciones isquémicas y disquinesia de las paredes cardíacas.	Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad	Número de estrategias	1				
2	Evaluar el perfil de expresión génica y de proteínas en cultivos de células cardíacas, y el proteoma del efuyente coronario del modelo ex vivo en interacción con el parche bioactivo.	Servicios de apoyo para entrenamiento especializado	Número de cursos	1				
3	Generar un biocompuesto electrohilado con arquitectura definida (parche bioactivo) a partir de residuos serícolas colombianos, reforzado con estructuras electroconductoras.	Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología	Número de organizaciones	1				
4	Validar el comportamiento biocompatible, bioeléctrico y biomecánico del prototipo de parche cardíaco bioactivo en un modelo in vitro de células cardíacas y ex vivo de pared cardíaca.	Servicio de fomento a la vigilancia y prospectiva tecnológica	Número de estudios	1				

Una vez revisado el módulo de Metas de Producto en el aplicativo GESPROY, se evidencia que el proyecto definió cuatro (4) productos, cada uno asociado a un objetivo específico, con una meta programada de una (1) unidad por producto, lo cual es consistente con el alcance aprobado del proyecto.

No obstante, para el periodo objeto de análisis, se observa que los campos correspondientes a año de reporte, mes de reporte, cantidad ejecutada y porcentaje de ejecución se encuentran sin diligenciar, lo que impide verificar de manera formal en el aplicativo el nivel de cumplimiento de las metas de producto, pese a que el proyecto registra una ejecución física acumulada del 92,28 % y una ejecución financiera del 94,58%, según la información general del proyecto.

Esta situación resulta relevante considerando que el proyecto cuenta con fecha de terminación 30 de noviembre de 2025, por lo cual, a la fecha, debería encontrarse debidamente actualizado el reporte final de los indicadores de producto, reflejando la ejecución efectiva de cada meta y permitiendo su validación por parte de la supervisión. En consecuencia, se concluye que:

- Las metas de producto se encuentran claramente definidas y alineadas con los objetivos específicos del proyecto.
- Sin embargo, no se evidencia en GESPROY el reporte de ejecución de dichas metas, lo que constituye una debilidad en el registro y cierre técnico del proyecto.
- Se hace necesario que la entidad ejecutora actualice y consolide el reporte final de los indicadores de producto, incluyendo cantidades ejecutadas y porcentajes de cumplimiento, como insumo indispensable para el cierre técnico y el cambio de estado del proyecto a "Terminado".

Finalmente, se recomienda requerir formalmente a la entidad ejecutora para que regularice el cargue de la información de ejecución de los productos en GESPROY, o en su defecto, justifique técnicamente las razones por las cuales no se efectuó dicho reporte, en el marco de las obligaciones de seguimiento y control establecidas para los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Análisis de seguimiento a indicadores de producto

Indicadores de Producto												
Mostrar 10 registros por página					Buscar							
	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
	Generar un biocompuesto electrohilado con arquitectura definida (parche bioactivo) a partir de residuos serícolas colombianos, reforzado con estructuras electroconductoras.	Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología	Número de organizaciones	1	Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la I+D+i	2024	2024	1,00				
	Validar el comportamiento biocompatible, bioeléctrico y biomecánico del prototipo de parche cardíaco bioactivo en un modelo in vitro de células cardíacas y ex vivo de pared cardíaca.	Servicio de fomento a la vigilancia y prospectiva tecnológica	Número de estudios	1	Estudios realizados	2024	2024	1,00				
	Evaluar el perfil de expresión génica y de proteínas en cultivos de células cardíacas, y el proteoma del efuyente coronario del modelo ex vivo en interacción con el parche bioactivo.	Servicios de apoyo para entrenamiento especializado	Número de cursos	1	Cursos especializados para mejorar competencias de desarrollo tecnológico e innovación a nivel industrial	2024	2024	1,00				
	Desarrollar un modelo in vitro de alteraciones isquémicas y disquinesia de las paredes cardíacas.	Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad	Número de estrategias	1	Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas	2024	2024	1,00				

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

De la revisión realizada al módulo de Indicadores de Producto en el aplicativo GESPROY, se evidencia que el proyecto cuenta con cuatro (4) indicadores, cada uno asociado a un producto y a su respectivo objetivo específico, con las siguientes características comunes:

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

- Unidad de medida: coherente con la naturaleza de cada producto (número de organizaciones, estudios, cursos y estrategias).
- Valor meta: 1,00 por indicador.
- Año inicial y final de la meta: 2024 en todos los casos.

Desde el punto de vista de la formulación, los indicadores se encuentran correctamente definidos, presentan coherencia interna con los productos aprobados y son medibles, verificables y consistentes con el alcance técnico del proyecto.

No obstante, en el análisis del seguimiento y reporte, se identifican las siguientes situaciones relevantes:

- Los campos correspondientes a año de reporte, mes de reporte, cantidad ejecutada y porcentaje de ejecución se encuentran sin diligenciar para la totalidad de los indicadores.
- En consecuencia, no es posible verificar en el aplicativo el nivel de cumplimiento efectivo de las metas, pese a que el proyecto cuenta con una fecha de terminación registrada al 30 de noviembre de 2025.
- Esta ausencia de información limita la validación formal del cumplimiento de los resultados esperados y constituye una debilidad en el registro del cierre técnico del proyecto.

Es importante resaltar que, dado que las metas se encontraban programadas para el año 2024, a la fecha debería reposar en GESPROY el reporte consolidado y final de los indicadores de producto, como soporte para el cambio de estado del proyecto a "Terminado" y para la verificación integral por parte de la supervisión.

Recomendaciones:

1. Actualizar de manera inmediata el reporte de los indicadores de producto en GESPROY, diligenciando los campos de año y mes de reporte, cantidad ejecutada y porcentaje de ejecución, con el fin de reflejar el cumplimiento efectivo de las metas establecidas y permitir su validación por parte de la supervisión.
2. Consolidar y cargar los soportes técnicos y documentales que respalden la ejecución de cada producto (informes finales, actas, certificados, estudios, evidencias de transferencia, materiales de comunicación, entre otros), asegurando su correspondencia con los indicadores reportados en el aplicativo.
3. Adelantar las gestiones necesarias para el cierre técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto, incluyendo la revisión integral de la información registrada en GESPROY, de manera que se garantice la coherencia entre el estado de ejecución, los indicadores de producto y la fecha de terminación registrada.
4. Solicitar y formalizar el cambio de estado del proyecto de "Contratado en Ejecución" a "Terminado", informando oportunamente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación cualquier situación que esté generando retrasos o dificultades en dicho trámite, en cumplimiento de las obligaciones de reporte y seguimiento establecidas para los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

8. AJUSTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APROBADOS POR OCAD

Numero de ajuste	Tipo de ajuste	Breve descripción del ajuste	Fecha de presentación de la solicitud	Fecha y documento de aval del supervisor	Fecha de acuerdo de aprobación del OCAD de CTel
No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.1. Presupuesto Inicial y ajustes aprobados

Código de la Actividad	Actividades del proyecto	Valor Inicial	Ajuste 1	Ajuste 2	Ajuste 3
No hubo ajustes aprobados por OCAD para el periodo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN

Número de contratos suscritos	Valor total comprometido	Registro presupuestal SPGR		Publicación en SECOP		Cargados en GESPROY SGR	
0	\$0	SI N/A	NO N/A	SI N/A	NO N/A	SI N/A	NO N/A

Observaciones: No se reporta contratación para el periodo. El proyecto terminó el horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025.

SECOP: No plica para este informe.

Gesproy-SGR: No plica para este informe.

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

BIO 2022 04-05-07	12/05/2022	Suministro	900026709	900026709-CESAR TABARES L Y CIA LTDA.	\$ 58.793.140,00	SPGR	12/06/2022
BIO-INSU-024	19/12/2022	Suministro	900355024	900355024-EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS	\$ 649.740,00	SPGR	2/01/2023
BIO-EQ- 202208	24/05/2022	Suministro	900355024	900355024-EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS	\$ 27.866.825,00	SPGR	12/06/2022
BIO-EQ-202201	23/05/2022	Suministro	900873783	900873783-CCV DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 142.000.000,00	SPGR	5/06/2022
BIO-EQ-202202	2/06/2022	Suministro	830139036	830139036-INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD DIVISION LABORATORIO LTDA	\$ 129.374.063,00	SPGR	12/06/2022
BIO-EQ-202203	23/05/2022	Suministro	830034233	830034233-A & M Asesoría y Mantenimiento Ltda.	\$ 159.565.910,00	SPGR	5/06/2022
BIO-EQ-202501	26/02/2025	Suministro	860028662	860028662-Lab Brands SAS	\$ 17.850.000,00	SPGR	16/03/2025
BIO-INSU- 123	24/07/2025	Suministro	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$ 5.157.400,00	SPGR	21/08/2025
BIO-INSU-001	23/09/2022	Suministro	800049074	800049074-Papelería y Servicios S.A.S.	\$ 859.270,00	SPGR	2/10/2022
BIO-INSU-002	17/11/2022	Suministro	900873783	900873783-CCV DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 5.831.000,00	SPGR	22/11/2022
BIO-INSU-003	23/09/2022	Suministro	805014913	805014913-Scientific Products SAS	\$ 453.278,00	SPGR	2/10/2022
BIO-INSU-004	13/10/2022	Suministro	900918150	900918150-SURGENOMA S.A.S	\$ 991.270,00	SPGR	3/11/2022
BIO-INSU-005	20/10/2022	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$ 1.640.415,00	SPGR	3/11/2022
BIO-INSU-006	23/09/2022	Suministro	900026709	900026709-CESAR TABARES L Y CIA LTDA.	\$ 1.586.477,00	SPGR	2/10/2022
BIO-INSU-007	18/01/2023	Suministro	900355024	900355024-EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS	\$ 7.109.060,00	SPGR	2/02/2023
BIO-INSU-008	23/09/2022	Suministro	900494362	900494362-Tecnómica MD S.A.S.	\$ 258.447,00	SPGR	2/10/2022
BIO-INSU-009	23/09/2022	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$ 3.349.850,00	SPGR	2/10/2022
BIO-INSU-010	30/11/2022	Suministro	900026709	900026709-CESAR TABARES L Y CIA LTDA.	\$ 3.134.746,00	SPGR	1/12/2022
BIO-INSU-011	30/11/2022	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$ 2.782.220,00	SPGR	1/12/2022
BIO-INSU-012	7/12/2022	Suministro	860072122	860072122-G&G SUCESTORES SAS	\$ 8.156.260,00	SPGR	2/01/2023
BIO-INSU-013	13/12/2022	Suministro	800036678	800036678-DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA.	\$ 1.927.800,00	SPGR	2/01/2023
BIO-INSU-014	16/11/2022	Suministro	800224833	800224833-ARC Análisis S.A.S	\$ 1.397.060,00	SPGR	1/12/2022
BIO-INSU-015	16/11/2022	Suministro	805014913	805014913-Scientific Products SAS	\$ 3.074.960,00	SPGR	22/11/2022
BIO-INSU-016	18/01/2023	Suministro	900745087	900745087-SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.	\$ 12.658.625,00	SPGR	30/01/2023
BIO-INSU-017	24/11/2022	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$ 3.091.620,00	SPGR	1/12/2022
BIO-INSU-018	5/12/2022	Suministro	900918150	900918150-SURGENOMA S.A.S	\$ 1.356.600,00	SPGR	2/01/2023
BIO-INSU-019	7/12/2022	Suministro	800053310	800053310-ARTILAB S.A.	\$ 1.129.203,00	SPGR	2/01/2023
BIO-INSU-020	13/12/2022	Suministro	860403097	860403097-ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	\$ 6.081.376,00	SPGR	2/01/2023
BIO-INSU-021	7/12/2022	Suministro	800154351	800154351-BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO SAS	\$ 282.744,00	SPGR	2/01/2023
BIO-INSU-022	1/12/2022	Suministro	800183169	800183169-Nor químicos Ltda.	\$ 525.861,00	SPGR	4/12/2022
BIO-INSU-023	20/01/2023	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$ 3.451.809,00	SPGR	30/01/2023
BIO-INSU-025	18/01/2023	Suministro	900026709	900026709-CESAR TABARES L Y CIA LTDA.	\$ 3.838.133,00	SPGR	2/02/2023
BIO-INSU-026	17/01/2023	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$ 1.898.050,00	SPGR	30/01/2023
BIO-INSU-027	18/01/2023	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$ 2.949.951,00	SPGR	2/02/2023
BIO-INSU-028	7/12/2022	Suministro	900745087	900745087-SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.	\$ 1.007.930,00	SPGR	2/01/2023
BIO-INSU-029	18/01/2023	Suministro	800224833	800224833-ARC Análisis S.A.S	\$ 2.695.350,00	SPGR	2/02/2023
BIO-INSU-030	7/02/2023	Suministro	800018856	800018856-AQUALAB S.A.S	\$ 2.058.700,00	SPGR	5/03/2023
BIO-INSU-031	25/01/2023	Suministro	900026709	900026709-CESAR TABARES L Y CIA LTDA.	\$ 516.800,00	SPGR	5/02/2023
BIO-INSU-033	27/01/2023	Suministro	900505419	900505419-AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS	\$ 188.020,00	SPGR	5/02/2023
BIO-INSU-034	25/01/2023	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$ 4.630.588,00	SPGR	5/02/2023
BIO-INSU-035	27/01/2023	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$ 499.800,00	SPGR	5/02/2023
BIO-INSU-036	17/02/2023	Suministro	901194165	901194165-NITRO GENÉTICA S.A.S	\$ 1.020.001,00	SPGR	5/03/2023
BIO-INSU-037	17/02/2023	Suministro	800224833	800224833-ARC Análisis S.A.S	\$ 1.939.700,00	SPGR	26/03/2023
BIO-INSU-038	24/02/2023	Suministro	900745087	900745087-SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.	\$ 658.070,00	SPGR	2/04/2023
BIO-INSU-039	17/02/2023	Suministro	900428481	900428481-LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLÓGICOS DE COLOMBIA LTDA.	\$ 2.343.110,00	SPGR	5/03/2023
BIO-INSU-040	22/02/2023	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$ 2.396.660,00	SPGR	5/03/2023
BIO-INSU-041	2/03/2023	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$ 3.459.330,00	SPGR	26/03/2023
BIO-INSU-042	2/03/2023	Suministro	900026709	900026709-CESAR TABARES L Y CIA LTDA.	\$ 427.210,00	SPGR	26/03/2023

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

BIO-INSU-043	27/06/2023	Suministro	900745087	900745087-SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.	\$	2.570.684,00	SPGR	11/07/2023
BIO-INSU-045	17/07/2023	Suministro	901384306	901384306-BIOCUTRO SAS	\$	5.217.555,00	SPGR	6/09/2023
BIO-INSU-046	26/06/2023	Suministro	900315664	900315664-GENPRODUCTS COMPANY S.A.S	\$	9.610.320,00	SPGR	11/07/2023
BIO-INSU-047	17/07/2023	Suministro	830101830	830101830-ADVANCED INSTRUMENTS SAS	\$	511.700,00	SPGR	6/09/2023
BIO-INSU-048	26/06/2023	Suministro	900355024	900355024-EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS	\$	4.479.249,00	SPGR	11/07/2023
BIO-INSU-049	20/06/2023	Suministro	900918150	900918150-SURGENOMA S.A.S	\$	678.300,00	SPGR	11/07/2023
BIO-INSU-050	23/06/2023	Suministro	860072122	860072122-G&G SUCESTORES SAS	\$	376.040,00	SPGR	11/07/2023
BIO-INSU-051	20/06/2023	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	4.928.810,00	SPGR	11/07/2023
BIO-INSU-052	31/07/2023	Suministro	800053310	800053310-ARTILAB S.A.	\$	1.347.675,00	SPGR	8/08/2023
BIO-INSU-054	28/06/2023	Suministro	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$	1.189.762,00	SPGR	11/07/2023
BIO-INSU-055	10/07/2023	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	6.326.873,00	SPGR	2/08/2023
BIO-INSU-056	26/06/2023	Suministro	860518299	860518299-PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	\$	4.758.533,30	SPGR	2/08/2023
BIO-INSU-058	10/07/2023	Suministro	830034233	830034233-A & M Asesoría y Mantenimiento Ltda.	\$	5.366.900,00	SPGR	2/08/2023
BIO-INSU-059	10/07/2023	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	3.784.200,00	SPGR	2/08/2023
BIO-INSU-060	25/10/2023	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	1.285.200,00	SPGR	2/11/2023
BIO-INSU-061	26/01/2024	Suministro	860403097	860403097-ELEMENTOS QUÍMICOS LTDA	\$	374.850,00	SPGR	6/02/2024
BIO-INSU-062	31/10/2023	Suministro	860072122	860072122-G&G SUCESTORES SAS	\$	7.707.961,00	SPGR	2/11/2023
BIO-INSU-063	1/12/2023	Suministro	900428481	900428481-LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLÓGICOS DE COLOMBIA LTDA	\$	4.095.742,00	SPGR	27/01/2024
BIO-INSU-064	20/11/2023	Suministro	901459190	901459190-NUCLEOLAB SAS	\$	3.631.880,00	SPGR	6/12/2023
BIO-INSU-065	14/11/2023	Suministro	800053310	800053310-ARTILAB S.A.	\$	1.795.818,00	SPGR	6/12/2023
BIO-INSU-066	28/10/2023	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	1.284.010,00	SPGR	2/11/2023
BIO-INSU-067	7/11/2023	Suministro	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$	5.387.130,00	SPGR	28/11/2023
BIO-INSU-068	25/10/2023	Suministro	800224833	800224833-ARC Análisis S.A.S	\$	4.229.560,00	SPGR	2/11/2023
BIO-INSU-069	29/02/2024	Suministro	860518299	860518299-PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	\$	11.890.978,40	SPGR	8/03/2024
BIO-INSU-070	17/11/2023	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	3.793.125,00	SPGR	6/12/2023
BIO-INSU-071	18/11/2023	Suministro	900355024	900355024-EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS	\$	1.471.411,00	SPGR	6/12/2023
BIO-INSU-072	1/12/2023	Suministro	900505419	900505419-AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS	\$	660.450,00	SPGR	23/12/2023
BIO-INSU-073	17/11/2023	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	5.641.790,00	SPGR	6/12/2023
BIO-INSU-074	17/11/2023	Suministro	900494362	900494362-Tecnológica MD S.A.S.	\$	179.400,00	SPGR	23/12/2023
BIO-INSU-075	16/01/2024	Suministro	901459190	901459190-NUCLEOLAB SAS	\$	1.123.360,00	SPGR	6/02/2024
BIO-INSU-076	1/02/2024	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	12.013.169,00	SPGR	4/03/2024
BIO-INSU-077	18/01/2024	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	535.500,00	SPGR	3/02/2024
BIO-INSU-079	27/05/2024	Suministro	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$	322.209,00	SPGR	7/06/2024
BIO-INSU-080	1/02/2024	Suministro	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$	10.849.400,00	SPGR	8/03/2024
BIO-INSU-081	14/02/2024	Suministro	900355024	900355024-EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS	\$	7.621.950,00	SPGR	8/03/2024
BIO-INSU-082	24/04/2024	Suministro	860518299	860518299-PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	\$	12.305.825,40	SPGR	10/05/2024
BIO-INSU-083	1/05/2024	Suministro	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$	18.834.855,00	SPGR	31/05/2024
BIO-INSU-084	22/05/2024	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	14.940.331,00	SPGR	31/05/2024
BIO-INSU-085	1/04/2024	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	4.643.600,00	SPGR	23/04/2024
BIO-INSU-086	2/05/2024	Suministro	901194165	901194165-NITRO GENÉTICA S.A.S	\$	4.320.004,60	SPGR	16/03/2025
BIO-INSU-087	1/04/2024	Suministro	900730558	900730558-CAHOZ INVERSIONES S A S	\$	8.330.000,00	SPGR	23/04/2024
BIO-INSU-088	18/04/2024	Suministro	830025281	830025281-ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT LTDA	\$	6.365.310,00	SPGR	23/04/2024
BIO-INSU-089	1/08/2024	Suministro	900026709	900026709-CESAR TABARES L Y CIA LTDA	\$	273.652,00	SPGR	3/09/2024
BIO-INSU-090	20/08/2024	Suministro	900730558	900730558-CAHOZ INVERSIONES S A S	\$	13.433.993,00	SPGR	6/09/2024
BIO-INSU-092	8/01/2025	Suministro	805014913	805014913-Scientific Products SAS	\$	1.904.000,00	SPGR	16/03/2025
BIO-INSU-093	24/07/2024	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	7.867.090,00	SPGR	31/07/2024
BIO-INSU-094	22/07/2024	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	10.820.194,00	SPGR	31/07/2024
BIO-INSU-095	17/12/2024	Suministro	860518299	860518299-PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	\$	35.049.993,40	SPGR	16/03/2025
BIO-INSU-096 Acta de recibido	20/07/2024	Suministro	900494362	900494362-Tecnológica MD S.A.S.	\$	1.129.800,00	SPGR	10/08/2024

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

BIO-INSU-097	22/07/2024	Suministro	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$	8.195.400,00	SPGR	31/07/2024
BIO-INSU-099	23/07/2024	Suministro	901459190	901459190-NUCLEOLAB SAS	\$	11.142.000,00	SPGR	3/09/2024
BIO-INSU-100	31/12/2024	Suministro	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$	1.555.268,00	SPGR	16/03/2025
BIO-INSU-101	23/08/2024	Suministro	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$	7.594.900,00	SPGR	3/09/2024
BIO-INSU-102	6/09/2024	Suministro	900494362	900494362-Tecnológica MD S.A.S.	\$	443.650,00	SPGR	6/10/2024
BIO-INSU-103	23/08/2024	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	712.632,00	SPGR	6/09/2024
BIO-INSU-104	23/08/2024	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	6.794.010,00	SPGR	16/09/2024
BIO-INSU-105	4/09/2024	Suministro	70042297	70042297-HERRERA CANO CARLOS MARIO	\$	981.750,00	SPGR	16/09/2024
BIO-INSU-106	23/08/2024	Suministro	900355024	900355024-EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS	\$	892.500,00	SPGR	16/09/2024
BIO-INSU-107	23/08/2024	Suministro	900745087	900745087-SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.	\$	963.900,00	SPGR	6/09/2024
BIO-INSU-108	6/09/2024	Suministro	900026709	900026709-CESAR TABARES L Y CIA LTDA	\$	791.350,00	SPGR	6/10/2024
BIO-INSU-109	25/08/2024	Suministro	901356015	901356015-INPHARMA MED SAS	\$	9.631.300,00	SPGR	16/09/2024
BIO-INSU-110	10/10/2024	Suministro	900505419	900505419-AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS	\$	3.813.950,00	SPGR	26/10/2024
BIO-INSU-111	31/08/2024	Suministro	800053310	800053310-ARTILAB S.A.	\$	1.299.004,00	SPGR	16/09/2024
BIO-INSU-112	9/09/2024	Suministro	901459190	901459190-NUCLEOLAB SAS	\$	2.186.000,00	SPGR	6/10/2024
BIO-INSU-113	29/10/2024	Suministro	900730558	900730558-CAHOZ INVERSIONES S A S	\$	731.921,00	SPGR	12/11/2024
BIO-INSU-114	30/09/2024	Suministro	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$	9.920.554,00	SPGR	26/10/2024
BIO-INSU-115	25/02/2025	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	2.853.620,00	SPGR	16/03/2025
BIO-INSU-116	25/02/2025	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	3.274.115,00	SPGR	16/03/2025
BIO-INSU-117	25/02/2025	Suministro	900494362	900494362-Tecnológica MD S.A.S.	\$	195.043,00	SPGR	16/03/2025
BIO-INSU-118	25/03/2025	Suministro	830025281	830025281-ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT LTDA	\$	8.825.040,00	SPGR	8/04/2025
BIO-INSU-119	28/03/2025	Suministro	800036678	800036678-DIDACTICOS Y LIBROS DIDACTIBROS LTDA.	\$	2.752.461,20	SPGR	8/04/2025
BIO-INSU-120	24/07/2025	Suministro	70042297	70042297-HERRERA CANO CARLOS MARIO	\$	892.500,00	SPGR	22/10/2025
BIO-INSU-121	13/08/2025	Suministro	901459190	901459190-NUCLEOLAB SAS	\$	7.471.000,00	SPGR	10/09/2025
BIO-INSU-122	24/07/2025	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	1.412.717,00	SPGR	21/08/2025
BIO-INSU-124	23/07/2025	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	3.109.600,00	SPGR	21/08/2025
BIO-INSU-125	13/08/2025	Suministro	900500480	900500480-BIODAN COLOMBIA SAS	\$	4.141.200,00	SPGR	22/10/2025
BIO-INSU-126	11/09/2025	Suministro	900026709	900026709-CESAR TABARES L Y CIA LTDA	\$	952.000,00	SPGR	18/10/2025
BIO-INSU-127	23/07/2025	Suministro	900494362	900494362-Tecnológica MD S.A.S.	\$	861.556,00	SPGR	21/08/2025
BIO-INSU-128	19/09/2025	Suministro	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	3.421.250,00	SPGR	22/10/2025
BIO-INSU-129	10/10/2025	Suministro	901376169	901376169-THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA S.A.S.	\$	24.722.741,00	SPGR	30/10/2025
BIO-INSU-130	19/09/2025	Suministro	900494362	900494362-Tecnológica MD S.A.S.	\$	909.932,00	SPGR	18/10/2025
BIO-INSU-131	18/09/2025	Suministro	70042297	70042297-HERRERA CANO CARLOS MARIO	\$	1.428.000,00	SPGR	18/10/2025
BIO-INSU-132	29/10/2025	Suministro	900500480	900500480-BIODAN COLOMBIA SAS	\$	3.308.200,00	SPGR	7/11/2025
BIO-INSU-133	29/10/2025	Suministro	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	12.718.661,00	SPGR	7/11/2025
BIO-INSU-134	24/11/2025	SPGR Por definir	811026956	811026956-MR y CIA S.A.S	\$	4.831.400,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU-135	3/11/2025	Suministro	900745087	900745087-SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.	\$	1.638.630,00	SPGR	7/11/2025
BIO-INSU-136	24/11/2025	SPGR Por definir	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$	7.935.000,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU-137	25/11/2025	SPGR Por definir	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$	389.059,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU-138	24/11/2025	SPGR Por definir	800036678	800036678-DIDACTICOS Y LIBROS DIDACTIBROS LTDA.	\$	1.201.900,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU-139	24/11/2025	SPGR Por definir	901459190	901459190-NUCLEOLAB SAS	\$	3.398.000,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU-140	24/11/2025	SPGR Por definir	901459190	901459190-NUCLEOLAB SAS	\$	4.516.000,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU-141	25/11/2025	SPGR Por definir	900918150	900918150-SURGENOMA S.A.S	\$	6.295.100,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU-142	25/11/2025	SPGR Por definir	830508200	830508200-Suministros Clínicos ISLAS S.A.S	\$	13.041.000,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU-143	25/11/2025	SPGR Por definir	900730558	900730558-CAHOZ INVERSIONES S A S	\$	9.595.865,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU-144	24/11/2025	SPGR Por definir	800160884	800160884-FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS	\$	12.283.954,00	SPGR	12/12/2025
BIO-INSU032	25/01/2023	Suministro	860072122	860072122-G&G SUCESORES SAS	\$	3.978.170,00	SPGR	5/02/2023
BIO-INSU044	26/06/2023	Suministro	860518299	860518299-PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	\$	9.301.442,20	SPGR	2/08/2023
BIO-SER-003	31/12/2024	Prestación de Servicios	890980040	890980040-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$	1.475.700,00	SPGR	16/03/2025
BIO-SER-023	28/11/2025	SPGR Por definir	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$	140.772,00	SPGR	12/12/2025

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

BIO-SERV-001	10/04/2024	Prestación de Servicios	115694943	115694943-MDPI AG	\$ 12.084.287,70	SPGR	23/04/2024
BIO-SERV-002	1/10/2024	Prestación de Servicios	NL005033019B01	NL005033019B01-ELSEVIER	\$ 7.780.922,10	SPGR	6/10/2024
BIO-SERV-004	1/09/2024	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 51.551,00	SPGR	12/11/2024
BIO-SERV-005	1/10/2024	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 56.073,00	SPGR	5/12/2024
BIO-SERV-006	17/12/2024	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 54.264,00	SPGR	16/03/2025
BIO-SERV-007	1/12/2024	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 56.073,00	SPGR	16/03/2025
BIO-SERV-008	16/05/2025	Prestación de Servicios	830122870	830122870-OLARTE MOURE & ASOCIADOS SAS	\$ 63.486.500,00	SPGR	3/07/2025
BIO-SERV-010	1/01/2025	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 70.386,00	SPGR	16/03/2025
BIO-SERV-011	1/02/2025	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 80.603,00	SPGR	8/04/2025
BIO-SERV-012	28/04/2025	Prestación de Servicios	2088124115	2088124115-Macrogen INC	\$ 26.169.882,50	SPGR	4/05/2025
BIO-SERV-013	1/03/2025	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 105.579,00	SPGR	4/05/2025
BIO-SERV-014	1/04/2025	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 121.473,00	SPGR	3/07/2025
BIO-SERV-015	1/05/2025	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 140.772,00	SPGR	3/07/2025
BIO-SERV-016	1/06/2025	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 136.231,00	SPGR	21/08/2025
BIO-SERV-017	28/10/2025	Prestación de Servicios	2088124115	2088124115-Macrogen INC	\$ 42.679.416,00	SPGR	31/10/2025
BIO-SERV-018	1/07/2025	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 140.772,00	SPGR	10/09/2025
BIO-SERV-019	1/08/2025	Prestación de Servicios	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 140.772,00	SPGR	22/10/2025
BIO-SERV-020	30/11/2025	SPGR Por definir	800176100	800176100-D' CARNES S.A.	\$ 1.296.000,00	SPGR	12/12/2025
BIO-SERV-021	28/11/2025	SPGR Por definir	901323018	901323018-PORTAFOLIO CENTRO DE SERVICIOS S.A.S	\$ 1.310.000,00	SPGR	12/12/2025
BIO-SERV-022	30/11/2025	SPGR Por definir	890902922	890902922-UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	\$ 447.000,00	SPGR	12/12/2025
BIO-SERV-024	30/11/2025	SPGR Por definir	890902922	890902922-UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	\$ 1.095.600,00	SPGR	12/12/2025
BIO-SERV-025	30/11/2025	SPGR Por definir	860013704	860013704-GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.	\$ 1.593.905,00	SPGR	12/12/2025
BIO-SERV-099	28/02/2025	Prestación de Servicios	890980040	890980040-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 1.099.800,00	SPGR	16/03/2025
BIO-TIQ-001	2/10/2023	Prestación de Servicios	860000018	860000018-Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.	\$ 3.929.732,00	SPGR	21/10/2023
BIO-TIQ-003	4/04/2024	Prestación de Servicios	860000018	860000018-Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.	\$ 11.313.502,00	SPGR	11/04/2024
BIO-TIQ-004	9/06/2025	Prestación de Servicios	860000018	860000018-Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.	\$ 16.927.844,00	SPGR	3/07/2025
BIO-TIQ-005	15/09/2025	Prestación de Servicios	860000018	860000018-Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.	\$ 6.893.696,00	SPGR	22/10/2025
BIO-TIQ-006	26/11/2025	SPGR Por definir	860000018	860000018-Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.	\$ 16.267.048,00	SPGR	12/12/2025
BIO-TIQ-02	2/10/2023	Prestación de Servicios	860000018	860000018-Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.	\$ 955.183,00	SPGR	21/10/2023
BIO-VAT-012	30/11/2025	SPGR Por definir	1020418219	1020418219-Orozco Valencia Paola Andrea	\$ 9.346.218,00	SPGR	12/12/2025
BIO-VAT-013	30/11/2025	SPGR Por definir	1017198464	1017198464-Montoya Osorio Yuliet Marlinda	\$ 9.262.794,00	SPGR	12/12/2025
BIO-VIAT-001	2/10/2023	Prestación de Servicios	1017198464	1017198464-Montoya Osorio Yuliet Marlinda	\$ 1.375.500,00	SPGR	21/10/2023
BIO-VIAT-002	2/10/2023	Prestación de Servicios	70077405	70077405-BUSTAMANTE OSORNO JOHN JAIRO	\$ 1.375.500,00	SPGR	21/10/2023
BIO-VIAT-003	2/10/2023	Prestación de Servicios	1020418219	1020418219-Orozco Valencia Paola Andrea	\$ 1.086.500,00	SPGR	21/10/2023
BIO-VIAT-004	2/10/2023	Prestación de Servicios	1152212861	1152212861-MONTOYA OSORIO CINDY YURANY	\$ 872.500,00	SPGR	21/10/2023
BIO-VIAT-005	2/10/2023	Prestación de Servicios	1035859816	1035859816-Agudelo Cataño Wilson	\$ 1.086.500,00	SPGR	21/10/2023
BIO-VIAT-006	5/04/2024	Prestación de Servicios	1017198464	1017198464-Montoya Osorio Yuliet Marlinda	\$ 21.960.000,00	SPGR	11/04/2024
BIO-VIAT-007	5/04/2024	Prestación de Servicios	70077405	70077405-BUSTAMANTE OSORNO JOHN JAIRO	\$ 21.960.000,00	SPGR	11/04/2024
BIO-VIAT-008	5/06/2025	Prestación de Servicios	70077405	70077405-BUSTAMANTE OSORNO JOHN JAIRO	\$ 27.960.000,00	SPGR	3/07/2025

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

BIO-VIAT-009	4/06/2025	Prestación de Servicios	1017198464	1017198464-Montoya Osorio Yuliet Marlinde	\$ 27.960.000,00	SPGR	3/07/2025
BIO-VIAT-010	5/09/2025	Prestación de Servicios	1017198464	1017198464-Montoya Osorio Yuliet Marlinde	\$ 13.592.357,00	SPGR	10/09/2025
BIO-VIAT-011	5/09/2025	Prestación de Servicios	70077405	70077405-BUSTAMANTE OSORNO JOHN JAIRO	\$ 13.478.155,00	SPGR	22/10/2025
BIO2022 06-10-12	11/06/2022	Suministro	860518299	860518299-PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	\$ 100.686.842,00	SPGR	16/06/2022
BIOP-EQ-202218	3/05/2022	Suministro	830145062	830145062-TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	\$ 8.925.000,00	SPGR	12/06/2022
BIOP-EQ-202220	9/06/2022	Suministro	805014913	805014913-Scientific Products SAS	\$ 15.969.800,00	SPGR	12/06/2022
BIOP-EQ-202221	17/05/2022	Suministro	800018856	800018856-AQUALAB S.A.S	\$ 6.545.000,00	SPGR	12/06/2022
BIOP-EQ-202222	16/06/2022	Suministro	830101830	830101830-ADVANCED INSTRUMENTS SAS	\$ 5.259.800,00	SPGR	19/06/2022
BIOP-EQ-202224	1/06/2022	Suministro	900505419	900505419-AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS	\$ 6.140.400,00	SPGR	16/06/2022
BIOP-EQ-202225	15/06/2022	Suministro	860028662	860028662-Lab Brands SAS	\$ 301.877.466,00	SPGR	19/06/2022
NIO-INSU-098	31/08/2024	Suministro	800053310	800053310-ARTILAB S.A.	\$ 2.528.988,00	SPGR	16/09/2024
OC-BIO-INSU-053	20/06/2023	Suministro	900344751	900344751-Servicios y Suministros para la Industria Ingenieria SAS	\$ 9.866.813,60	SPGR	11/07/2023
PC- 10-1017148358	18/02/2022	Prestación de Servicios	1017148358	1017148358-Velez Zapata Sindy Marcela	\$ 50.348.794,00	SPGR	24/02/2022
PC-1047972831	10/03/2022	Prestación de Servicios	1047972831	1047972831-Cuartas Marulanda Diego Alejandro	\$ 13.800.000,00	SPGR	27/03/2022
PC-01-43107133	3/12/2021	Prestación de Servicios	43107133	43107133-Giraldo Londoño Isabel Cristina	\$ 17.296.587,00	SPGR	8/08/2022
PC-02-1017198464	17/12/2021	Prestación de Servicios	1017198464	1017198464-Montoya Osorio Yuliet Marlinde	\$ 345.600.000,00	SPGR	20/12/2023
PC-02-43107133	1/06/2022	Prestación de Servicios	43107133	43107133-Giraldo Londoño Isabel Cristina	\$ 7.131.058,00	SPGR	8/08/2022
PC-03-1035859816	17/12/2021	Prestación de Servicios	1035859816	1035859816-Agudelo Cataño Wilson	\$ 273.600.000,00	SPGR	23/12/2021
PC-04-1017259380	17/12/2021	Prestación de Servicios	1017269380	1017269380-Quintana Mosquera Marlon Estiven	\$ 61.809.264,00	SPGR	23/12/2021
PC-05-1040730573	17/12/2021	Prestación de Servicios	1040730573	1040730573-Vergara Gómez Leidy Carolina	\$ 53.251.728,00	SPGR	23/12/2021
PC-06-43168449	17/12/2021	Prestación de Servicios	43168449	43168449-Orrego Alvarez Carolina Lizeth	\$ 53.251.728,00	SPGR	23/12/2021
PC-07-42691542	17/12/2021	Prestación de Servicios	42691542	42691542-Zapata Echeverry Catalina Maria	\$ 66.564.660,00	SPGR	23/12/2021
PC-08-1037602622	13/12/2021	Prestación de Servicios	1037602622	1037602622-Zapata Florez Paula Andrea	\$ 2.189.078,00	SPGR	23/12/2021
PC-08-12-2021	4/08/2022	Prestación de Servicios	43914186	43914186-Franco Morales Paula Andrea	\$ 17.827.645,00	SPGR	8/08/2022
PC-09-16632739	21/02/2022	Prestación de Servicios	16632739	16632739-MARIN GARAVITO JESUS ANTONIO	\$ 36.000.000,00	SPGR	24/02/2022
PC-11-1 -1047972832	29/09/2022	Prestación de Servicios	1047972831	1047972831-Cuartas Marulanda Diego Alejandro	\$ 13.800.000,00	SPGR	2/10/2022
PC-12.152.222.453	18/03/2022	Prestación de Servicios	1152222453	1152222453-Oviedo Narvaez Maria Camila	\$ 67.474.275,00	SPGR	2/10/2022
PC-13-1.017.255.443	22/03/2022	Prestación de Servicios	1017255443	1017255443-Atehortua Jimenez Juan Camilo	\$ 78.720.000,00	SPGR	2/10/2022
PC-14-43914186	12/01/2023	Prestación de Servicios	43914186	43914186-Franco Morales Paula Andrea	\$ 124.793.515,00	SPGR	23/01/2023
PC-15	20/10/2022	Prestación de Servicios	1017253425	1017253425-Bedoya Vasquez Andrea	\$ 7.910.833,40	SPGR	3/11/2022
PC-16-43634921	3/02/2023	Prestación de Servicios	43634921	43634921-RUBIO CARRASQUILLA MARCELA	\$ 28.818.432,00	SPGR	19/02/2023
PC-17-1020418219	30/03/2023	Prestación de Servicios	1020418219	1020418219-Orozco Valencia Paola Andrea	\$ 28.479.000,00	SPGR	2/04/2023
PC-18-1128275390	17/03/2023	Prestación de Servicios	1128275390	1128275390-OROZCO MARIN LINA PAOLA	\$ 41.400.000,00	SPGR	26/03/2023
PC-19-1152212861	26/07/2023	Prestación de Servicios	1152212861	1152212861-MONTOYA OSORIO CINDY YURANY	\$ 136.300.000,00	SPGR	2/08/2023
PC-20-30238413	31/08/2023	Prestación de Servicios	30238413	30238413-RENDON MORALES KELLY JOHANA	\$ 19.874.784,00	SPGR	6/09/2023
PC-21-25.273.210	26/10/2023	Prestación de Servicios	25273210	25273210-BOLAÑOS DIAZ DORIS AMANDA	\$ 36.000.000,00	SPGR	1/11/2023
PC-22-80740737	29/02/2024	Prestación de Servicios	80740737	80740737-PUERTA GONZALEZ ANDRES	\$ 59.624.352,00	SPGR	8/03/2024

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

PC-23-1128449724	26/06/2024	Prestación de Servicios	1128449724	1128449724-MIRANDA BRAND YANETH DE JESUS	\$ 30.019.200,00	SPGR	5/07/2024
PC-24-1020418219	30/09/2024	Prestación de Servicios	1020418219	1020418219-Orozco Valencia Paola Andrea	\$ 85.500.000,00	SPGR	6/10/2024
PC-25-1017243811	22/11/2024	Prestación de Servicios	1017243811	1017243811-TANGARIFE MUNERA LAURA CRISTINA	\$ 29.900.000,00	SPGR	5/12/2024

La ejecución contractual del proyecto asciende a un valor total ejecutado de **\$ 3.765.982.226,80**, conforme al consolidado de contratos registrados en GESPROY. Este nivel de ejecución es consistente con el avance financiero reportado y evidencia una utilización intensiva de los recursos del Sistema General de Regalías, principalmente orientada a garantizar la operatividad científica, técnica y administrativa del proyecto. Desde el punto de vista de la tipología contractual, se evidencia que la mayor proporción de los contratos corresponde a contratos de suministro, asociados principalmente a la adquisición de insumos, reactivos, equipos y elementos especializados de laboratorio. De la revisión del listado contractual se identifica que más de 150 contratos corresponden a esta modalidad, representando el componente predominante tanto en número de contratos como en recurrencia a lo largo del horizonte del proyecto.

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL PROYECTO DE INVERSIÓN

Análisis de ejecución acumulada

Año	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
2022	\$ 1.025.191.397	\$ 25.546.614	\$ 999.644.783
2023	\$ 950.779.052	\$ 27.351.516	\$ 923.427.536
2024	\$ 792.780.276	\$ 8.523.028	\$ 784.257.248
2025	\$ 975.471.469	\$ 15.435.079	\$ 960.036.390
Total, general	\$ 3.744.222.194	\$ 76.856.237	\$ 3.667.365.957

Con corte a diciembre de 2025, la ejecución financiera acumulada asciende a un valor bruto de \$ 3.744.222.194, del cual se registran deducciones por \$ 76.856.237, obteniéndose un valor neto ejecutado de \$ 3.667.365.957. El comportamiento anual evidencia una ejecución mayor en 2022 y 2023, una disminución en 2024 y un repunte significativo en 2025, lo que refleja una adecuada gestión del cierre financiero. En términos agregados, las deducciones representan alrededor del 2 % del valor bruto, indicando que da cuenta de una ejecución eficiente y controlada, sin afectaciones materiales que comprometan el resultado financiero global.

Análisis de ejecución del mes de diciembre 2025

Fecha de giro	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
29/12/2025	\$ 1.201.900	\$ 54.035	\$ 1.147.865
29/12/2025	\$ 37.243.048	\$ 524.400	\$ 36.718.648
29/12/2025	\$ 3.308.200	\$ 148.730	\$ 3.159.470
29/12/2025	\$ 7.903.950	\$ -	\$ 7.903.950
29/12/2025	\$ 10.506.515	\$ -	\$ 10.506.515
29/12/2025	\$ 16.465.529	\$ 10.164	\$ 16.455.365
29/12/2025	\$ 9.595.865	\$ 378.155	\$ 9.217.710
29/12/2025	\$ 29.365.245	\$ 1.271.672	\$ 28.093.573
29/12/2025	\$ 47.426.900	\$ 4.372.468	\$ 43.054.432
29/12/2025	\$ 33.947.224	\$ 360.405	\$ 33.586.819
29/12/2025	\$ 15.333.851	\$ 689.379	\$ 14.644.472
29/12/2025	\$ 140.772	\$ -	\$ 140.772

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

29/12/2025	\$ 1.982.964	\$ -	\$ 1.982.964
	\$ 214.421.963	\$ 7.809.408	\$ 206.612.555

Con fecha de giro 29 de diciembre de 2025, se registran operaciones por un valor bruto total de \$ 214.421.963, sobre las cuales se aplicaron deducciones por \$ 7.809.408, resultando un valor neto girado de \$ 206.612.555. Las deducciones representan aproximadamente el 3,6 %.

Ejecución consolidada

	PROYECTO	DIFERENCIA	DESEMBOLSOS	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
VALOR SGR SIN SUPERVISIÓN	\$ 3.752.931.854	\$ 8.709.660	\$ 3.744.222.194	99,77%	0,23%
VALOR CONTRAPARTIDA	\$ 1.242.619.635,60	\$ 2	\$ 1.242.619.634	100,00%	0,00%
	\$ 4.995.551.490	(99,77%)	\$ 4.986.841.828		0,23%

- La ejecución financiera consolidada del proyecto evidencia un alto nivel de cumplimiento presupuestal, con un valor total aprobado de \$ 4.995.551.490 y desembolsos acumulados por \$ 4.986.841.828, lo que equivale a una ejecución global del 99,77 %, quedando únicamente un 0,23 % pendiente por ejecutar.
- En el componente SGR sin supervisión, se registra un presupuesto de \$ 3.752.931.854, con una diferencia de \$ 8.709.660, reflejando una ejecución del 99,77 %. Por su parte, la contrapartida alcanza una ejecución del 100 %, con desembolsos por \$ 1.242.619.635.

Ejecución financiera registrada Gesproy

Perfil Consulta

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Código BPIN

2020000100190

Desarrollo e implementación a escala in vitro y ex vivo de un prototipo de parche bioactivo cardíaco como estrategia terapéutica en el tratamiento de alteraciones en la conducción eléctrica cardíaca producto de enfermedades isquémicas para Antioquia

Paso a Paso

Aprobación y Envío

Pagos

Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar	Reintegros Cuenta Unica SGR
SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación	\$4.160.979.824,40	\$3.973.541.946,05	\$0,00	\$0,00	\$187.437.878,35	
Propios	\$1.242.619.635,60	\$1.131.464.547,70	\$0,00	\$0,00	\$111.155.087,90	
Total	\$5.403.599.460,00	\$5.105.006.493,75	\$0,00	\$0,00	\$298.592.966,25	\$0,00

* Se debe realizar la homologación de pagos pendientes al interior de cada contrato para que se visualicen los pagos en la tabla superior y se afecte el avance financiero del proyecto.

Nota: información tomada Gesproy (fechade Consulta 10/05/2026)

Con base en el presupuesto aprobado por OCAD, el proyecto cuenta con una financiación total de \$ 5.403.599.460,00, de los cuales \$ 4.160.979.824,40 corresponden a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y \$ 1.242.619.635,60 a recursos propios. De este total, los pagos efectivamente ejecutados ascienden a \$ 5.105.006.493,75, lo que representa una ejecución financiera global del 95,5 % frente al valor total aprobado, evidenciando un nivel de ejecución alto y consistente con el avance general del proyecto. Al desagregar por fuente de financiación, se observa que

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

los recursos SGR presentan pagos por \$ 3.973.541.946,05, equivalentes a una ejecución del 96,9 % respecto al valor aprobado para esta fuente, con un saldo pendiente de \$ 187.437.878,35. Por su parte, los recursos propios registran pagos por \$ 1.131.464.547,70, lo que corresponde a una ejecución del 91,1 % del valor aprobado, con un saldo por conciliar de \$ 111.155.087,90.

10.1 ODP PAGADAS PARA EL PERIODO REPORTADO

No. Memorando o No. Radicado Anexo 4	Valor Total	Fecha máxima de pago	Presupuestal	NO Presupuestal (Reintegros)	Valor total Desembolsado
N/A	\$0	N/A	\$0	\$0	\$0
Total	\$0	-	\$0	\$0	\$0

Para el mes de marzo de 2026 no se evidencia tramite de Órdenes de Pago, según los registros reportados.

De acuerdo con la verificación de información en el SPGR, se evidencia que a la fecha se han realizado desembolsos por valor de **\$ 7.889.113.033,82**.

Ejecución desagregada por mes y proveedor

EJECUCIÓN DEL MES - PROVEEDOR	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA.	\$ 1.201.900	\$ 54.035	\$ 1.147.865
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S	\$ 16.267.048	\$ -	\$ 16.267.048
SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	\$ 20.976.000	\$ 524.400	\$ 20.451.600
BIODAN COLOMBIA SAS	\$ 3.308.200	\$ 148.730	\$ 3.159.470
Agudelo Cataño Wilson	\$ 5.700.000	\$ -	\$ 5.700.000
Velez Zapata Sindy Marcela	\$ 1.094.539	\$ -	\$ 1.094.539
Zapata Echeverry Catalina Maria	\$ 1.109.411	\$ -	\$ 1.109.411
MONTOYA OSORIO CINDY YURANY	\$ 4.700.000	\$ -	\$ 4.700.000
Orrego Alvarez Carolina Lizeth	\$ 1.109.411	\$ -	\$ 1.109.411
Quintana Mosquera Marlon Estiven	\$ 1.287.693	\$ -	\$ 1.287.693
TANGARIFE MUNERA LAURA CRISTINA	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000
Vergara Gómez Leidy Carolina	\$ 1.109.411	\$ -	\$ 1.109.411
Franco Morales Paula Andrea	\$ 3.565.529	\$ -	\$ 3.565.529
Montoya Osorio Yuliet Marlinde	\$ 7.200.000	\$ 10.164	\$ 7.189.836
Orozco Valencia Paola Andrea	\$ 5.700.000	\$ -	\$ 5.700.000
CAHOZ INVERSIONES S A S	\$ 9.595.865	\$ 378.155	\$ 9.217.710
D' CARNES S.A.	\$ 1.296.000	\$ 42.000	\$ 1.254.000
FILTRACION Y ANALISIS S.A.S.	\$ 25.002.615	\$ 1.124.068	\$ 23.878.547
HERRERA CANO CARLOS MARIO	\$ 1.428.000	\$ 66.360	\$ 1.361.640
SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.	\$ 1.638.630	\$ 39.244	\$ 1.599.386
MR Y CIA S.A.S	\$ 4.831.400	\$ 224.518	\$ 4.606.882
NUCLEOLAB SAS	\$ 8.859.000	\$ 221.475	\$ 8.637.525
OLARTE MOURE & ASOCIADOS SAS	\$ 33.736.500	\$ 3.926.475	\$ 29.810.025

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

BUSTAMANTE OSORNO JOHN JAIRO	\$ 3.038.155	\$ -	\$ 3.038.155
Montoya Osorio Yuliet Marlinde	\$ 12.415.151	\$ -	\$ 12.415.151
Orozco Valencia Paola Andrea	\$ 9.346.218	\$ -	\$ 9.346.218
PORTAFOLIO CENTRO DE SERVICIOS S.A.S	\$ 1.310.000	\$ 77.390	\$ 1.232.610
SURGENOMA SAS	\$ 6.295.100	\$ 283.015	\$ 6.012.085
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	\$ 1.542.600	\$ -	\$ 1.542.600
THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA S.A.S.	\$ 15.333.851	\$ 689.379	\$ 14.644.472
GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.	\$ 140.772	\$ -	\$ 140.772
GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.	\$ 1.982.964	\$ -	\$ 1.982.964
	\$ 214.421.963	\$ 7.809.408	\$ 206.612.555

La ejecución financiera analizada a nivel de proveedor, presenta un valor bruto total de \$ 214.421.963, con deducciones por \$ 7.809.408, lo que resulta en un valor neto ejecutado de \$ 206.612.555, equivalente a una afectación promedio del 3,6 %. La ejecución se concentra en una diversidad de proveedores, tanto personas naturales como jurídicas, lo que evidencia una adecuada dispersión del gasto conforme a la naturaleza de las actividades del proyecto. Las deducciones se focalizan principalmente en proveedores de mayor cuantía, asociados a servicios especializados, suministros técnicos y asesoría jurídica, mientras que una proporción significativa de pagos —especialmente honorarios y servicios individuales— se realizó sin aplicación de descuentos, lo cual es consistente con el régimen contractual y tributario aplicable.

10.2 CONSOLIDADO DE ODP PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

No de ODP presentadas	VALOR TOTAL	Fecha Máxima de pago	Presupuestal	No presupuestal	Valor Total
N/A	\$0	N/A	\$0	\$0	\$0
Total	\$0	N/A	\$0	\$0	\$0

Teniendo en cuenta El proyecto BPIN 2020000100190 finalizó su horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025, para los periodos de marzo de 2026 no se recibieron Órdenes de Pago, conforme a lo reportado en los archivos de seguimiento financiero autorizados por la supervisión (Derrotero y SPGR).

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN

CONCLUSIONES:

En concordancia con la Constitución Política de Colombia, el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 55 de la Ley 2056 del 2020, la guía de supervisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS), las normas del Sistema General de Regalías (SGR) y demás normas concordantes para el buen cumplimiento de la ejecución de los recursos del SGR de los proyectos de las entidades ejecutoras privadas, la SUPERVISIÓN del proyecto de inversión identificado con el BPIN 2020000100538 ha construido el presente informe observando el periodo comprendido entre 1 y 31 de MARZO de 2026.

Así las cosas y de manera general se evidencia el cumplimiento de gran parte de la normativa aplicable por parte de la ENTIDAD EJECUTORA con ocasión a la ejecución del proyecto de inversión; se verifica el cumplimiento con la metodología del proyecto, el cual fue estructurado a partir de dos objetivos específicos articulados con las actividades programadas. Sin embargo, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1474 en su artículo 84 "(...) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente"

- El proyecto BPIN 2020000100190 finalizó su horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025. No obstante, el presente informe de supervisión se realiza para continuar el seguimiento del proyecto hasta tanto la entidad ejecutora pase a estado "TERMINADO" en el aplicativo Gesproy.
- El porcentaje avalado para los periodos de ABRIL de 2026 corresponde a 0%.
- El avance financiero del proyecto conforme a la información de los desembolsos registrados en el Gesproy y SPGR para los periodos de ABRIL de 2026 es 0%.

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

RECOMENDACIONES:

"...las responsabilidades de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control contempladas en el Art. 1.2.10.1.4 del Decreto 1821 de 2020, dentro de lo cual establece el registro de información de forma veraz, oportuna e idónea en los aplicativos dispuestos por el DNP.

En caso de contar con evidencia de que la información reportada por las entidades en el aplicativo GESPROY SGR, no corresponde a la realidad de los proyectos de inversión, se procederá en virtud del artículo 182 de la Ley 2056 de 2020, a realizar el respectivo reporte a la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público en el marco del artículo 286 del Código Penal (Ley 599 de 2000) o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, o los delitos a los que hubiere a lugar de acuerdo a las conductas irregulares encontradas..."

RECOMENDACIONES PARA INFORME FINAL:

1. Actualizar de manera inmediata el reporte de los indicadores de producto en GESPROY, diligenciando los campos de año y mes de reporte, cantidad ejecutada y porcentaje de ejecución, con el fin de reflejar el cumplimiento efectivo de las metas establecidas y permitir su validación por parte de la supervisión.
2. Consolidar y cargar los soportes técnicos y documentales que respalden la ejecución de cada producto (informes finales, actas, certificados, estudios, evidencias de transferencia, materiales de comunicación, entre otros), asegurando su correspondencia con los indicadores reportados en el aplicativo.
3. Adelantar las gestiones necesarias para el cierre técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto, incluyendo la revisión integral de la información registrada en GESPROY, de manera que se garantice la coherencia entre el estado de ejecución, los indicadores de producto y la fecha de terminación registrada.

Solicitar y formalizar el cambio de estado del proyecto de "Contratado en Ejecución" a "Terminado", informando oportunamente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación cualquier situación que esté generando retrasos o dificultades en dicho trámite, en cumplimiento de las obligaciones de reporte y seguimiento establecidas para los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

COMO RECOMENDACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN y ADICIONALES AL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ SOPORTAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- Impacto a los beneficiarios del proyecto (cumplimiento de la población objetivo y caracterización demográfica de la población objetivo contenidas en la MGA).
 - Sostenibilidad del Proyecto (soporte de las estrategias de sostenibilidad).
 - Indicadores de productos – Medios de verificación.
 - Se solicita a la entidad ejecutora presentar los informes de ejecución suscrito por el representante legal o quien haga sus veces.
 - Se solicita a la entidad ejecutora reportar la realización de comités técnicos/ directivos/ de ejecución dando cumplimiento al modelo de gobernanza del proyecto.
 - Cumplimiento Control social (Qué ejercicios de control social realizaron y las evidencias).
 - Cumplimiento del modelo de gobernanza (Evidencias del seguimiento).
 - Cumplimiento de las demandas territoriales sobre las cuales se presentó el proyecto a la convocatoria.
 - Balance físico y financiero por actividades y de contratos suscritos en el marco del proyecto de inversión.
 - Gestión sobre cierre y liquidación de contratos.
 - Análisis de todas las entidades cooperantes (recursos al proyecto en contrapartida especie/ efectivo).
 - Gestión documental de todo el proyecto de inversión.
 - Relación de los bienes y servicios adquiridos derivados de la ejecución del proyecto. Equipos/insumos, etc. (Si aplica: Actas de entrega debidamente firmadas, Actas de recibo a satisfacción por parte de los receptores de los bienes/servicios, Facturas de las compras, y demás soportes de adquisiciones).
 - Análisis de licencias y permisos necesarios para el proyecto de inversión.
 - Bitácora de los ajustes o modificaciones decididas por el ejecutor en el marco del proyecto con sus debidas justificaciones técnicas, jurídicas y financieras.
 - Aporte de las actividades al componente de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la convocatoria de la cual se derivan los recursos del SGR para la financiación de este proyecto.
 - La tabla de recopilación de porcentajes tomados de los informes de ejecución mensuales y de los informes de supervisión firmados y notificados por la supervisión.
 - La entidad ejecutora deberá poner en conocimiento de la supervisión los requerimientos del DNP o antes de control en el marco de la ejecución del proyecto (y la respuesta de la entidad ejecutora en caso de requerimiento por estas entidades).
 - Análisis de los Derechos de Propiedad Intelectual derivados del proyecto de inversión.
- Con relación al desarrollo metodológico del proyecto de inversión se solicita a la entidad ejecutora soportar la ejecución del proyecto de manera organizada y consecuente con el documento técnico aprobado por OCAD-ACTeI-SGR.

Se solicita a la entidad ejecutora lo siguiente en el aplicativo GESPROY

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

- Pasar el proyecto a estado " Terminado".
- Completitud de la información de la pestaña de contratos.
- Ejecución física registrada hasta el último periodo.
- "Aprueba y Envía" hasta el último periodo
- Información de cada contrato registrado (acta de inicio, pólizas, actas de liquidación, etc.)
- Información de beneficiarios y sostenibilidad
- Programación de los ejercicios de control social. Pestaña programación/Hitos.

12. ANEXOS SOPORTES DE LA SUPERVISIÓN

Evidencias del Acompañamiento de la supervisión: como soporte se presenta el informe de supervisión del mes de abril de 2026.

Las evidencias del desarrollo de las actividades de SUPERVISIÓN reposan en el expediente virtual 20200170691200178E del Sistema de Gestión Documental – ORFEO/AZ Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

13. FIRMAS


DIANA PATRICIA PADILLA CABRERA
 Contratista Apoyo a la Supervisión SGR
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ
 Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Regional
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

YERLY PATRICIA CARDONA MONTOYA
 Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Técnico
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

JOHN JAIRO JURADO CORONELL
 Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Financiero
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

MADIVA MISULA PÉREZ DURAN
 Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Jurídico
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

CARLOS YAMEL ROJAS ORTIZ
 Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Nacional
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR AZSIGN

CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO
 Directora de Gestión de Recursos con Delegación en la Supervisión de Programas y Proyectos Privados financiados SGR-Ejecutores Naturaleza Privada
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
