

INFORME DE REUNIÓN

Fase de Ejecución Senavance — Proyecto Tayana: Seguimiento Trimestre 1 de 2026

1. Datos Generales de la Reunión

Fecha	Jueves, 14 de mayo de 2026
Hora	2:00 p.m. – 4:00 p.m.
Modalidad	Presencial / Virtual — Sin grabación
Tipo de sesión	Sesión de trabajo — Registro del seguimiento del Trimestre 1 de 2026 del Proyecto Tayana en la plataforma Senavance, módulo de Ejecución de Planes y Proyectos
Objetivo	Cargar en la plataforma Senavance las observaciones mensuales de seguimiento del Proyecto Tayana correspondientes al Trimestre 1 de 2026 (enero, febrero, marzo y abril), adjuntando los informes de seguimiento del formato GOR-F-012 V03, y verificar el estado de la ejecución financiera del proyecto en el sistema.

2. Participantes

N°	Nombre Completo	Rol / Dependencia
1	Julio César Arroyave Suaza	Líder Funcional — Aplicativo Tayana / Grupo de Planeación Operativa
2	Daniel López Bedoya	Agente Técnico — Aplicativo Tayana / Grupo de Planeación Operativa

3. Antecedentes y Contexto

El Proyecto Tayana — denominado formalmente "Fortalecimiento y Optimización del aplicativo Tayana para la gestión integral, trazable y eficiente de la operación estratégica y soporte del SENA" — es un proyecto de carácter nacional, con consecutivo NACIONAL_2025_355_25, adscrito a la Regional 1000 - Dirección General y al Centro 3030 - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. El proyecto cuenta con un valor total aprobado de \$2.423.082.940.

En el marco de las obligaciones de seguimiento y reporte del proyecto ante la plataforma Senavance, el equipo liderado por Julio César Arroyave Suaza realizó el cargue de las observaciones de seguimiento correspondientes al Trimestre 1 de 2026, cubriendo los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026. Cada observación fue acompañada del informe de seguimiento mensual elaborado en el formato GOR-F-012 V03. Esta sesión no fue grabada; la evidencia del trabajo realizado se recoge en las capturas de pantalla de la plataforma Senavance que se incluyen en este informe.

4. Desarrollo de la Reunión

4.1. Cargue de observaciones de seguimiento en Senavance

Julio César Arroyave Suaza y Daniel López Bedoya realizaron el cargue en la plataforma Senavance de las cuatro observaciones de seguimiento del Trimestre 1 de 2026, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril. A continuación se transcriben las observaciones registradas en el sistema, tal como fueron cargadas:

Mes	Observación registrada en Senavance
Enero	Se adjunta Informe de Seguimiento Proyecto TAYANA – Enero 2026 (GOR-F-012 V03). Durante el mes se formalizaron los 33 contratos del equipo (Fábrica de Software Risaralda y equipo funcional DPDC), se configuraron los entornos de desarrollo y se ejecutaron los ciclos 19 al 22 bajo metodología SCRUM, alcanzando el 100% de los puntos comprometidos. El sistema se mantuvo estable en producción con atención continua de peticiones de las 33 regionales y 118 centros de formación. Ejecución presupuestal: 69%.
Febrero	Se adjunta Informe de Seguimiento Proyecto TAYANA – Febrero 2026 (GOR-F-012 V03). Durante el mes se ejecutaron los ciclos 23 al 26 bajo metodología SCRUM, completando el 100% de los 255 puntos comprometidos. Se entregaron en producción el módulo de Repositorio de Formularios y las mejoras en sesiones v1. Se avanzó en el desarrollo de Múltiples Funcionalidades de Formularios y el Botón de Centro de Ayuda. Ejecución presupuestal: 69%.
Marzo	Se adjunta Informe de Seguimiento Proyecto TAYANA – Marzo 2026 (GOR-F-012 V03). Durante el trimestre se completaron 28 de 30 módulos funcionales planificados, representando un avance técnico del 93,3%. Se ejecutaron los ciclos 25 al 30 bajo metodología SCRUM, completando el 100% de los puntos comprometidos. Se encuentran en desarrollo activo los módulos de Gestión de Indicadores y Planes, Planes Prospectivos y Formulación PEI, con cierre proyectado para junio 2026. El análisis de requerimientos para Metas FPI quedó formalizado en documentos GTI-F-017 y GTI-F-018. Ejecución presupuestal: 83%.
Abril	Se adjunta Informe de Seguimiento Proyecto TAYANA – Abril 2026 (GOR-F-012 V03). Durante el mes se ejecutaron los ciclos 31, 32 y 33 bajo metodología SCRUM, completados al 100%. Las actividades se concentraron en la migración de identidad visual del módulo de Formularios, reformulación de la vista de Ejecuciones Complementarias, reconstrucción visual de la parametrización de Formulación PA, refactorización de backend y frontend por dominios y flujos, centralización del contrato de reglas y validaciones, y diagnóstico de deuda técnica del módulo de Formularios. El sistema mantiene 28 de 30 módulos completados (93,3%). Ejecución presupuestal: 83%.

4.2. Verificación del cargue exitoso en Senavance

Una vez realizado el cargue de las cuatro observaciones con sus respectivos informes adjuntos en formato GOR-F-012 V03, el sistema Senavance confirmó el guardado exitoso mediante el mensaje de confirmación "¡Éxito! La observación y evidencia han sido guardadas exitosamente". A continuación, se incluye la captura de pantalla que evidencia el cargue realizado:



Captura 1. Confirmación de cargue exitoso de observaciones en Senavance — 14 de mayo de 2026

4.3. Vista de observaciones registradas por mes

La plataforma Senavance presenta las cuatro observaciones de seguimiento del Trimestre 1 de 2026 correctamente registradas, cada una con el informe adjunto en formato GOR-F-012 V03 disponible para descarga:




Captura 2. Observaciones registradas por mes en Senavance — Trimestre 1 de 2026 (enero, febrero, marzo y abril)

4.4. Estado de la ejecución financiera del proyecto en Senavance

La plataforma Senavance registra el siguiente estado de la ejecución financiera del Proyecto Tayana con corte a la fecha de la sesión:

Indicador	Valor / Porcentaje	Línea de inversión	% Comprometido / Pagado
-----------	--------------------	--------------------	-------------------------

Valor aprobado	\$ 2.423.082.940	Software	0% comprometido / 0% pagado
Valor comprometido	\$ 1.867.250.278 (77,06%)	Contratación de apoyos administrativos y de gestión	89,98% comprometido / 29,23% pagado
Valor pagado	\$ 545.738.414 (29,23%)	—	—

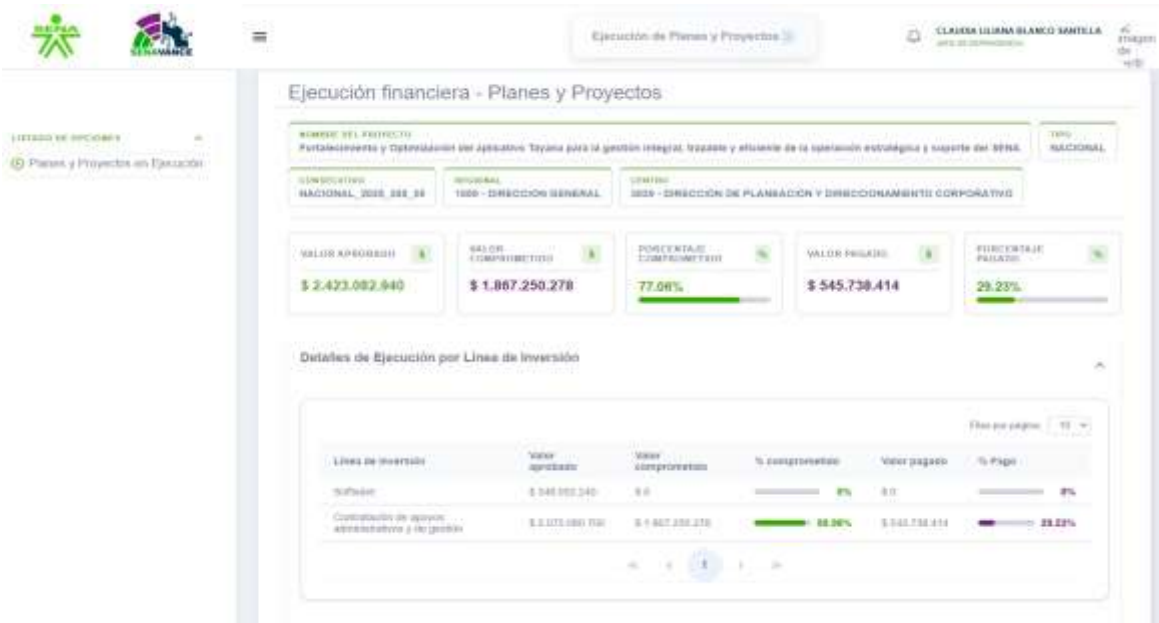

Captura 3. Ejecución financiera del Proyecto Tayana en Senavance — corte 14 de mayo de 2026

5. Compromisos y Acciones a Seguir

Compromiso / Acción	Responsable	Plazo
Continuar el cargue oportuno de los informes de seguimiento mensual del Proyecto Tayana en Senavance, siguiendo el formato GOR-F-012 V03	Julio César Arroyave Suaza / Daniel López Bedoya	Mensualmente, durante la vigencia del proyecto
Realizar el seguimiento a la ejecución financiera del proyecto, con énfasis en el avance del componente de Software (0% comprometido a la fecha) y en el componente de Contratación de Apoyos Administrativos (89,98% comprometido)	Julio César Arroyave Suaza	De manera continua

6. Observaciones

El registro en Senavance del seguimiento del Trimestre 1 de 2026 del Proyecto Tayana evidencia el cumplimiento de las obligaciones de reporte institucional del proyecto. Las cuatro observaciones cargadas documentan un avance técnico consistente durante el trimestre: ejecución al 100% de los puntos comprometidos en cada ciclo SCRUM, entrega en producción de módulos clave (Repositorio de Formularios, mejoras en sesiones v1, módulo de

Formularios con nueva identidad visual), y un avance técnico acumulado del 93,3% (28 de 30 módulos) al cierre del trimestre.

El estado de la ejecución financiera muestra que el proyecto tiene un valor comprometido del 77,06% (\$1.867.250.278 sobre \$2.423.082.940 aprobados), concentrado en la línea de Contratación de Apoyos Administrativos y de Gestión (89,98% comprometido). La línea de Software registra 0% de comprometido y pagado a la fecha, lo que indica que los recursos asociados a este componente están aún por comprometer. El valor pagado del 29,23% refleja el avance en la ejecución de los desembolsos correspondientes a los contratos del equipo.

La participación de Julio César Arroyave Suaza en esta sesión se enmarca en su rol de Líder Funcional del aplicativo Tayana y en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales de seguimiento y reporte del Proyecto Tayana ante los sistemas institucionales de información de gestión del SENA.

7. Cierre

La sesión concluyó con el cargue exitoso de las cuatro observaciones de seguimiento del Trimestre 1 de 2026 en la plataforma Senavance, con sus respectivos informes adjuntos en formato GOR-F-012 V03. El sistema confirmó el guardado exitoso de cada observación y evidencia. La ejecución financiera del proyecto quedó verificada con corte al 14 de mayo de 2026.

Julio César Arroyave Suaza

Líder Funcional — Aplicativo Tayana

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Grupo de Planeación Operativa

Bogotá, mayo de 2026
