



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD: 2120

ACTA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
16	TEAMS	26/12/2025	03:00 PM	04:00 PM

OBJETO DE LA REUNION

Realizar el Comité Técnico Operativo de diciembre de 2025 con la finalidad de revisar el avance técnico, jurídico y financiero y el cumplimiento del Convenio Interadministrativo 1989-2024 el cual tiene por objeto: "CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS.", en cumplimiento de lo dispuesto en las Cláusulas Novena y Décima, con el fin de establecer los lineamientos para el cumplimiento de compromisos adquiridos y la toma de decisiones para la correcta ejecución del referido convenio.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Verificación de Quorum
3. Estado del Convenio (Gobernación de Cauca)
Presentación Informe avance de ejecución:
Estado de obligaciones financieras
Avance jurídico
4. Matriz de Riesgo
5. Propuestas – varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Documentar las acciones que han impactado el cronograma de implementación del proyecto.	Culminado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y Verificación del Quórum

Delegado del Fondo Único de TIC por parte del Ministerio TIC inicia la sesión y se procede con la verificación de la asistencia de los miembros del comité. Así:

- Por la gobernación de Cauca, se encuentra Daniel Valencia Vitery,
- Representante del Fondo Único De TIC-I ingeniero César Andrés Escalante Borrero

De acuerdo con la verificación del quórum se da por iniciado el comité.

2. Presentación del Estado del Convenio

La Gobernación del Cauca, a través del ingeniero Daniel Valencia, informó que:

El contrato del operador fue adjudicado a la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL S.A. E.S.P.) mediante el contrato 1515 de 2025, con acta de inicio firmada el 6 de junio de 2025.

La interventoría fue adjudicada mediante el contrato 1922 de 2025 a la Unión Temporal Interventoría Inclusión Tecnológica Cauca, con acta de inicio suscrita también el 6 de junio de 2025.

Es importante precisar que los contratos se encuentran en ejecución.

Avance técnico:

El equipo de la Gobernación reportó que el convenio se encuentra en ejecución paralela de varias fases, con el objetivo de optimizar tiempos y garantizar la continuidad y ejecución del proyecto, se está realizando instalación de nodos e instalación de ramales, a la fecha de tiene un avance del 42% en la ejecución física del proyecto.

Estudio Trazado de Red Troncales y Ramales

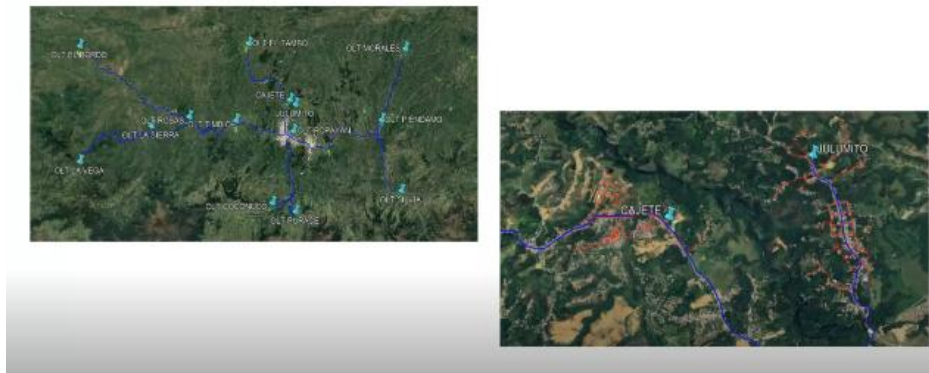


Imagen 1. Trazados de red troncales y ramales. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

La gobernación indica que, referente a la instalación de los rack y equipos en los nodos, esta actividad ya se completó al 100%. Ya se hizo la configuración del canal de Internet en el nodo estratégico del proyecto, el nodo ubicado en Popayán. Ahí tenemos ya establecido el canal de Internet por donde se va a arrancar la. La distribución o la asignación del ancho de banda en Cajete y Julumito, que son los corregimientos que inician la operación del proyecto.

Tendidos de fibra óptica (F.O) Ramales. (Diciembre 2025)



Imagen 2. Tendido de FO y ramales. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

Durante el mes de diciembre se alcanzaron 105 km en despliegue fibra óptica, teniendo en cuenta que se han presentado impactos al cronograma ya que se ha evidenciado que hay algunos que se han materializado riesgos relacionados con tema de orden público.

La gobernación manifiesta que se han presentado inconvenientes para acceso a los predios donde se despliega la fibra óptica, y se ha tenido que realizar compensación a los dueños de los predios.

Tendidos de fibra óptica (F.O) de Backbone. (Diciembre 2025)



Imagen 3. Tendidos de fibra óptica. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

Instalación Rack y Equipos Nodos Principales y Cabeceras.



Imagen 4. Instalación de equipos y nodos. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

La gobernación reitera la preocupación por el tema del orden público, indicando que se ha intensificado las acciones terroristas sobre todo en la vía Panamericana, que comunica a todos los municipios.

Indican que se han recibido alertas tempranas que afecta de forma muy álgida el tema de la operación del del convenio. Se está recopilando información para sustentar este impacto frente al avance en la ejecución del convenio.

En relación con las consignas, la gobernación indica que recibió comunicación de la empresa compañía Energética de Occidente - CEO en la cual indican que se congelan las consignas del 20 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, según esta la directriz no se puede trabajar en la red en este periodo

ESTADO CONSIGNAS CEO

Cuadro de seguimiento de solicitudes de Consignas CEO- Cauca							
TRONCALES							
Numero de PES	4123	Observaciones	4124	Observaciones	Numero de PES	4321	Observaciones
Proyecto	Rosas-Timbio	Pendiente inicio	Rosas-Timbio	Pendiente inicio	Proyecto	Piendamó-Morales	Pendiente Inicio
Fecha Inicio	15/12/2025		5/01/2026		Fecha Inicio	22/12/2025	
Fecha final	23/12/2025		12/01/2026		Fecha final	31/12/2025	
Agente 1	Felipe agualimpia		Felipe agualimpia		Agente 1	CRISTIAN RODRIGUEZ	
Agente 2	Alfonso Gomez		Alfonso Gomez		Agente 2	CRISTIAN DORADO	
Aliado	GLOBAL		GLOBAL		Aliado	NPE	
Ramales							
Numero de PES	4129	Observaciones	Ramal-Cajete				
Proyecto	Ramal Julumito	Finalizado	Ramal-Cajete	En construccion			
Fecha Inicio	1/12/2025		10/12/2025				
Fecha final	9/12/2025		16/12/2025				
Agente 1	Juan pablo ortega		Juan pablo ortega				
Agente 2	cristian prado		cristian prado				
Aliado	GLOBAL		GLOBAL				

Imagen 5. Planeación de consignas con la empresa CEO. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

En cuanto a la caracterización de beneficiarios del proyecto, la gobernación indica que se ha culminado encuestas de caracterización en los municipios de Piendamó-Tunía, Timbio, Rosas, el Tambo, Morales, Silvia y Popayán (Cajete y Julumito), Purace – Coconuco, La Sierra, Patia - El bordo y la Vega, de este proceso ya se cuenta con listado de beneficiarios estrato 1 y 2.

Caracterización Beneficiarios del Proyecto

Priorización	Municipio o Vereda	Meta Projectada	Cumplen con requisitos mínimos
Municipios priorizados Segunda Utilización	Piendamó - Tunia	432	432
	Timbio	231	231
	Rosas	87	87
	El Tambo	375	375
	Morales	87	87
	Silvia	202	202
	Popayán (Julumito Cajeta)	432	432
SubTotal		1846	1846
Municipios priorizados Tercera Utilización	El Bordo - Patia	116	116
	La Sierra	87	87
	La Vega	87	87
	Puracé	232	232
SubTotal		522	522
TOTAL		2368	2368



Imagen 6. Caracterización de beneficiarios. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

En relación con el impacto generado por la afectación al orden público, la interventoría manifiesta que no ha logrado hacer visitas para avalar los avances mencionados por el operador, sobre todo en la parte de centros de datos.

Frente a los retrasos en cronograma, la gobernación presenta una relación de afectaciones asociadas a condiciones climáticas que han imposibilitado el normal desarrollo de las actividades de tendido d de fibra.

Condiciones Climáticas y Afectaciones en la Ejecución del Proyecto

Reporte Lluvias Troncales	
Emtel-Julumito	23/10/25
	24/10/25
	27/10/25
	28/10/25
	30/10/25
	6/11/25
	7/11/25
	8/11/25
Rosas-Timbio	22/11/25
	3/11/25
	4/11/25
	5/11/25
	6/11/25
	7/11/25
	8/11/25
	12/11/25
Reporte Lluvia Ramales	
Piendamó	13/11/25



Durante octubre y noviembre de 2025 se presentaron lluvias continuas que generaron atrasos en las actividades de instalación de fibra óptica en las troncales Emtel-Julumito y Rosas-Timbio, así como en el ramal Piendamó.

Las precipitaciones impidieron el avance de canalización y tendido, afectando los cronogramas previstos.

Se implementaron medidas de recuperación como reprogramación de actividades, refuerzo de cuadrillas y jornadas extendidas para mitigar los retrasos y garantizar el cumplimiento del proyecto "Conectando al Cauca".

Imagen 7. Condiciones climáticas y afectaciones al proyecto. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

- Avance financiero:

- Rendimientos financieros:

De la cuenta bancaria de Banco de Occidente se generaron rendimientos desde diciembre 2024 a mayo 2025 por valor de \$4.153.584,45 los cuales ya se encuentran girados en su totalidad al FUTIC.

Desde la cuenta de Banco de Santander se ha generado rendimientos desde abril a noviembre 2025 por valor de \$60.242.543,16 los cuales se encuentran transferidos al FUTIC en su totalidad.

Periodo	Rendimientos obtenidos	Rendimientos consignados	Fecha de la consignacion
Abril	\$7,653,511,58	7653511,58	18/09/2025
Mayo	\$8,476,977,34	8476977,34	18/09/2025
Junio	\$7,659,688,06	7659688,06	18/09/2025
Julio	\$9,031,267,62	9031267,62	18/09/2025
Agosto	\$8,153,406,79	8153406,79	18/09/2025
Septiembre	\$6,194,216,31	\$6,194,216,31	
Octubre	\$7,038,135,90	\$7,038,135,90	
Noviembre	\$6,035,339,56	\$6,035,339,56	
Total	\$ 60.242.543,16	\$ 60.242.543,16	

Tabla 1. Rendimientos financieros Cuenta Banco Santander convenio 1989-2024

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se han generado rendimientos financieros desde diciembre de 2024 a noviembre 2025 el valor de \$64.396.127,6, los cuales en su totalidad se encuentran transferidos al FUTIC.

- Seguimiento al Plan de utilidades:

Se han aprobado 2 utilidades, la primera utilización aprobada el 24 de julio de 2025 los recursos ya han sido girados al operador. La segunda utilización fue aprobada el 14 de noviembre y ya fue girada al operador.

UTILIZACION	VALOR UTILIZACION	ESTADO DE LA UTILIZACION
Utilizacion 1	\$ 4.400.000.000	APROBADA
Utilizacion 2	\$ 4.400.000.000	APROBADA
Utilizacion 3	\$ 6.600.000.000	PENDIENTE
Utilizacion 4	\$ 4.600.000.000	PENDIENTE

Tabla 2. Estado del plan de utilidades convenio 1989-2024

La gobernación indica se acataron y se subsanaron estas observaciones frente a los documentos de la legalización de la utilización dos, por lo que está pendiente radicar los documentos ante MINTIC.

El Supervisor por parte del MINTIC solicita a la Gobernación revisar y darle celeridad al hito que falta cumplir para darle continuidad al trámite financiero.

- Avance jurídico:

- Formalización contractual: El contrato del operador (1515 – EMTEL) y de la interventoría (1922 – UT Inclusión Tecnológica Cauca) se encuentran en ejecución desde el 6 de junio de 2025, con actas de inicio firmadas y pólizas constituidas.

La supervisión de parte del MINTIC enfatizó la importancia de consolidar en los expedientes del convenio todos los modificatorios, pólizas y actas de subsanación, para garantizar trazabilidad en auditorías y soporte jurídico al cierre del convenio.

La gobernación indica que se realizó solicitud formal de suspensión del convenio ante la imposibilidad de realizar actividades de implementación de redes, así como actividades asociadas a la verificación por parte de interventoría.

Se destaca alertas tempranas emitidas por la defensoría del pueblo en la cual se involucra directamente municipios que hacen parte del convenio.

Afectaciones Por Orden Publico

Fecha	Descripción del hecho	Fuente	Municipio afectado
13/08/25	Cancelación de ferias y fiestas por escatada de violencia armada.	Infobae	La Sierra, La Vega
20/08/25	Neutralizado centro logístico de disidencias de las FARC.	W.Radio	Cauca (zona rural)
20/08/25	Explosión en la vía Panamericana atribuida a disidencias.	Infobae	Rosas
13/09/25	Hostigamientos en zona urbana.	Radio Reloj (Facebook)	Silvia
18/10/25	Ataque con explosivos frente a estación de Policía.	Infobae	El Patía – El Bordo
19/10/25	Bloqueo campesino en la vía Panamericana.	Informativo del Gualco	Rosas
22/10/25	Atentado contra líder indígena Nasa Kite Kiwe.	El Tiempo	Timbio
26/10/25	Explosiones durante celebración de fundación del municipio.	El Tiempo	La Vega
1/11/25	Comunicado oficial de la Alcaldía tras hechos violentos.	Alcaldía de La Vega (Facebook)	La Vega
3/11/25	Explosión de carro bomba en zona urbana; dos víctimas fatales.	El País (España)	Suárez

Durante el segundo semestre de 2025, varios municipios del Cauca presentaron situaciones de alteración del orden público que impactaron directamente la ejecución del proyecto “Conectando al Cauca: Inclusión y Apropiación Tecnológica para Todos”.

Entre agosto y noviembre se registraron ataques, hostigamientos, bloqueos y explosiones que afectaron la movilidad del personal técnico, el ingreso a zonas rurales y el avance en las actividades de instalación de red y empalmes de fibra óptica.

Pese a ello, se mantuvo la coordinación con las autoridades locales y fuerza pública para garantizar la seguridad de las operaciones y la continuidad del proyecto.

Imagen 8. Afectaciones por orden público. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

3. Matriz de riesgo

- Se mantiene el riesgo de orden público en zonas rurales por presencia de grupos armados ilegales, situación que ha dificultado el acceso seguro a algunos municipios.
- Se reiteró la recomendación de mantener reportes semanales para anticipar riesgos y activar alertas tempranas.

4. Propositiones y Varios



ACTA DE REUNIÓN



- La supervisión de parte del MINTIC recomendó mantener la documentación de hitos técnicos actualizada para soportar la viabilidad de la segunda utilización.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Realizar la revisión de solicitud de suspensión del convenio	Ministerio TIC	30/12/2025

REGISTRO FIRMAS COMITÉ

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Daniel Valencia Vitery	Delegado Gobernación de Cauca	
Cesar Andrés Escalante Borrero	Representante del Fondo TIC	

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Daniel Valencia Vitery	Delegado	Gobernación de Cauca
Carlos Alvis	Apoyo técnico	Gobernación de Cauca
Marly Ching	Líder	Interventoría
Ivone Carvajal Moreno	Apoyo técnico	Gobernación de Cauca
Cesar Andrés Escalante Borrero	Profesional Especializado Subdirección de Operaciones	MINTIC
Carmen Laura Mejía Puerta	Contratista dirección de Infraestructura	MINTIC
Kelly Johanna Aguilera	Contratista Dirección de Infraestructura	MINTIC
Adriana Patricia Moya Castaño	Contratista Dirección de Infraestructura	MINTIC

Anexos

- Lista de asistencia generada por Microsoft Teams.

Comité operativo convenio 1989-2024

viernes, 26 de diciembre de 2025 03:00 p.m. - 04:13 p.m. Más

10 Asistieron	03:00 p.m. - 04:13 p.m. Hora de inicio y finalización
1h 13m 16s Duración de la reunión	43m 25s Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
CB Cesar Andres Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co	03:01 p.m.	03:50 p.m.	49m 32s
KM Kelly Johanna Aguilera Martinez kaguileram@mintic.gov.co	03:01 p.m.	03:50 p.m.	49m 31s
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	03:03 p.m.	04:06 p.m.	1h 3m 2s
MC Marly Ching (No comprobado)	03:03 p.m.	03:50 p.m.	47m 27s
DV DANIEL VALEN... (No comprobado)	03:03 p.m.	03:50 p.m.	47m 26s
AC Adriana Patricia Moya Castano amoya@mintic.gov.co	03:03 p.m.	03:50 p.m.	46m 52s
CA Carlos alvis (No comprobado)	03:06 p.m.	03:50 p.m.	43m 43s
IM Ivon Carvajal Moreno	03:09 p.m.	03:50 p.m.	40m 51s
CP Carmen Laura Mejia Puerta cmejia@mintic.gov.co	03:24 p.m.	03:24 p.m.	5s
PM Pablo Alejandro Z... (No comprobado)	03:27 p.m.	04:13 p.m.	45m 43s

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_comite_diciembre_Cauca 1989-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260121-154206-f3e3b9-31495162

Creación: 2026-01-21 15:42:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-21 19:21:28



Escanee el código
para verificación

Firma: Delegado Gobernación de Cauca

Daniel Fernando Valencia Vitery
1061728951
daniel.valencia@cauca.gov.co
Apoyo Técnico SED
Gobernación Del Cauca

Firma: delegado FUTIC - MINTIC

Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta_comite_diciembre_Cauca 1989-2024 Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260121-154206-f3e3b9-31495162 Creación: 2026-01-21 15:42:07 Estado: Finalizado Finalización: 2026-01-21 19:21:28			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-01-21 15:42:11 Lec.: 2026-01-21 15:42:54 Res.: 2026-01-21 15:43:14 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Daniel Fernando Valencia Vitery daniel.valencia@cauca.gov.co Apoyo Técnico SED Gobernación Del Cauca	Aprobado	Env.: 2026-01-21 15:43:14 Lec.: 2026-01-21 19:21:13 Res.: 2026-01-21 19:21:28 IP Res.: 181.48.255.70 Canal: Email
