

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

1. INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN									
Fecha de elaboración del informe	17	03	2026	Periodo de seguimiento	01 al 31	12	2024	Informe número	38
					01 al 31	01	2025	Informe número	39
					01 al 28	02	2025	Informe número	40
					01 al 31	03	2025	Informe número	41
					01 al 30	04	2025	Informe número	42
					01 al 31	05	2025	Informe número	43
Nombre del supervisor		Carolina Otilia Montealegre Castillo		Documento delegación			Correo electrónico		
Cargo		Supervisor Proyectos SGR		Resolución 0477 del 15 de julio de 2025			drq-supervisorsgr@minciencias.gov.co		
Profesional de apoyo a la supervisión		Karen Dayán Jurado Fonseca		Correo electrónico			kdurado@minciencas.gov.co		
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
BPIN	Nombre del proyecto						Nombre de la entidad ejecutora		
2020000100242	Optimización - Adecuar la oferta de recursos virtuales y multimediales en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C, a partir del prototipo del Portal www.mentalpuntodeapoyo.gov.co .						Pontificia Universidad Javeriana.		
Convocatoria de la cual deriva el proyecto	Convocatoria no. 3 del SGR – fondo de CTI - para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios, en el marco de la celebración del bicentenario.	Acuerdo aprobatorio No.	Fecha	Valor aprobado conforme Acuerdo de Aprobación			Fe de erratas Acuerdo aprobación		
				SGR (ACTel)	Contrapartida	Total			
				100	24 de noviembre de 2020	\$ 1.702.180.213	\$ 83.016.516	\$1.785.196.729	-
Plazo Inicial (meses)	Fecha de inicio del proyecto	Fecha de inicio reportada en GESPROY		Fecha final Inicial reportada en GESPROY		Ampliación de Horizonte (meses) (En caso de que se presente durante la ejecución del proyecto)		Fecha Final del proyecto	
36 meses.	10 de noviembre de 2021	03 de noviembre de 2021		10 de noviembre de 2024		43		31 de mayo de 2025	
Descripción Alcance del Proyecto: Incrementar la oferta de herramientas virtuales y multimediales en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C., como una innovación incremental por varias razones: primero, proporciona contenidos validados y de fuentes confiables a todos los grupos de interés abarcando la salud mental integralmente; segundo, los contenidos se encuentran dirigidos a todas los grupos de interés; tercero, los contenidos son apropiados para cada grupo teniendo en cuenta sus intereses y niveles de alfabetismo; cuarto, integra todos los recursos en un solo sitio Web y quinto, usa tecnología de punta (chatbot y gamificación) para incrementar la fidelidad con el sitio. Son también diferenciales importantes de este sitio-hijo la gratuidad y el fomento de redes de conexiones no solamente entre profesionales de la salud e individuos sino también con los terceros (pares, padres, cuidadores, educadores, etc.).									
Fuente: MGA BPIN 2020000100242									
3. OBJETIVOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO									
OBJETIVO GENERAL		Incrementar la oferta de herramientas virtuales y multimediales en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.			Indicador del Objetivo General: Incremento de la oferta de recursos virtuales con el propósito de brindar a la comunidad un entorno de recursos de comunicación – información – orientación clínica, en el campo de la salud mental, enfocado en infancia, niñez, adolescencia y juventud. Meta:5 Fuente de verificación: Se hará seguimiento al número de visitas a través del enlace: analytics.google				
Objetivo Especifico 1		Adecuar el número de materiales diseñadas para infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.			1.1 Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación Medido a través de: Número de proyectos Cantidad: 1,0000				

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

		Costo: \$ 730.449.344
Objetivo Especifico 2	Integrar en un portal específico las herramientas relacionadas a infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	2.1 Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología Medido a través de: Número de organizaciones Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 569.401.831
Objetivo Especifico 3	Implementar las estrategias de comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	3.1 Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad Medido a través de: Número de estrategias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 299.192.299

Licencias o permisos

Nombre de licencia o permiso	Fecha de expedición	Vigencia	Entidad que expide
Se reitera la observación relacionada con lo señalado en el documento técnico (página 51), donde se indica: "En el documento técnico se expresa en el numeral 16 'A pesar de que el Portal www.mentalpuntodeapoyo proviene de investigaciones previas, considerando que es un software no tiene licencia patente o modelo de utilidad. El Portal www.mentalpuntodeapoyo no tiene registro de software, tiene identidad de marca, pero no registro". En este sentido, se sugiere a la entidad ejecutora aclarar de manera expresa si el portal requiere o no algún tipo de licencia de funcionamiento, así como precisar su situación frente al registro de software, derechos de autor u otros mecanismos de protección aplicables, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la adecuada formalización del producto desarrollado.	Se requiere mencionar la funcionalidad de las páginas bajo el dominio de la Pontificia Universidad Javeriana.	La vigencia está sujeta a lo que la entidad ejecutora exprese en el siguiente informe y según esquema de sostenibilidad.	Pontificia universidad Javeriana

Localización	Departamento (s)	Bogotá D.C	No. de beneficiarios	Cumplimiento de requisitos de pre-ejecución					
	Municipio (s)	Bogotá D.C							
	Localización específica de la alternativa de solución	Región: Centro Oriente. Departamento: Bogotá, D.C, aunque por ser un Portal virtual trasciende la delimitación geográfica.		Fecha del certificado de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución	Fecha del acto de apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados	Fecha de publicación SPGR del acta de apertura o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados	Fecha de publicación SECOP del acta de apertura o acto administrativo unilateral con cargo a los recursos asignados	No. fecha del CDP	No. y fecha del CRP
			829.345	06 de octubre de 2021	06 de octubre de 2021	06 de octubre de 2021	06 de octubre de 2021	CDP 14521, fecha: 04 de octubre de 2021.	CRP 14521 fecha: 04 de octubre de 2021

4. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

4.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN APROBADAS OCAD

Fuentes Financiación Aprobadas OCAD	Valor Aprobado SGR	Valor Aprobado Otras Fuentes	Valor Total
Pontificia Universidad Javeriana	-	\$ 67.615.044,00	\$ 67.615.044,00
Departamentos - BOGOTA	\$ 1.516.026.958	-	\$ 1.516.026.958

**INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN
PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTel) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA**

Privadas - Hospital Universitario san Ignacio	-	\$ 15.401.472,00	\$ 15.401.472,00
Ajustes en valores APROBADOS por OCAD ACTel- SGR	\$ 186.153.255,00	-	\$ 186.153.255,00
TOTAL	\$ 1.702.180.213,00	\$ 83.016.516,00	\$ 1.785.196.729

4.2. CONSOLIDADO EJECUCIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

ENTIDAD	Valor Financiado por SGR - CTel	Valor Financiado por Otras Fuentes	Valor Total
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	-	\$ 1.432.180.213,00	\$ 1.432.180.213,00
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 270.000.000	-	\$ 270.000.000
TOTAL	\$ 270.000.000	\$ 1.432.180.213,00	\$ 1.702.180.213,00

5. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Avance de ejecución	% de avance físico del periodo reportado por la entidad	% de avance físico del periodo validado por la supervisión	% de avance acumulado GESPROY SGR	Tipología de Alerta Alertas no subsanadas (GESPROY SGR)	
			% de avance acumulado Avalado Supervisión		
Físico diciembre 2024	0	0.19%	100% verificado el: 09/01/2025. Avalado Supervisión 93,71%		
Físico enero 2025	0.06%	0.06%	87,82% Avalado Supervisión 93,77%		
Físico febrero 2025	0.06%	0.06%	87,82% Avalado Supervisión 93,83%		
Físico marzo 2025	0.06%	0.06%	87,82% Avalado Supervisión 93,89%		
Físico abril 2025	0.05%	0.05%	87,82% Avalado Supervisión 93,94%		
Físico mayo 2025	0.02%	0.02%	87,82% Avalado Supervisión 93,96%		
Financiero diciembre 2024	Valor Total Desembolsado	Valor Total Certificado Contrapartida (Avalado supervisión)	% de avance acumulado del proyecto SGR + Contrapartida (-Supervisión)		
	\$ 1.265.192.122	\$ 83.016.516	88,98%		
Financiero enero 2025	\$ 1.281.301.281	\$ 83.016.516	90,04%		
Financiero febrero 2025	\$ 1.298.765.440	\$ 83.016.516	91,19%		
Financiero marzo 2025	\$ 1.311.294.887	\$ 83.016.516	92,02%		
Financiero abril 2025	\$ 1.329.643.154	\$ 83.016.516	93,23%		

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Financiero mayo 2025	\$ 1.329.643.154	\$ 83.016.516	93,23%				
6. SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN							
6.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO							
6.1.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 2024							
Objetivos específicos	Actividad MGA	Entregables	Evidencias o soportes de ejecución del periodo reportado No. Expediente virtual (Minciencias) del proyecto: 20200170691200224E		Fecha evidencia	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en Informe Técnico	Actividad reportada de la Actividad reportado por el ejecutor en POA
			Descripción de la evidencia Por parte de la EE	Radicado AZ Minciencias			
OE3. Implementar las estrategias de comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	3.1.3 Realizar el seguimiento administrativo del proyecto.	Entregable proyectado total: 36 informes técnicos. 36 informes financieros.	Se adjuntan informes de ejecución del mes de diciembre de 2024.	El número de radicado del informe de ejecución del presente periodo se encuentra asociado al expediente virtual 202001706912002 24E	01 al 31 de diciembre de 2024.	0,19%	0,19%
Avance total en el periodo: La suma de los porcentajes reportados de las actividades para el periodo 38 (diciembre de 2024) dan evidencia de un avance del						0,19%	0,19%
6.2. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RELACIONADA POR EL EJECUTOR DICIEMBRE 2024							
ACTIVIDAD MGA		ENTREGABLE (ACTIVIDAD)			DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN		
No aplica para este mes de ejecución		No aplica para este mes de ejecución			No aplica para este mes de ejecución		
CONCEPTO GENERAL							
Las actividades desarrolladas en el marco de la actividad 2.1.1., evidenciadas a través de la implementación de funcionalidades en la página web institucional (página de inicio y sección de recursos), contribuyen directamente al cumplimiento del objetivo general del proyecto, en tanto permiten ampliar y poner a disposición herramientas virtuales y contenidos multimediales orientados a la salud mental de la población objetivo (infancia, niñez, adolescencia y juventud). Estas funcionalidades facilitan el acceso a información, recursos psicoeducativos y estrategias de intervención digital, fortaleciendo la cobertura y disponibilidad de servicios en entornos virtuales en Bogotá D.C. En este sentido, la consolidación del portal web se constituye en un medio clave para la difusión, apropiación y uso de herramientas innovadoras, alineándose con el propósito de incrementar la oferta tecnológica en el campo de la salud mental. El avance físico del proyecto durante el mes de diciembre ha alcanzado un 0,19% de ejecución. De forma general, al realizar una comparación entre la metodología descrita en el documento técnico aprobado por el OCAD (capítulo metodología) y los anexos del informe de ejecución correspondientes al mes de diciembre de 2024, se puede observar que la entidad está desarrollando su metodología en cada evidencia presentada. Durante el mes de diciembre, el equipo investigador de la Pontificia Universidad Javeriana a cargo del BPIN 2020000100242 da continuidad del sitio web del proyecto, disponible en https://www.javeriana.edu.co/enmental/. Este portal actúa como una plataforma central para el acceso a recursos psicoeducativos y cuenta con diversas secciones estratégicas: una página de inicio que brinda una visión general y acceso rápido a las áreas más relevantes; una sección de recursos educativos destinada a apoyar la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; y una sección de comunidad diseñada para fomentar la interacción y el apoyo mutuo entre los usuarios. Estos avances reflejan un esfuerzo significativo del equipo en la construcción de herramientas digitales que promuevan el bienestar mental y social, fortaleciendo la capacidad del proyecto para impactar positivamente a la comunidad. Nota 1: el porcentaje de ejecución del mes de diciembre corresponde a la actividad 3.1.3 Realizar el seguimiento administrativo del proyecto con un 0,19%. Nota 2: Para el periodo 38 (corte físico a diciembre de 2024), se evidencia un avance del 0,19% correspondiente al mes de diciembre de 2024, según lo reportado en el informe y verificado. Asimismo, el proyecto alcanza un avance acumulado del 93,71%, el cual ha sido avalado por la supervisión. En este sentido, se cuenta con un avance acumulado avalado del 93,71%.							

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Imagen 1. Imágenes de la página ENMENTAL



Nota: Imágenes tomadas de la página ENMENTAL (diciembre 09-01-2025).

Nota: El avance físico total del objetivo general, reportado por el ejecutor del proyecto en el informe técnico al 38 de diciembre de 2024 es de un: **0,19%** y un acumulado total del **95,27%**.

Metas de producto Gesproy

Imagen 2. Metas de producto Gesproy

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Código BPIN

2020000100242

Optimización - Adecuar la oferta de recursos virtuales y multimediales en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C., a partir del prototipo del Portal .mentalpuntodeapoyo Bogotá

Paso a Paso

Aprobación y Envío

Metas de Productos

Mostrar 10 registros por página

Buscar

	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
1	Adecuar el número de materiales diseñados para infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número de proyectos	1	2024	Octubre	1	100
2	Implementar las estrategias de comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad	Número de estrategias	1	2024	Octubre	1	100
3	Integrar en un portal específico las herramientas relacionadas a infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología	Número de organizaciones	1	2024	Octubre	1	100

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 09-01-2025).

La Pontificia Universidad Javeriana, en su calidad de entidad ejecutora del proyecto BPIN 2020000100242, ha finalizado y registrado las metas de producto en el aplicativo Gesproy. Estas metas incluyen:

- ✓ El diseño y adecuación de materiales enfocados en la infancia, niñez, adolescencia y juventud, abordando sus principales problemáticas en el campo de la salud mental en Bogotá D.C.
- ✓ La implementación de estrategias de comunicación y difusión, dirigidas a los mismos grupos poblacionales y problemáticas, también en Bogotá D.C.
- ✓ La creación y finalización de un portal específico, que proporciona herramientas relacionadas con la infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental en Bogotá D.C.

De este modo, se concluyen satisfactoriamente las metas de producto definidas para este proyecto.

Indicadores de producto Gesproy

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Imagen 3. Indicadores de producto BPIN 2020000100242


Indicadores de Producto												
Mostrar 10 registros por página										Buscar		
Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución	
Adecuar el número de materiales diseñados para infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número de proyectos	1	Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	2021	2021	1,00	2024	Octubre	1	100	
Integrar en un portal específico las herramientas relacionadas a infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología	Número de organizaciones	1	Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la I+D+i	2021	2021	1,00	2024	Octubre	1	100	
Integrar en un portal específico las herramientas relacionadas a infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología	Número de organizaciones	1	Prototipos desarrollados	2022	2022	1,00	2024	Octubre	1	100	
Implementar las estrategias de comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad	Número de estrategias	1	Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas	2022	2022	1,00	2024	Octubre	1	100	

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 09-01-2025).

La Pontificia Universidad Javeriana, en su calidad de entidad ejecutora del proyecto BPIN 2020000100242, ha finalizado y registrado los cuatro indicadores de producto.

Imagen 1. Horizonte del Proyecto BPIN 2020000100242

Alcance Estructurar el sitio-hijo Portal www.mentalpuntodeapoyo, para los NNAJ. Generar herramientas para la detección e intervención en salud mental y ante problemas y trastornos en NNAJ disminuyendo el sufrimiento y la carga de enfermedad. Lo que incluye el desarrollo de 1 videojuego, 10 videos, 5 materiales de psicoeducación con 200 copias cada uno y 10 programas radiales. Capacitar a 150 docentes y orientadores escolares en el Diplomado Orientando hacia la salud mental en IE.	Fecha aprobación	24/11/2020	Fecha terminación	10/11/2024	Estado	TERMINADO
	Valor total	\$ 1.785.196.729	Valor SGR	\$ 1.702.180.213	Aprobado directamente	No
	* Cifras en pesos					

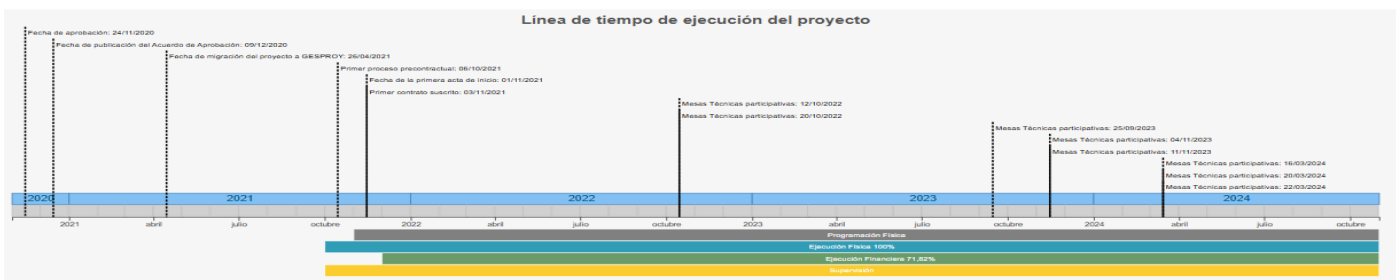

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 30/12/2024).


Análisis Curva S Gesproy

Los indicadores de desempeño del aplicativo Gesproy para el proyecto BPIN 2020000100242 reflejan un avance alineado con lo programado (SPI = 1), un manejo eficiente de los recursos financieros dentro del presupuesto (CPI = 1) y la ausencia de retrasos en el cronograma (SV(t) = 0 meses). Estos resultados indican que el proyecto

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

se encuentra en un estado favorable para su culminación exitosa, cumpliendo con los plazos y objetivos establecidos.


Imagen 2. Curva S Gesproy diciembre 2024

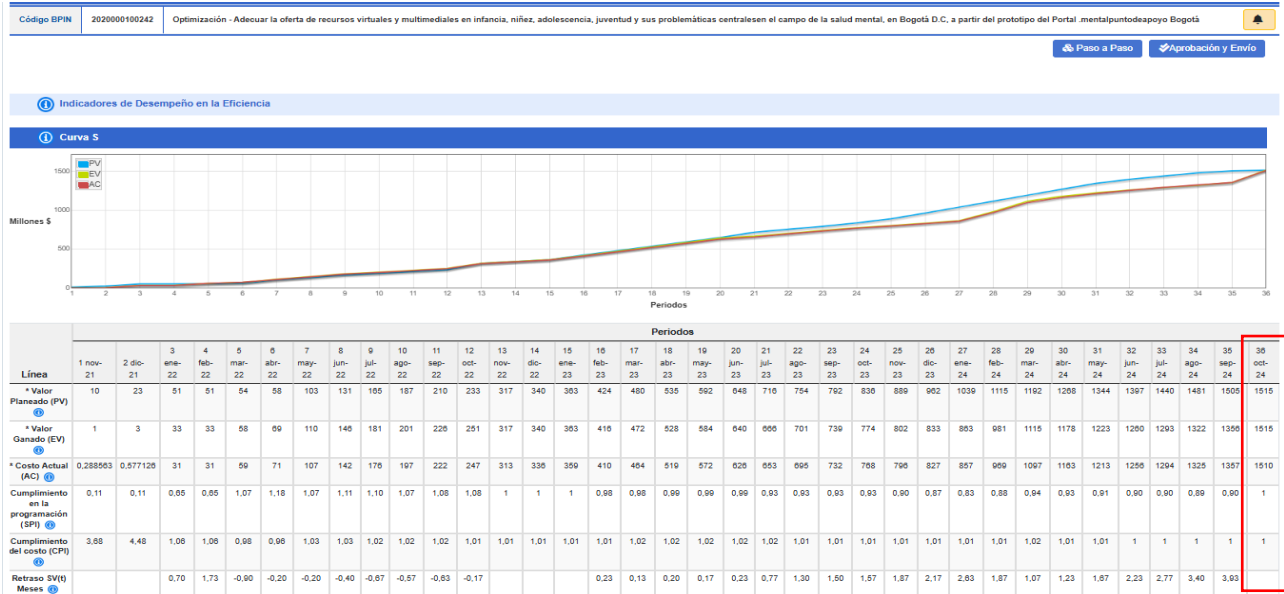

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 09-01-2025).

Cumplimiento de la Programación

Gráfica 1. Comportamiento del Cumplimiento BPIN 2020000100242

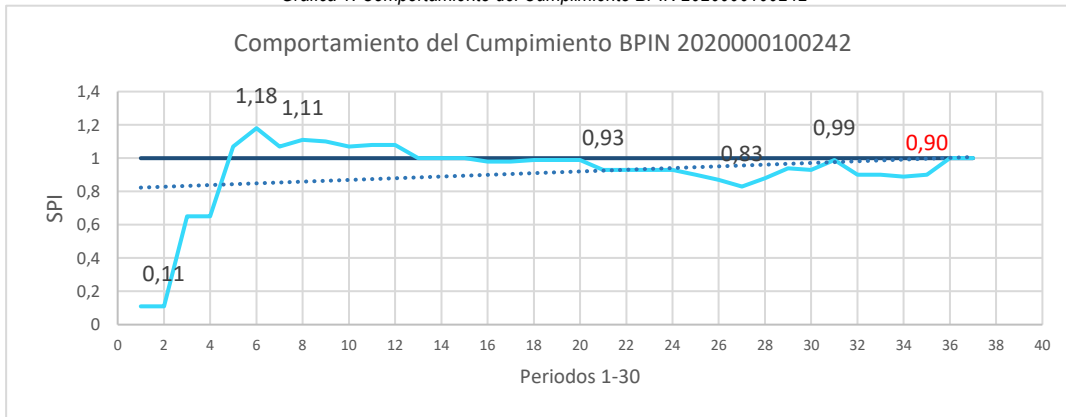


Nota: Elaboración Propia con información de Gesproy (Fecha de consulta 09-01-2025)

Un SPI (Índice de Desempeño del Cronograma) = 1 indica que el proyecto está avanzando exactamente según lo planeado, sin retrasos ni adelantos acumulados. Esto significa que el trabajo completado hasta la fecha corresponde al trabajo programado para este punto del cronograma. Si se perciben retrasos, podrían deberse a problemas en actividades específicas no reflejados en el indicador global

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Comportamiento de retraso de Actividades

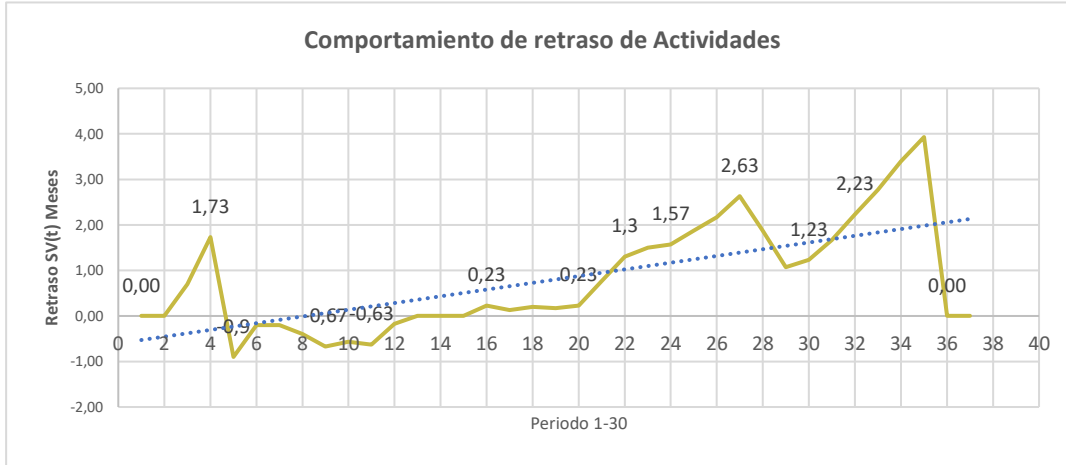

Nota: Elaboración Propia con información de Gesproy (Fecha de consulta 09-01-2025)

La gráfica muestra que el proyecto BPIN 2020000100242 experimentó un incremento en el retraso durante el periodo 4, seguido de una recuperación en el periodo 5. Sin embargo, a partir del periodo 20, el proyecto presenta una tendencia de retraso sostenido, que se extiende hasta el periodo 35, finalizando con un valor de Retraso SV(t) de 0 meses.

6.1.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCIÓN ENERO 2025

Objetivos específicos	Actividad MGA	Entregables	Evidencias o soportes de ejecución del periodo reportado No. Expediente virtual (Minciencias) del proyecto: 20200170691200224E		% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en Informe Técnico	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en POA
			Descripción de la evidencia Por parte de la EE	Radicado AZ Minciencias		
OE2. Integrar en un portal específico las herramientas relacionadas a infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	2.1.1 Estructurar Sitio - hijo con diseño de aplicación híbrida	2.1.1 Estructurar Sitio - hijo con diseño de aplicación híbrida	La entidad ejecutora adjunta enlace correspondiente al desarrollo de la actividad 2.1.1., en la cual se evidencian las funcionalidades implementadas en la página web institucional disponible en: https://www.javeriana.edu.co/enmental/ En dicho sitio se verifican los avances asociados a la estructuración de la página de inicio y la sección de recursos, en coherencia con los productos definidos para esta actividad.	01 al 31 de enero de 2025	0,04%	0,04%
OE3. Implementar las estrategias de	3.1.3 Realizar el seguimiento	36 informes técnicos 36 informes financieros	Se adjunta informe técnico y financiero del	01 al 31 de enero de 2025	0,02%	0,02%

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	administrativo del proyecto		mes de enero de 2025			
Avance total en el periodo: La suma de los porcentajes reportados de las actividades para el periodo 39 (enero de 2025) dan evidencia de un avance del					0,06%	0,06%

6.2. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RELACIONADA POR EL EJECUTOR ENERO 2025		
ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución

CONCEPTO

La entidad ejecutora adjunta el enlace correspondiente al desarrollo de la actividad 2.1.1., en el cual se evidencian las funcionalidades implementadas en la página web institucional (página de inicio y sección de recursos), en coherencia con los productos definidos. Asimismo, se adjunta el informe técnico y financiero del mes de enero de 2025. El desarrollo de estas actividades contribuye directamente a la finalización del proyecto, en tanto corresponden a la consolidación de entregables clave orientados a la disponibilidad de herramientas virtuales y contenidos multimediales en salud mental.

Nota: Para el periodo correspondiente a enero de 2025, se evidencia un avance físico del 0,06% durante el mes, conforme a la información reportada. Con este resultado, el proyecto alcanza un avance acumulado del 93,77%, el cual ha sido avalado por la supervisión.

Horizonte del proyecto

Código BPIN

2020000100242

Optimización - Adecuar la oferta de recursos virtuales y multimediales en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C. a partir del prototipo del Portal .mentalpunto de apoyo Bogotá

Paso a Paso

Aprobación y Envío

Alcance

Estructurar el sitio-hijo Portal www.mentalpunto de apoyo, para los NNAJ. Generar herramientas para la detección e intervención en salud mental y ante problemas y trastornos en NNAJ disminuyendo el sufrimiento y la carga de enfermedad. Lo que incluye el desarrollo de 1 videojuego, 10 videos, 5 materiales de psicoeducación con 200 copias cada uno y 10 programas radiales. Capacitar a 150 docentes y orientadores escolares en el Diplomado Orientando hacia la salud mental en IE.

Fecha aprobación

24/11/2020

Fecha terminación

31/05/2025

Estado

CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total

\$ 1.785.196.729

Valor SGR


\$ 1.702.180.213

Aprobado directamente

No

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 17-03-2026).

La imagen refleja la ampliación del horizonte del proyecto hasta el 31 de mayo de 2025. En este sentido, se solicita a la entidad ejecutora realizar el reporte de los periodos 37 al 43, una vez se cuente con la programación ajustada conforme a la ejecución planeada, considerando el periodo de ampliación comprendido entre el 11 de noviembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

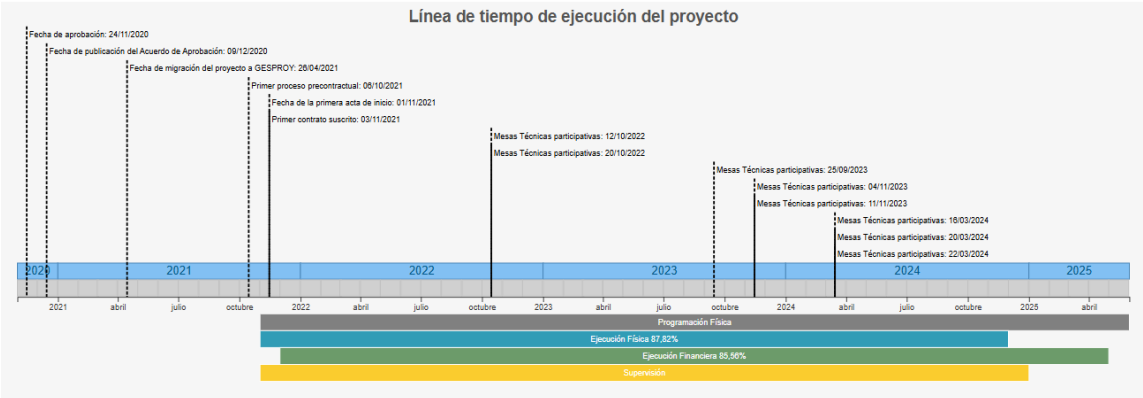

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 17-03-2026).

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

El proyecto BPIN 2020000100242 presenta un avance físico del 87,82% y un avance financiero del 85,50%, lo que evidencia un nivel alto de ejecución y una adecuada coherencia entre ambos indicadores. La ampliación del horizonte hasta mayo de 2025 permitió continuar con el desarrollo de actividades pendientes y avanzar significativamente hacia el cumplimiento de los productos. Sin embargo, dado que los indicadores aún no alcanzan el 100%, se infiere que la ampliación fue necesaria para completar el proyecto, pero no fue suficiente para lograr su cierre total en el tiempo previsto. En este sentido, se requiere que la entidad ejecutora finalice las actividades restantes y actualice la información en GESPROY, con el fin de formalizar el cierre y evitar afectaciones en la evaluación del desempeño.

6.1.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCIÓN FEBRERO 2025

Objetivos específicos	Actividad MGA	Entregables	Evidencias o soportes de ejecución del periodo reportado No. Expediente virtual (Minciencias) del proyecto: 20200170691200224E		% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en Informe Técnico	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en POA
			Descripción de la evidencia Por parte de la EE	Fecha evidencia		
OE2. Integrar en un portal específico las herramientas relacionadas a infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	2.1.1 Estructurar Sitio - hijo con diseño de aplicación híbrida	2.1.1 Estructurar Sitio - hijo con diseño de aplicación híbrida	La entidad ejecutora adjunta enlace correspondiente al desarrollo de la actividad 2.1.1., en la cual se evidencian las funcionalidades implementadas en la página web institucional disponible en: https://www.javeriana.edu.co/enmental/ . En dicho sitio se verifican los avances asociados a la estructuración de la página de inicio y la sección de recursos, en coherencia con los productos definidos para esta actividad.	01 al 28 de febrero de 2025	0,04%	0,04%
OE3. Implementar las estrategias de comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	3.1.3 Realizar el seguimiento administrativo del proyecto	36 informes técnicos 36 informes financieros	Se adjunta informe técnico y financiero del mes de febrero de 2025	01 al 28 de febrero de 2025	0,02%	0,02%
Avance total en el periodo: La suma de los porcentajes reportados de las actividades para el periodo 40 (febrero de 2025) dan evidencia de un avance del					0,06%	0,06%

6.2. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RELACIONADA POR EL EJECUTOR FEBRERO 2025

ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución

CONCEPTO GENERAL

En el marco del Objetivo Específico 2 (OE2), orientado a integrar en un portal específico las herramientas relacionadas con infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas en salud mental en Bogotá D.C., la actividad 2.1.1 "Estructurar sitio – hijo con diseño de aplicación híbrida", desarrollada durante el periodo de febrero de 2025, evidencia avances significativos mediante la implementación de funcionalidades estratégicas en la página web institucional. En el enlace suministrado y conforme al anexo del periodo, se verifican componentes como la Sección de Comunidad y el Botón de Ayuda, los cuales fortalecen tanto la interacción social como el acceso oportuno a orientación y recursos especializados.

Estas funcionalidades aportan valor agregado al portal al promover espacios de participación, apoyo entre pares y construcción colectiva de conocimiento, así como mecanismos de atención inmediata y acompañamiento al usuario, especialmente en contextos de vulnerabilidad psicosocial. En este sentido, la actividad no solo contribuye a la estructuración técnica del sitio, sino que avanza en la integración efectiva de herramientas digitales con enfoque psicosocial, garantizando accesibilidad, usabilidad y pertinencia de los contenidos. De esta manera, se fortalece el cumplimiento del OE2 al consolidar una plataforma tecnológica integral que centraliza servicios, recursos y canales de interacción en salud mental, configurándose como un entregable clave en la

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

fase final del proyecto y aportando de manera directa al logro del objetivo general.

Análisis Gesproy

Producto MGA: Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación.

Actividad MGA: Desarrollar intervenciones basadas en materiales audiovisuales interactivos para mejorar la convivencia, la empatía y el cuidado personal, familiar y comunitario de la infancia y la niñez.

2	2.2.2 Realizar grupos focales, sesiones multidisciplinarias y generar contenidos para desarrollar intervenciones basadas en materiales audiovisuales interactivos para mejorar la convivencia, empatía, y el cuidado personal, familiar y comunitario de la infancia y la niñez (C)	%	1.16	100	Si		Inicial			
							Prog	9	1.946.235,11	17.516.116
							Eje	9	1.948.457,33	17.536.116

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 17-03-2026).

La entidad ejecutora reporta en GESPROY una **sobreejecución** en la actividad asociada al producto "Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación", específicamente en la actividad orientada al desarrollo de intervenciones basadas en materiales audiovisuales interactivos. Lo anterior se evidencia al comparar los valores programados frente a los ejecutados, donde el valor ejecutado (\$1.948.457,33) supera el valor programado (\$1.946.235,11), así como en la cantidad física, manteniéndose en 9 unidades pero con un mayor valor financiero ejecutado (\$17.536.116 frente a \$17.516.116). Esta situación refleja una desviación en la ejecución presupuestal que debe ser justificada por la entidad ejecutora, indicando las causas del incremento y verificando su coherencia con los productos entregados, con el fin de garantizar la adecuada trazabilidad financiera y evitar inconsistencias en el proceso de cierre del proyecto.

Actividad MGA: Reforzar en padres y cuidadores una habilidad general para el manejo de problemas del desarrollo y de la conducta en la infancia y la niñez.

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

2	2.1.2 Realizar grupos focales, sesiones multidisciplinarias y generar contenidos para reforzar en padres y cuidadores de una habilidad general en el manejo de problemas del desarrollo y de la conducta en la infancia y la niñez (C)	%	.63	100	Si		Inicial			
							Prog	8,5	1.120.464,47	9.523.948
							Eje	8,5	1.132.535,76	9.626.554

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 17-03-2026).

El análisis de la actividad 2.1.2 evidencia una **sobreejecución financiera** frente a lo programado, manteniendo coherencia en la meta física. En términos cuantitativos, la actividad presenta un cumplimiento del 8,5 sobre 9 unidades programadas (equivalente al 63%), lo que indica un avance parcial en la ejecución física. No obstante, al comparar los valores financieros, se observa que el valor ejecutado (\$1.132.535,76) supera el valor programado (\$1.120.464,47), así como el total ejecutado (\$9.626.554) frente al programado (\$9.523.948), configurando una desviación presupuestal.

Actividad MGA: Co diseñar prototipo

2	1.1.2 Codiseñar prototipo (C)	\$	.45	100.2	Si		Inicial			
							Prog	5	1.384.601,4	6.823.007
							Eje	5,01	1.960.638,52	9.822.799

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 17-03-2026).

El análisis de la actividad 1.1.2 "Codiseñar prototipo (C)" evidencia una **sobreejecución tanto física como financiera** frente a lo programado. En términos físicos, se supera ligeramente la meta establecida, pasando de 5 unidades programadas a 5,01 ejecutadas, lo que indica un cumplimiento superior al 100%. De igual forma, en el componente financiero se observa que el valor ejecutado (\$1.960.638,52) excede el valor programado (\$1.384.601,4), así como el total ejecutado (\$9.822.799) frente al programado (\$6.823.007), evidenciando una desviación significativa en el uso de los recursos.

Actividad MGA: Crear prototipado rápido (prototipo) y realizar pruebas de usuario.

2	1.2.2 Crear Prototipado rápido (prototipo) y pruebas de usuario (C)	%	.89	100	Si		Inicial			
							Prog	6,25	2.145.680,32	13.410.502
							Eje	6,25	2.965.741,12	18.535.882

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 17-03-2026).

El análisis de la actividad 1.2.2 "Crear prototipado rápido (prototipo) y pruebas de usuario" evidencia una **sobreejecución financiera con cumplimiento físico acorde a lo programado**. En términos físicos, la actividad presenta un avance del 89%, con una ejecución de 6,25 unidades sobre 7 aproximadamente, lo cual indica que aún no se ha alcanzado el 100% de la meta. No obstante, en el componente financiero se observa una desviación significativa, dado que el valor ejecutado (\$2.965.741,12) supera ampliamente el valor programado (\$2.145.680,32), así como el total ejecutado (\$18.535.882) frente al programado (\$13.410.502).

El proyecto evidencia **inconsistencias en la relación entre la ejecución física y financiera de varias actividades**, caracterizadas principalmente por sobreejecuciones presupuestales que no guardan proporcionalidad con el nivel de avance físico reportado. Si bien se observan avances significativos en el cumplimiento de metas, la reiterada presencia de desviaciones financieras sugiere debilidades en la planeación inicial, estimación de costos y control de la ejecución. En este sentido, se recomienda que la entidad ejecutora realice una revisión integral de la ejecución del proyecto, sustente técnicamente las variaciones presentadas y adopte medidas correctivas que garanticen la coherencia entre los avances físicos, financieros y los productos efectivamente entregados.

6.1.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCIÓN MARZO 2025

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Objetivos específicos	Actividad MGA	Entregables	Evidencias o soportes de ejecución del periodo reportado No. Expediente virtual (Minciencias) del proyecto: 20200170691200224E		% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en Informe Técnico	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en POA
			Descripción de la evidencia Por parte de la EE	Fecha evidencia		
OE2. Integrar en un portal específico las herramientas relacionadas a infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	2.1.1 Estructurar Sitio - hijo con diseño de aplicación híbrida	2.1.1 Estructurar Sitio - hijo con diseño de aplicación híbrida	La entidad ejecutora adjunta enlace correspondiente al desarrollo de la actividad 2.1.1., en la cual se evidencian las funcionalidades implementadas en la página web institucional disponible en: https://www.javeriana.edu.co/enmental/ En dicho sitio se verifican los avances asociados a la estructuración de la página de inicio y la sección de recursos, en coherencia con los productos definidos para esta actividad.	01 al 31 de enero de 2025	0,04%	0,04%
OE3. Implementar las estrategias de comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	3.1.3 Realizar el seguimiento administrativo del proyecto	36 informes técnicos 36 informes financieros	Se adjunta informe técnico y financiero del mes de marzo de 2025	01 al 31 de febrero de 2025	0,02%	0,02%
Avance total en el periodo: La suma de los porcentajes reportados de las actividades para el periodo 40 (marzo de 2025) dan evidencia de un avance del					0,06%	0,06%

6.2. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RELACIONADA POR EL EJECUTOR MARZO 2025

ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución

CONCEPTO GENERAL


En el periodo 41 (marzo de 2025), la entidad ejecutora adjunta el informe técnico y financiero junto con el enlace del portal web, en el cual se evidencian avances en la actividad 2.1.1. asociados a la implementación de funcionalidades clave como el Foro de Pares y el Buscador Inteligente, las cuales fortalecen tanto la interacción comunitaria como el acceso eficiente a los contenidos. Estas herramientas permiten no solo la disponibilidad de recursos, sino también la generación de espacios de apoyo, intercambio y navegación optimizada dentro de la plataforma. En este sentido, dichas funcionalidades contribuyen directamente al cumplimiento del objetivo general del proyecto, al ampliar la oferta de herramientas virtuales y multimediales en salud mental, facilitando el acceso, la apropiación y el uso de los contenidos por parte de la población objetivo. Asimismo, consolidan el portal como un entorno integral de consulta e interacción, evidenciando avances sustanciales en la fase final del proyecto y aportando de manera directa al logro de los resultados esperados.

Nota: Para el periodo correspondiente a marzo de 2025, se evidencia un avance físico del 0,06% durante el mes, de acuerdo con la información reportada. Con este resultado, el proyecto alcanza un avance acumulado del 93,89%, el cual ha sido avalado por la supervisión.

Curva S

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

① Curva S



Nota: Gesproy (Fecha de consulta 17-03-2026).

La Curva S a corte de marzo de 2026 evidencia que el proyecto presenta un rezago en la ejecución frente a lo programado, dado que el valor ganado se mantiene por debajo del valor planificado, confirmando un atraso en el cumplimiento de las metas. Aunque el comportamiento financiero es estable y acorde al gasto realizado, este no se traduce en un avance oportuno, lo cual es consistente con los indicadores de desempeño y las sobreejecuciones identificadas, reflejando desarticulación entre la planeación, la ejecución y el uso de los recursos.

Indicadores de desempeño del proyecto (corte 17 de marzo de 2026)

Indicador	Valor	Observación
Cumplimiento en la programación (SPI)	0,88	El proyecto presenta atraso en la ejecución, ya que el avance es inferior a lo programado ($SPI < 1$).
Cumplimiento del costo (CPI)	1,00	La ejecución financiera es acorde a lo presupuestado, sin evidenciar sobre costos.
Retraso SV(t) (meses)	5,80	Se evidencia un retraso significativo en el cronograma del proyecto.

De manera general, los indicadores de desempeño evidencian que el proyecto se encuentra atrasado en su programación ($SPI = 0,88$ y $SV(t) = 5,80$ meses), pese a mantener un comportamiento financiero controlado ($CPI = 1$). Esta situación, al contrastarse con las sobreejecuciones identificadas en varias actividades, refleja una desarticulación entre la planeación, el avance físico y el uso de los recursos, en donde se han ejecutado valores superiores a los programados sin lograr el cumplimiento oportuno de las metas. En consecuencia, se configura un escenario de riesgo en la eficiencia del proyecto, dado que el mayor gasto no se traduce proporcionalmente en avance, lo cual puede afectar negativamente el proceso de cierre y la evaluación final conforme a la metodología del DNP.

6.1.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCIÓN ABRIL 2025

Objetivos específicos	Actividad MGA	Entregables	Evidencias o soportes de ejecución del periodo reportado No. Expediente virtual (Minciencias) del proyecto: 20200170691200224E		% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en Informe Técnico	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en POA
			Descripción de la evidencia Por parte de la EE	Fecha evidencia		
OE2. Integrar en un portal específico las herramientas relacionadas a infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	2.1.1 Estructurar Sitio - hijo con diseño de aplicación híbrida	2.1.1 Estructurar Sitio - hijo con diseño de aplicación híbrida	La entidad ejecutora adjunta enlace correspondiente al desarrollo de la actividad 2.1.1., en la cual se evidencian las funcionalidades implementadas en la página web institucional disponible en: https://www.javeriana.edu.co/enmental/ . En dicho sitio se verifican los avances asociados a la estructuración de la página de inicio y la sección de recursos, en coherencia con los productos definidos para esta actividad.	01 al 31 de abril de 2025	0,03%	0,03%

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA


OE3. Implementar las estrategias de comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	3.1.3 Realizar el seguimiento administrativo del proyecto	36 informes técnicos 36 informes financieros	Se adjunta informe técnico y financiero del mes de abril de 2025	01 al 31 de abril de 2025	0,02%	0,02%
Avance total en el periodo: La suma de los porcentajes reportados de las actividades para el periodo 40 (marzo de 2025) dan evidencia de un avance del					0,05%	0,05%

6.2. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RELACIONADA POR EL EJECUTOR ABRIL 2025

ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución

CONCEPTO GENERAL

En el periodo correspondiente a abril de 2025, la entidad ejecutora adjunta el enlace del portal web y el informe técnico y financiero, en los cuales se evidencia el desarrollo de la actividad 2.1.1., particularmente con la implementación del Chatbot como funcionalidad adicional del sitio. Esta herramienta permite brindar orientación en tiempo real, facilitar la navegación y recomendar contenidos psicoeducativos de manera personalizada, mejorando significativamente la accesibilidad y usabilidad del portal. En este sentido, estas actividades contribuyen directamente al cumplimiento del objetivo general del proyecto, al fortalecer la oferta de herramientas virtuales y multimediales en salud mental mediante una plataforma completamente funcional, interactiva y accesible. La incorporación del Chatbot, junto con las funcionalidades previamente desarrolladas, consolida el portal como un entorno integral de atención y consulta, permitiendo no solo la disponibilidad de contenidos, sino también su uso efectivo por parte de la población objetivo, lo cual es clave en la fase final y de cierre del proyecto.

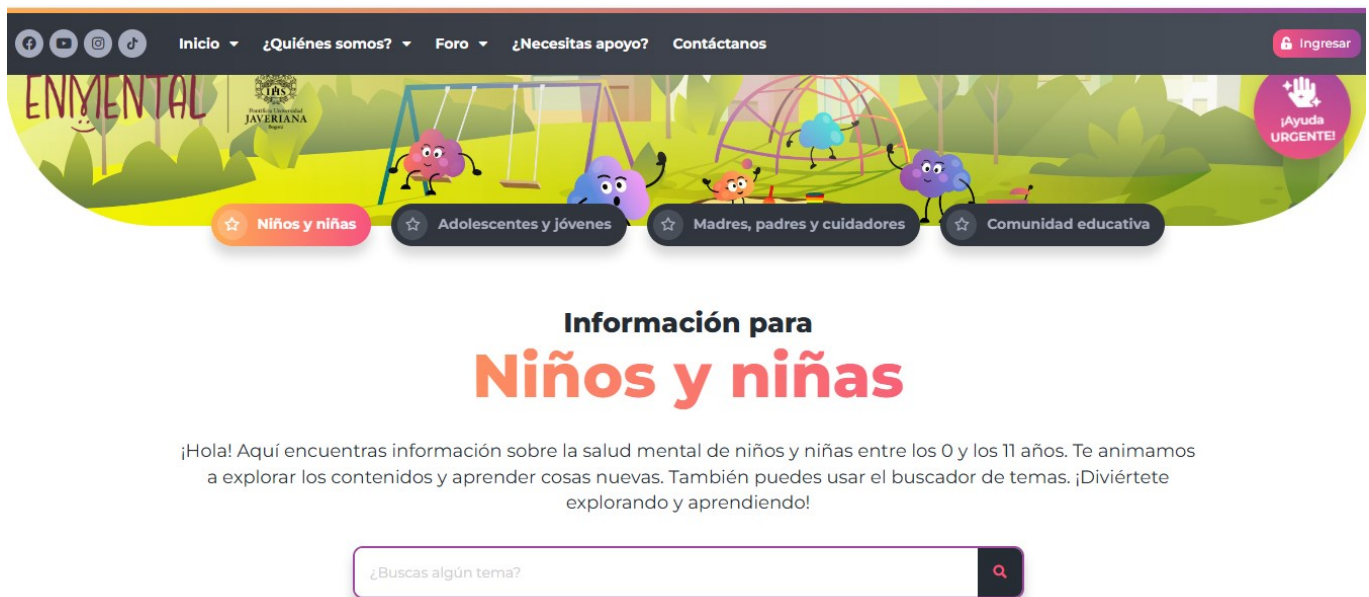

Nota: Tomado de <https://www.javeriana.edu.co/enmental/recursos/ninos-y-ninas/>

En el periodo de abril de 2025, el portal web evidencia un avance significativo, destacándose que la página se encuentra en pleno funcionamiento en todas sus pestañas y servicios ofrecidos, incluyendo herramientas como el chatbot, secciones de recursos y espacios de interacción. Esto mejora la navegación, la orientación y el acceso a los contenidos. Este desarrollo contribuye directamente al objetivo general del proyecto, ya que permite disponer de manera integral, organizada e interactiva las herramientas virtuales y multimediales en salud mental, facilitando su uso por parte de la población objetivo y consolidando el portal como el principal medio de entrega de los resultados del proyecto.

6.1.1. DETALLE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DE EJECUCIÓN MAYO 2025

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Objetivos específicos	Actividad MGA	Entregables	Evidencias o soportes de ejecución del periodo reportado No. Expediente virtual (Minciencias) del proyecto: 20200170691200224E		% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en Informe Técnico	% Avance del periodo de la Actividad reportado por el ejecutor en POA
			Descripción de la evidencia Por parte de la EE	Fecha evidencia		
OE3. Implementar las estrategias de comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.	3.1.3 Realizar el seguimiento administrativo del proyecto	36 informes técnicos 36 informes financieros	Se adjunta informe técnico y financiero del mes de mayo de 2025	01 al 31 de mayo de 2025	0,02%	0,02%
Avance total en el periodo: La suma de los porcentajes reportados de las actividades para el periodo 42 (mayo de 2025) dan evidencia de un avance del					0,02%	0,02%


6.2. OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD RELACIONADA POR EL EJECUTOR ABRIL 2025

ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE (ACTIVIDAD)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución	No aplica para este mes de ejecución

CONCEPTO GENERAL

Para el último periodo de ejecución (periodo 42, mayo de 2025), la entidad ejecutora adjunta el desarrollo de la actividad 3.1.3 "Realizar el seguimiento administrativo del proyecto", orientada a efectuar una revisión general del estado del proyecto y proyectar su cierre. Esta actividad permite consolidar la información técnica, administrativa y financiera, verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y asegurar las condiciones necesarias para el cierre adecuado del proyecto.

Análisis general Gesproy

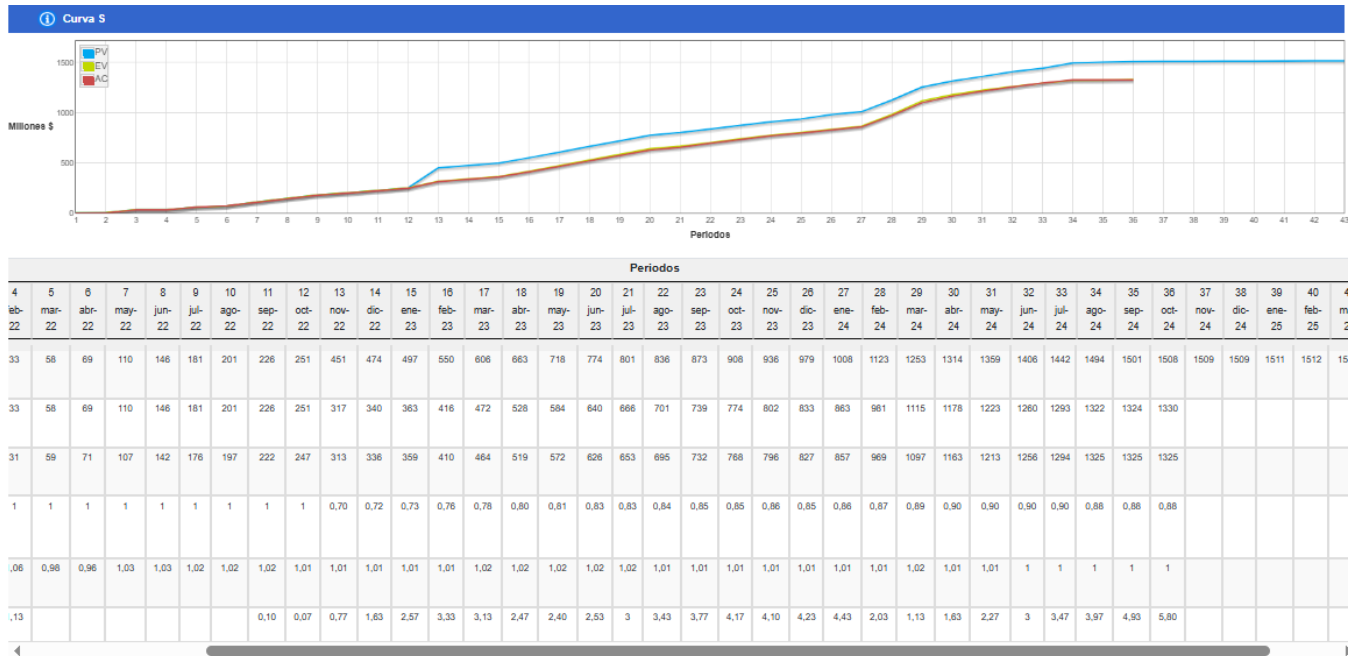

Nota: Gesproy (Fecha de consulta 17-03-2026).

En el último periodo de ejecución (periodo 42, mayo de 2025), la Curva S evidencia que el proyecto finaliza con un avance inferior al programado, dado que el valor ganado (EV) y el costo real (AC)

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

no alcanzan la curva del valor planificado (PV), lo que confirma un rezago en la ejecución. Aunque se observa coherencia entre el avance y el gasto, sin sobre costos significativos, el proyecto no logra cumplir completamente las metas en el tiempo previsto, cerrando en condición de atraso y requiriendo la respectiva justificación en el proceso de cierre.

6.3. DATOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE AVANCE EN GESPROY DICIEMBRE 2024

ACEPTA EL AVANCE REPORTADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA	SI	NO	N/A
Inconsistencia en el reporte	X		
Incumplimiento del contratista			X
Deficiencias en estudios y/o diseños			X
Deficiencias Técnicas			X
Trámite de licencias y/o permisos			X
Pruebas técnicas y ensayos no satisfactorios			X
Otros			

Concepto

Para el mes de diciembre de 2024 no se avala el porcentaje reportado por la entidad ejecutora, toda vez que en el informe general no se registró avance en el porcentaje de ejecución; no obstante, en el detalle por actividad se evidencia un avance del 0,19% correspondiente a la actividad 3.1.3 "Realizar el seguimiento administrativo del proyecto", en el marco del OE3.

6.3. DATOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE AVANCE EN GESPROY ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-2025

ACEPTA EL AVANCE REPORTADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA	SI	NO	N/A
Inconsistencia en el reporte		X	
Incumplimiento del contratista			X
Deficiencias en estudios y/o diseños			X
Deficiencias Técnicas			X
Trámite de licencias y/o permisos			X
Pruebas técnicas y ensayos no satisfactorios			X
Otros			

Concepto

Para los periodos correspondientes a enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2025 no aplica el presente concepto, toda vez que los avances reportados por la entidad ejecutora fueron debidamente avalados, evidenciándose coherencia entre la información registrada en GESPROY y los soportes técnicos y financieros presentados.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN PARA LOS PERIODOS REPORTADOS

Mesas Técnicas:	No. 2	Orientaciones en ajustes al proyecto	No. N/A	Orientaciones en cierre de proyectos	No. 1	Otros	No. 1	Visitas a Campo	No. N/A
-----------------	-------	--------------------------------------	---------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-----------------	---------

Durante el desarrollo de las mesas técnicas de seguimiento al proyecto BPIN 2020000100242, realizadas en los meses de noviembre y diciembre de 2025, se efectuó un análisis integral del estado de ejecución del proyecto, particularmente en lo relacionado con la actualización en GESPROY, la ampliación del horizonte y las condiciones para su cierre. En estos espacios se revisaron los avances físicos y financieros, se identificaron riesgos asociados al retraso en la programación y se brindaron orientaciones técnicas, administrativas y jurídicas a la entidad ejecutora. Asimismo, se enfatizó en la responsabilidad de la entidad frente a la gestión de la ampliación del proyecto y la coherencia de la información reportada. Como resultado, se establecieron compromisos con fechas definidas, entre los cuales se destacan: la actualización del proyecto en GESPROY, la revisión de la viabilidad de ampliación, la consolidación de soportes para el cierre y el seguimiento a los procesos administrativos y financieros pendientes, con el fin de garantizar un cierre adecuado, oportuno e integral del proyecto.

Entre las actividades de seguimiento técnico del proyecto se realizaron las siguientes actividades para este periodo:

1. Revisión del avance técnico del proyecto, con el fin de comprobar que se estén cumpliendo los objetivos y metas propuestas en el plan de trabajo.
2. Revisión del cumplimiento de los plazos de entrega de los productos establecidos en el POA.
3. Revisión de la información reportada en Gesproy, SECOP, SPGR.

Adicionalmente, en el marco del seguimiento al proyecto BPIN 2020000100242, resulta pertinente tener en cuenta las disposiciones establecidas en la Circular Conjunta No. 001 de 2026 emitida por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, la cual establece orientaciones para la protección de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), especialmente en las etapas de aprobación, designación de ejecutores, contratación y ejecución de proyectos de inversión. Esta circular enfatiza la necesidad de garantizar principios de planeación, transparencia, trazabilidad y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, así como el cumplimiento estricto de la normativa vigente durante el ciclo de inversión de los proyectos financiados con regalías. En este contexto, para el proyecto BPIN 2020000100621, que se encuentra en fase de cierre y consolidación de resultados, la revisión de esta circular resulta relevante para asegurar la adecuada gestión administrativa, contractual y documental del proyecto, así como para fortalecer los procesos de seguimiento, control y sostenibilidad de los productos generados. Lo anterior contribuye a garantizar que la ejecución y el cierre del proyecto se realicen conforme a los lineamientos del Sistema General de Regalías y bajo criterios de legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

8. AJUSTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APROBADOS POR OCAD

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Numero de ajuste	Tipo de ajuste	Breve descripción del ajuste	Fecha de presentación de la solicitud	Fecha y documento de aval del supervisor	Fecha de acuerdo de aprobación del OCAD de CTel
01	Incremento de recursos	Ajuste al proyecto BPIN 2020000100242, incrementando los recursos asignados al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia encargada de adelantar la supervisión a un valor de \$270.000.000,00.	19 de abril de 2021, mediante radicado 20212430182002.	31 de mayo de 2021, mediante radicado 20210170307841.	Acuerdo aprobación de ajustes por parte del OCAD: Acuerdo No. 04 del 14 de mayo de 2021 - Artículo 15.

8.1. Presupuesto Inicial y ajustes aprobados					
Código de la Actividad	Actividades del proyecto	Valor Inicial	Ajuste 1	Ajuste 2	Ajuste 3
2.1.3	Realizar la supervisión al proyecto.	\$ 1.516.026.958,00	\$ 1.702.180.213,00	-	-

9. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DICIEMBRE 2024							
Número de contratos suscritos	Valor total comprometido	Registro presupuestal SPGR	Publicación en SECOP	Cargados en GESPROY SGR			
6	\$ 28.275.609	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒	NO ☐	SI ☒	NO ☐

Observaciones:

Durante el mes de **noviembre de 2024**, se suscribieron **seis (6) contratos**, que representan un **valor total comprometido de \$28.275.609**. Estos compromisos financieros corresponden a la ejecución de actividades planificadas dentro del marco del proyecto, orientadas al cumplimiento de las metas técnicas y administrativas establecidas en el periodo. La formalización de estos contratos evidencia el avance en la gestión presupuestal y la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados, garantizando la continuidad operativa y el soporte técnico requerido para el desarrollo de las acciones proyectadas.

CONTRATO NO.	TIPO DE CONTRATO	TÉRMINO	VALOR	PÓLIZA	RIESGO / OBSERVACIONES
Otrosi No. 03 PUJ-00114-22	Prestación de servicios	3 meses	\$14.014.341	No requiere	Se amplía vigencia más allá del 10 de noviembre de 2024; riesgo de contratación sin utilidad operativa para el proyecto.
Otrosi No. 05 PUJ-08790-21	Prestación de servicios	3 meses	\$6.511.268	No requiere	Periodo contratado excede la fecha de cierre del proyecto; riesgo de pagos sin soporte técnico posterior.
Otrosi No. 04 PUJ-02189-22	Prestación de servicios	45 días	\$4.050.000	No requiere	La duración abarca días posteriores al cierre; riesgo de actividades no ejecutables dentro del cronograma oficial.
Contrato PUJ-07258-24	Prestación de servicios	20 días	\$930.000	No requiere	Término posterior al 10 de noviembre; riesgo de obligaciones que no pueden evidenciarse como parte del proyecto.
Otrosi No. 05 PUJ-03000-23	Prestación de servicios	1 mes	\$1.200.000	No requiere	Se contrata por un mes pese al cierre del proyecto; riesgo de improcedencia o falta de impacto en el objetivo general.
Contrato PUJ-08221-24	Prestación de servicios	1 mes	\$1.570.000	No requiere	El periodo contratado no coincide con la vigencia del proyecto; riesgo de gastos no elegibles o no imputables.

Nota: Información tomada de informe 37 (Fecha de consulta 17/03/2026).

Durante el mes de diciembre de 2024, la entidad ejecutora reportó la celebración de 10 contratos y otrosíes, comprometiendo un valor total de \$28.275.609. Aunque las fechas de ejecución de estos instrumentos contractuales superaban el horizonte temporal inicialmente aprobado del proyecto, cuyo cierre estaba previsto para el 10 de noviembre de 2024, esta situación se enmarca en la necesidad previamente identificada por la supervisión de ampliar el plazo de ejecución, debido a la existencia de actividades críticas pendientes y un rezago técnico evidenciado en el cumplimiento del objetivo general. En este sentido, la posterior ampliación del horizonte del proyecto, formalizada mediante la reprogramación en GESPROY hasta el 30 de mayo de 2025, subsana la situación inicialmente observada, permitiendo la adecuada ejecución de los compromisos contractuales. De esta manera, la contratación reportada resulta coherente con la continuidad operativa requerida, contribuye al cierre de las brechas técnicas identificadas y garantiza la alineación entre la ejecución técnica, financiera y administrativa del proyecto para su culminación integral.

9. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN ENERO 2025					
Número de contratos suscritos	Valor total comprometido	Registro presupuestal SPGR	Publicación en SECOP	Cargados en GESPROY SGR	Número de contratos suscritos
0	\$0,00	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	NO ☒

Observaciones: Durante el presente periodo, la entidad **NO** reporto la suscripción de nuevos contratos.

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

SECOP: Durante el presente periodo, la entidad **NO** reporto la suscripción de nuevos contratos.

Gesproy-SGR: Durante el presente periodo, la entidad **NO** reporto la suscripción de nuevos contratos.

9.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN FEBRERO 2025

Número de contratos suscritos	Valor total comprometido	Registro presupuestal SPGR	Publicación en SECOP	Cargados en GESPROY SGR	Número de contratos suscritos
3	\$37.588.341	SI <u>X</u>	NO N/A	SI <u>X</u>	NO N/A

Observaciones:

Durante el mes de febrero de 2025, se suscribieron tres (3) contratos y otrosíes, que representan un valor total comprometido de \$37.588.341. Estos compromisos financieros se orientan a dar continuidad a la ejecución de actividades técnicas y administrativas del proyecto, en coherencia con la planificación establecida para el periodo.

Contrato / Otrosí No.	Tipo de contrato	Término	Valor	Póliza
PUJ-00149-25	Prestación de servicios	3 meses	\$14.574.000	No requiere
Otrosí No. 04 PUJ-00114-22	Prestación de servicios	3 meses	\$14.014.341	No requiere
Otrosí No. 06 PUJ-00790-21	Prestación de servicios	3 meses	\$9.000.000	No requiere
Total comprometido			\$37.588.341	

Para el mes de febrero de 2025, la entidad ejecutora suscribió tres (3) contratos/otrosíes bajo la modalidad de prestación de servicios, todos con una duración de tres meses, comprometiendo un valor total de \$37.588.341. Esta contratación evidencia continuidad en la ejecución operativa del proyecto, con recursos orientados al fortalecimiento de actividades técnicas y administrativas, manteniendo coherencia en los plazos y sin requerimientos de póliza.

9.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN MARZO 2025

Número de contratos suscritos	Valor total comprometido	Registro presupuestal SPGR	Publicación en SECOP	Cargados en GESPROY SGR
2	\$9.000.000	SI <u>X</u>	NO N/A	SI <u>X</u>

Observaciones:

Contrato / Otrosí No.	Tipo de contrato	Término	Valor	Póliza
PUJ-00826-25	Prestación de servicios	25 días	\$6.000.000	No requiere
PUJ-01155-25	Prestación de servicios	20 días	\$3.000.000	No requiere
Total, comprometido			\$9.000.000	

En el periodo 41 del mes de marzo se suscribieron dos (2) contratos bajo la modalidad de prestación de servicios, por un valor total de \$9.000.000. Los contratos presentan términos cortos (20 y 25 días), lo que indica que están orientados a actividades puntuales o de cierre. Esta contratación evidencia una ejecución focalizada y operativa, coherente con etapas finales del proyecto, sin requerimiento de pólizas, lo que refleja agilidad en la gestión contractual.

9.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN ABRIL 2025

Número de contratos suscritos	Valor total comprometido	Registro presupuestal SPGR	Publicación en SECOP	Cargados en GESPROY SGR
7	\$33.874.850	SI <u>X</u>	NO N/A	SI <u>X</u>

Observaciones:

Para el mes de abril de 2025, la entidad ejecutora comprometió un total de \$21.374.850 mediante registros presupuestales asociados a contratos y actividades operativas, destacándose la impresión de materiales como el mayor rubro. Adicionalmente, se suscribió un (1) contrato de prestación de servicios por \$12.500.000, con un término corto, lo que evidencia una ejecución enfocada en actividades específicas y de cierre. En conjunto, estos compromisos reflejan una fase intensiva en producción de entregables y soporte operativo del proyecto.

Tabla de compromisos (RP)

RP	Concepto	Valor
31625	Contrato PUJ-08790-21-05	\$3.000.000
31725	Contrato PUJ-01398-25	\$742.400
31825	Contrato PUJ-01397-25	\$1.589.200
31925	Impresión de libros	\$9.835.000
32125	Contrato PUJ-00826-25	\$6.000.000
32325	Impresión de póster	\$208.250
Total, comprometido		\$21.374.850

Tabla de contratos

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Contrato / Otrosí No.	Tipo de contrato	Término	Valor	Póliza
PUJ-01414-25	Prestación de servicios	25 días	\$12.500.000	No requiere

Durante el mes de abril de 2025, se suscribió un (1) contrato de prestación de servicios por un valor de \$12.500.000. Adicionalmente, se registraron compromisos presupuestales asociados a contratos y actividades operativas por un total de \$21.374.850. En conjunto, el valor total comprometido en el periodo asciende a \$33.874.850.

9. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO AL PROYECTO DE INVERSIÓN MAYO 2025

Número de contratos suscritos	Valor total comprometido	Registro presupuestal SPGR		Publicación en SECOP		Cargados en GESPROY SGR	
0	\$0,00	SI N/A	NO N/A	SI N/A	NO N/A	SI N/A	NO N/A

Observaciones: Durante el presente periodo, la entidad **NO** reportó la suscripción de nuevos contratos.

SECOP: Durante el presente periodo, la entidad **NO** reportó la suscripción de nuevos contratos.

Gesproy-SGR: Durante el presente periodo, la entidad **NO** reportó la suscripción de nuevos contratos.

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL PROYECTO DE INVERSIÓN (Consolidado - SPGR)

Ejecución general del proyecto con corte marzo de 2026

	PROYECTO	DIFERENCIA	DESEMBOLSOS	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
VALOR SGR SIN SUPERVISIÓN	\$ 1.432.180.213	\$ 102.537.059	\$ 1.329.643.154	92,84%	7,16%
VALOR CONTRAPARTIDA	\$ 83.016.516	\$ -	\$ 83.016.516	100,00%	0,00%
	\$ 1.515.196.729	93,23%	\$ 1.412.659.670		

A corte del mes de mayo de 2025, la ejecución financiera del proyecto evidencia que los recursos del SGR sin supervisión alcanzan un nivel de ejecución del 92,84%, con desembolsos por \$1.329.643.154 frente a un total de \$1.432.180.213, quedando un saldo por ejecutar de \$102.537.059 (7,16%). Por su parte, los recursos de contrapartida presentan una ejecución del 100%, con desembolsos totales por \$83.016.516, sin valores pendientes. En términos agregados, el proyecto alcanza una ejecución del **93,23%**, con un total desembolsado de \$1.412.659.670 sobre un valor total de \$1.515.196.729, porcentaje calculado sin tener en cuenta los recursos asociados a la supervisión.

Valor Financiado por SGR – Ctel – Corte marzo 2026

Año	Valor Desembolsado SGR	Deducciones	Valor Neto
2021	\$ 4.347.609	\$ 129.778	\$ 4.217.831
2022	\$ 301.380.288	\$ 16.143.130	\$ 285.237.158
2023	\$ 348.768.118	\$ 15.178.337	\$ 333.589.781
2024	\$ 610.696.107	\$ 36.409.647	\$ 574.286.460
2025	\$ 64.451.032	\$ 2.665.234	\$ 61.785.798
Total, general	\$ 1.329.643.154	\$ 70.526.126	\$ 1.259.117.028

A corte del periodo analizado, el proyecto registra un desembolso total de recursos SGR por \$1.329.643.154, con deducciones acumuladas de \$70.526.126, para un valor neto de \$1.259.117.028. La mayor concentración de desembolsos se presenta en el año 2024 con \$610.696.107, seguido de 2023 con \$348.768.118 y 2022 con \$301.380.288, mientras que en 2025 se reportan \$64.451.032 y en 2021 \$4.347.609.

Ejecución financiera del mes de diciembre de 2024

EJECUCIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2024			
Fecha de desembolso	Valor Desembolsado SGR	Deducciones	Valor Neto
27/12/2024 6:20	\$ 4.000.000	\$ 268.328	\$ 3.731.672
27/12/2024 6:20	\$ 3.060.800	\$ -	\$ 3.060.800
27/12/2024 6:20	\$ 32.957.824	\$ 4.103.388	\$ 28.854.436
27/12/2024 6:20	\$ 7.464.159	\$ 509.230	\$ 6.954.929
27/12/2024 6:20	\$ 1.200.000	\$ 11.592	\$ 1.188.408
27/12/2024 6:21	\$ 1.570.000	\$ 17.333	\$ 1.552.667
27/12/2024 6:21	\$ 3.630.000	\$ -	\$ 3.630.000
27/12/2024 6:23	\$ 60.852	\$ -	\$ 60.852
Total, diciembre 2024	\$ 53.943.634	\$ 4.909.871	\$ 49.033.763

En diciembre de 2024, el proyecto registra desembolsos SGR por \$53.943.634, con deducciones por \$4.909.871, para un valor neto de \$49.033.763. Los movimientos se concentran en una única fecha (27/12/2024).

Ejecución financiera del mes de enero de 2025

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

EJECUCIÓN FINANCIERA ENERO 2025			
Fecha de desembolso	Valor Desembolsado SGR	Deducciones	Valor Neto
30/01/2025 9:58	\$ 2.000.000	\$ 249.008	\$ 1.750.992
30/01/2025 9:58	\$ 8.664.159	\$ 331.628	\$ 8.332.531
30/01/2025 9:58	\$ 1.945.000	\$ 39.080	\$ 1.905.920
30/01/2025 9:58	\$ 3.500.000	\$ 33.810	\$ 3.466.190
Total, enero 2025	\$ 16.109.159	\$ 653.526	\$ 15.455.633

En enero de 2025, el proyecto registra desembolsos SGR por \$16.109.159, con deducciones por \$653.526, para un valor neto de \$15.455.633. Los desembolsos se concentran en una única fecha (30/01/2025).

Ejecución financiera del mes de febrero de 2025

EJECUCIÓN FINANCIERA FEBRERO 2025			
Fecha de desembolso	Valor Desembolsado SGR	Deducciones	Valor Neto
28/02/2025 6:52	\$ 4.671.447	\$ 250.670	\$ 4.420.777
28/02/2025 6:53	\$ 2.792.712	\$ 26.978	\$ 2.765.734
28/02/2025 6:53	\$ 10.000.000	\$ 1.085.600	\$ 8.914.400
Total, febrero 2025	\$ 17.464.159	\$ 1.363.248	\$ 16.100.911

En febrero de 2025, el proyecto registra desembolsos SGR por \$17.464.159, con deducciones por \$1.363.248, para un valor neto de \$16.100.911. Los movimientos se concentran el 28/02/2025, destacándose un desembolso de \$10.000.000 como el de mayor valor del periodo.

Ejecución financiera del mes de marzo de 2025

EJECUCIÓN FINANCIERA MARZO 2025			
Fecha de desembolso	Valor Desembolsado SGR	Deducciones	Valor Neto
28/03/2025 6:48	\$ 7.671.447	\$ 282.920	\$ 7.388.527
28/03/2025 6:50	\$ 4.858.000	\$ 46.928	\$ 4.811.072
Total, marzo 2025	\$ 12.529.447	\$ 329.848	\$ 12.199.599

En marzo de 2025, el proyecto registra desembolsos SGR por \$12.529.447, con deducciones por \$329.848, para un valor neto de \$12.199.599. Los desembolsos se concentran el 28/03/2025, destacándose el valor de \$7.671.447 como el de mayor cuantía del periodo.

Ejecución financiera del mes de abril de 2025

EJECUCIÓN FINANCIERA ABRIL 2025			
Fecha de desembolso	Valor Desembolsado SGR	Deducciones	Valor Neto
29/04/2025 6:20	\$ 7.671.447	\$ 184.819	\$ 7.486.628
29/04/2025 6:21	\$ 304.520	\$ 36.439	\$ 268.081
29/04/2025 6:22	\$ 5.220.000	\$ 50.426	\$ 5.169.574
29/04/2025 6:23	\$ 5.152.300	\$ 46.928	\$ 5.105.372
Total, abril 2025	\$ 18.348.267	\$ 318.612	\$ 18.029.655

En abril de 2025, el proyecto registra desembolsos SGR por \$18.348.267, con deducciones por \$318.612, para un valor neto de \$18.029.655. Los movimientos se concentran el 29/04/2025, destacándose el desembolso de \$7.671.447 como el de mayor valor, seguido de dos pagos superiores a los cinco millones.

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

No. Memorando o No. Radicado Anexo 4	Valor Total, Presentado	Fecha máxima de pago	Presupuestal	NO Presupuestal (Reintegros)	Valor total Desembolsado
20240008454M	\$53.943.634	27/diciembre/2024	\$53.943.634	-	\$53.943.634
20240008454M	\$ 6.432.240	27/diciembre/2024	-	\$ 6.432.240	\$ 6.432.240
Total	\$ 60.375.874		\$53.943.634	\$ 6.432.240	\$ 60.375.874
Observaciones: Para el mes de diciembre de 2024, se registran ODP pagadas por un valor total de \$ 60.375.874, distribuidas en dos radicados. De este total, \$53.943.634 corresponden a pagos presupuestales y \$ 6.432.240 a valores no presupuestales asociados a reintegros.					
10.1 ODP PAGADAS PARA EL PERIODO REPORTADO ENERO 2025					
No. Memorando o No. Radicado Anexo 4	Valor Total, Presentado	Fecha máxima de pago	Presupuestal	NO Presupuestal (Reintegros)	Valor total Desembolsado
20250000536M	\$ 4.909.871,00	30/01/2025	-	\$ 4.909.871,00	\$ 4.909.871,00
20250000538M	\$ 13.514.159,00	30/01/2025	\$ 13.514.159,00	-	\$ 13.514.159,00
20250000551M	\$ 2.594.999,68	30/01/2025	\$ 2.594.999,68	-	\$ 2.594.999,68
Total	\$ 21.019.029,68		\$ 16.109.158,68	\$ 4.909.871,00	\$ 21.019.029,68
Observaciones: Para el periodo de enero de 2025, se registran ODP pagadas por un valor total de \$21.019.029,68, distribuidas en tres radicados. De este total, \$16.109.158,68 corresponden a pagos presupuestales y \$4.909.871,00 a valores no presupuestales asociados a reintegros.					
10.1 ODP PAGADAS PARA EL PERIODO REPORTADO FEBRERO 2025					
No. Memorando o No. Radicado Anexo 4	Valor Total, Presentado	Fecha máxima de pago	Presupuestal	NO Presupuestal (Reintegros)	Valor total Desembolsado
20250001306M	\$ 1.186.833,00	28/02/2025	-	\$ 1.186.833,00	\$ 1.186.833,00
20250001312M	\$ 17.464.189,00	28/02/2025	\$ 17.464.189,00	-	\$ 17.464.189,00
	\$ 18.651.022,00		\$ 17.464.189,00	\$ 1.186.833,00	\$ 18.651.022,00
Observaciones: Para el periodo de febrero de 2025, se registran ODP pagadas por un valor total de \$18.651.022, distribuidas en dos radicados. De este total, \$17.464.189 corresponden a pagos presupuestales y \$1.186.833 a valores no presupuestales asociados a reintegros.					
10.1 ODP PAGADAS PARA EL PERIODO REPORTADO MARZO 2025					
No. Memorando o No. Radicado Anexo 4	Valor Total, Presentado	Fecha máxima de pago	Presupuestal	NO Presupuestal (Reintegros)	Valor total Desembolsado
20250002163M	\$ 1.363.248,00	28/03/2025	-	\$ 1.363.248,00	\$ 1.363.248,00
20250002164M	\$ 12.529.447,00	28/03/2025	\$ 12.529.447,00	-	\$ 12.529.447,00
Total	\$ 13.892.695,00		\$ 12.529.447,00	\$ 1.363.248,00	\$ 13.892.695,00
Observaciones:					
10.1 ODP PAGADAS PARA EL PERIODO REPORTADO ABRIL 2025					
No. Memorando o No. Radicado Anexo 4	Valor Total, Presentado	Fecha máxima de pago	Presupuestal	NO Presupuestal (Reintegros)	Valor total Desembolsado
N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Observaciones: No se autorizaron los giros de las ODPS presentadas					
10.1 ODP PAGADAS PARA EL PERIODO REPORTADO ABRIL 2025					
No. Memorando o No. Radicado Anexo 4	Valor Total, Presentado	Fecha máxima de pago	Presupuestal	NO Presupuestal (Reintegros)	Valor total Desembolsado
N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Observaciones: No se autorizaron los giros de las ODPS presentadas					
10.2 CONSOLIDADO DE ODP PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO MARZO 2026					
No de ODP presentadas	VALOR TOTAL	Fecha Máxima de pago	Presupuestal	No presupuestal	Valor Total
195313225	\$ 4.671.447,00	31/MARZO/2026	\$ 4.671.447,00	-	\$ 4.671.447,00
195313325	\$ 3.000.000,00	31/MARZO/2026	\$ 3.000.000,00	-	\$ 3.000.000,00
195313425	\$ 742.400,00	31/MARZO/2026	\$ 742.400,00	-	\$ 742.400,00
195313525	\$ 3.000.000,00	31/MARZO/2026	\$ 3.000.000,00	-	\$ 3.000.000,00
195313625	\$ 1.589.200,00	31/MARZO/2026	\$ 1.589.200,00	-	\$ 1.589.200,00
195313725	\$ 9.835.000,00	31/MARZO/2026	\$ 9.835.000,00	-	\$ 9.835.000,00
195313825	\$ 4.858.000,00	31/MARZO/2026	\$ 4.858.000,00	-	\$ 4.858.000,00
195313925	\$ 6.000.000,00	31/MARZO/2026	\$ 6.000.000,00	-	\$ 6.000.000,00
195394925	\$ 208.250,00	31/MARZO/2026	\$ 208.250,00	-	\$ 208.250,00
196974725	\$ 12.500.000,00	31/MARZO/2026	\$ 12.500.000,00	-	\$ 12.500.000,00
195299025	\$ 174.402,00	31/MARZO/2026	-	\$ 174.402,00	\$ 174.402,00
195311325	\$ 144.210,00	31/MARZO/2026	-	\$ 144.210,00	\$ 144.210,00
Total	\$ 46.722.909,00		\$ 46.404.297,00	\$ 318.612,00	\$ 46.722.909,00

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Observaciones: Para el periodo reportado de marzo de 2026, se presentaron un total de 12 ODP por un valor consolidado de \$46.722.909, de los cuales \$46.404.297 corresponden a recursos presupuestales y \$318.612 a valores no presupuestales asociados a reintegros.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN

CONCLUSIONES:

En concordancia con la Constitución Política de Colombia, el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 55 de la Ley 2056 del 2020, la guía de supervisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS), las normas del Sistema General de Regalías (SGR) y demás normas concordantes para el buen cumplimiento de la ejecución de los recursos del SGR de los proyectos de las entidades ejecutoras privadas.

Lo estipulado en la Ley 1474 en su artículo 84 "(...) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente".

• CONCLUSIONES TÉCNICAS

- El avance físico del proyecto durante el periodo analizado presenta incrementos marginales mensuales entre 0,02% y 0,19%, evidenciando una fase final de ejecución. La supervisión registra un avance acumulado superior (93,71% a 93,96%) frente al 87,82% en GESPROY.
- Durante el periodo 38 (diciembre de 2024), el avance físico mensual fue de 0,19%, alcanzando un acumulado de 93,71%.
- En el periodo 39 (enero de 2025), el avance fue de 0,06%, con acumulado de 93,77%.
- En el periodo 40 (febrero de 2025), el avance fue de 0,06%, con acumulado de 93,83%.
- En el periodo 41 (marzo de 2025), el avance fue de 0,06%, con acumulado de 93,89%.
- En abril de 2025, el avance fue de 0,05%, con acumulado de 93,94%.
- En mayo de 2025, el avance fue de 0,02%, asociado a actividades de cierre.
- Las metas e indicadores de producto se encuentran finalizados y registrados en GESPROY, incluyendo el portal web ENMENTAL y estrategias de comunicación.
- Las actividades ejecutadas (portal web, informes técnicos y financieros) contribuyen al cumplimiento de OE2 y OE3.
- Se consolidan funcionalidades del portal como chatbot, comunidad, buscador y foro, fortaleciendo el cumplimiento del objetivo general.

• CONCLUSIONES FINANCIERAS

- La ejecución financiera presenta crecimiento desde 88,98% (dic-2024) hasta 93,23% (abr-may 2025), evidenciando estabilización.
- La ejecución financiera consolidada alcanza 93,23% (\$1.412.659.670 de \$1.515.196.729), con 92,84% SGR y 100% contrapartida.
- Se identifican sobreejecuciones financieras sin correspondencia con el avance físico, evidenciando inconsistencias en la planeación.
- Los desembolsos SGR se concentran en 2024 (45,93%), seguido de 2023 (26,24%) y 2022 (22,67%).
- En diciembre de 2024, se ejecutaron \$53.943.634 de \$63.943.634 programados, por anulación de ODP de \$10.000.000.
- Para marzo de 2026, se registran 12 ODP por \$46.722.909 (99,32% presupuestales).

• CONCLUSIONES DE CONTRATACIÓN

- Se evidencia concentración de contratación en febrero (\$37.588.341) y abril (\$33.874.850) de 2025.
- La contratación de marzo y abril presenta términos cortos, orientados a actividades de cierre.
- La situación de contratos que superaban el horizonte fue subsanada con la ampliación hasta mayo de 2025.
- En enero y mayo de 2025 no se reporta contratación, evidenciando fase de cierre sin nuevas obligaciones.

• CONCLUSIONES RELACIONADAS CON GESPROY

- Se evidencian diferencias entre el avance registrado en GESPROY (87,82%) y el avalado por supervisión (hasta 93,96%).
- Los indicadores iniciales (SPI = 1, CPI = 1) reflejan cumplimiento; sin embargo, posteriormente se evidencia atraso (SPI = 0,88 y SV(t) = 5,80 meses).
- El proyecto se encuentra en estado de programación vencida en GESPROY sin registro de cierre.
- Se fortaleció el seguimiento mediante mesas técnicas orientadas a actualización en GESPROY.

• CONCLUSIONES SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL HORIZONTE

- La ampliación hasta mayo de 2025 permitió continuar la ejecución de actividades críticas.
- La ampliación subsanó inconsistencias contractuales y permitió la continuidad operativa del proyecto.

• CONCLUSIONES SOBRE EL CIERRE DEL PROYECTO

- La Curva S evidencia rezago frente a lo programado, con EV por debajo del PV.
- No se evidencian sobrecostos significativos, pero sí atraso en la ejecución.
- Las actividades de mayo se orientan a consolidación técnica, administrativa y financiera para el cierre.

RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO PERIODO DE EJECUCIÓN:

"...las responsabilidades de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control contempladas en el Art. 1.2.10.1.4 del Decreto 1821 de 2020, dentro de lo cual establece el

INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

registro de información de forma veraz, oportuna e idónea en los aplicativos dispuestos por el DNP.

En caso de contar con evidencia de que la información reportada por las entidades en el aplicativo GESPROY SGR, no corresponde a la realidad de los proyectos de inversión, se procederá en virtud del artículo 182 de la Ley 2056 de 2020, a realizar el respectivo reporte a la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público en el marco del artículo 286 del Código Penal (Ley 599 de 2000) o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, o los delitos a los que hubiere a lugar de acuerdo a las conductas irregulares encontradas..."

- Se sugiere a la entidad ejecutora consolidar y documentar el estado final de los productos, especialmente el portal web ENMENTAL, garantizando la trazabilidad entre funcionalidades desarrolladas, entregables y objetivos específicos (OE2 y OE3).
- Se sugiere a la entidad ejecutora explicar los incrementos del avance físico (0,02% a 0,19%), indicando a qué actividades corresponden y qué productos se generaron.
- Se sugiere a la entidad ejecutora asegurar la coherencia entre los avances reportados por actividad MGA y los productos finales, especialmente en la fase de cierre.
- Se sugiere a la entidad ejecutora justificar las sobreejecuciones financieras identificadas, demostrando su correspondencia con los avances físicos y los productos entregados.
- Se sugiere a la entidad ejecutora conciliar los valores de desembolsos, deducciones y valores netos entre SPGR, informes financieros y GESPROY.
- Se sugiere a la entidad ejecutora validar el impacto de las ODP anuladas o no ejecutadas en la ejecución financiera total del proyecto.
- Se sugiere a la entidad ejecutora documentar la relación entre los contratos de corta duración y las actividades específicas de cierre.
- Se sugiere a la entidad ejecutora conciliar los porcentajes de ejecución entre el informe final, los valores avalados por la supervisión y los registrados en GESPROY.
- Se sugiere a la entidad ejecutora actualizar de manera inmediata el estado del proyecto en GESPROY, evitando la condición de programación vencida.
- Se sugiere a la entidad ejecutora garantizar la consistencia de la información reportada en GESPROY, SPGR y SECOP.
- Se sugiere a la entidad ejecutora ajustar la programación en GESPROY conforme al periodo ampliado (noviembre de 2024 a mayo de 2025).
- Se sugiere a la entidad ejecutora realizar el registro oportuno del cierre del proyecto en GESPROY, conforme a los lineamientos del SGR.
- Se sugiere a la entidad ejecutora justificar técnicamente las desviaciones evidenciadas en la Curva S, especialmente el rezago frente al valor planificado.
- Se sugiere a la entidad ejecutora consolidar un informe final que integre de manera coherente la ejecución técnica, financiera y administrativa del proyecto.

COMO RECOMENDACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN A LA ENTIDAD EJECUTORA y ADICIONALES AL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ EN LOS PRÓXIMOS INFORMES DE EJECUCIÓN SOPORTAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

- Impacto a los beneficiarios del proyecto (cumplimiento de la población objetivo y caracterización demográfica de la población objetivo contenidas en la MGA).
 - Sostenibilidad del Proyecto (soporte de las estrategias de sostenibilidad).
 - Indicadores de productos – Medios de verificación.
 - Se solicita a la entidad ejecutora presentar los informes de ejecución suscrito por el representante legal o quien haga sus veces.
 - Se solicita a la entidad ejecutora reportar la realización de comités técnicos/ directivos/ de ejecución dando cumplimiento al modelo de gobernanza del proyecto.
 - Cumplimiento Control social (Qué ejercicios de control social realizaron y las evidencias).
 - Cumplimiento del modelo de gobernanza (Evidencias del seguimiento).
 - Cumplimiento de las demandas territoriales sobre las cuales se presentó el proyecto a la convocatoria.
 - Balance físico y financiero por actividades y de contratos suscritos en el marco del proyecto de inversión.
 - Gestión sobre cierre y liquidación de contratos.
 - Análisis de todas las entidades cooperantes (recursos al proyecto en contrapartida especie/ efectivo).
 - Gestión documental de todo el proyecto de inversión.
 - Relación de los bienes y servicios adquiridos derivados de la ejecución del proyecto. Equipos/insumos, etc. (Si aplica: Actas de entrega debidamente firmadas, Actas de recibo a satisfacción por parte de los receptores de los bienes/servicios, Facturas de las compras, y demás soportes de adquisiciones).
 - Análisis de licencias y permisos necesarios para el proyecto de inversión.
 - Bitácora de los ajustes o modificaciones decididas por el ejecutor en el marco del proyecto con sus debidas justificaciones técnicas, jurídicas y financieras.
 - Aporte de las actividades al componente de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la convocatoria de la cual se derivan los recursos del SGR para la financiación de este proyecto.
 - La tabla de recopilación de porcentajes tomados de los informes de ejecución mensuales y de los informes de supervisión firmados y notificados por la supervisión.
 - La entidad ejecutora deberá poner en conocimiento de la supervisión los requerimientos del DNP o entes de control en el marco de la ejecución del proyecto (y la respuesta de la entidad ejecutora en caso de requerimiento por estas entidades).
 - Análisis de los Derechos de Propiedad Intelectual derivados del proyecto de inversión.
- Con relación al desarrollo metodológico del proyecto de inversión se solicita a la entidad ejecutora soportar la ejecución del proyecto de manera organizada y consecuente con el documento técnico aprobado por OCAD-ACTeI-SGR.

Se solicita a la entidad ejecutora lo siguiente en el aplicativo GESPROY

- Completitud de la información de la pestaña de contratos.
- Ejecución física registrada hasta el último periodo.
- "Aprueba y Envía" hasta el último periodo
- Información de cada contrato registrado (acta de inicio, pólizas, actas de liquidación, etc.)
- Información de beneficiarios y sostenibilidad
- Programación de los ejercicios de control social. Pestaña programación/Hitos.

**INFORME INTEGRAL DE SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ASIGNACIÓN
PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTeI) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA**

12. ANEXOS SOPORTES DE LA SUPERVISIÓN

Evidencias del Acompañamiento de la supervisión: Como soporte se presenta el informe de supervisión de los meses de diciembre de 2025, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2025. Las evidencias del desarrollo de las actividades de SUPERVISIÓN reposan en el expediente virtual **20200170691200224E** del Sistema de Gestión Documental - ORFEO del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

13. FIRMAS



KAREN DAYAN JURADO FONSECA
Contratista Apoyo a la supervisión SGR
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO
Contratista Apoyo a la supervisión SGR Regional
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

YERLY PATRICIA CARDONA MONTOYA
Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Técnico
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

JOHN JAIRO JURADO CORONELL
Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Financiero
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

MADIVA MÍSULA PÉREZ DURÁN
Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Jurídico
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

CARLOS YAMEL ROJAS ORTIZ
Contratista Apoyo a la Supervisión SGR Nacional
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR AZSIGN

CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO

Directora de Gestión de Recursos con Delegación en la Supervisión de Programas y Proyectos Privados financiados SGR-Ejecutores Naturaleza Privada
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

El supervisor actual ejerce esta actividad desde el 15 de julio de 2025, conforme a lo establecido en la Resolución 0477 del 15 de julio de 2025
