SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

Información General

Contrato	2200955	Solicitud Nro.	410 - 03 JUN 2021
Convenio	212080		
Gestor Convenio	DORIS PATRICIA LEON GUEVARA		
Abogado Convenio			
Coordinador Grupo Ejecucion	JUAN CARLOS PINILLA SALGADO		

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	27-DEC-12	28-DEC-12	31-DEC-21

Información del Contrato

Contratista	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA		
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		
Fecha de Inicio	26 October 2020		
Fecha de Vencimiento	26 June 2021		
Valor Inicial/Adiciones/Total	$175,017,920	$0	$175,017,920
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	4 Meses	4 Meses	8 Meses
Supervisor	LUZ ANDREA MOLINA HURTADO		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

1	10-FEB-21	SUSPENSION	$0	1 Meses
2	10-MAR-21	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	2 Meses
3	10-MAY-21	PRORROGA DE LA SUSPENSION	$0	1 Meses

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	REINICIO
Detalle de la Novedad	
Antecedentes	FONADE (HOY ENTERRITORIO) SUSCRIBIÓ EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS NO. 212080 CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, CON EL SIGUIENTE OBJETO: «FONADE SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL A ADELANTAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS POR ESTE», QUE SEGÚN OTROSÍ NO. 13, EL CONVENIO FUE PRORROGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE. EN VIRTUD DEL CONVENIO 212080, FONADE Y EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SUSCRIBIERON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NO. 2133481 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2013, CUYO OBJETO CONSISTE EN ¿(...) EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, EL MUNICIPIO SE OBLIGA A EJECUTAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CÁRTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS MUNICIPIO DE FACATATIVÁ¿ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE SUMINISTRADOS FONADE, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. (...), POR UN VALOR DE $ 1.031.589.389,00 Y UN PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, HECHO QUE SE DIO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2013 CON LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA POR PARTE DE ENTERRITORIO. DE CONFORMIDAD CON LA PRÓRROGA NO. 11 EL CONTRATO TIENE COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

31 DE JUNIO DE 2021
EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE OBRA NO. 549 DE 2020 CON CALING LTDA REPRESENTADO POR EL SEÑOR HENRRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA, CUYO OBJETO ES ¿MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA¿ POR LA SUMA DE $900.744.482 Y UN PLAZO DE 4 MESES, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 3 DEL 10 DE MAYO DE 2021 EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2021, CON UN PORCENTAJE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL 73,40% DE CONFORMIDAD CON EL INFORME SEMANAL NO. 15 DEL 9 DE FEBRERO DE 2021.
EL 15 DE OCTUBRE DE 2020, ENTERRITORIO SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200955 CON LA FIRMA CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA CUYO OBJETO ES ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA¿, POR UN VALOR DE $ 175.017.920 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 4 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
EL 26 DE OCTUBRE DE 2020 SE FIRMÓ EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200955, EL CUAL DEBÍA CONCLUIR EL 26 DE FEBRERO DE 2021.
EL 10 DE FEBRERO DE 2021 LAS PARTES SUSCRIBIERON LA SUSPENSIÓN NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200955, A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DE 2021, POR EL TÉRMINO DE 1 MES, ES DECIR HASTA EL 10 DE MARZO DE 2021, JUSTIFICADO EN:
MEDIANTE COMUNICADO NO. CIC-S-016-2021 DEL 1 DE FEBRERO DE 2021, LA FIRMA CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA SOLICITA A ENTERRITORIO LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200954, TENIENDO EN CUENTA QUE SE ESTÁ TRAMITANDO LA APROBACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS NO PREVISTOS Y TAMBIÉN LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE RECURSOS PARA DAR FINALIDAD DEL CONTRATO
EL 10 DE MARZO DE 2021 LAS PARTES SUSCRIBIERON LA PRÓRROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200955, A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2021, POR EL TÉRMINO DE 2 MESES, ES DECIR HASTA EL 10 DE MAYO DE 2021. JUSTIFICADO EN:

Justificación CONTINUAN ANTECEDENTES

(¿) ¿TODAVÍA NO SE HAN SOLUCIONADO LOS MOTIVOS QUE GÉNERO LA PRIMERA SUSPENSIÓN, YA QUE SE ESTÁ TRAMITANDO LA APROBACIÓN DE ALGUNOS ÍTEMS NO PREVISTOS Y TAMBIÉN LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE RECURSOS PARA UNA MEJOR FINALIDAD DEL CONTRATO¿ (¿)
EL 10 DE MAYO DE 2021 LAS PARTES SUSCRIBIERON LA PRÓRROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200955, A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE 2021, POR EL TÉRMINO DE 1 MES, ES DECIR HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2021. JUSTIFICADO EN:
(¿) ¿A QUE NO SE HAN SUPERADO LOS MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN, YA QUE ACTUALMENTE SE ESTÁ TRAMITANDO LA APROBACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE PROSPERIDAD SOCIAL, UNA VEZ SE TENGA APROBACIÓN POR PARTE DE PROSPERIDAD SOCIAL SE DEBE TRAMITAR ADICIÓN AL CONVENIO 2133481 Y EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEBE A SU VEZ HACER ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA , COMO CONSECUENCIA DE ELLO SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 2200955.¿ (¿)

JUSTIFICACIÓN
MEDIANTE COMUNICADO DEL 1 DE JUNIO DE 2021, EL INGENIERO HENRRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA, REPRESENTANTE LEGAR DE LA FIRMA CALING LTDA, SOLICITA REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 549-2020 CUYO OBJETO ES ¿MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA¿ CON EL FIN DE REANUDAR ACTIVIDADES QUE FALTAN POR REALIZAR DEL CONTRATO Y DAR UNA PRONTA FINALIDAD EN SU TOTALIDAD.
MEDIANTE COMUNICADO NO. CIC-S-063-2021 DEL 3 DE JUNIO DE 2021, LA FIRMA CONSTRUCTODO

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

	INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA APRUEBA EL REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 549-2020, SEGÚN LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA CALING LTDA, A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2021 YA QUE SE HAN SUPERADO LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PRIMERA SUSPENSIÓN. MEDIANTE COMUNICADOS NO. CIC-S-196-2021 DEL 3 DE JUNIO DE 2021 Y COMUNICADO NO. CIC-S-162-2021 DEL 3 DE JUNIO DE 2021 RADICADO EN ENTERRITORIO BAJO NO. 20214300193652 DEL 03 DE JUNIO DE 2021, LA FIRMA CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA SOLICITA A ENTERRITORIO REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200954, A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2021, TENIENDO EN CUENTA QUE: (¿) ¿SUPERADOS LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE SUSPENDIÓ, DADO QUE ENTERRITORIO Y EL DPS, GESTIONARON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ, GESTIONO RECURSOS ADICIONALES, SOLICITA EL REINICIO DE LAS OBRAS Y ESTA INTERVENTORÍA DETERMINA QUE ES VIABLE A PESAR DEL PARO NACIONAL REGISTRADO HACE MÁS DE UN MES.¿ MEDIANTE OFICIO NO. 20212700112661 DEL 3 DE JUNIO DE 2021, LA SUPERVISIÓN TÉCNICA RECOMIENDA EL REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200955, A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2021, CON BASE EN: ¿LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA CONSTRUCTODO LTDA MEDIANTE EL OFICIO NO. 20214300193652 DEL 03 DE JUNIO DE 2021, DONDE LA INTERVENTORÍA SOLICITA A ENTERRITORIO EL REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2021 PUESTO QUE YA SE SOLUCIONARON LOS MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN. POR LO ANTERIOR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA RECOMIENDA LA REALIZACIÓN DEL REINICIO AL CONTRATO NO 2200955 A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2021, EL CUAL DEBE CONCLUIR EL 26 DE JUNIO DE 2021.¿
Solicitud	1. REINICIO NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200955, A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2021, EL CUAL DEBE CONCLUIR EL 26 DE JUNIO DE 2021 2. LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200955 DEBERÁN SER AJUSTADAS DE ACUERDO CON LA PRESENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones

LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Subgerente

JUAN CARLOS PINILLA SALGADO
Gerente De Unidad

DORIS PATRICIA LEON GUEVARA
Gerente De Convenio

enterritorio	**ACTA DE REINICIO**	CÓDIGO:	**F-GG-13**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-12-07**

ACTA No. _1___

CONVENIO ASOCIADO No.	212080
CONTRATO N°	2200955
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”.
CONTRATISTA	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
VALOR INICIAL	175.017.920
VALOR ACTUAL	175.017.920
PLAZO INICIAL	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021
PLAZO ACTUAL	4 meses
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	26/06/2021
FECHA DE TERMINACION CON EL PRESENTE REINICIO	26/06/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia del reinicio del Contrato anteriormente citado, a partir del día 11 del mes Junio del año 2021 teniendo en cuenta que:

Que la Interventoría del contrato Constructodo Ingenieros Contratistas, mediante No consecutivo CIC-S-162-2021 del 03 de JUNIO de 2021, avaló las razones expuestas por el contratista de obra CALING LTDA, mediante comunicación con radicado No 01 DE JUNIO DE 2021, en el cual solicitó el reinicio del CONTRATO DE OBRA No 549/2020 a partir del 11 de Junio 2021, dado que ya se superaron los motivos por los cuales se suspendió. Ya que se da aprobación a los recursos `por parte de Prosperidad Social, y se debe tramitar adición al convenio No 2133481, y el municipio Facatativá debe a su vez hacer adición al contrato de obra, como consecuencia de ello solicitó el reinicio del contrato de interventoría No 2200575.


En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, el cual debe concluir el día 26 del mes junio del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma 	Firma 
NOMBRE: HENRY ALBERTO CASTRO REINA **REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA** **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**	**NOMBRE: LUZ ANDREA MOLINA HURTADO** **SUPERVISOR ENTERRITORIO**

Firma 
NOMBRE: DORIS PATRICIA LEÓN GUEVARA **GERENTE DE CONVENIO**

Firma 	Vo. Bo. 
NOMBRE: JUAN CARLOS PINILLA **GERENTE DE UNIDAD**	**NOMBRE: BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZ** **ORDENADOR DEL GASTO**

Observación:

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente, las modificaciones del valor y plazo de los contratos que se encuentran en la plataforma **SECOP II**, deben ser registrados en el campo asignado para tal fin, lo que permite realizar la firma electrónica de las partes en la plataforma.

Para los contratos suscritos por medio de la plataforma **SECOPII** que requieran tramitar las novedades de suspensión y reinicio, se cargarán los soportes documentales que avalan el concepto técnico de la novedad dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría. La firma de la novedad se realizará de forma electrónica, razón por la cual no se requiere la firma de este formato, permitiendo mejorar los tiempos de los procesos.

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20212700112661

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 03-06-2021

Ingeniero
ARQ. JUAN CARLOS PINILLA
Gerente Grupo Desarrollo Proyectos 2
ENTERRRITORIO

Arquitecta.

DORIS PATRICIA LEÓN GUEVARA
Gerente de Convenio No. 212080
ENTERRRITORIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REFERENCIA: Convenio No. 069/2012 - 212080. "**FONADE** se compromete con el **DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ** a adelantar la gerencia integral de los proyectos entregados por el DPS".

ASUNTO: **RECOMENDACIÓN DE REINICIO AL CONTRATO INTERVENTORIA 2200955.**

Respetados Gerentes,

Según la Guía GMI005 del Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE de fecha 10 de agosto de 2018 en su Versión 02; de acuerdo con el capítulo 2**.5 NOVEDADES DEL CONTRATO Y TOMA DE DECISIONES** y la **Actividad No. 4 – Suscribir reinicio del Contrato**, haciendo referencia a la responsabilidad del supervisor cuando se indica:

Supervisor Fonade: verificar y avalar el acta de reinicio del contrato. Tramitarla ante la Gerencia y Ordenador del Gasto.

Con base a los soportes presentados por la interventoría CONSTRUCTODO LTDA mediante el oficio No. 20214300193652 del 03 de Junio de 2021, donde la interventoría solicita a ENTerritorio el reinicio del contrato de interventoria desde el 11 de junio de 2021 puesto que ya se solucionaron los motivos que dieron lugar a la suspensión.

Por lo anterior la supervisión técnica recomienda la realización del reinicio al contrato No **2200955** a partir del 11 de junio de 2021 el cual debe concluir el 26 de junio de 2021.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co

CQR COTECNA COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Así las cosas, adjunto una (1) carpeta virtual con los soportes requeridos para el trámite correspondiente de la novedad contractual: Reinicio del contrato No. **2200955**.

Atentamente,

LUZ ANDREA MOLINA HURTADO
Supervisor Técnico de los Contratos No. 2180749
ENTERRITORIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Bogotá D.C 03 de Junio de 2021

CIC-S-162-2021

Señores:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL. (ENTERRITORIO).
LUZ ANDREA MOLINA HURTADO.
ENTERRITORIO | Calle 26 No 13 -19 Bogotá D.C.,
Plataforma del PISO 20

REF: **CONTRATO 2200955 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

ASUNTO: **SOLICITUD DE REINICIO DE LA SUSPENSIÓN No 1 DEL CONTRATO INTERVENTORÍA No 2200955 Y DE OBRA No 549/2020.**

Por medio de la presente nos permitimos solicitar a **ENTERRITORIO** el reinicio de la suspensión No 1 de los contratos de interventoría No 2200955 y del contrato de obra No 549/2020, desde el **11 DE JUNIO DE 2021**. Ya que se han solucionado los motivos que género la primera suspensión, enviamos los siguientes documentos para el reinicio:

- Solicitud de reinicio. **(INTERVENTORÍA).**
- Aprobación al reinicio por parte de la interventoría.
- Acta de reinicio. **(INTERVENTORÍA).**
- Certificado de cámara de comercio. **(INTERVENTORÍA).**
- Cedula representante legal. **(INTERVENTORÍA).**
- Certificado de parafiscales. **(INTERVENTORÍA).**
- Rut de la empresa. **(INTERVENTORÍA).**
- Pantallazo del contrato. **(INTERVENTORÍA).**
- Certificación bancaria. **(INTERVENTORÍA).**
- Fap 801. **(INTERVENTORÍA).**
- Certificación de contadores.
- Antecedentes policía nacional, procuraduría y contraloría.
- Actas de inicio contrato interventoría.

ATT.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
REPRESENTANTE LEGAL.
Digito: Sebastian M.t.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 03/06/2021
HORA: 14:57:39
20214300193652

Bogotá D.C., 3 de junio de 2021.

CIC-196-2021

Señores:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL. (ENTERRITORIO).
LUZ ANDREA MOLINA HURTADO
SUPERVISOR DESIGNADO.
Calle 26 No 13 -19 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 57(1)5940407
Plataforma del
PISO 21
Ciudad.

Ref.1: CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Ref 2: CONTRATO 2200955 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Con la presente y dado que el contratista **CALING LTDA**, solicita el reinicio del contrato superados los motivos por los cuales se suspendió, dado que ENTERRITORIO y el DPS, gestionaron los recursos necesarios para la culminación de las obras, asi mismo la alcaldía de Facatativá, gestiono recursos adicionales, solicita el reinicio de las obras y esta interventoría determina que es viable a pesar del paro nacional registrado hace mas de un mes.

Solicitamos el REINICIO de los contratos de la referencia y anexamos oficio de solicitud del contratista.

Atentamente;

ATT.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
REPRESENTANTE LEGAL.
No de folios: 0 folios.
COPIA A : ENTERRITORIO.
Digito: Sebastián Martinez.

Bogotá D.C 03 de junio de 2021

CIC-S-163-2021

Señores:
CALING LTDA.
HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA
TUNJA- BOYACÁ | Carrera 9 A No 11 A-28
Teléfono: 7433512- 3107630820
Correo: calingltda@yahoo.es

REF: **CONTRATO No 549/2020 MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA.**

ASUNTO: **APROBACIÓN DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No 1 SOLICITADA POR EL CONTRATISTA CALING LTDA DEL CONTRATO DE OBRA No 549/2020.**

Por medio de la presente nos permitimos **APROBAR** el reinicio a la suspensión No 1 solicitada por el contratista CALING LTDA del contrato de obra No 549/2020, desde el **11 DE JUNIO DE 2021**. Ya que se han solucionado los motivos que género la primera suspensión.

ATT.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
REPRESENTANTE LEGAL.
Digito: Sebastian M.t.

Tunja, 01 de junio de 2021

Señores
MUNICIPIO DE FACATATIVA
Facatativá - Cundinamarca

REFERENCIA: CONTRATO 549/2020 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y AJUSTES A DISEÑOS POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDIN, LA PAZ Y LOS MONARKAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA – CUNDINAMARCA.

ASUNTO: SOLICITACIÓN DE REINCIO DE OBRA

Respetados Señores:

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar el reinicio de obra del contrato objeto de la referencia, a partir del día **once (11) de junio del 2021**, con el fin de reanudar con las actividades que faltan por realizar del contrato y darle una pronta finalidad en su totalidad.

Cordialmente,

ING. HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA
REP. LEGAL CALING LTDA
NIT. 900.173.496-6

C.C. Interventoría - Ing. Henry Alberto Castro Reina - Constructodo Ingenieros Contratista s

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. XXX

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **1/02/2021** al **8/02/2021** Fecha **9/02/2021**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO PROYECTO	CO1.SLCNTR.5756414			
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	CUNDINAMARCA	**MUNICIPIO**	FACATATIVA
GERENCIA A CARGO				
SUPERVISOR	LUZ ANDREA MOLINA			
ESTADO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		549del 2020
Contratista		CALING LTDA
Valor inicial	$	900.744.482,00
Valor actual	$	900.744.482,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/10/2020
Plazo inicial (Días)		123 Días
Plazo actual (Días)	123 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/02/2021
Tiempo Transcurrido (días)	106	86,18%
Días remanentes del Contrato	17	13,82%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	163.315.235,60

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2200955
Interventor		CONSTRUCTODOLTDA
Valor inicial	$	175.017.920,00
Valor actual	$	175.017.920,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/10/2020
Plazo inicial		123 Días
Plazo actual	123 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/02/2021
Ejecución del Contrato		
Días remanentes del Contrato	17	13,82%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	31.695.745,32

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 900.744.482,00

Semaforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 633.929.592,61	70,38%	$ 633.979.207,14	70,38%	$ 49.614,53	0,01%
Durante el Periodo	$ 42.207.065,89	4,69%	$ 27.123.400,09	3,01%	-$ 15.083.665,80	-1,67%
Acumulado a la Fecha	**$ 676.136.658,50**	**75,06%**	**$ 661.102.607,24**	**73,40%**	**-$ 15.034.051,27**	**-1,67%**


Desviación en días




Observaciones al desempeño del proyecto

<Si el semaforo no es verde, indique las acciones en proceso relacionadas en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido subsanadas>

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

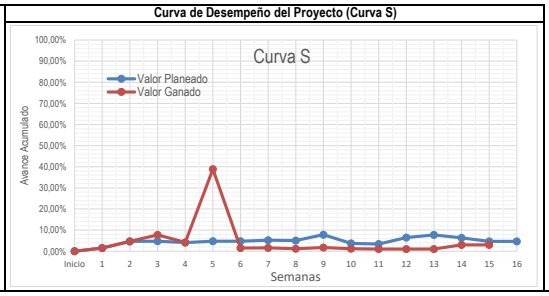




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

SE COMIENZAN ACTIVIDADES EN LOS POLIDEPORTIVO DE LA PAZ., LAS ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO DE MONARKAS COMENZARÁN LA PRÓXIMA SEMANA.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	70,38%	70,38%	0,01%	
Durante el Periodo	4,69%	3,01%	-1,67%	
Acumulado a la Fecha	**75,06%**	**73,40%**	**-1,67%**	

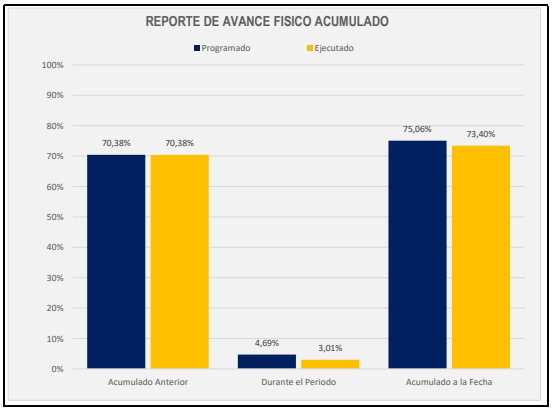


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 900.744.482,00	$ 900.744.482,00	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 513.424.354,74	57,00%	1	$ 513.424.354,74	57,00%	15/12/2020	$ 513.424.354,74







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 175.017.920,00	$ 175.017.920,00	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 99.760.214,40	57,00%	1	$ 99.760.214,40	57,00%	15/12/2020	$ 99.760.214,40







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

Se esta incumpliendo con actividades del Cronograma propuesto por el contratista. Se estan realizando las actividades de Cubierta

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. XXX

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **1/02/2021** al **8/02/2021** Fecha **9/02/2021**

se está incumpliendo con actividades del cronograma propuesto por el contratista se están realizando las actividades de cubierta

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En la semana se trabajo en el polideportivo La paz, en esta semana se instalo la cubierta del polideportivo**. Se trabaja en el polideportivo Monarkas, se pintan canales y se instalan.**

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


Se tiene programado: INSTALACION HIDROSANITARIA: Para el polideportivo Monarkas y La Paz
INSTALACION ELECTRICA: Para los polideportivos La paz y monarkas
Para los polideportivos Cartagenita y Monarkas

DOTACION:


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0	0	0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES

A pesar de que se han presentado lluvias el contratista continua trabajando en la estructura metálica o adelanta trabajos en los otros frentes.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. XXX

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **1/02/2021** al **8/02/2021** Fecha **9/02/2021**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre HENRY ALBERTO CASTRO REINA	Nombre LUZ ANDREA MOLINA
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

ACTA No:	10
FECHA:	28/1/2021
CONTRATO No:	2200955
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. _____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>

Responsable por Contratista			
Responsable por Interventoría			
Fecha programada cumplimiento		% de avance	

La interventoría realiza una reunión donde se cita al contratista y secretaria de obras públicas para tratar los no previstos

Donde se entrega el presupuesto de obra civil ajustado a un aproximado de 50 millones para dar aprobación pero el secretario de obras públicas se retiró a mitad de reunión

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1) **Avance de obra.**
2) **Problemáticas.**

Aspectos Técnicos

Se realiza reunión de reunión de audtoría visible para poder revisar los componentes técnicos, administrativos y sociales de los cada uno de los polideportivos, se realiza en cada punto una reunión comenzando a las 9 am por el polideportivo de La Paz , 10 am en Monarkas y 11 am en Cartagenita. En cada uno de estos se le enseño el avance y se aclararon dudas acerca del proyecto a enterritorio, alcaldía, personería, comunidad.

En el proyecto se encuentran laborando 0 profesionales, 0 personas de oficina y 4 trabajadores, operarios u obreros para un total de 4 personas.

Programa de Proyecto

Se le solicita una reprogramación al contratista debido a que se viene presentando un atraso con la programación enviada y esta debe ser ajustada.

Aspectos Administrativos

Se realiza reunión con enterritorio y se realiza la entrega de los ítems no previstos a esta entidad para realizar revisión de estos.

Aspectos Presupuestales:

El pago al contratista esta pendiente, debido a que la alcaldía no ha realizado la gestión del pago.

Riesgos

En el polideportivo la Paz se están presentando problemas con los habitantes de calle que están juntándose a dormir en el lugar de la obra.

Aspectos sociales y/o ambientales

La población menciona que en las noches se están presentando problemas sociales en el lugar debido a que se están reuniendo mucho expendedor de drogas y se esta convirtiendo en foco de inseguridad.

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA


Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. 01** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	Diego Buitrago
Responsable por Interventoría	César Ramírez
Fecha programada cumplimiento	4/2/2021
Realizar reprogramación del proyecto	
El contratista debe realizar la reprogramación del proyecto para subsanar el atraso que se viene presentando en la obra con respecto al cronograma.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES

NOMBRE	César Ignacio Ramírez Castro	Firma César Ramírez
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	Constructodoltda2@gmail.com	
Teléfono	3152737872	
NOMBRE	Anny Sharite Preciado Rodriguez	Firma 
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	Constructodoltda2@gmail.com	
Teléfono	3223394797	
NOMBRE	Hugo Andrés Castro Castellanos	Firma Hugo Castro
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	Constructodoltda2@gmail.com	
Teléfono	3106884205	
NOMBRE	Diego Buitrago	Firma
En Representación de	Calling LTDA	
Correo electrónico	calingltda@yahoo.es	
Teléfono	3166000628	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.



Firma_____
Nombre:Henry Orlando Buitrago
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:Luz Andrea Molina
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

13

29 Ene 2021 Las Manuelas Auditoria Visible #2

Se realiza la segunda Auditoria Visible por parte de entorno Alcaldia, Personeria, Veeduria Interventoria, Contratista donde se explica el avance, estado y dudas acerca del proyecto en el Polideportivo.

15

16 E 29 Ene 2021 Cartagenita El Jardín.

Se realiza la Segunda Auditoria Visible por parte de entorno Alcaldia, Personeria, Veeduria, Interventoria Contratista donde se explica el avance, estado, y alcance del Proyecto del Polideportivo.

17 E

18 E

19 E

20 E 30 Ene 2021 La Paz Clima parcialmente soleado. Trabajan 5 personas
Actividad realizada repintado de estructura metalica.
Manuelas No hay actividad, no hay personas trabajando.

21 E 31 Ene 2021 Cartagenita No hay actividad, no hay personas trabajando.
Domingo. Festivo Clima parcialmente soleado En ninguno de los tres polideportivos se registra actividad, no hay trabajadores.

01 Feb 2021 La Paz Actividad realizada instalación de templetes y corte vertical en la estructura metalica se repinta estructura, trabajan 5 personas. Clima parcialmente soleado

22 E Manuelas No hay actividad, no hay personas trabajando.
Cartagenita No hay actividad, no hay personas trabajando.

Escaneado con CamScanner

Feb 2021 La Paz Llego tejo para cubierta, se reparte estructura metalica, se termina de instalar templetes. Equipo. Perforadora, alistando cubierta para instalación Clima soleado. Trabajan 5 personas del municipio y 3 de personal de Tunja. para un total de 6 personas.

Monarkas: No hay actividad, no hay personal.


Cartagenita. No hay actividad, no hay personal. Atfjf


8 Feb 2021 La Paz: Actividad realizada se empieza a instalar cubierta. Trabajan 5 personas en este polideportivo. Clima soleado.

Monarkas Se alistan canales para instalar, se pintan canales. Se les llama la atención al maestro para que hagan un area exclusiva para pintura, para evitar pintar zona verde y la placa del polideportivo. Trabajan 4 personas en este polideportivo.

Cartagenita: No hay actividad, no hubo personal trabajando Atfjf

Escaneado con CamScanner

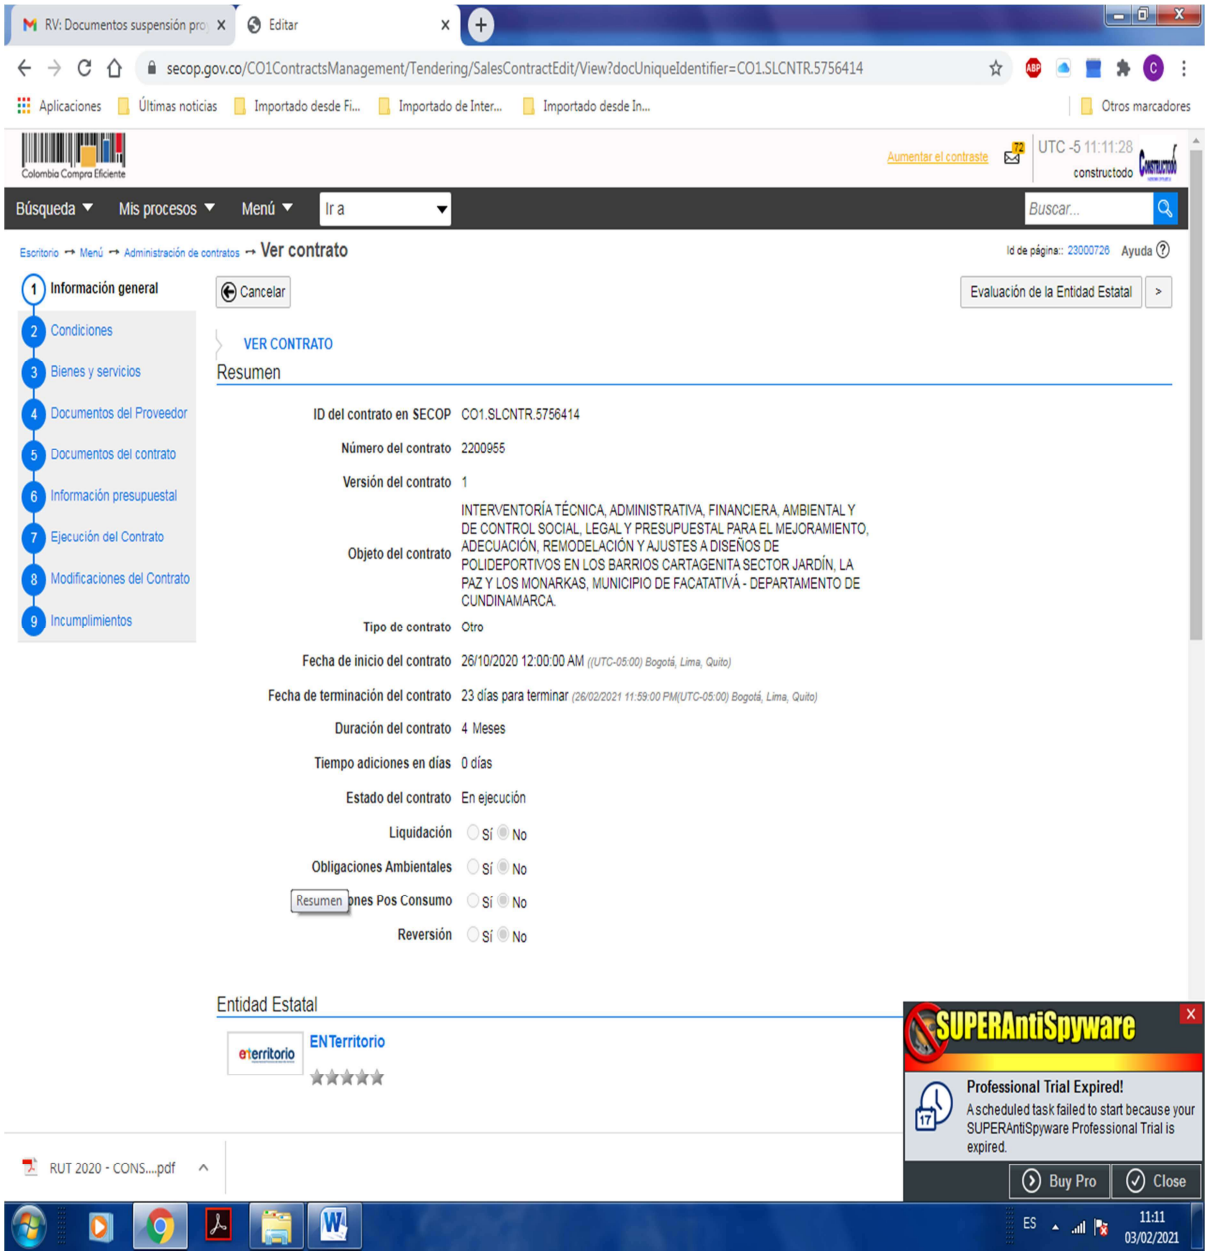
RV: Documentos suspensión pro
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.5756414
Aplicaciones
Últimas noticias
Importado desde Fi...
Importado de Inter...
Importado desde In...
Otros marcadores
Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 11:11:28
constructodo
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio ↦ Menú ↦ Administración de contratos ↦ Ver contrato
Id de página:: 23000726
Ayuda
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Resumen
ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.5756414
Número del contrato 2200955
Versión del contrato 1
Objeto del contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Tipo de contrato Otro
Fecha de inicio del contrato 26/10/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato 23 días para terminar (26/02/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Duración del contrato 4 Meses
Tiempo adiciones en días 0 días
Estado del contrato En ejecución
Liquidación Sí No
Obligaciones Ambientales Sí No
Resumen ones Pos Consumo Sí No
Reversión Sí No
Entidad Estatal
ENTerritorio
SUPERAntiSpyware
Professional Trial Expired!
A scheduled task failed to start because your SUPERAntiSpyware Professional Trial is expired.
Buy Pro
Close
RUT 2020 - CONS....pdf
ES
11:11
03/02/2021

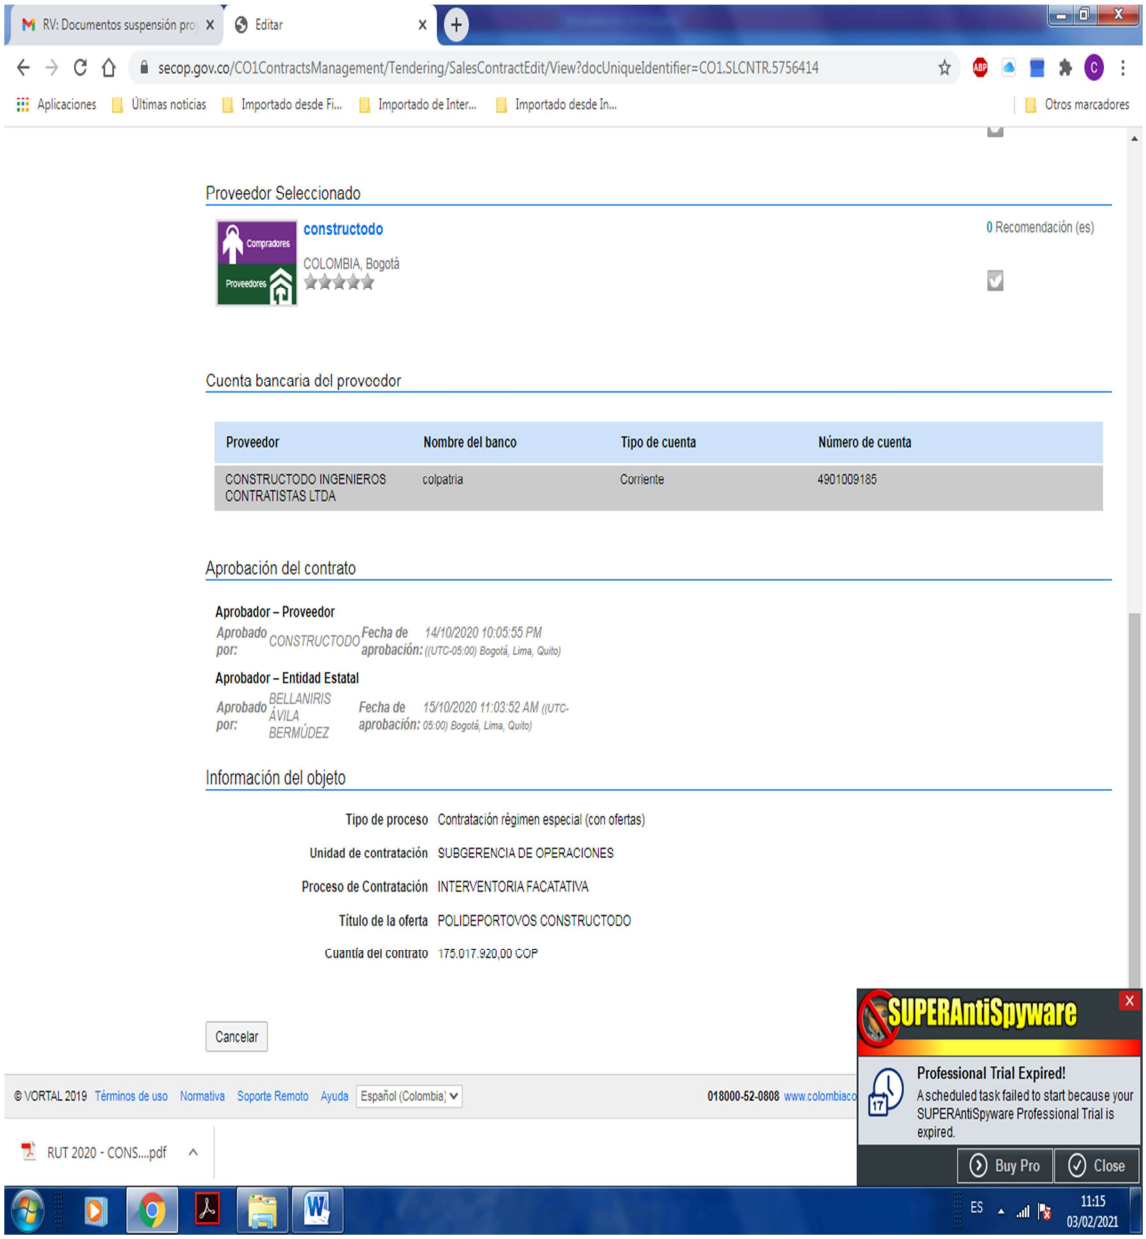
RV: Documentos suspensión pro
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.5756414
Aplicaciones
Últimas noticias
Importado desde Fi...
Importado de Inter...
Importado desde In...
Otros marcadores
Proveedor Seleccionado
Compradores
Proveedores
constructodo
COLOMBIA, Bogotá
0 Recomendación (es)
Cuenta bancaria del provoedor
Proveedor
Nombre del banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
colpatria
Corriente
4901009185
Aprobación del contrato
Aprobador – Proveedor
Aprobado por: CONSTRUCTODO
Fecha de aprobación: 14/10/2020 10:05:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZ
Fecha de aprobación: 15/10/2020 11:03:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Información del objeto
Tipo de proceso Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación SUBGERENCIA DE OPERACIONES
Proceso de Contratación INTERVENTORIA FACATATIVA
Título de la oferta POLIDEPORTOVOS CONSTRUCTODO
Cuantía del contrato 175.017.920,00 COP
Cancelar
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiaco
RUT 2020 - CONS....pdf
SUPERAntiSpyware
Professional Trial Expired!
A scheduled task failed to start because your SUPERAntiSpyware Professional Trial is expired.
Buy Pro
Close
ES
11:15
03/02/2021

PLATAFORMA SECOP	SECOP II		
NOMBRE PROFESIONAL JURÍDICO	AMANDA MENESES ORTEGA	FECHA DE RECIBIDO	04/06/2021
CONVENIO	212080	CLIENTE	PROSPERIDAD SOCIAL
GERENTE DE UNIDAD	ING. JESUS EDUARDO REYES	GERENTE DE CONVENIO	DORIS PATRICIA LEÓN GUEVARA
OBJETO	FONADE SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL A ADELANTAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS POR ESTE		
CONTRATO	2200955	CONTRATISTA	CONSTRUCTODO
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”.		
PLAZO	4 MESES	VALOR INICIAL	$ 175.017.920,00
SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO ETAPA 2	26/10/2020	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2	26/02/2021
SUSPENSIÓN No. 1	10/02/2021	FECHA DE TERMINACIÓN	10/03/2020
PRÒRROGA 1 A LA SUSPENSIÒN 1	10/03/2020	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2020
PRÒRROGA 2 A LA SUSPENSIÒN 1	10/05/2020	FECHA DE TERMINACIÓN	10/06/2020
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	90%		
MODIFICACIONES (Incluir el concepto de la novedad contractual)	MEDIANTE COMUNICADOS NO. CIC-S-196-2021 DEL 3 DE JUNIO DE 2021 Y COMUNICADO NO. CIC-S-162-2021 DEL 3 DE JUNIO DE 2021 RADICADO EN ENTERRITORIO BAJO NO. 20214300193652 DEL 03 DE JUNIO DE 2021, LA FIRMA CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA SOLICITA A ENTERRITORIO REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200954, A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2021, TENIENDO EN CUENTA QUE: (…) “SUPERADOS LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE SUSPENDIÓ, DADO QUE ENTERRITORIO Y EL DPS, GESTIONARON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ, GESTIONO RECURSOS ADICIONALES, SOLICITA EL REINICIO DE LAS OBRAS Y ESTA INTERVENTORÍA DETERMINA QUE ES VIABLE A PESAR DEL PARO NACIONAL REGISTRADO HACE MÁS DE UN MES.”		
BALANCE DEL CONTRATO			
Valor contrato inicial	$ 175.017.920,00		
Valor adición 1	$ -		
Valor adición 2*	$ -		
Valor Total	$ 175.017.920,00	$ -	$ -
PAGOS REALIZADOS			
Porcentaje ejecutado	90,0%	Valor	$ 157.516.128,00
Porcentaje pagado	57%	Valor	$ 99.760.214,40
Porcentaje por pagar	43%	Valor	$ 75.257.705,60

PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO CARTAGENITA SECTOR EL JARDIN		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				
ITEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	VLR. TOTAL
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS							11.088.079,00										11.088.079,00
2	REFUERZO								5.284.945,06	5.284.945,06	5.284.945,06							15.854.835,17
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO								17.890.461,87	17.890.461,87	17.890.461,87							53.671.385,60
4	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA										409.600,00							409.600,00
5	DOTACIÓN												22.132.719,23	22.132.719,23				44.265.438,46
6	PINTURA												724.006,40	724.006,40				1.448.012,80
7	ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA											2.169.081,69	2.169.081,69	2.169.081,69				6.507.245,06
8	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)							475.051,52	475.051,52	475.051,52	475.051,52	475.051,52	475.051,52	475.051,52				3.325.360,64
	TOTAL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)																	136.569.956,73
	AJUSTE AL PESO																	0,27
	VALOR TOTAL																	136.569.957,00

PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LA PAZ		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				
ITEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	VLR. TOTAL
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS	13.211.534,28																13.211.534,28
2	REFUERZO		10.013.593,58	10.013.593,58														20.027.187,15
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO		32.140.014,59	32.140.014,59														64.280.029,18
4	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA												4.819.720,96	4.819.720,96				9.639.441,92
5	BASES, PISOS Y AFINADOS				2.379.632,64													2.379.632,64
6	DOTACIÓN													10.509.624,58	10.509.624,58	10.509.624,58	10.509.624,58	42.038.498,30
7	INSTALACIÓN ELECTRICA													9.508.824,96	9.508.824,96	9.508.824,96	9.508.824,96	38.035.299,84
8	CUBIERTA E IMPERMEABLIZACIONES													27.216.448,67	27.216.448,67			54.432.897,34
9	PINTURA DE TRAFICO															724.006,40	724.006,40	1.448.012,80
10	ESTRUCTURA METÁLICA					18.000.652,80	18.000.652,80	18.000.652,80	18.000.652,80	18.000.652,80	18.000.652,80	18.000.652,80	18.000.652,80	18.000.652,80	18.000.652,80			180.006.528,00
11	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	207.835,04	3.325.360,64
	TOTAL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)																	428.824.422,09
	AJUSTE AL PESO																	-0,09
	VALOR TOTAL																	428.824.422,00

PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LOS MONARKAS		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				
ITEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	VLR. TOTAL
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS			13.010.038,53														13.010.038,53
2	REFUERZO				20.027.187,15													20.027.187,15
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO					32.140.014,59	32.140.014,59											64.280.029,18
4	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					4.819.720,96	4.819.720,96											9.639.441,92
5	BASES, PISOS Y AFINADOS							2.379.632,64										2.379.632,64
6	DOTACIÓN															21.019.249,15	21.019.249,15	42.038.498,30
7	INSTALACIÓN ELECTRICA											9.508.824,96	9.508.824,96	9.508.824,96	9.508.824,96			38.035.299,84
8	CUBIERTA E IMPERMEABLIZACIONES									27.216.448,67	27.216.448,67							54.432.897,34
9	PINTURA DE TRAFICO									1.448.012,80								1.448.012,80
10	REPARACIONES POR ABANDONO DE OBRA, ESTRUCTURA METÁLICA Y DE CONCRETO			14.455.617,49	14.455.617,49	14.455.617,49	14.455.617,49	14.455.617,49	14.455.617,49									86.733.704,96
13	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)			237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	237.525,76	3.325.360,64
	TOTAL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)																	335.350.103,30
	AJUSTE AL PESO																	-0,30
	VALOR TOTAL																	335.350.103,00

VALOR TOTAL CONTRATO POR SEMANA	13.419.369,32	42.361.443,21	70.064.624,99	37.307.798,08	69.861.366,64	69.861.366,64	46.844.394,25	56.552.089,54	70.760.933,51	69.722.520,71	30.598.971,77	58.275.418,36	105.510.316,56	75.189.736,77	42.207.065,89	42.207.065,89	900.744.482,00

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/02 HORA: 18:14:11

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: x4+cvr+gU3

OPERACION: AA21895019 PAGINA: 1

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

****

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

****

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

N.I.T. : 900.084.348-2 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01598094 DEL 15 DE MAYO DE 2006

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

*** CONTINUA ***

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/02 HORA: 18:14:11

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: x4+cvr+gU3

OPERACION: AA21895019 PAGINA: 2

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ACTIVO TOTAL : 694,284,222

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CARACAS NO. 34 86 OF 408
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : constructodoltda@gmail.com
DIRECCION COMERCIAL : AV CARACAS NO. 34 86 OF 408
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : constructodoltda@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000127 DE NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. DEL 25 DE MARZO DE 2006, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01055257 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA.

CERTIFICA:

REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
299 2016/03/11 NOTARIA 70 2016/03/28 02075274

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 25 DE MARZO DE 2031

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA COMPAÑIA TIENE POR OBJETOS SOCIALES: ACTIVIDAD: 1. CONSTRUCTOR. ESPECIALIDAD: 01 OBRAS CIVILES HIDRAULICAS: GRUPO 01 PRESAS, DIQUES Y MUELLES GRUPO 02 REGULACION Y CONTROL DE RIOS, GRUPO 03 SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE, GRUPO 04 DRAGADOS Y CANALES, GRUPO 05 AGUAS SUBTERRANEAS Y POZOS PROFUNDOS, GRUPO 06 GENERACION Y MODIFICACION DE PLAYAS, GRUPO 07 CONDUCCION DE AGUAS. ESPECIALIDAD: 02 OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES GRUPO 01 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, GRUPO 02 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS, GRUPO 03

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ESTACIONES DE BOMBEO, GRUPO 04 PLANTAS DE TRATAMIENTO, GRUPO 05 TANQUES DE ALMACENAMIENTO GRUPO 06 PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES, GRUPO 07 RECUPERACION ECOLOGICA Y MORFOLOGICA, GRUPO 08 EMPRADIZACION, GRUPO 09 REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL, GRUPO 10 RELLENOS SANITARIOS, GRUPO 11 POZOS SEPTICOS, GRUPO 12 MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL, GRUPO 13 EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES. ESPECIALIDAD: 03 SISTEMAS DE COMUNICACION Y OBRA COMPLEMENTARIAS: GRUPO 01 CENTRALES TELEFONICAS, GRUPO 02 REDES DE FIBRA OPTICA, GRUPO 03 REDES DE TRANSMISION DE DATOS, GRUPO 04 ANTENAS Y EQUIPOS DE REPETICION, GRUPO 05 REDES DE COMPUTACION CONMUTACION, GRUPO 06 CABLEADO ESTRUCTURADO. ESPECIALIDAD: 04 EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO: GRUPO 01 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS, GRUPO 02 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS, GRUPO 03 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, GRUPO 04 RESTAURACION DE EDIFICACIONES, GRUPO 05 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS, GRUPO 06 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES, GRUPO 07 ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO, GRUPO 08 ESTRUCTURAS METALICAS, GRUPO 09, ESTRUCTURAS DE MADERA, GRUPO 10 INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES. ESPECIALIDAD: 05 MONTAJES ELECTROMECANICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: GRUPO 01 MONTAJES PARA CENTRALES HIDRAULICAS, GRUPO 02 MONTAJES PARA CENTRALES TERMICAS, GRUPO 03 SUBESTACIONES DE ENERGIA, GRUPO 04 SISTEMAS DE CALEFACCION, REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO, GRUPO 05 MONTAJE DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y PUENTE GRUAS, GRUPO 06 LINEAS DE TRANSMISION Y SUBTRANSMISION DE ENERGIA, GRUPO 07 REDES DE DISTRIBUCION AEREAS Y SUBTERRANEAS, GRUPO 08 MONTAJES DE TUBERIAS DE PRESION. ESPECIALIDAD: 06 SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES GRUPO 01 UNIDADES DE PROCESO,

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

GRUPO 02 SERVICIOS INDUSTRIALES, GRUPO 03 ALIMENTICIOS, GRUPO 04 FARMACEUTICOS, GRUPO 05 QUIMICOS, GRUPO 06 VIDRIOS, ACRILICOS Y SIMILARES, GRUPO 07 FRIGORIFICOS, GRUPO 08 SIDERURGICOS, GRUPO 09 MADEREROS, GRUPO 10 PAPELEROS, GRUPO 11 ZONAS FRANCAS, GRUPO 12 ASTILLEROS, GRUPO 13 MATADEROS GRUPO 14 BODEGAS. ESPECIALIDAD: 07 OBRAS PARA MINERIA E HIDROCARBUROS : GRUPO 01 EXPLOTACION MINERA, GRUPO 02 DUCTOS PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, GRUPO 03 CRUCES SUBFLUVIALES DE LINEA, GRUPO 04 ESTRUCTURAS MARINAS, PLATAFORMAS Y MONOBOYAS GRUPO 05 REFINERIAS Y PLANTAS PETROQUIMICAS. GRUPO 06 TANQUES Y RECIPIENTES METALICOS PARA ALMACENAMIENTO, GRUPO 07 VASIJAS DE PROCESO, GRUPO 08 ESTACIONES DE RECOLECCION Y/ O DE BOMBEO, GRUPO 09 LINEAS REGULARES, GRUPO 10 SALVAMENTO Y SEGURIDAD MINERA. ESPECIALIDAD: 08 OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS : GRUPO 01 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE, GRUPO 02 PAVIMENTOS RIGIDOS, GRUPO 03 PAVIMENTOS FLEXIBLES, GRUPO 04 PUENTES ATIRANTADOS Y CABLES AEREOS, GRUPO 0 PERFORACIONES, TUNELES Y EXCAVACIONES SUBTERRANEAS, GRUPO 06 PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES, GRUPO 07 SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION, GRUPO 08 SEGURIDAD AEREA. ESPECIALIDAD: 09 SERVICIOS GENERALES: GRUPO 01 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, GRUPO 02 SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, GRUPO 03 SISTEMAS CONTRA INCENDIO, GRUPO 04 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, GRUPO 05 SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y/ O EVACUACION DE PRODUCTO INDUSTRIALES, GRUPO 06 CERCAS ELECTRICAS DE SEGURIDAD. ACTIVIDAD: 2 CONSULTOR. ESPECIALIDAD: 01 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: GRUPO 01 REGIONES CLIMATICAS, GRUPO 02 ESTUDIOS MACROECONOMICOS, GRUPO 03 APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA, GRUPO 04 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS GRUPO 05 INFRAESTRUCTURA FISICA, GRUPO 06 INFRAESTRUCTURA SOCIAL, GRUPO 07 CREDITO E INSTITUCIONES, GRUPO

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

08 PRODUCCION RURAL NO AGRICOLA, GRUPO 09 MECANIZACION AGRICOLA. ESPECIALIDAD: 02 INDUSTRIA: GRUPO 15 PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, GRUPO 16 MAQUINARIA Y EQUIPOS, EXCEPTO ELECTRICOS. 21 CONSTRUCCION. ESPECIALIDAD: 04 ENERGIA: GRUPO 01 GESTION ENERGETICA 04 GAS. ESPECIALIDAD: 05 AMBIENTAL: GRUPO 01 PLANEACION Y LEGISLACION, GRUPO 02 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL, GRUPO 03 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL. ESPECIALIDAD: 07 TRANSPORTE: GRUPO 01 ORGANIZACION DEL TRANSPORTE, GRUPO 02 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL, GRUPO 03 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA, GRUPO 04 TRANSPORTE FERROVIARIO, GRUPO 05 PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES, GRUPO 07 VIAS DE NAVEGACION INTERIOR GRUPO 08 AEROPUERTOS, GRUPO 10 OTROS TRANSPORTES. ESPECIALIDAD: 08 DESARROLLO URBANO: GRUPO 01 PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO, GRUPO 02 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDA, GRUPO 03 SERVICIOS URBANOS, GRUPO 04 EMPLEO URBANO, GRUPO 07 TRANSPORTE URBANO, GRUPO 08 DISEÑO ARQUITECTONICO. ESPECIALIDAD: 09 SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO: GRUPO 01 SUMINISTRO DE AGUA, GRUPO 02 SANEAMIENTO, GRUPO 03 DESECHOS DE SOLIDOS, GRUPO 04 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO. ESPECIALIDAD: 10 OTROS: GRUPO 05 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA. ACTIVIDAD : 3 PROVEEDOR. ESPECIALIDAD: 05 PRODUCTOS MINERALES: GRUPO 01 SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS; CALES Y CEMENTOS, GRUPO 02 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS, GRUPO 03 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES PRODUCTOS DE SUDESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS CERAS MINERALES. ESPECIALIDAD: 06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIA QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS: GRUPO 01 PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTO INORGANICOS U ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS, DE LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS O

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

DE ISOTOPOS. GRUPO 02 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS. ESPECIALIDAD: 11 MATERIAS TEXTILES Y SU MANUFACTURAS: GRUPO 08 ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIAS TEXTILES, GRUPO 09 TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO; ENCAJES; TAPICERIA; PASAMANERIA; BORDADOS. ESPECIALIDAD: 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO: GRUPO O1 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIAS ANALOGAS, GRUPO 02 PRODUCTOS CERAMICOS, GRUPO: 03 VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO. ESPECIALIDAD: 15 METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES: GRUPO 01 FUNDICION, HIERRO Y ACERO, GRUPO 02 MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, GRUPO 03 COBRE Y MANUFACTURAS DE COBRE, GRUPO 04 NIQUEL Y MANUFACTURAS DE NIQUEL, GRUPO 05 ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO, GRUPO 06 (RESERVADO PARA UNA FUTURA UTILIZACION EN EL SISTEMA ARMONIZADO), GRUPO 07 PLOMO Y MANUFACTURAS DE PLOMO, GRUPO 08 CINC Y MANUFACTURAS DE CINC, GRUPO 09 ESTAÑO Y MANUFACTURAS DE ESTAÑO, GRUPO 10 LOS DEMAS METALES COMUNES; CERMETS; MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS, GRUPO 11 HERRAMIENTAS Y UTILES, ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBIERTOS DE MESA, DE METALES COMUNES; PARTES DE ESTOS ARTICULOS, DE METALES COMUNES, GRUPO 12 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES. ESPECIALIDAD: 16 MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES, APARATOS PARA LA GRABACION O LA REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS PARA LA GRABACION O LA REPRODUCCION DE IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS: GRUPO 02 MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS PARA LA GRABACION O LA REPRODUCCION DE IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS. ESPECIALIDAD: 17 MATERIAL DE TRANSPORTE: GRUPO O1 VEHICULOS Y

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/02 HORA: 18:14:11

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: x4+cvr+gU3

OPERACION: AA21895019 PAGINA: 7

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

MATERIAL PARA VIAS FERREAS O SIMILARES Y SUS PARTES, APARATOS MECANICOS INCLUSO ELECTROMECANICOS DE SEÑALIZACION PARA VIAS DE COMUNICACION, GRUPO 02 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS. ESPECIALIDAD : 20 MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS : GRUPO 01 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO QUIRURGICO ; ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS. GRUPO 02 JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS, GRUPO 03 MANUFACTURAS DIVERSAS. ESPECIALIDAD: 22 OTROS: GRUPO 01 REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO IMPLIQUEN LA EXPEDICION DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION O SUS MODALIDADES, GRUPO 02 EQUIPOS DE COMPUTO Y SUS PARTES, GRUPO 03 SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)
OTRAS ACTIVIDADES:
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: $40,000,000.00 DIVIDIDO EN 4,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $10,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :
- SOCIO CAPITALISTA (S)
CASTRO REINA YECID HERNANDO C.C. 0000000079863803
NO. CUOTAS: 400.00 VALOR: $4,000,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/02 HORA: 18:14:11

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: x4+cvr+gU3

OPERACION: AA21895019 PAGINA: 8

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

CASTRO REINA HENRY ALBERTO C.C. 000000080019099

NO. CUOTAS: 3,600.00 VALOR: $36,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 4,000.00 VALOR: $40,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y UN SUBGERENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000127 DE NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. DEL 25 DE MARZO DE 2006, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01055257 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
CASTRO REINA HENRY ALBERTO	C.C. 000000080019099
SUBGERENTE	
CASTRO REINA YECID HERNANDO	C.C. 000000079863803

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : LE CORRESPONDE AL GERENTE EN FORMA ESPECIAL LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EL USO DE LA RAZON SOCIAL.

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

*** CONTINUA ***

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 15 DE ABRIL DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Microempresa

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $612,457,952

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/06/02 HORA: 18:14:11

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: x4+cvr+gU3

OPERACION: AA21895019 PAGINA: 10

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4112

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 0

****

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 168696814

WEB
18:44:55

Bogotá DC, 08 de junio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA identificado(a) con NIT número 9000843482:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 08 de junio de 2021, a las 18:47:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9000843482
Código de Verificación	9000843482210608184700

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/06/2021 06:50:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80019099** y Nombre: **HENRY ALBERTO CASTRO REINA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **23472780** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:03:09 PM horas del 09/06/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **80019099**
Apellidos y Nombres: **CASTRO REINA HENRY ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 168697056

WEB
18:48:47

Bogotá DC, 08 de junio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HENRY ALBERTO CASTRO REINA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80019099:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 08 de junio de 2021, a las 18:47:43, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	80019099
Código de Verificación	800190992106081847 43

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HENRY ALBERTO CASTRO REINA, identificado con cedula de ciudadanía No 80.019.099, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA identificada con Nit 900.084.348-2 , certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y CREE, *(Articulo 25 Ley 1607de 2012)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los CUATRO (4) días del mes de JUNIO de 2021.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA
C. C. NO 80.019.099
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTODO LTDA.

RV: Aprobación Pólizas Acta de Suspensión N° 3 Contrato N° 2200955 - CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

Luis Carlos Mejia Freyle <cmejia@enterritorio.gov.co>

Mié 9/06/2021 4:37 PM

Para: Amanda Liliana Meneses ortega <ameneses@enterritorio.gov.co>
CC: Luz Andrea Molina Hurtado <lmolina@enterritorio.gov.co>; Doris Patricia Leon Guevara <dleon@enterritorio.gov.co>

Buenas tardes Amanda

Remito correo de aprobación de pólizas.

Por favor radicar nuevamente la solicitud de reinicio de la interventoría.

Atentamente,

Luis Carlos Mejía Freyle
Grupo Desarrollo de Proyectos 2
cmejia@enterritorio.gov.co
(+57)(1) 5940407 Ext. 10200
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá D.C., Colombia

www.enterritorio.gov.co



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. Si usted no es a quien se dirige el presente correo, por favor contactar al remitente respondiéndolo y eliminar todas las copias del mensaje original, incluyendo sus archivos. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, ENTerritorio tendrá derecho a la reparación de los daños y perjuicios causados. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail message, including attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, sensible and /or privileged material. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message, including attachments. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle ENTerritorio to seek for damages. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of ENTerritorio is prohibited.

De: Harricson Smith Romero <hromero@enterritorio.gov.co>
Enviado: miércoles, 9 de junio de 2021 4:35 p. m.
Para: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS <constructodoltda@gmail.com>
Cc: Doris Patricia Leon Guevara <dleon@enterritorio.gov.co>; Luz Andrea Molina Hurtado <lmolina@enterritorio.gov.co>; Luis Carlos Mejia Freyle <cmejia@enterritorio.gov.co>; Amanda Liliana Meneses ortega <ameneses@enterritorio.gov.co>
Asunto: Aprobación Pólizas Acta de Suspensión N° 3 Contrato N° 2200955 - CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

Bogotá, D.C.
Señores
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

REF: Legalización Acta de Suspensión N° 3 Contrato N° 2200955

Respetado doctor:
Para los fines pertinentes les informamos que la(s) póliza(s) que ampara el contrato citado en referencia fue aprobada por la Subgerencia de Operaciones el **09 DE JUNIO DE 2021**.

Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
CALIDAD DE LOS SERVICIOS
RESPONSABILIDAD CIVIL

Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta dependencia.

Cordial Saludo,

Harricson Smith Romero
Procesos de Selección - Subgerencia de Operaciones
Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial - Enterritorio
