BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA**

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	258-2019
Periodo y/o No. de Pago	Obra Terminada
Nombre Del Contratista	CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS
Objeto Del Contrato	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIDADA DE MENOR CUANTÍA No. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS"
Fecha de Inicio	13-11-2019
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	21-11-2020
No. Póliza	14-44-101112887 Seguros del Estado S.A.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente** (describir si o no)
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA 1	13-02-2020	1 mes	Pendiente de aprobación
PRORROGA 2	13-03-2020	15 días	Pendiente de aprobación
PRORROGA 3	20-10-2020	1 mes	Pendiente de aprobación
SUSPENSIÓN	25-03-2020	19-10-2020	Pendiente de aprobación
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

En el transcurso de la obra se han revisado las actividades expresadas en el contrato, así mismo con el paso del tiempo y cumpliendo los tiempos de ejecución se ha mencionado al contratista sus obligaciones contractuales.

Durante el periodo marzo a octubre de 2020, por motivos de fuerza mayor los contratos de obra e interventoría quedaron suspendidos hasta nueva orden, debido a la calamidad que se presenta a nivel mundial con la propagación del virus COVID-19.

Durante este lapso, el contratista hace presentación de una nueva solicitud de prórroga, con el fin de acabar con la totalidad del objeto contractual, cabe mencionar que el tiempo necesario para culminar las actividades obedece a la espera del suministro de la empresa sautech, empresa encargada de instalar la red de detención de humo, ya que, por motivos de las afectaciones provocadas por la pandemia, se complica la importación de los elementos a instalar de la red ya que estos son de origen extranjero.

Se reiniciaron las actividades el día 19 de octubre del 2020, se superaron los motivos de la suspensión que tuvo una duración de 6 meses y 24 días, el motivo de suspensión entre varios aspectos fue por la emergencia sanitaría que estaría afrontando el país lo que generó una cuarentena estricta y la suspensión total de todas las actividades comerciales y operativas..


Durante este último periodo de ejecución correspondiente del 13 de marzo al 23 de marzo de 2020 y del 19 de octubre 2020 al 21 de noviembre de 2020, y de conformidad a las necesidades del proyecto, siguiendo las instrucciones de esta supervisión y de la Secretaria Distrital de Integración Social, el contratista de obra presento solicitud del otro sí modificatorio, se cumple con los días restantes para culminar la prórroga No. 2 y aplicando la nueva prórroga No. 3 con un plazo otorgado de un mes adicional, se modifica la fecha de terminación final para el día 21 de noviembre del presente año.

Las obras realizadas correspondieron a: Vinilo tipo 1 a tres manos, instalación de tomacorrientes en área de lavandería, instalación de paneles led de 60x60, instalación de luminarias de emergencia, instalación de cielo raso en pvc, instalación de sandblasting en ventanería perimetral, instalación de tubería EMT ¾ reflectores led exteriores, pintura en esmalte (dos manos), instalación completa de red detención de humo, limpieza de grafitis de fachadas, instalación de perfilería metálica como soporte de estructura de cubierta, limpieza general, retiro de escombros.


La obra se recibe el día 20 de noviembre del 2020, en compañía de la Secretaría de Integración Distrital, personal encargado del jardín objeto de intervención, el contratista de obra y la interventoría, se revisa la totalidad de actividades ejecutadas en el objeto del contrato y los acabados finales, se da visto bueno y se recibe la obra a satisfacción, el día 21 de noviembre se realiza retiro de escombros y entrega final.

Se realiza acta de entrega y recibo final de obra, firmada por la Secretaria Distrital de integración social, Contratista, Interventoría y Supervisión, la cual se entregó a la SDIS.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

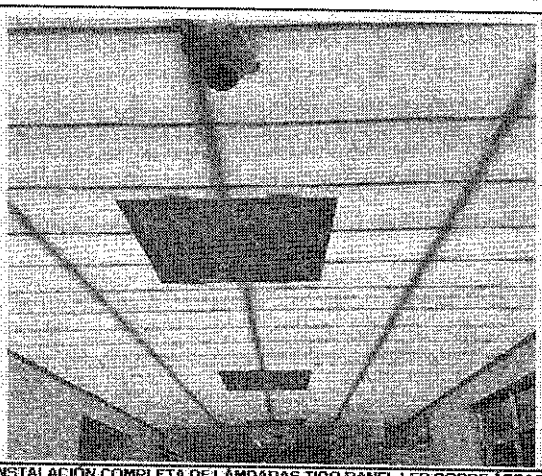


INSTALACIÓN COMPLETA DE LÁMPARAS TIPO PANEL LED SOBRE ÁREAS

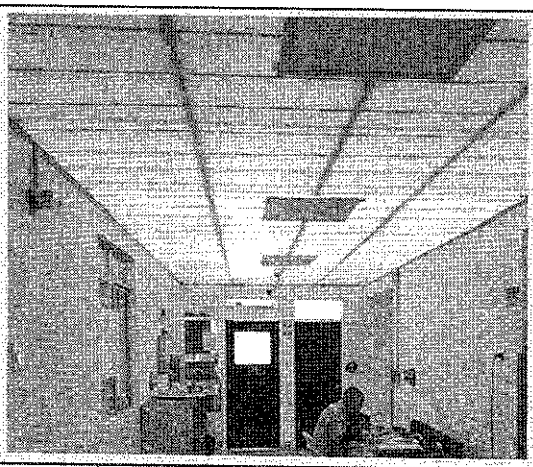


INSTALACIÓN COMPLETA DE CIELO RASO EN ÁREAS COMUNES DEL

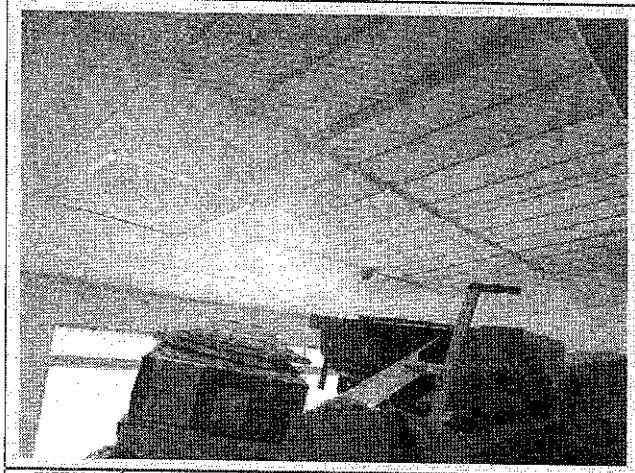

INSTALACIÓN COMPLETA DE CIELO RASO EN ÁREAS COMUNES DEL JARDÍN.

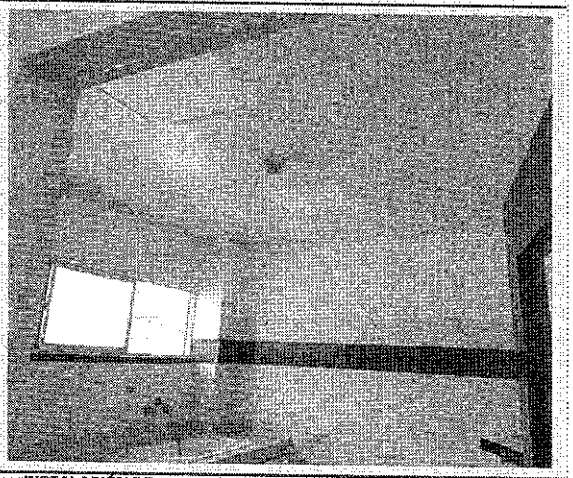







INSTALACIÓN COMPLETA DE CIELO RASO EN ÁREAS COMUNES DEL

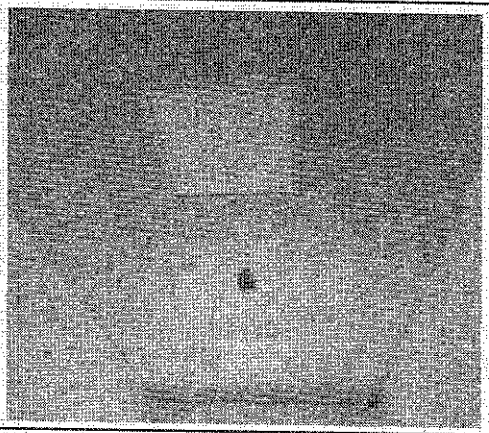


INSTALACIÓN COMPLETA DE CIELO RASO EN ÁREAS COMUNES DEL JARDÍN.




INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE RED DE DETENCIÓN DE HUMO.

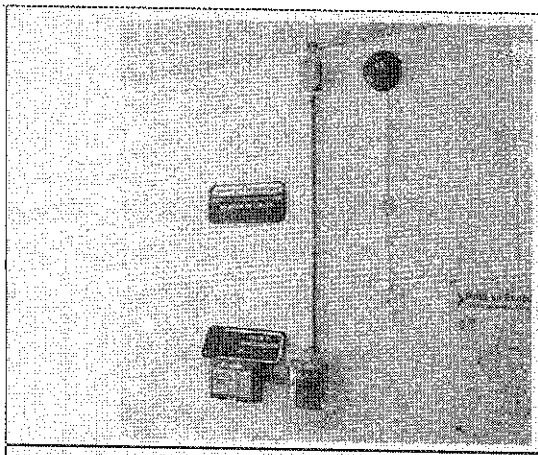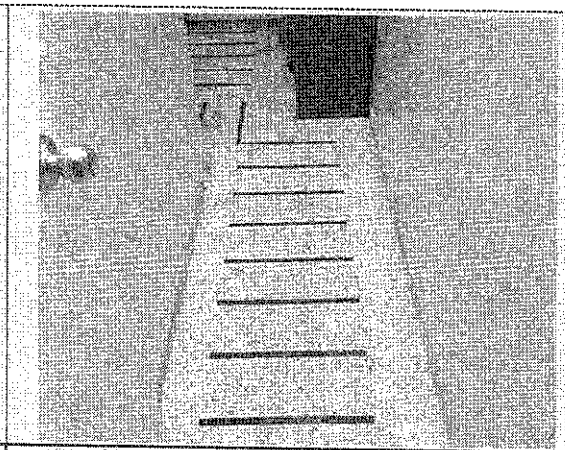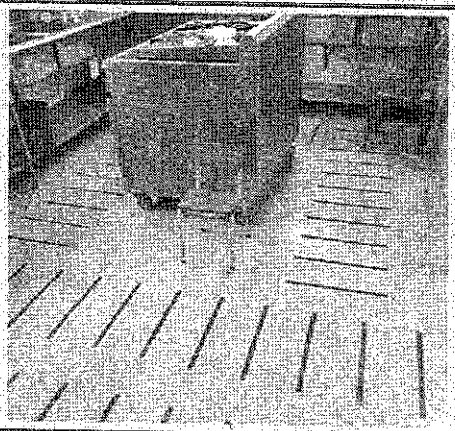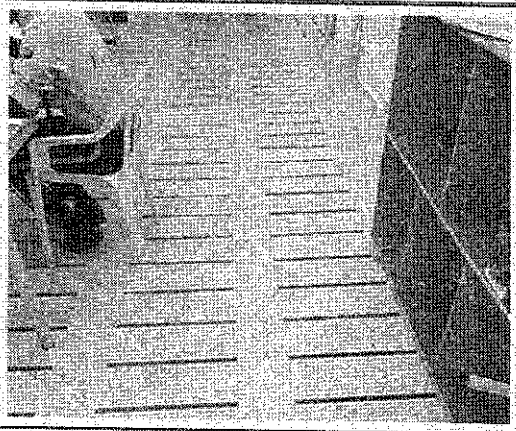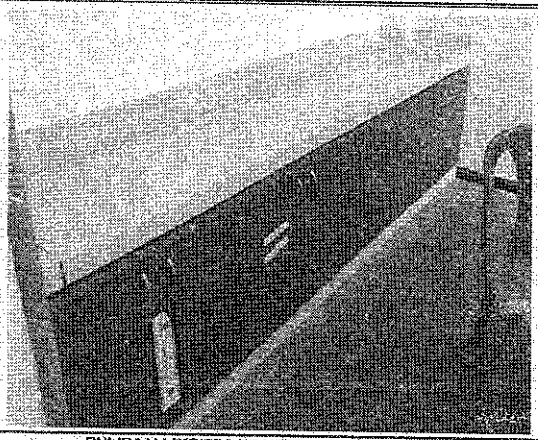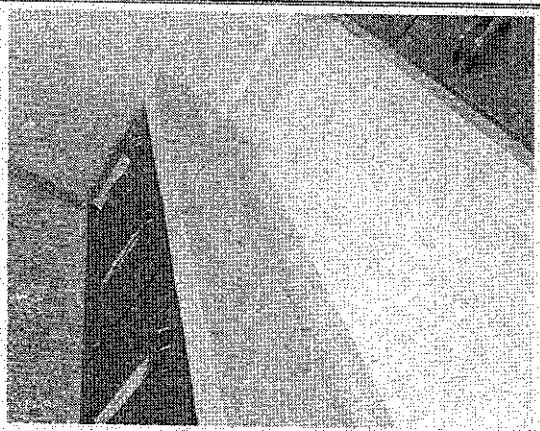
	
INSTALACIÓN COMPLETADE DE SISTEMA DE ALARMA DE RED DETENCIÓN DE HUMO	INSTALACIÓN COMPLETA DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN ZONAS HÚMEDAS DEL JARDÍN.
	
INSTALACIÓN COMPLETA DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN ZONAS HÚMEDAS DEL JARDÍN.	INSTALACIÓN COMPLETA DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN ZONAS HÚMEDAS DEL JARDÍN.
	
PULIDA Y LIMPIEZA DE MEZONES EN GRANITO.	PULIDA Y LIMPIEZA DE MEZONES EN GRANITO.

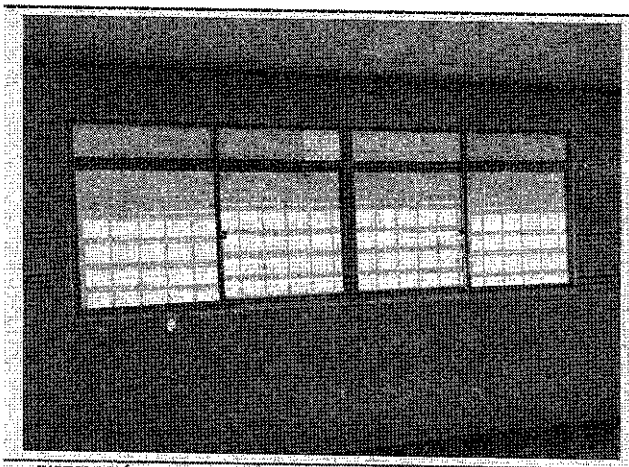


INSTALACIÓN COMPLETA DE PERSIANA SANDBLASSING EN VENTANAS DE EXTERIORES DEL JARDÍN.

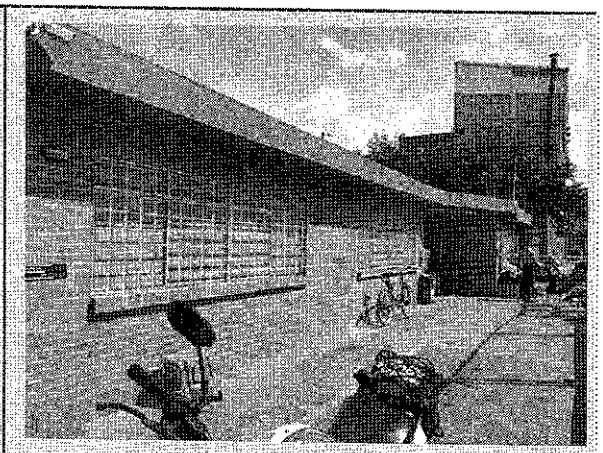

INSTALACIÓN COMPLETA DE PERSIANA SANDBLASSING EN VENTANAS DE EXTERIORES DEL JARDÍN.

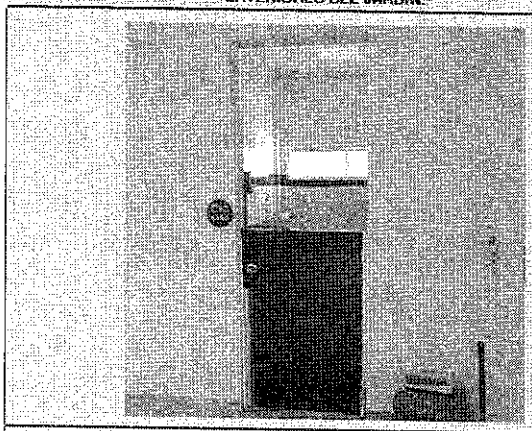

PINTURA EN ESMALTE SOBRE PUERTAS.

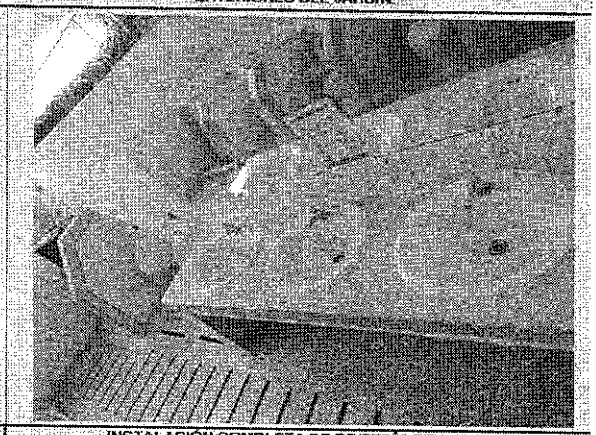

INSTALACIÓN COMPLETA DE GRIFERIA TIPO PUSH

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	$10.800.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	-
Valor Otro Sí	-
Valor Total	$10.800.000
Valor No Ejecutado del Contrato (factor Calidad)	-
Pago No. 1	$ 5.241.996 (en trámite)
Pago No. 2	$4.478.004 (en trámite)
Retegarantia 10%	
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	0

El contratista remitió el acta No. 1 y No. 2 el día 11 de diciembre de 2020, durante la ejecución del contrato no presentó factura de cobro, a la fecha las cuentas se encuentran en trámite de revisión por parte del área financiera para proceder a pago respectivo. Encontrándose pendiente la liquidación.

ROSA E. GÓMEZ CORREDOR
Arquitecta Área de Infraestructura
Apoyo a la Supervisión

JUAN PABLO CAÑÓN RODRIGUEZ
Ingeniero Área de Infraestructura
Apoyo a la Supervisión

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa
Supervisora

Bogotá D.C. diciembre de 2020

Doctora
LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
ALCALDE LOCAL DE BOSA
Bogotá D.C.

Ref. Informe **01,02,03,04** de Actividades del **13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 12 DE MARZO DEL 2020**

Contrato de interventoría No. **258 de 2019**

Yo, **OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA** Identificado como aparece al pie de mi firma correspondiente, en mi calidad de contratista del Fondo de Desarrollo local de Bosa, contrato que responde a los siguientes datos:

Contrato de Interventoría No:	**258 DE 2019**
Plazo de ejecución inicial:	**3 MESES**
Plazo de ejecución final:	**4 meses**
Fecha de iniciación:	**13 DE NOVIEMBRE DE 2019**
Fecha de terminación inicial:	**12 DE FEBRERO DE 2020**
Fecha de terminación actual:	**21 DE NOVIEMBRE DE 2020**
Fecha de cesión:	**N/A**
Prórroga 1:	**13 DE FEBRERO A 12 DE MARZO DE 2020**
Periodo reportado:	**13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 12 DE MARZO DEL 2020**

Manifiesto respetuosamente a usted señora alcaldesa, que presento mi **acumulado** de actividades correspondiente al periodo de ejecución del **13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 12 DE MARZO DEL 2020 (respectivamente)**, el cual da cuenta del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato referido.

Anexo copias del aporte a Salud, Pensión y ARL del mes correspondiente y soporte.

Comedidamente le solicito se sirva proceder de conformidad.

Atentamente.

CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT 900.633.259-1
OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA
Representante legal
C.C. 1.018.428.445 de Bogotá

Anexos ____ Folios____ CD

CAPPING
INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

NIT.900633259-1

HOJA DE RUTA

Carrera 30 No. 75-61 OF 307. Bogotá, Colombia.
Teléfonos (+57) 5400948 (+57-1) 310 556 63 30.
Proyectoscapping@gmail.com Capping Ingeniería y Arquitecturas ® 2013

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: _____ Fecha: DICIEMBRE 2020 Clase de contrato: CIN

No. de Pago: UNO (01) de DOS (02) Contrato No. 258 – 2019

Nombre del Contratista: **CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS.**

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➢ Carta dirigida al supervisor del contrato ➢ Informe de gestión o avance ➢ Factura o documento equivalente ➢ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➢ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o Interventor o apoyo a la supervisión	LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS		
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	YINETH BOHÓRQUEZ PINTO		
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	YINETH BOHÓRQUEZ PINTO	Febrero 2021	
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➢ Recibe y verifica el listado de los documentos ➢ Reprograma PAC ➢ Elabora y aprueba Orden de Pago ➢ Revisa y valida Planilla ➢ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	ALBERTO TRIANA HOYOS		
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde(sa) Local	LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL			

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

Transversal 78K # 41 A-04 sur - Conmutador: 4481400 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

CAPPING
INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

NIT.900633259-1

FACTURA

Carrera 30 No. 75-61 OF 307. Bogotá, Colombia.
Teléfonos (+57) 5400948 (+57-1) 310 556 63 30.
Proyectoscapping@gmail.com Capping Ingeniería y Arquitecturas ® 2013

CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT 900.633.259
CR 106 N 17 B 09
Tel: (031) 3105566330
Bogotá - Colombia
proyectoscapping@gmail.com

Factura electrónica de Venta
No. FE-5

				Fecha y hora Factura	
Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			**Generación**	15/12/2020, 15:37
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 7750462	**Expedición**	15/12/2020, 15:37
Dirección	CR 80I 61 05 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	03/01/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 258 DE 2020 - ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1. EL CONTRATISTA DE OBLIGA PARA CON EL FONDO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	1.00	5,824,440.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-01-03 por $ 5,824,440.00

Total Bruto	4,894,487.39
IVA 19%	929,952.61
Total a Pagar	5,824,440.00

Observaciones:
LA PRESENTE FACTURA ESTA SUJETA A RETEGARANTIA DEL 10%

$ 574.560 ND.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764006177377 aprobado en 20201023 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9
CUFE 431c7fc2698c07e96e0be3974c1c666efc4ffb1a16550693542cb746feea5f70a131e10daf23a8aa7dfcb673b71af9fe

CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT 900.633.259
CR 106 N 17 B 09
Tel: (031) 3105566330
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 6

Fecha Nota Crédito	2021-02-26
Factura de Venta	FE-5
Generación	26/02/2021, 10:09
Expedición	26/02/2021, 10:10
Vencimiento	26/02/2021

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 7750462
Dirección	CR 80I 61 05 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 258 DE 2020 - ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1. EL CONTRATISTA DE OBLIGA PARA CON EL FONDO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	1.00	652,320.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y dos mil trescientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-26 por $ 652,320.00

Total Bruto	548,168.07
IVA 19%	104,151.93
Total	652,320.00

Observaciones:
Se genera nota crédito a la factura FE 5 de fecha 15 de diciembre de 2020 por aclaración y verificación de valores de la entidad.

CUDE: c17f78827c90a69e6a1e95d3a160b220b99f305625c3f228cfb2c42a2fbeed09690d0aed0f54e64e0f4a814a4e36adfb
CUFE factura: 431c7fc2698c07e86e0be3974c1c666efc4ffb1a185506935 42cb748feae5f70a131e10daf23a8aa7dfcb873b71af9fe

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT 900.633.259
CR 106 N 17 B 09
Tel: (031) 3105566330
Bogotá - Colombia

Débito Facturación
No. 1

Fecha Nota Debito	2021-03-11
Factura de Venta	FE-5
Generación	11/03/2021, 14:38
Expedición	11/03/2021, 14:38
Vencimiento	11/03/2021

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 7750462
Dirección	CR 80I 61 05 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 258 DE 2020 - ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1. EL CONTRATISTA DE OBLIGA PARA CON EL FONDO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	1.00	574,560.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Quinientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-11 por $ 574,560.00

Total Bruto	482,823.53
IVA 19%	91,736.47
Total	574,560.00

Observaciones:
Se genera nota débito a la factura FE 5 de fecha 15 de diciembre de 2020 por aclaración y verificación de valores de la entidad.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONSTRUCCIONES Y VALORES S.A.S.

NIT: 900.518.211-7

ACTA DE CANTIDADES

CONTRATISTA	CONSTRUVALORES S.A.S
CONTRATO	DE OBRA PUBLICA
INTERVENTORIA	CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.
CONTRATO N°	257 DEL 2019
FECHA DE INICIO	13 NOVIEMBRE DE 2019
F. TERMINACIÓN INICIAL	12 FEBRERO DE 2020
F. TERMINACIÓN FINAL	20 NOVIEMBRE DE 2020
PRORROGA No. 1	13 FEBRERO -12 DE MARZO 2020
OTRO SI No. 1	28 DE FEBRERO
PRORROGA No. 2	22 OCTUBRE -20 DE NOVIEMBRE 2020
V. INICIAL DEL CONTRATO	$ 158 928 960
V. FINAL DEL CONTRATO	$ 158 928 960

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

OBJETO: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS DEL JARDÍN INFANTIL ANTONIA SANTOS PRESENTE EN LA LOCALIDAD DE BOSA."

				CORTE DE OBRA									12 DE MARZO DE 2020		20 DE NOVIEMBRE DE 2020	
	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES INICIALES			OTROSI #1		CONDICIONES MODIFICADAS				CORTE DE OBRA N°1		CORTE DE OBRA FINAL	
ITEM	ITEM NUEVO	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	UN	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	MENOR CANTIDAD	MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	1	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 74 132	UN	3,00	$ 72 396,00	8,00	$ 193 056,00			8,00	$ 193 056,00	8,00	$ 193 056,00		
2	NA	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO (METÁLICAS - MADERA), INCLUYE VIDRIO Y REJAS. INCLUYE DISPOSICIÓN, RETIRO Y CARGUE	$ 15 418,00	M2	2,00	$ 30 836,00										
3	2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (URASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	$ 15 421,00	M2	100,00	$ 1 542 100,00	28,00	$ 1 171 998,00			72,00	$ 1 171 998,00	72,00	$ 1 171 998,00		
4	3	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	$ 6 619,00	M2	80,00	$ 529 520,00	28,00	$ 241 332,00			28,00	$ 241 332,00			28,00	$ 241 332,00
5	4	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO.	$ 36 385,00	M2	80,00	$ 2 884 800,00	60,00	$ 2 884 800,00			60,00	$ 2 884 800,00	60,00	$ 2 884 800,00		
6	NA	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	$ 27 842,00	M2	725,00	$ 6 842 870,00										
7	5	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	$ 10 656,00	M2	200,00	$ 2 131 200,00	200,00	$ 2 131 200,00			200,00	$ 2 131 200,00	200,00	$ 2 131 200,00		
8	6	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO = 0.75 M)	$ 35 768,00	ML	30,00	$ 1 073 040,00	30,00	$ 1 072 950,00			30,00	$ 1 072 950,00	30,00	$ 1 072 950,00		
9	7	LLAVE MANGUERA 1/2"	$ 78 873,00	M2	1,00	$ 78 873,00	1,00	$ 78 873,00			1,00	$ 78 873,00	1,00	$ 78 873,00		
10	NA	PUNTO SANITARIO 2"	$ 25 343,00	ML	1,00	$ 25 343,00										
11	NA	INSTALACION DE SANITARIO	$ 72 201,00	UN	1,00	$ 72 201,00										
12	NA	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	$ 66 600,00	UN	4,00	$ 266 640,00										
13	8	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3#12 (F) + 1#12 (N) + 1#12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 133 205,00	UN	6,00	$ 799 230,00	13,00	$ 1 731 665,00	6,00		7,00	$ 932 435,00			7,00	$ 932 435,00
14	9	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3#12 (F) + 1#12 (N) + 1#12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 182 358,00	UN	4,00	$ 729 432,00	4,00	$ 729 432,00			4,00	$ 729 432,00			4,00	$ 729 432,00
15	10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" INCLUYE SOPORTERÍA. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	$ 34 324,00	ML	120,00	$ 4 118 880,00	120,00	$ 4 118 880,00			120,00	$ 4 118 880,00			120,00	$ 4 118 880,00
16	11	SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO, INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3#12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 317 690,00	UN	1,00	$ 317 690,00	1,00	$ 317 690,00			1,00	$ 317 690,00			1,00	$ 317 690,00
17	12	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3#12 (F) + 1#12 (N) + 1#12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA PAVIBEL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	$ 117 565,00	UN	2,00	$ 235 130,00	2,00	$ 235 130,00			2,00	$ 235 130,00			2,00	$ 235 130,00
18	13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 75 042,00	UN	2,00	$ 150 084,00	2,00	$ 150 084,00			2,00	$ 150 084,00			2,00	$ 150 084,00
19	14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	$ 124 192,00	UN	40,00	$ 4 967 680,00	28,00	$ 3 477 376,00			28,00	$ 3 477 376,00			28,00	$ 3 477 376,00
20	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	$ 124 192,00	UN	4,00	$ 496 768,00	4,00	$ 496 768,00			4,00	$ 496 768,00			4,00	$ 496 768,00
21	16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 139 640,00	UN	4,00	$ 558 560,00	6,00	$ 837 840,00	2,00		4,00	$ 558 560,00			4,00	$ 558 560,00
22	17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE	$ 213 409,00	UN	21,00	$ 4 481 589,00	15,00	$ 3 201 135,00			15,00	$ 3 201 135,00			15,00	$ 3 201 135,00
23	18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	$ 283 296,00	UN	1,00	$ 283 200,00	2,00	$ 566 592,00			2,00	$ 566 592,00			2,00	$ 566 592,00
24	19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ ESTROBOSCÓPICA	$ 417 708,00	UN	2,00	$ 835 416,00	2,00	$ 835 416,00			2,00	$ 835 416,00			2,00	$ 835 416,00
25	20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	$ 559 082,00	UN	2,00	$ 1 118 164,00	2,00	$ 1 118 164,00			2,00	$ 1 118 164,00			2,00	$ 1 118 164,00
26	21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	$ 206 269,00	UN	2,00	$ 412 538,00	2,00	$ 412 538,00			2,00	$ 412 538,00			2,00	$ 412 538,00
27	NA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL	$ 132 053,00	UN	1,00	$ 132 053,00										
28	NA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE RELAY	$ 972 580,00	UN	1,00	$ 972 580,00										
29	NA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE AUXILIAR	$ 1 055 847,00	UN	1,00	$ 1 055 847,00										
30	22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MODULOS EXPANSIBLE A UN SEGUNDO LAZO	$ 6 407 680,00	UN	1,00	$ 6 407 680,00	1,00	$ 6 407 680,00			1,00	$ 6 407 680,00			1,00	$ 6 407 680,00
31	23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOTIFICADOR REMOTO "ESTACIÓN GUARDIAN"	$ 1 220 318,00	UN	1,00	$ 1 220 318,00	1,00	$ 1 220 318,00			1,00	$ 1 220 318,00			1,00	$ 1 220 318,00
32	24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE PLOMO SELLADA DE 12A-12V	$ 800 071,00	UN	1,00	$ 800 071,00	2,00	$ 1 600 142,00			2,00	$ 1 600 142,00			2,00	$ 1 600 142,00
33	NA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE TELEFONÍA	$ 318 550,00	UN	1,00	$ 318 550,00										
34	NA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELÉFONO DE EMERGENCIA	$ 637 218,00	UN	1,00	$ 637 215,00										
35	NA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE AUDIO	$ 2 305 086,00	UN	1,00	$ 2 305 086,00										
36	NA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARLANTES DE EMERGENCIA	$ 297 237,00	UN	1,00	$ 297 237,00										
37	25	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	$ 75 813,00	UN	21,00	$ 1 585 773,00	8,00	$ 604 104,00			8,00	$ 604 104,00			8,00	$ 604 104,00
38	26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2*20LR METRO LINEAL	$ 6 808,00	ML	510,00	$ 3 372 880,00	510,00	$ 3 372 880,00			510,00	$ 3 372 880,00			510,00	$ 3 372 880,00
39	27	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1KVA	$ 1 238 329,00	UN	1,00	$ 1 238 329,00	1,00	$ 1 238 329,00			1,00	$ 1 238 329,00			1,00	$ 1 238 329,00
40	28	CINTA ANTIDESLIZANTE 3" 3 CM	$ 10 268,00	ML	200,00	$ 2 053 600,00	148,25	$ 1 521 782,32			148,25	$ 1 521 782,32			148,25	$ 1 521 782,25
41	29	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	$ 41 522,00	M2	2,00	$ 83 044,00	5,20	$ 215 914,40			5,20	$ 215 914,40			5,20	$ 215 914,40
42	NA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO 6G 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES	$ 237 902,00	M2	1,00	$ 237 902,00										
43	NA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	$ 140 078,00	M2	50,00	$ 7 003 900,00										
44	30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, INCLUYE VALVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE	$ 428 222,00	UN	1,00	$ 428 222,00	6,00	$ 2 857 332,00			6,00	$ 2 857 332,00	6,00	$ 2 857 332,00		

45	31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORNAL LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	$ 333.234,00	UN	3,00	$ 999.702,00	2,67	$ 889.401,00			2,00	$ 666.468,00	2,00	$ 666.468,00		
46	NA	CRUCETAS CON GRIFERÍA	$ 172.301,00	UN	2,00	$ 356.602,00										
47	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	$ 172.459,00	UN	3,00	$ 517.377,00	3,00	$ 517.377,00			3,00	$ 517.377,00	3,00	$ 517.377,00		
48	33	VARIO TIPO 1 A TRES MANOS	$ 15.284,00	M2	950,00	$ 4.071.000,00	266,45	$ 4.179.887,83			266,45	$ 4.179.891,80	141,40	$ 2.309.614,40	14,85	$ 243.017,40
49	34	PINTURA EPÓXICA	$ 18.334,00	M2	100,00	$ 1.833.400,00	100,00	$ 1.833.400,00			100,00	$ 1.833.400,00	100,00	$ 1.833.400,00		
50	35	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA	$ 17.341,00	M2	100,00	$ 1.734.100,00	100,00	$ 1.734.100,00			100,00	$ 1.734.100,00	60,39	$ 1.046.700,78	39,61	$ 687.397,24
51	36	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS)	$ 25.436,00	M2	300,00	$ 5.087.200,00	269,26	$ 6.772.583,36			269,26	$ 6.772.583,36	269,26	$ 6.772.583,36		
52	37	PINTURA VINILACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA INCLUYE LIJADA Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES	$ 22.044,00	M2	50,00	$ 1.102.200,00	35,00	$ 782.540,00			35,00	$ 782.540,00	35,00	$ 782.540,00		
53	38	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 16.594,00	M2	50,00	$ 829.400,00	32,97	$ 546.929,00			32,97	$ 546.936,36	32,97	$ 546.929,00		
54	39	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD (METÁLICA	$ 14.812,00	M2	40,01	$ 592.480,00	70,10	$ 1.038.321,20			70,10	$ 1.038.321,20	70,10	$ 1.038.321,20		
55	40	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	$ 16.225,00	ML	190,00	$ 3.084.840,00	190,00	$ 3.084.840,00			190,00	$ 3.084.840,00	100,00	$ 3.084.840,00		
56	41	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200DS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (Vista - 10 mm)	$ 73.592,00	M2	210,63	$ 15.499.920,00	257,92	$ 18.986.538,88			257,92	$ 18.986.694,24			257,92	$ 18.986.694,24
57	42	SUMINISTRO E INSTALACION SANDBLASTING COLOR GRIS SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	$ 47.052,00	M2	103,00	$ 4.765.200,00	28,00	$ 1.334.928,00			28,00	$ 1.334.256,00			28,00	$ 1.334.256,00
58	43	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	$ 89.204,00	M2	2,00	$ 178.408,00	2,00	$ 178.408,00			2,00	$ 178.408,00	2,00	$ 178.408,00		
59	NA	CONCERTINA SOBRE MURO O REJA	$ 49.964,00	ML	40,00	$ 1.998.560,00										
60	44	PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL#26 DESARROLLO 0.25	$ 24.172,00	ML	100,00	$ 2.117.200,00	44,00	$ 1.391.568,00			44,00	$ 1.391.568,00	44,00	$ 1.391.568,00		
61	45	TEJA ECORDOF TRASLUCIDA ONAL PC 37	$ 60.118,00	M2	30,00	$ 1.803.540,00	30,00	$ 1.803.540,00			30,00	$ 1.803.540,00	30,00	$ 1.803.540,00		
62	NA	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 16.053,00	ML	255,00	$ 4.242.465,00										
		TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL				$ 115.098.653,50		$ 89.168.031,64				$ 87.169.722,51		$ 92.395.164,72		$ 53.696.240,53
								ITEMS NO PREVISTOS								
NP1	NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECORDOF ONAL PC 37	$ 92.172,03	M2			264,80	$ 21.902.137,50		3,07	267,87	$ 22.150.083,44	264,80	$ 21.902.137,50	3,07	$ 253.925,94
NP2	NP2	CANALETA PARA TEJA ECORDOF	$ 39.821,00				22,00	$ 876.062,00			22,00	$ 876.062,00	22,00	$ 876.062,00		
NP3	NP3	RETIRO DE PINTURA (GRAFITIS) EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA CON REMOVEDOR DE PINTURAS INCLUYE LAVADO CON HIDROFUGO	$ 21.447,00	M2			66,00	$ 1.415.502,00			66,00	$ 1.415.502,00	52,60	$ 1.128.352,20	13,40	$ 287.280,09
NP4	NP4	IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES EXISTENTES CON MANTO ASFALTICO Y EMULSIÓN ASFALTICA INCLUYE LIMPIEZA DE BAJANTES	$ 13.839,00				58,10	$ 803.123,00	58,10							
NP5	NP5	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, CON CABELLETES Y FLANCHES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 14.904,00				294,60	$ 4.391.159,77			294,60	$ 4.391.215,20	294,60	$ 4.391.166,77		
NP6	NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO 8X4, INCLUYE SOLDADURA Y PLATINAS	$ 19.894,00	KG			214,66	$ 3.808.552,44			214,66	$ 3.808.552,44	214,60	$ 3.807.619,20	0,06	$ 933,24
NP7	NP7	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 1.427.473,78	GL							1,00	$ 1.427.473,77		$ 3.807.619,20	1,00	$ 1.427.473,78
		TOTAL EJECUCION CONTRACTUAL						$ 37.366.363,91				$ 34.047.977,84		$ 32.076.137,77		$ 1.969.729,04
		COSTO DIRECTO						$ 121.157.595,45				$ 121.151.595,45		$ 64.472.222,49		$ 55.056.963,17
		AIU 32%						$ 38.770.430,53				$ 38.730.430,55		$ 20.634.434,20		$ 17.617.906,23
		COSTO TOTAL						$ 159.928.025,98				$ 159.938.026,00		$ 85.106.656,69		$ 72.672.871,35

CONTRATISTA
R.L. ORLANDO GONZALEZ PEREZ
CONSTRUVALORES

V.B. INTERVENTORIA M.P

INTERVENTORIA
R.L. OSCAR JULIAN OJILLON CORREA
CAPPING INGENIERÍA Y

APOYO A LA SUPERVISIÓN
JUAN PABLO CAÑON

CAPPING
INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

NIT.900633259-1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Carrera 30 No. 75-61 OF 307. Bogotá, Colombia.
Teléfonos (+57) 5400948 (+57-1) 310 556 63 30.
Proyectoscapping@gmail.com Capping Ingeniería y Arquitecturas ® 2013

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

7

Fecha Expedición: 25 de noviembre de 2020 Hora: 12:07:40
Recibo No. AB20451694
Valor: $ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B204516949471C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
Nit: 900.633.259-1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02339450
Fecha de matrícula: 9 de julio de 2013
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 12 de marzo de 2020

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 106 No. 17 B 09
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: proyectoscapping@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3105566330
Teléfono comercial 2: 5400948
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 106 No. 17 B 09
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: proyectoscapping@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3105566330
Teléfono para notificación 2: 5400948
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Validez desconocida
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de noviembre de 2020 Hora: 12:07:40
Recibo No. AB20451694
Valor: $ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B204516949471C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

reparaciones completas de centrales hidroeléctricas; construcción, reformas y reparaciones completas de áreas deportivas, instalaciones de pilotes; construcción, reformas y reparaciones completas de obras de ingeniería civil marítimas, dragado y eliminación de rocas; mantenimiento de vías y prados; mantenimiento y reparación de estructuras metálicas. 4) Construcción de edificaciones para uso residencial: Hormigado para edificaciones de uso residencial. Colocación de techado o impermeabilización de techos. Construcción de viviendas nuevas, tipo familiar y/o multifamiliar. Ampliaciones y reformas completas. Construcción de saunas y chacusis. 5) Construcción de edificaciones para uso no residencial. Demolición y derribo de edificios. Venta de materiales procedentes de la demolición. Preparación de terrenos para la construcción de edificaciones para uso no residencia. 6) Trabajos de demolición y preparación de terrenos para obras civiles. Trabajos de excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civiles. 7) instalaciones eléctricas y trabajos conexos. 8) Trabajos de electricidad. 9) Trabajos de instalación de equipos. 10) Trabajos de acondicionamiento 11) instalación de vidrios y ventanas. 12) Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos 13) servicios de limpieza y desmonte.14) Servicios de fumigación 15) Servicios de obtención y suministro de personal 16) Servicio de avalúos y valoraciones17) Fabricación y suministro de artículos metálicos para uso estructural. Fabricación y suministro de elementos metálicos para arquitectura y ornamentación, puertas, ventanas, rejas, etc. Fabricación y suministro de puentes, secciones, torres, columnas, vigas, andamios, armaduras, etc.18) Transporte de materiales19) fabricación y suministro de hojas de madera para enchapados, tableros, etc. 20) Fabricación y suministro de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones. 21) alquiler de equipo para construcción y demolición 22) suministro de materiales para construcción y de ferretería. 23) Suministro de pinturas, lacas, barnices, vinilos, masillas, esmaltes, solventes, removedores 24) Suministro de papelería y artículos de escritorio, libros, periódicos, material didáctico 25) Suministro de equipos de cómputo y equipos de oficina 26) Suministro de toda clase de mobiliario 27) Suministro de toda clase de dotaciones 28) suministro de material quirúrgico29) Suministro de alimentos 30) Suministro de productos diversos31) En general cualquier acto lícito de comercio y/o servicios. La empresa para el desarrollo de su objeto social podrá: 1) Realizar cualquier acto licito de comercio y/o servicio. 2) Celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de noviembre de 2020 Hora: 12:07:40
Recibo No. AB20451694
Valor: $ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B204516949471C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. SIN NUM del 5 de julio de 2013 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 9 de julio de 2013, con el No. 01746368 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 5 de julio de 2043.

OBJETO SOCIAL

El objeto para la cual se crea la sociedad consiste 1) Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas: Actividades de levantamiento de planos y dibujo industrial actividades de topografía. Actividades geológicas o de prospección. Estudios técnicos, investigativos y servicios integrados actividades de ingeniería eléctrica y electrónica actividades de ingeniería civil. Actividades de ingeniería química actividades de ingeniería industrial actividades de ingeniería de minas y petróleos actividades de ingeniería mecánica actividades de ingeniería de alimentos actividades de ingeniería sanitaria actividades de ingeniería de sistemas actividades de ingeniería geográfica actividades de ingeniería forestal y ambiental. 2) Consultorías e interventorías en las diferentes ramas de la ingeniería y arquitectura. 3) Actividades realizadas con construcción de obras de ingeniería civil. Construcción, reformas y reparaciones completas de carreteras y calles; construcción, reformas y reparaciones completas de redes eléctricas; construcción, reformas y reparaciones completas de obras y redes hidráulicas; construcción, reformas y reparaciones completas líneas de ferrocarril y metro; construcción, reformas y reparaciones completas de puentes, canales y muelles; construcción, reformas y reparaciones completas de aeropuertos; construcción, reformas y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de noviembre de 2020 Hora: 12:07:40
Recibo No. AB20451694
Valor: $ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B204516949471C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

utilizables en el desempeño del objeto social. 13) Los demás actos preparatorios, complementarios y accesorios de los anteriores y que sean necesarios para el desarrollo del objeto social. 14) En general efectuar en su propio nombre o por cuenta de terceros toda clase de operaciones civiles, comerciales, industriales o financieras necesarias o convenientes para et logro de los fines que ella persigue o que puedan favorecer o desarrollar sus actividades o las de empresas en que ella tenga interés y que en forma directa se relacionen con su objeto social. 15) Importar, exportar, adquirir y obtener equipos necesarios para el desarrollo del objeto social. 16) Celebrar toda clase de contratos ya sea con personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales y/o extranjeras. 17) Adquirir o fundar establecimientos de comercio, sucursales o agencias, con sede en esta ciudad, o a nivel nacional o internacional. 16) constituir empresas o sociedades o formar parte de las ya constituidas que desarrollen actividades complementarias o conexas con su objeto principal, suscribir acciones o aportar bienes a las mismas sociedades o incorporarlas a la sociedad misma

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $800.000.000,00
No. de acciones	: 8.000,00
Valor nominal	: $100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $200.000.000,00
No. de acciones	: 2.000,00
Valor nominal	: $100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $200.000.000,00
No. de acciones	: 2.000,00
Valor nominal	: $100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de noviembre de 2020 Hora: 12:07:40
Recibo No. AB20451694
Valor: $ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B204516949471C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 02 del 20 de febrero de 2015 de la Asamblea de Accionistas	01920739 del 13 de marzo de 2015 del Libro IX
Acta No. 07 del 20 de diciembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02555748 del 20 de febrero de 2020 del Libro IX

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	7110
Actividad secundaria Código CIIU:	4290
Otras actividades Código CIIU:	4390, 4111

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 24 de julio de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el

La administración de la sociedad estará a cargo de un Gerente, quien será el representante legal de la misma, pudiendo hacer negocios o adquirir compromisos en nombre de la sociedad sin limitación de cuantía. El Gerente de la sociedad tendrá un (1) suplente quien lo reemplazará en sus faltas temporales y absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Mientras no se designe Junta Directiva, la totalidad de las funciones de administración de la sociedad las ejercerá el Gerente, quien no tendrá limitación alguna para el ejercicio de la administración de la sociedad, ni cuantía máxima para efectuar cualquier negocio lícito en nombre de la misma.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 02 del 20 de febrero de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2015 con el No. 01920741 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Guillen Correa Oscar Julian	C.C. No. 000001018428445

Mediante Acta No. 07 del 20 de diciembre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2020 con el No. 02555747 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Guillen Marroquin Jaime	C.C. No. 000000002978698

REFORMAS DE ESTATUTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de noviembre de 2020 Hora: 12:07:40
Recibo No. AB20451694
Valor: $ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B204516949471C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

TAMAÑO EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 751,027,903

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7110

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de noviembre de 2020 Hora: 12:07:40
Recibo No. AB20451694
Valor: $ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B204516949471C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CAPPING INGENIERÌA Y ARQUITECTURA SAS. sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente entre el periodo comprometido del 13 de noviembre de 2019 al 12 de marzo del 2020 en un porcentaje de ejecución del 47,89%.

Contrato:	No. 258 DE 2019
Tipo de Contrato:	INTERVENTORÌA
Contratista:	CAPPING INGENIERÌA Y ARQUITECTURA SAS
NIT	No. 900.633.259-9
Objeto:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO A REALIZAR LA INTERVENTOR/A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS".
Plazo de Ejecución Inicial:	03 meses.
Plazo de Ejecución Final:	04 meses.
Fecha Iniciación:	13/11/2019
Fecha de Terminación Inicial:	12/02/2020
Fecha de Terminación Final:	21/11/2020
Prórroga(s)	PRÓRROGA 1 UN (01) MES.
Valor Inicial Pactado:	$10.800.000,00
Valor Adicional:	N/A
Valor a Pagar:	$ 5.746.680, oo (1er. Pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS**. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral. En constancia se firma 26 días del mes de febrero de DOS MIL VEINTIUNO (2021).

ALCALDÍA

Lizeth Jahira González Vargas
C.C. 1.073.160.296 de Madrid (Cund)
Supervisor

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Pablo Cañón
Profesional Técnico de Apoyo
Apoyo a la supervisión

Arq. Rosa Gómez Corredor
Profesional Técnico de Apoyo
Apoyo a la supervisión

CAPPING
INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

NIT.900633259-1

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

Carrera 30 No. 75-61 OF 307. Bogotá, Colombia.
Teléfonos (+57) 5400948 (+57-1) 310 556 63 30.
Proyectoscapping@gmail.com Capping Ingeniería y Arquitecturas ® 2013

ALCALDÍA LOCAL DE: BOSA — FONDO DE DESARROLLO LOCAL — 1

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 — PARCIAL: X — FINAL:

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	DD	MM	AA		DD	MM	AA
	13	de NOVIEMBRE	de 2019		12	de MARZO	de 2020

CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORIA — **No.** 258 — **VIGENCIA** 2019

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA :	CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS			**NIT**	900.633.259
DIRECCIÓN:	Carrera 30 No. 75-61 OF 307	**TELEFONO**	310 556 63 30	**CORREO ELECTRONICO**	PROYECTOSCAPPING@GMAIL.COM

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	**INFORMACION BANCARIA**		
	ENTIDAD BANCARIA	**CLASE DE CUENTA**	**No. CUENTA**
NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	BANCOLOMBIA	AHORROS	38831131770

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS".

FORMA DE PAGO

CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SOSA se compromete a pagar el valor total del contrato de interventoría que suscriba mediante pagos teniendo en cuenta el porcentaje de avance de ejecución de obra objeto de interventoría, previa presentación de los siguientes documentos:

VALOR CONTRATO	
VALOR INICIAL DE CONTRATO	10.800.000
ADICIONES	
VALOR ADICION 1	
VALOR ADICION 2	
VALOR ADICION 3	
VALOR ADICION 4	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	10.800.000

FECHAS		EJECUCION EN	No.DE MESES
FECHA DE INICIO	13/11/2019	**PLAZO INICIAL**	3,0
TERMINACION INICIAL	12/02/2020		
PRORROGAS			
FECHA PRORROGA 1	13/02/2020	No.MESES O DIAS PRORROGA 1	30,0
FECHA PRORROGA 2		No.MESES O DIAS PRORROGA 2	
FECHA PRORROGA 3		No.MESES O DIAS PRORROGA 3	
FECHA PRORROGA 4	NA		
TERMINACION CON PRORROGA(S)		**TOTAL EN MESES O DIAS**	

FECHA CESION		FECHA SUSPENSION		FECHA REINICIO	

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	SUPERVISOR(A)	Lizeth Jahira González Vargas	VINCULACION	FUNCIONARIO DE PLANTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	NO APLICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	Juan Pablo Cañón	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	NO APLICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	Arq. Rosa Gómez Corredor	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	NO APLICA

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC SEGUN PLANILLA OPERADOR)		3.544.821
		BASE CORRECTA
VALOR APORTE A SALUD		443.200
VALOR APORTE A PENSION	SI	567.200
VALOR APORTE A R.L.		18.600
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		1.029.000

Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades certifica que los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL ,anexos a este documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007 RESOLUCION 1195/2009 S.H.D.)

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ANTICIPO POR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0		-	0	0

6. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA -PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
$	$ 517.212,00	$ 517.212,00

7. INFOPMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$	10.800.000,00
ACUMULADO CORTES PARCIALES	$	-
SALDO POR EJECUTAR	$	10.800.000,00
PAGO PARCIAL PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	$	4.346.319,00
IVA	$	825.801,00
SUB-TOTAL PAGO PARCIAL	$	5.172.120,00
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	$	517.212,00
MENOS: OTROS DESCUENTOS	$	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	$	4.654.908,00

INFORMACION PRESUPUESTAL						
No.REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS			
			DETALLE GIROS			
			ACUMULADO ANTERIOR	VR. A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
721	2-abr.-19					
	TOTALES	-	-	-	-	-

SON: (Valor en letras a cancelar en el presente corte): CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	0%

8. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1		1er recibo parcial	5.172.120
2		2do recibo parcial	
3		3er recibo parcial	
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13to recibo parcial	
14		15to recibo parcial	
15		16to recibo parcial	
16		17mo recibo parcial	
17		18vo recibo parcial	
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		5.172.120
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			-

VALIDACION DE SALDOS		
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	$	-
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	$	517.212,00
SALDO POR EJECUTAR	$	517.212,00

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	47,89%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	0%

9. INFORMACION DEL PROYECTO

No.PROYECTO	No. DE UPZ	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA		CANTIDAD POBLACION BENEFICIADA		
		DIRECTA	INDIRECTA	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	TOTAL
				-		-
				-		-
				-	-	-
				TOTAL		

10. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	14-44-101112987	0%	$ 10.800.000,00	17 de octubre de 2019	12 de septiembre de 2020
ANTICIPO		0%		NA	NA
PRESTACIONES SOCIALES	14-44-101112987	0%	$ 540.000,00	17 de octubre de 2019	12 de marzo de 2023
RESPONSABILIDAD CIVIL		0%		NA	NA
CALIDAD	14-44-101112987	0%	$ 1.080.000,00	17 de enero de 2020	17 de enero de 2025
ESTABILIDAD		0%		NA	NA

En Bogotá D.C. el 11-dic.-20 recibe a satisfaccion el informe presentado por el contratista INTERVENTORIA con el fin de gestionar el pago UNO (1)
en cumplimiento de la Cláusula N/A del contrato 258 de 2019

CERTIFICANDO que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

Arq. Rosa Gómez Corredor
APOYO A LA SUPERVISION

Juan Pablo Cañón
APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo. Profesional de Planeación
Nombre

Vo.Bo AUTORIZACION GIRO
LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDESA LOCAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101112987	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2019	17	10	2019	00:00	17	01	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.633.259-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 106 NRO. 17 B - 09	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5400948

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN COMUNICADO DE ACEPTACION No. 258 DE 2019, REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/10/2019	17/07/2020	$1,080,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/10/2019	17/01/2023	$540,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2020	17/01/2025	$1,080,000.00

ACLARACIONES

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******61,623.00	$ *******7,000.00	$ ******13,038.00	$ **********81,662.00	$ ********2,700,000.00	60 DÍAS

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101112987

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101112987	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2019	17	10	2019	00:00	17	01	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.		NIT: 900.633.259-1	
DIRECCIÓN: KR 106 NRO. 17 B - 09	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	5400948

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7750434

ADICIONAL:

PSE GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******61,623.00	$ *******7,000.00	$ ******13,038.00	$ **********81,662.00	$ ********2,700,000.00	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002108759363(3900)000000081662(96)20201016

REFERENCIA PAGO: 1100210875936-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101112987	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	10	2019	17	10	2019	00:00	17	01	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL			
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.			IDENTIFICACIÓN NIT: 900.633.259-1
DIRECCIÓN: KR 106 NRO. 17 B - 09	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 5400948

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:			
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7750434
ADICIONAL:			

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101112987

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLP143637B

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101112987, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de OCTUBRE de 2019

14-44-101112987

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101112987	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	02	2020	17	10	2019	00:00	17	01	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.633.259-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 106 NRO. 17 B - 09	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5400948

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
.	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN COMUNICADO DE ACEPTACION No. 258 DE 2019, REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/10/2019	12/09/2020	$1,080,000.00	$1,080,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/10/2019	12/03/2023	$540,000.00	$540,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2020	17/01/2025	$1,080,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN PRORROGA No. 1 DE FECHA FEBRERO 11 DE 2020 AL COMUNICADO DE ACEPTACION No. 258 DE 2019, SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******7,000.00	$ *******4,370.00	$ **********27,370.00	$ ********2,700,000.00	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101112987

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101112987	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	02	2020	17	10	2019	00:00	17	01	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.		NIT: 900.633.259-1	
DIRECCIÓN: KR 106 NRO. 17 B - 09	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5400948

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: .	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7750434

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101112987

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101112987, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de FEBRERO de 2020

14-44-101112987

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

CAPPING
INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

NIT.900633259-1

MEMORIA DE CÁLCULO DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

Carrera 30 No. 75-61 OF 307. Bogotá, Colombia.
Teléfonos (+57) 5400948 (+57-1) 310 556 63 30.
Proyectoscapping@gmail.com Capping Ingeniería y Arquitecturas ® 2013

MEMORIA DE CALCULO ACTA DE PAGO No. 1 DE INTERVENTORÍA
DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 22 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 258 de 2020

"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO A REALIZAR LA INTERVENTOR/A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS".

CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SOSA se compromete a pagar el valor total del contrato de interventoría que suscriba mediante pagos

teniendo en cuenta el porcentaje de avance de ejecución de obra objeto de interventoría, previa presentación de los siguientes documentos:

Pago mensual variable de Interventoría proporcional a la ejecución financiera de la obra

		CONTRATO INICIAL	TOTAL CONTRATO
		$ 10.800.000,00	$ 10.800.000,00
VALOR VARIABLE	90,00%	$ 9.720.000	$ 9.720.000
LIQUIDACION	10,00%	$ 1.080.000	$ 1.080.000
VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA (IVA incluido)		**$ 10.800.000**	**$ 10.800.000**

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA Nº 258 de 2020	**$ 10.800.000**

ITEM	DESCRIPCION (producto)	VALOR FACTURADO CONTRATO DE OBRA ACTA N° 1	% DE FACTURACIÓN	VALOR VARIABLE DE FACTURACIÓN INTERVENTORÍA	
				SUBTOTAL	VALOR TOTAL
ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO A REALIZAR LA INTERVENTOR/A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. FDLB-SAMC-003-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES, CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS".				
TOTAL					
VALOR VARIABLE			47,89%	$ 5.172.120	**$ 5.172.120**

VALOR TOTAL ACTA No. 1 INTERVENTORÍA	**$ 5.172.120**

INTERVENTORÍA

CAPPING INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS

$	4.346.319
$	825.801
$	5.172.120,00

CAPPING
INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

NIT.900633259-1

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Carrera 30 No. 75-61 OF 307. Bogotá, Colombia.
Teléfonos (+57) 5400948 (+57-1) 310 556 63 30.
Proyectoscapping@gmail.com Capping Ingeniería y Arquitecturas ® 2013

Referencia Bancaria

miércoles, 25 de abril de 2020

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECT identificado (a) con NIT 900633259 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	38831131770	17/09/2014	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellin - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia
