
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.

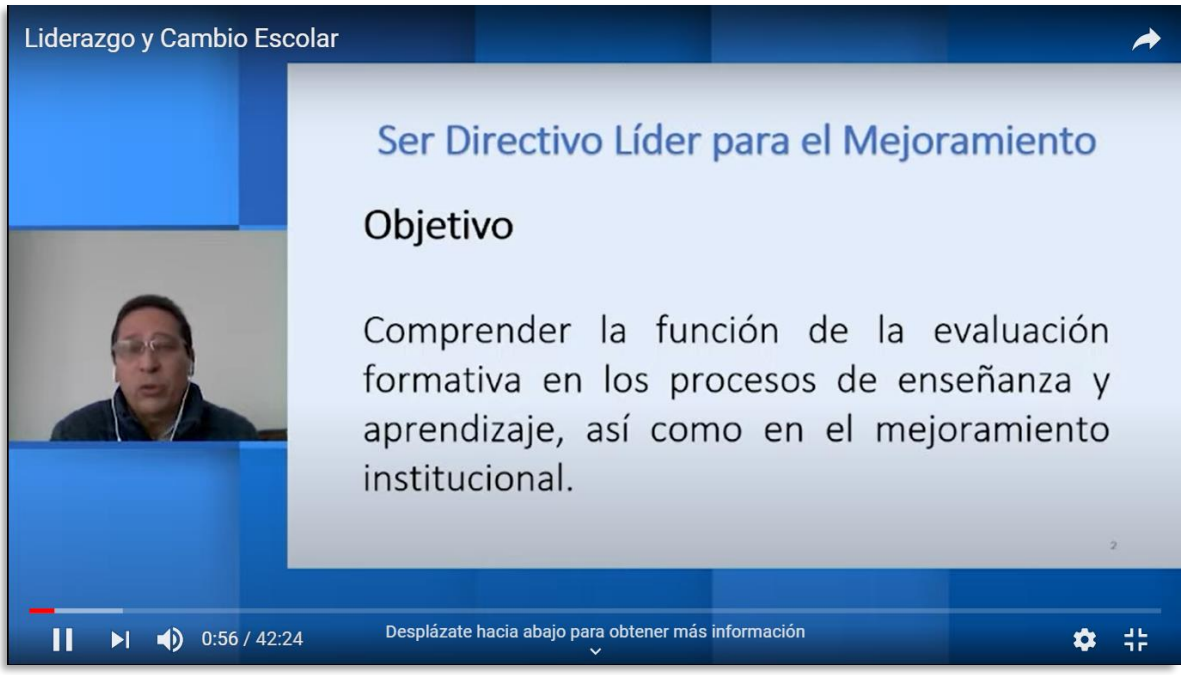

Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ABRIL 2021

Bogotá, D.C., Mayo de 2021

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO		
Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.		**CÓDIGO DEL DOCUMENTO** P143-10-2019
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DEL DOCUMENTO		Archivados por: ARRP.
Texto: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES/ MENSUAL/		
Anexos: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES/ MENSUAL/		
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO		
REVISIÓN ACTUAL:	**INICIO DEL DOCUMENTO:**	**N.º de Copias: 1**
CONTROL	**NOMBRE**	**FECHA**
Preparado por:	Milena Saavedra (Directora de interventoría) Patricia Patiño (Coordinador Operativo) Oscar Melo (Coordinador Adtivo y Financiero)	Mayo de 2021
Revisado por:	Dpto. Calidad, Adriana Veloza.	Mayo de 2021
DISTRIBUCIÓN	**ENTREGADO A:**	**FECHA**
1	Jorge Enrique Celis supervisor contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019	Mayo de 2021

TABLA DE CONTENIDO

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 7

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones 9

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO 9

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE 13

1.4 COMPONENTE JURÍDICO 14

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021. 15

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 17

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio 17

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021. 18

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO 18

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico 19

2.2.2 Valores Agregados Operador. 19

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 19

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN 20

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021. 20

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado. 20

2.3.1.1.2 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables. 21

2.3.1.1.3 Costos Reembolsables 21

2.3.1.1.4 Costos directos 21

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal. 22

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales 22

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico. 22

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*. 23

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico 23

2.3.7 Programación del PAC. 24

3 RECOMENDACIONES 25

4 RELACION DE ANEXOS 25

RELACION DE TABLAS

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN 6

Tabla 1-2 consolidado acompañamiento grabaciones SE066 ODT1 11

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística 17

Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO 18

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico 19

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021 19

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe 20

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio 20

Tabla 2-7 Relación comisiones sobre costos reembolsables 21

Tabla 2-8 Relación costos reembolsables 21

Tabla 2-9 Relación costos directo 21

Tabla 2-10 Control Presupuestal por vigencias 22

Tabla 2-11 Contrato incluidas modificaciones presupuestales 22

Tabla 2-12 Control Presupuestal por vigencias 23

Tabla 2-13 Recursos comprometidos 23

Tabla 2-14 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 marzo 2021 24

Tabla 2-15 Programación por la Interventoría sobre el PAC junio 2021 24

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el mes de abril de 2021, la interventoría realizó las actividades relacionadas con el contrato, las cuales se describen en este informe, así como las actividades del Consorcio Logística MEN 2019-2021–CLM para el cuarto mes de 2021.

A continuación, se relaciona la información del contrato de interventoría.

Aspectos contractuales relevantes:

<table>
<tr><th colspan="4">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td>Contratante</td><td colspan="3">Ministerio de Educación Nacional (MEN)</td></tr>
<tr><td>Razón social Interventoría</td><td colspan="3">SCAIN Administración e Ingeniería S.AS.

Nit: 900.188.602-6</td></tr>
<tr><td>Tipo contrato</td><td colspan="3">Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del concurso de méritos CM-MEN-10-2019, adjudicado mediante Resolución No. 016705 del 26 de diciembre de 2019.</td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td colspan="3">El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la terminación del Contrato celebrado con el Operador Logístico objeto de la interventoría, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</td></tr>
<tr><td>Valor Inicial</td><td colspan="3">El valor del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($3.422.944.649) Incluido IVA y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:

➢ Vigencia 2019: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($10.702.698) IVA incluido.
➢ Vigencia 2020: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS ($1.679.235.057) IVA Incluido.
➢ Vigencia 2021: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.733.006.894) IVA Incluido.

<table>
<tr><td>TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS</td><td></td><td>$ 2.178.850.134</td></tr>
<tr><td>Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)</td><td>14,9%</td><td>$ 324.648.670</td></tr>
<tr><td>SUBTOTAL ANTES DE IVA</td><td></td><td>$ 2.503.498.804</td></tr>
<tr><td>IVA (19%, si aplica)</td><td>19%</td><td>$ 475.664.773</td></tr>
<tr><td>Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)</td><td></td><td>$ 443.781.072</td></tr>
<tr><td>TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA</td><td></td><td>$ 3.422.944.649</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bolsa de Gastos Reembolsables</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Vigencia</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Personal Adicional</td><td>$35.498.727</td><td>$36.670.185</td><td>$72.168.912</td></tr>
<tr><td>Viajes</td><td>$182.880.000</td><td>$188.732.160</td><td>$371.612.160</td></tr>
<tr><td>Total, Bolsa de Gastos reembolsables</td><td>$218.378.727</td><td>$225.402.345</td><td>$443.781.072</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Valor ajustado después de modificaciones</td><td>
Vigencia 2019: $ 10.702.698

Vigencia 2020: $ 1.463.974.055

Vigencia 2021: $ 1.733.006.893

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 3.207.683.646
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR INCIAL</th><th>EJECUTADO</th><th>SALDO FINAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2020</td><td>HONORARIOS</td><td>$ 1.460.856.331</td><td>$ 1.460.856.331</td><td>-$ 0</td></tr>
<tr><td>VIAJES</td><td>$ 218.378.727</td><td>$ 3.117.724</td><td>$ 215.261.003</td></tr>
<tr><td>PERSONAL ADI</td><td>$ -</td><td>$ -</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>$ 1.679.235.058</td><td>$ 1.463.974.055</td><td>$ 215.261.003</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR INCIAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2021</td><td>HONORARIOS</td><td>$ 1.507.604.548</td></tr>
<tr><td>VIAJES</td><td>$ 188.732.160</td></tr>
<tr><td>PERSONAL ADI</td><td>$ 36.670.185</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>$ 1.733.006.893</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Disponibilidad Presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Valor</th><th>Rubro</th><th>Vigencia</th><th>Valor a afectar</th></tr>
<tr><td>CDP</td><td>175319</td><td>$ 11.500.000</td><td>C-2201-0700-13 -0-2201006-02</td><td>2019</td><td>$ 10.702.698</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura</td><td>89819</td><td>$ 60.137.504.449</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2020</td><td>$ 1.679.235.057</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura</td><td>89819</td><td>$ 49.369.022.650</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2021</td><td>$ 1.733.006.894</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio</td><td>27 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Modificaciones /adiciones</td><td>Modificación N. 1 de 27 de diciembre de 2019
Modificación N. 2 de 4 de junio de 2020
Modificación N. 3 de 12 de noviembre de 2020</td></tr>
</table>

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En abril de 2021, se realizaron las siguientes actividades del componente administrativo por parte de la interventoría:

- El 6 de abril de 2021, la interventoría recibió por parte del Consorcio correo con los documentos para revisión y trámite de pago del equipo mínimo requerido por el periodo de marzo - 2021 del Consorcio Logística MEN 2019-2021. Una vez revisada la información la interventoría solicitó actualizados al mes de abril los aportes de seguridad social y parafiscales del consorciado Prime Producciones S.A. al validar la información, la interventoría gestionó el trámite en el MEN atendiendo las nuevas orientaciones para cargue y aprobación de la facturación del operador logístico. La interventoría aprobó el 21 de abril de 2021 la factura electrónica desde la plataforma Olimpia IT del Ministerio de Hacienda. El MEN indicó el 21 de abril de 2021 que los documentos fueron radicados bajo consecutivo 2021-IE-016153. La evidencia se presenta como anexo N°01 de este informe.

- El 7 de abril de 2021 mediante radicado SCAI-P143-0152-2021-REC la interventoría recibió del Consorcio en las oficinas los informes físicos de los meses de enero a diciembre de 2020, una vez revisados los ajustes requeridos fueron aprobados y radicados en el MEN el 21 de abril de 2021, con consecutivo de oficio SCAI-P143-0066-2021. La evidencia se presenta como anexo N°02 de este informe.

- El 8 de abril de 2021, en cumplimiento a los compromisos contractuales la interventoría remitió vía correo electrónico al MEN el informe parcial de supervisión N°5 con los anexos correspondientes. La evidencia se presenta como anexo N°03 de este informe.

- El 8 de abril de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN la notificación y soportes de devolución de los recursos reintegrados por parte del Consorcio, correspondientes a mayores valores cancelados en los eventos SE 032 y 043 de 2020 por valor de $18.714.018. La evidencia se presenta como anexo N°04 de este informe.

- El 13 de abril de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN el nuevo formato del certificado de cumplimiento y trámite de pago versión10 para el trámite de pago de las facturas. Así mismo, sobre el nuevo proceso que se debía adelantar para la validación de las facturas emitidas por el contratista, informó que el MEN se encontraba en el proceso de solicitud de usuario para SCAIN, para que como entidad interventora pudiera validar las facturas. La evidencia se presenta como anexo N°05 de este informe.

- El 13 de abril de 2021, la interventoría remitió en cumplimiento a sus compromisos contractuales el informe mensual correspondiente a marzo 2021, el cual fue radicado en gestión documental del MEN con el radicado 2021-ER-114197. El mismo día, se requirió por parte del MEN no radicar la factura correspondiente al mes de marzo de 2021, debido a las orientaciones para expedición de facturas a partir del mes de abril por parte de financiera. La evidencia se presenta como anexo N°06 de este informe.

- El 14 de abril de 2021, la interventoría mediante oficio con consecutivo SCAI-P143-0066-2021 y en cumplimiento a los compromisos contractuales, radicó en el MEN los informes mensuales aprobados correspondientes a la vigencia 2020 de los meses de enero a diciembre. La evidencia se presenta como anexo N°07 de este informe.

- El 14 de abril de 2021, la interventoría recibió invitación por parte del MEN para asistir a los espacios de capacitación respecto de las nuevas orientaciones de facturación electrónica. El mismo día, el MEN remitió la guía para revisión y aprobación en la plataforma Olimpia de las facturas electrónicas para proveedores. Así mismo, la interventoría recibió comunicado con orientaciones para la emisión de las facturas electrónicas por parte del Supervisor del contrato. La evidencia se presenta como anexo N°08 de este informe.

- El 15 de abril de 2021, la interventoría remitió al MEN correo electrónico con consecutivo P143-MEN-1247901-00276-2021 relacionada con la solicitud de envío de los soportes del Insumo de modificación del contrato de operación logística, puntualmente los que tienen que ver con los porcentajes de administración que consideró el MEN, tomando como punto de partida la información de otros contratos ejecutados por la Entidad, así mismo, la información referente a las cotizaciones que se consideraron por parte del MEN para definir los valores de los ítems que se pretenden adicionar al tarifario que fueron socializados a la interventoría y de los cuales no se contaba con copia de las cotizaciones y de los contratos que respaldan el mismo. El MEN remitió respuesta el 16 de abril de 2021, con soportes de los documentos cargados en la plataforma NEON para la modificación N°3, (cotizaciones y tabla de valores referencia), sin embargo, manifestó que se recibieron nuevas observaciones de la subdirección de contratación, las cuales se encontraban en revisión y solicitó verificar por parte de SCAIN si existían otros ítems que fuera pertinente cotizar para incluirlos en el tarifario para eventos mediados por la tecnología. La interventoría respondió el 20 de abril de 2021 con sugerencia de ítems requeridos. La evidencia se presenta como anexo N°09 de este informe.

- El 16 de abril de 2021, la interventoría en respuesta a la solicitud del MEN remitió con consecutivo P143-MEN-1247901-00277-2021 el reporte de novedades trimestral, con corte al 30 de marzo de 2021. La evidencia se presenta como anexo N°10 de este informe.

- El 21 de abril de 2021, la interventoría solicitó al MEN remitir la estructura del informe final del contrato de interventoría para avanzar en la consolidación de la información de las vigencias. El 27 de abril de 2021 indicó que el informe final se debe realizar en el mismo formato que se utiliza para el trimestral. La evidencia se presenta como anexo N°11 de este informe.

- El 22 de abril de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN la evaluación de servicio de interventoría, que fue solicitada por el área de calidad de la compañía. En la cual se evidencia un nivel de satisfacción entre bueno y excelente. La evidencia se presenta como anexo N°12 de este informe.

- El 23 de abril de 2021, la interventoría remitió al MEN con consecutivo SCAI-P143-065-2021 los documentos para trámite de pago diecisiete de Interventoría del mes de marzo de 2021, certificado de equipo para el mes de marzo de 2021, certificado de parafiscales de la compañía y la factura electrónica aceptada en la plataforma Olimpia del MEN. La evidencia se presenta como anexo N°13 de este informe.

- En cumplimiento a la obligación contractual, la interventoría presenta soporte de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de abril 2021, suscrito por el revisor fiscal de la compañía, en la que se describe que durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de la certificación los pagos se han realizado de manera oportuna, así mismo, que se encuentra al día con los pagos de las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las caja de compensación, al ICBF y al servicio nacional de aprendizaje SENA. La evidencia se presenta como anexo N° 14 de este informe.

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones

En abril de 2021, la interventoría no realizó reuniones solo con el MEN.

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

En el mes de abril de 2021, la interventoría realizó las actividades correspondientes a las solicitudes de evento remitidas por el MEN en el componente técnico operativo, en la matriz operativa presentada como anexo N°15 del presente informe, se describe el detalle de cada solicitud, adicionalmente, la interventoría presenta un consolidado del estado de cada solicitud tramitada en el numeral 2.2.1 del presente informe.

Sobre cada solicitud de evento se registran actividades de ejecución y cierre, si aplica, con corte a abril de 2021, las cuales se detallan en los anexos de cada solicitud con los documentos soporte. Así mismo, es necesario mencionar que la interventoría para el trámite de pago de cada evento remite al MEN la totalidad de los soportes del evento, incluyendo el informe de interventoría de cada evento y sus anexos.

SE056 Taller de Trabajo en Torno a los Espacios Educativos Temporales para Garantizar la Continuidad del Proceso de Aprendizaje a los Niños.

- El 9 de abril de 2021, el Consorcio remitió la carpeta de cierre de la SE 056 con los ajustes requeridos, una vez aprobada por la interventoría, el 14 de abril de 2021 envió al MEN la carpeta con el certificado de cierre del evento para validación y firma. El 19 de abril de 2021, se recibió el certificado firmado, así mismo, se solicitó al Consorcio la entrega de los documentos para facturación que fueron recibidos el 22 de abril de 2021, el mismo día la interventoría remitió al MEN el certificado de cumplimiento y trámite de pago con las facturas soportes. La evidencia se presenta como anexo N°16 de este informe.

SE064 Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para avanzar

El 13 de abril de 2021, se recibió por parte del Consorcio la carpeta de cierre de SE 064 con la subsanación de observaciones realizadas por parte de la interventoría, el 14 de abril de 2021 se recibió nuevamente la certificación del proveedor con los ajustes requeridos y se remitió el enlace para descargar la información. El 16 de abril de 2021 la interventoría reiteró la solicitud de ajuste a los

anexos de la carpeta para continuar con el trámite, el 17 de abril de 2021 el Consorcio remitió respuesta y el 21 de abril de 2021 se remitieron observaciones nuevamente por parte de interventoría, el 23 de abril se recibió en interventoría la carpeta subsanada, incluido el certificado de validación de productos por parte del MEN, el 29 de abril de 2021 se remitió la carpeta al MEN con certificado de cierre para aprobación, se recibió el mismo día 29 de abril de 2021 el certificado firmado el cual se remitió al Consorcio con la solicitud del envío de los documentos para facturación del evento. La evidencia se presenta como anexo N°17 de este informe.

SE065 Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2"

- El 8 de abril de 2021 la interventoría remitió al Consorcio correo indicando que se sugería presentar la carpeta de cierre con el fin de avanzar en el proceso de revisión, mientras se recibían los documentos pendientes (aprobación documentos de las relatorías por parte del MEN). El 9 de abril de 2021, se recibió la carpeta de cierre del evento, el 12 de abril de 2021, la interventoría envió las observaciones correspondientes al Consorcio. El 26 de abril de 2021, el Consorcio remitió la carpeta subsanada, sin embargo, posterior a la revisión por parte de la interventoría el 27 de abril de 2021 se remitieron de nuevo observaciones que no fueron subsanadas y se sugirió realizar una mesa de trabajo para aclarar los pendientes y finalmente aprobar el cierre del evento y legalización del mismo. El Consorcio remitió la solicitud al MEN de la aprobación de la relatoría del 19 de marzo de 2021 para el webinario 2 y se recibió respuesta por parte del MEN el 29 de abril indicando "*Entendemos la situación, pero debido al tiempo actual que afronta el país en temas de pandemia, nos hemos visto en la necesidad de atender otros procesos. En cuanto se tenga lista la revisión la enviamos*". La evidencia se presenta como anexo N°18 de este informe.

SE066 Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender

El 8 de abril de 2021 la interventoría recibió vía correo electrónico los enlaces del segundo grupo de videos remitidos por la Universidad Nacional de Colombia-UNAL. El 9 de abril de 2021 se remitió desde la interventoría archivo con las observaciones a los videos del segundo grupo programación 1 enlace drive. Así mismo, el Consorcio remitió los enlaces de los videos para validación de interventoría correspondiente a los enlaces YouTube.
El 16 de abril de 2021 se remitió el consolidado de observaciones a los videos del segundo grupo de la SE 066 ODT1 programación 1 y 2, de acuerdo con segundos enlaces Drive remitidos el 15 y 22 de abril de 2021, a fin de ser remitidas a la Universidad Nacional para los respectivos ajustes, las evidencias del envío de observaciones y el consolidado de las mismas se presenta como anexo N°19 de este informe.

A continuación, se relaciona lo evidenciado en el acompañamiento por parte del equipo de interventoría a la asesoría y/o grabación de los videos correspondientes a la programación 2 del 7 al 9 de abril de 2021 y 3 del 19 al 23 de abril de 2021.

N°	CONFERENCISTA	NOMBRE DEL VIDEO	FECHA ASESORIA Y/O GRABACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO ASESORIA Y/O GRABACIÓN INTERVENTORIA		
				SI	NO	OBSERVACIONES
1	James Valderrama Rengifo	Área de lenguaje en el marco del programa todos a aprender	4/04/2021	X		Se brindó asesoría sobre el uso de la plataforma OBS para la grabación de videos al tutor James Valderrama Rengifo, dicha asesoría duró 2 horas y 20 minutos y fue brindada por Juan Camilo Rojas de la UNAL. La asesoría contó con el acompañamiento de Solanyi Rocio Rodríguez Reyes por parte del Consorcio. Durante la asesoría se presentaron retrasos, ya que el equipo de cómputo del tutor presentaba continuas fallas ocasionando perdida de la señal, de acuerdo a la revisión que realizó la UNAL al mismo vía remota, se le informo al tutor que el equipo presentaba deficiencia de las memorias y el procesador para sostener varios archivos abiertos a la vez adicional a la mala señal de internet, por lo cual se le sugirió para la grabación del video agendar la cita a través del MEN para el lunes 12 de abril de 2021 y hacer la grabación vía remota a través de los equipos de la UNAL.
2	Álvaro Montero Escobar	Liderazgo y Cambio Escolar	Grabación individual		X	No se requirió asesoría para la grabación esta se hará a través de la aplicación OBS. El video será enviado a GITEI para su edición el 8 de abril de 2020.
3	Maribel Betancur Cortés	El enfoque de la evaluación formativa	Grabación individual		X	No se requirió asesoría para la grabación y esta se hará a través de la aplicación OBS.

Tabla 1-2 consolidado acompañamiento grabaciones SE066 ODT1

SE067 Programa de formación para directivos docentes La Voz De Los Directivos Docentes PTA

- La interventoría recibió por parte del MEN la solicitud SE 067 el 19 de abril de 2021, cuyo objetivo es *ofrecer espacios de formación sincrónica a los directivos docentes PTA para fortalecer sus competencias en liderazgo educativo e identificar oportunidades en el acompañamiento y mejoramiento de sus instituciones educativas en función de los aprendizajes de los estudiantes.* La interventoría realizó el mismo día observaciones, una vez se recibió en versión final la solicitud de evento (SE), el 21 de abril de 2021 la interventoría remitió al Consorcio mediante correo electrónico con consecutivo P143-MEN-1247901-00279-2021 la notificación de la SE, se recibió del Consorcio el cuadro comparativo con cotizaciones, una vez revisadas por la interventoría, se enviaron observaciones iniciales.
  El día 22 de abril de 2021, el Consorcio preguntó si se requería del micrositio para los dos días, la interventoría remitió la consulta al MEN y el mismo viernes 22 de abril de 2021 respondió que solo

requería el micrositio para la primera sesión, para la segunda sesión tal como se especifica en la SE no se requiere de micrositio porque corresponde a un espacio de retroalimentación de la primera sesión.
El día viernes 23 de abril de 2021 se recibieron las cotizaciones ajustadas de acuerdo a las observaciones presentadas por parte de la interventoría, una vez revisadas se aprueban los ítems paquete gráfico e invitaciones, sin embargo, luego de la validación de las cotizaciones presentadas para los demás ítems, se evidenció el día lunes 26 de abril de 2021 que estas no correspondían a precios de mercado, por lo anterior, se requirió al Consorcio revisarlas y ajustarlas, el martes 27 de abril se convocó a reunión al Consorcio para el 28 de abril de 2021 en la que se concertó con el Consorcio la revisión de las cotizaciones, el mismo día, se recibieron ajustadas a precios de mercado y una vez validadas por la interventoría se aprobó el cuadro comparativo y presupuesto.
El día 28 de abril de 2021 se realizaron las pruebas de la primera sesión y se recibió en interventoría por parte del MEN, la modificación de la fecha de la segunda sesión del evento, la cual quedó para el 10 de mayo de 2021.
El 30 de abril de 2021, el Consorcio indicó que el proveedor seleccionado daría sin costo el micrositio para la segunda sesión de evento programada para el 10 de mayo de 2021. Por su parte, la interventoría aclaró que el micrositio, ya había sido costeado para su ejecución a lo largo de todo el evento, en ese sentido, la activación o no de algunos de sus servicios tales como la encuesta, el registro o cualquier otro servicio, no debe generar costos, dado que tecnológicamente los recursos del micrositio debían ser funcionales para cuando fueran requeridos. La evidencia se presenta como anexo N°20 de este informe.

SE068 Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3, 4 y 5"

- El 27 de abril de 2021 la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud cuyo objetivo es *"enriquecer la reflexión para cuestionar y profundizar visiones y conocimientos que se traduzcan en unas prácticas con propósitos de aprendizaje más claros y con juicios basados en evidencias más tangibles.",* la interventoría remitió observaciones a la SE, una vez se recibió la versión final por parte del MEN el 30 de abril de 2021, la interventoría remitió al Consorcio la notificación de la SE para remisión de cuadro comparativo soportado con cotizaciones. La evidencia se presenta como anexo N°21 de este informe.

SE069 Eventos formativos contacto maestro

- El 30 de abril de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud cuyo objetivo es "*eventos formativos para la transformación educativa en el marco de la presencialidad con Alternancia y del aprendizaje en Casa, con el fin de poder divulgar las prácticas innovadoras de docentes para hacer posible la presencialidad con alternancia y destacar los retos y desafíos del docente de hoy frente a las oportunidades del sector educativo en desarrollo de la presencialidad con alternancia".* Al corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la interventoría. La evidencia se presenta como anexo N°22 de este informe.

SE070 Conéctate con el MEN-4

- El 30 de abril de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud de evento, cuyo objetivo es "*Generar un espacio de reflexión en relación a los temas de educación de los estudiantes de los docentes y del regreso a clases".* Al corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de interventoría. La evidencia se presenta como anexo N°23 de este informe.

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades en el componente financiero y contable:

- El 8 de abril de 2021, la interventoría recibió del Consorcio el certificado de proveedores correspondiente al mes de marzo de 2021, la interventoría dio respuesta al correo, enviando observaciones para el ajuste correspondiente. El 16 de abril de 2021 se recibieron los ajustes y respuesta por parte del Consorcio, el mismo día la interventoría remitió nuevamente observaciones y al final del día se remitió nuevamente por parte del Consorcio el documento ajustado. El 19 de abril de 2021, la interventoría emitió concepto de aprobación del informe de proveedores correspondiente al mes de marzo de 2021. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°24 de este informe.

- Teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda Nacional realizó la implementación de la validación de la facturación electrónica que emiten todos los proveedores de las entidades del nivel central incluido el Ministerio de Educación Nacional, a través de la plataforma OLIMPIA IT. El MEN convocó a capacitación a todos los supervisores e interventores que tuvieran bajo su responsabilidad aprobar pagos los días 14 de abril 2021 y 19- de abril 2021, con la finalidad de entregar instrucciones al respecto sobre los cambios de este procedimiento.

- Así mismo, la interventoría replicó la información socializada en las capacitaciones del MEN sobre la implementación realizada por parte del Ministerio de Hacienda al operador logístico mitigando o evitando traumatismos sobre la facturación del proyecto que tiene relación directa con el flujo de caja del mismo. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°8 de este informe.

- El 30 de abril de 2021, con consecutivo de correo electrónico P143-MEN-1247901-00282-2021 la interventoría remitió al MEN la programación del PAC mes de junio 2021, con los cálculos proyectados sobre la liquidación de pagos del contrato de operación logística o de los proveedores del mismo. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°25 de este informe.

- El 30 de abril de 2021, con consecutivo de correo electrónico P143-MEN-1247901-00283-2021 la interventoría remitió al MEN la solicitud de los reportes SIIF con corte al mes de abril de 2021, lo anterior, con el fin de que la interventoría controle los pagos radicados del contrato de operación logística de manera mensualizada con la matriz financiera. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°26 de este informe.

1.4 COMPONENTE JURÍDICO

Para el mes de abril de 2021, desde el componente jurídico la interventoría brindó apoyo en las validaciones de las solicitudes en el marco del contrato de operación logística e interventoría.

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de operación logística.

Aspectos contractuales relevantes.

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Razón social Operador Logístico	CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021 (CLM) Nit: 901.351.562-1
Integrantes del Consorcio	Consultoría Estratégica Integral S.A. Nit. 811.042.842-7, Nader Palis Zaquille María Nit. 52.249.157-7, Eventos Y Protocolo Empresarial S.A.S. Nit.900.369.179-9 Prime Producciones S.A Nit.900.062.666-5
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II para el proceso de selección LP-MEN-09-2019, adjudicada mediante acto administrativo No. 16704 del 26 de diciembre de 2019.
Contrato No.	CO1.PCCNTR. 1247601 DE 2019.
Plazo	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor	El valor del contrato corresponde a la suma de: de **TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($37.823.130.189),** incluido IVA y todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista, distribuidos por vigencia de la siguiente forma: ➢ **Vigencia 2019**: CIEN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($100.723.492) IVA incluido. ➢ **Vigencia 2020**: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($17.143.230.210) IVA Incluido. ➢ **Vigencia 2021**: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($20.579.176.487) IVA Incluido. **Pago de equipo Base** El contrato de operación logística describe el valor del equipo base como se relaciona a

<table>
<tr><th colspan="2">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td></td><td>
continuación, de acuerdo con los valores definidos en el estudio de mercado, así:
El valor Mensual a pagarse en cada vigencia será:
<table>
<tr><th>Vigencia</th><th>Equipo Base</th><th>IVA equipo Base</th><th>Total, equipo base</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>$68.972.522</td><td>$13.104.779</td><td>$82.077.301</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>$856.638.723</td><td>$162.761.357</td><td>$1.019.400.081</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>$884.051.162</td><td>$167.969.721</td><td>$ 1.052.020.883</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>EVENTOS</th><th>EQUIPO BASE</th><th>IVA EQUIPO BASE</th><th>TOTAL EQUIPO BASE</th><th>VALOR TOTAL POR VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>18.646.191</td><td>68.972.522</td><td>13.104.779</td><td>82.077.301</td><td>100.723.492</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>16.123.830.129</td><td>856.638.723</td><td>162.761.357</td><td>1.019.400.081</td><td>17.143.230.210</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>19.527.155.604</td><td>884.051.162</td><td>167.969.721</td><td>1.052.020.883</td><td>20.579.176.487</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>37.823.130.189</td></tr>
</table>
La presente distribución de los recursos por cada vigencia.

2019: $82.077.301
2020: $84.950.007
2021: $87.668.407
</td></tr>
<tr><td>Valor total del contrato después de modificaciones</td><td>
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>VALOR CONTRATO INICIAL</th><th>MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL</th><th>MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL</th><th>VALOR FINAL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>100.723.492</td><td>95.251.672</td><td>0</td><td>5.471.820</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>17.143.230.210</td><td>5.100.000.000</td><td>5.000.000.0000</td><td>7.043.230.210</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>20.579.176.487</td><td>0</td><td>0</td><td>20.579.176.487</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL</td><td>37.823.130.189</td><td>5.195.251.672</td><td>5.000.000.0000</td><td>27.627.878.517</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Disponibilidad Presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th>Reserva presupuestal año</th><th>Unidad Ejec.</th><th colspan="2">Dependencia Presupuestal</th><th>N° RP</th><th>Recurso</th><th>Situación</th><th>Rubro Presupuestal</th><th>Uso Presupuestal</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>22/01/2001</td><td>10</td><td>Calidad PTA</td><td>3920</td><td>11</td><td>CSF</td><td>C-2201-0700-18-0-2201074-02</td><td>A-02-02-02-008-003-09</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>22/01/2001</td><td>10</td><td>Calidad PTA</td><td>3921</td><td>11</td><td>CSF</td><td>C-2201-0700-18-0-2201074-02</td><td>A-02-02-02-008-003-09</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio</td><td>27 de diciembre de 2019</td></tr>
</table>

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Modificaciones/adiciones	**Modificación No. 1 del 27 de abril 2020**: • Se modificaron las obligaciones generales del Contrato No. 10, 11, 12, 13,28, y 30 en el sentido de ajustar algunas expresiones de las obligaciones. • Se modificaron las obligaciones específicas del contrato en cuanto se traslada parágrafo contenido en las obligaciones relativas a la calidad del servicio a las obligaciones relativas al personal del contratista. • Se modificaron las obligaciones relativas al catering. • Se modificaron las obligaciones relativas al transporte y alojamiento de los asistentes Nos. 57, 62, 64 y 65. • Se modificaron las obligaciones relativas al contrato y la supervisión. • Se modificaron las obligaciones 34 y 36 relativas a la logística de los eventos.
	Modificación No. 2 del 20 de octubre de 2020: • Reducir el valor del contrato en la suma de Cinco Mil Millones De Pesos M/CTE. ($5.000.000.000) de los recursos del contrato para la vigencia 2020. • Incluir Nota en la obligación 23: • Modificaron la cláusula séptima -Forma de pago: Durante los meses de octubre a diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021 el MEN reconocerá y pagará el valor fijo mensual estimado de $ 21.667.127 incluido IVA por concepto de gastos administrativos. • Pago de gastos reembolsables: respecto al valor de gastos reembolsables no incluidos en la propuesta económica, el contratista es el responsable de suministrar por los servicios de operación logística y realizar las contrataciones que para ello se requieran.

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística
Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247601 de 2019

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- El Consorcio remitió a la interventoría las actas de devolución de materiales de las SE03 a la SE 014 que fueron canceladas, indicando que las mismas habían sido ajustadas de acuerdo a las observaciones remitidas en el mes de marzo, una vez revisadas por la interventoría se evidenció que se realizaron los ajustes solicitados y las actas fueron aceptadas. La evidencia se presenta como anexo N°27 de este informe.

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio

En el mes de abril de 2021 el Consorcio participó en las siguientes reuniones convocadas por la interventoría y/o el MEN, cuyas actas se presentan en el anexo N°28 de este informe.

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
5 de abril de 2021	099	Revisión solicitud SE066.	MEN-SCAIN-CLM
19 de abril de 2021	100	Socialización requerimientos SE067.	MEN-SCAIN-CLM
22 de abril de 2021	101	Socialización requerimientos SE068.	MEN-SCAIN-CLM
28 de abril de 2021	102	Revisión de las cotizaciones remitidas a la interventoría por el consorcio de la solicitud SE067	MEN-SCAIN-CLM
30 de abril de 2021	103	Socialización requerimientos SE069 y SE070	MEN-SCAIN-CLM

Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO
Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

- El 7 de abril de 2021 la interventoría recibió por parte del Consorcio el informe de febrero de 2021, ajustado de acuerdo con segundas observaciones, una vez revisado, se remitió al Consorcio mediante correo electrónico con consecutivo P143-CLMEN-1247601-00266-2021 las terceras observaciones de interventoría informe febrero 2021. El 12 de abril de 2021, el Consorcio remitió nuevamente el informe con los ajustes requeridos, finalmente el 14 de abril de 2021 desde la interventoría se remitió aprobación del informe y sus anexos. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°29 del presente informe.

- El 12 de abril de 2021 la interventoría recibió por parte del Consorcio el informe de marzo de 2021, una vez revisado se remitió el 19 de abril al Consorcio mediante correo electrónico con consecutivo P143-CLMEN-1247601-00278-2021 las observaciones al informe, el Consorcio dio respuesta el 23 de abril de 2021 enviando el informe y la interventoría el 27 de abril de 2021 remitió segundas observaciones al informe, finalmente el 30 de abril de 2021 el Consorcio nuevamente envió el informe con los ajustes requeridos, el cual al corte del presente informe se encuentra en revisión de la interventoría. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°30 del presente informe.

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

La gestión del Consorcio se describió en el componente técnico del informe del contrato de interventoría en el que se relacionan de cada solicitud de evento la completitud de información generada, respecto al desarrollo de cada evento por parte del Consorcio.

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

A continuación, se relacionan los eventos gestionados por el operador logístico durante el mes de abril de 2021:

Solc Event (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total Conv.	Total Asist	Valor Presupuesto aprobado	Valor Total Facturado	Estado del Evento
67	P143 -MEN-1247901-00279-2021	Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA	Bogotá	20/04/2021	18/05/2021	4500	510	$ 38.203.212	$ -	En ejecución

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico
Fuente: control interventoría

Nota: El evento tiene programadas 2 sesiones una en abril y la siguiente en mayo de 2021, el reporte Total Asistentes corresponde al mayor número de asistentes conectados en la primera sesión.

2.2.2 Valores Agregados Operador.

De acuerdo con la propuesta del Consorcio de valores agregados como unidades ofertadas de diferentes Ítems, se describen a continuación las cantidades usadas en 2020 y 2021 así como, los saldos al corte del presente informe.

Concepto	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO
Cantidades Ofrecidas	400	400	400	400	400	100
Cantidades Usadas 2020	6	3	2	1	2	1
Cantidades Usadas 2021	1	1	0	0	0	0
Saldos	393	396	398	399	398	99

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021
Fuente: propuesta técnica aprobada

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Al corte del presente informe se presenta el seguimiento y control de las cifras de ejecución presupuestal y financiera del contrato de operación logística, de la cual la interventoría realiza esta gestión y como soporte de lo anterior se evidencia la Matriz Financiera al corte de abril anexo No. 31 del presente informe.

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN

A continuación, se presenta la información relacionada con la radicación de cuentas del contrato de operación logística al corte del presente informe.

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la facturación generada por el Consorcio durante el mes de abril de 2021, la cual el MEN tramitó y pago con los costos relacionados:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
16vo Pago por concepto de personal del mes de marzo de 2021	21/04/2021	21/04/2021	$ 87.668.407	2021-IE-016153 / 21/04/2021	90408421 / 27/04/2021
Costos Directos evento SE 056	22/04/2021	22/04/2021	$ 35.181.069	2021-IE-016893 / 23/04/2021	94414721 / 27/04/2021
Comisión evento SE 056	22/04/2021	22/04/2021	$ 4.716.558	2021-IE-016900 / 23/04/2021	92388421 / 28/04/2021
Gastos reembolsables evento SE 056	22/04/2021	22/04/2021	$ 104.314.651	2021-IE-016896 / 23/04/2021	92332921 / 28/04/2021
Gastos reembolsables evento SE 064	28/04/2021	29/04/2021	$ 129.341.100	POR INFORMAR	PENDIENTE DE PAGO
Comisión evento SE 064	28/04/2021	29/04/2021	$ 5.561.667	POR INFORMAR	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL			**$ 366.783.452**		

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe
Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.

El Consorcio generó la facturación del equipo base atendiendo la forma de pago del contrato, los soportes se pueden evidenciar en el anexo N°01 del presente informe y el resumen de la facturación por este concepto, se relaciona a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
16vo Pago por concepto de personal del mes de marzo de 2021	21/04/2021	21/04/2021	$ 87.668.407	2021-IE-016153 / 21/04/2021	90408421 / 27/04/2021
TOTAL			**$ 87.668.407**		

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio
Fuente: Información tomada de la factura

2.3.1.1.2 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.

El Consorcio generó la facturación de la comisión de costos reembolsables de las solicitudes de los siguientes eventos:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Comisión evento SE 056	22/04/2021	22/04/2021	$ 4.716.558	2021-IE-016900 / 23/04/2021	92388421 / 28/04/2021
Comisión evento SE 064	28/04/2021	29/04/2021	$ 5.561.667	POR INFORMAR	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL			**$ 10.278.225**		

Tabla 2-7 Relación comisiones sobre costos reembolsables
Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.3 Costos Reembolsables

El Consorcio generó la facturación de los gastos reembolsables de las siguientes solicitudes de eventos:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Gastos reembolsables evento SE 056	22/04/2021	22/04/2021	$ 104.314.651	2021-IE-016896 / 23/04/2021	92332921 / 28/04/2021
Gastos reembolsables evento SE 064	28/04/2021	29/04/2021	$ 129.341.100	POR INFORMAR	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL			**$ 233.655.751**		

Tabla 2-8 Relación costos reembolsables
Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.4 Costos directos

El Consorcio generó la facturación de los costos directos de las siguientes solicitudes de eventos:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Costos Directos evento SE 056	22/04/2021	22/04/2021	$ 35.181.069	2021-IE-016893 / 23/04/2021	94414721 / 27/04/2021
TOTAL			**$ 35.181.069**		

Tabla 2-9 Relación costos directo
Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución del contrato de operación logística al corte del presente informe:

VIGENCIA	VALOR RP	EJECUTADO	SALDO	CONCEPTO
2019	$ 5.471.820	$ 5.471.820	$ 0	Equipo base dic 2019
2020	$ 7.043.230.210	$ 6.862.881.000	$ 180.349.210	Equipo base ene a dic 2020 Gastos administrativos oct a dic 2020 Pago de los eventos SE 001 a la SE, SE 018 a la SE 055
2021	$ 20.579.176.487	$ 607.847.217	$ 19.971.329.270	Equipo base de ene a mar 2021 Gastos administrativos ene y feb 2021 Eventos SE 057, SE 059 a la SE 065
TOTAL RECURSOS INICIALES	**$ 27.627.878.517**	**$ 7.476.200.037**	**$ 20.151.678.480**	

Tabla 2-10 Control Presupuestal por vigencias
Fuente: Información tomada del Contrato Consorcio

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de operación logística a corte del presente informe, lo cual no ha tenido novedades al respecto:

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	$ 100.723.492	$ 95.251.672	$ 0	$ 5.471.820
2020	$ 17.143.230.210	$ 5.100.000.000	$ 5.000.000.0000	$ 7.043.230.210
2021	$ 20.579.176.487	$ 0	$ 0	$ 20.579.176.487
VALOR TOTAL	**$ 37.823.130.189**	**$ 5.195.251.672**	**$ 5.000.000.0000**	**$ 27.627.878.517**

Tabla 2-11 Contrato incluidas modificaciones presupuestales
Fuente: Modificación No. 1 y 2 contrato operador logístico

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.

Se presenta la ejecución financiera y presupuestal consolidada del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	* TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL DISPONIBLE	% DISPONIBLE
2019	$ 5.471.820	$ 5.471.820	$ 0	$ 0	0,00%
2020	$ 7.043.230.210	$ 6.862.881.000	$ 0	$ 180.349.210	2,56%
2021	$ 20.579.176.487	$ 607.847.217	$ 1.027.647.378	$ 18.943.681.892	92,10%
TOTAL	**$ 27.627.878.517**	**$ 7.476.200.037**	**$ 1.027.647.378**	**$ 19.124.031.102**	**69,22%**

Tabla 2-12 Control Presupuestal por vigencias
Fuente: Información matriz financiera de Interventoría abril 30 de 2021
** Presupuesto aprobado de la SE 066 a la SE 70*

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.

Al corte de este informe se reporta el valor total comprometido del contrato de operación logística para la vigencia 2021:

VIGENCIA	EVENTOS	COMISIÓN	EQUIPO BASE	TOTAL
2021	$ 221.090.137	$ 17.541.578	$ 789.015.663	$ 1.027.647.378
TOTAL COMPROMETIDO	**$ 221.090.137**	**$ 17.541.578**	**$ 789.015.663**	**$ 1.027.647.378**

Tabla 2-13 Recursos comprometidos
Fuente: Información matriz financiera de Interventoría abril 30 de 2021
** Presupuesto aprobado de la SE 066 a la SE 70*

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico

La Interventoría realizó seguimiento y control sobre los términos y condiciones de las negociaciones y el pago de proveedores del operador logístico, este control se realiza por cada solicitud de evento mensualmente a través del informe presentado por el operador logístico.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las comunicaciones emitidas por el Consorcio y la interventoría, en referencia al informe de pago de proveedores al corte de 31 de marzo de 2021:

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
8/04/2021	P143 -CLMEN-1247601-00275-2021	Oficio	Radicado inicial Informe de proveedores corte marzo 31 de 2021	Interventoría
13/04/2021	P143 -CLMEN-1247601-00275-2021	Correo	Observaciones 1 al Informe de proveedores corte marzo 31 de 2021	Consorcio Logística MEN

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
16/04/2021	P143 -CLMEN-1247601-00275-2021	Correo	Respuesta a las observaciones 1 al Informe de proveedores corte marzo 31 de 2021	Interventoría
16/04/2021	P143 -CLMEN-1247601-00275-2021	Correo	Observaciones 2 al Informe de proveedores corte marzo 31 de 2021	Consorcio Logística MEN
16/04/2021	P143 -CLMEN-1247601-00275-2021	Correo	Respuesta a las observaciones 2 al Informe de proveedores corte marzo 31 de 2021	Interventoría
19/04/2021	P143 -CLMEN-1247601-00275-2021	Correo	Concepto de conformidad al Informe de proveedores corte marzo 31 de 2021	Interventoría

Tabla 2-14 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 marzo 2021
Fuente: Información tomada del sistema de correspondencia de Interventoría

2.3.7 Programación del PAC.

Al corte del presente informe se programaron desde la Interventoría el PAC de junio de 2021 con consecutivo P143-MEN-1247901-00282-2021. Ver anexo No.25 programación PAC 2021 del presente informe:

NO.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLS ESTIMADOS	COMISIÓN 4,30% ESTIMADA	EQUIPO BASE MAYO 2021
65	Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2"	19/03/2021	$ 0	$ 87.272.624	$ 3.871.902	$87.668.407
66 ODT 1	Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender ODT 1	9/08/2021	$ 0	$ 43.967.200	$ 2.249.802	
64	Actividad para el mejoramiento del Ambiente Laboral	1/04/2021	$ 2.500.000	$ 0	$ 1.151.325	
103	Sesiones de liderazgo educativo para los 4.500 rectores de las instituciones educativas focalizadas por el PTA	25/04/2021	$ 2.500.000	$ 0	$ 1.151.325	
104	Sesiones de liderazgo educativo para los 4.500 rectores de las instituciones educativas focalizadas por el PTA	25/04/2021	$ 2.500.000	$ 0	$ 1.151.325	
TOTAL			**$ 7.500.000**	**$ 131.239.824**	**$ 9.575.679**	**$ 87.668.407**

Tabla 2-15 Programación por la Interventoría sobre el PAC junio 2021
Fuente: Información tomada formato programación PAC 2021

3 RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones.

4 RELACION DE ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
1	Equipo base CLM
2	Entrega Informes físicos CLM
3	Inf. Parcial de supervisión
4	Devolución de recursos CLM
5	Formato trámite pago
6	Informe Marzo SCAIN
7	Entrega Informes físicos SCAIN
8	Capacitación facturación electrónica
9	Modificación CLM
10	Reporte novedades trimestrales
11	Estructura Informe Final de interventoría
12	Evaluación servicio SCAIN
13	Tramite pago marzo SCAIN
14	Parafiscales
15	Matriz operativa
16	SE056
17	SE064
18	SE065
19	SE066
20	SE067
21	SE068
22	SE069
23	SE070
24	Certificado proveedores marzo
25	PAC
25	SIIF
26	Equipo Base
27	Actas Materiales SE Canceladas
28	Actas CLM-MEN-SCAIN
29	Informe febrero CLM
30	Informe marzo CLM
31	Matriz Financiera
32	Matriz Obligaciones
