

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**MANTENIMIENTO AWOS A NIVEL NACIONAL LOTE 2**	**306 días**	**dom 21/02/21**	**jue 23/12/21**
2		**PRIMER VISITA**	**306 días**	**dom 21/02/2**	**jue 23/12/21**
3		**BARRANQUILLA**	**9 días**	**dom 21/02/2**	**lun 1/03/21**
4		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	dom 21/02/2	dom 21/02/2
5		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	lun 22/02/21	lun 22/02/21
6		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	mar 23/02/21	mié 24/02/21
7		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**jue 25/02/21**	**lun 1/03/21**
8		Cambio de herrajes	3 días	jue 25/02/21	sáb 27/02/21
9		Verificación de sistema de tierras	1 día	jue 25/02/21	jue 25/02/21
10		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	jue 25/02/21	vie 26/02/21
11		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	jue 25/02/21	vie 26/02/21
12		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	sáb 27/02/21	dom 28/02/21
13		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	lun 1/03/21	lun 1/03/21
14		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	lun 1/03/21	lun 1/03/21

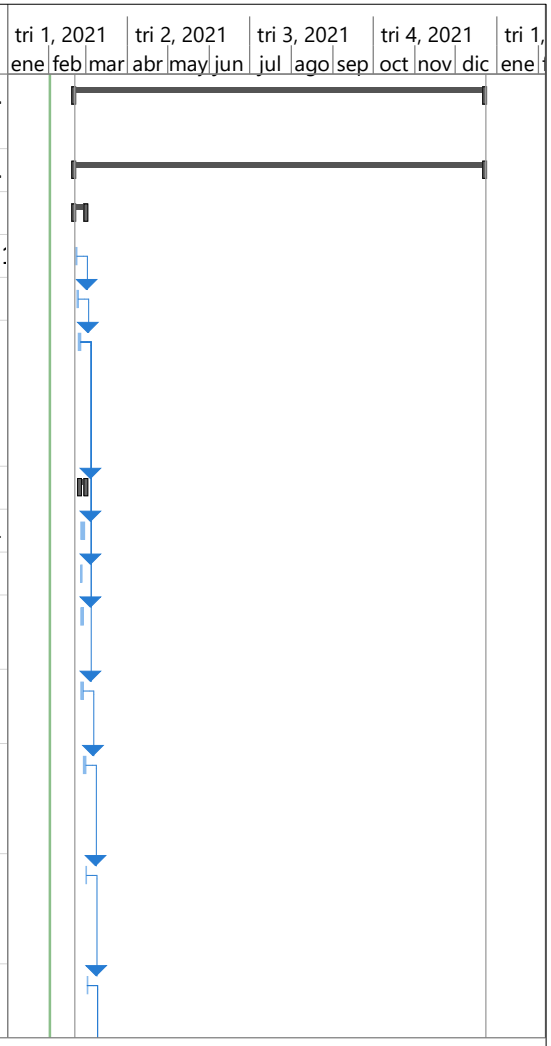

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
15		**CARTAGENA**	**9 días**	**mar 2/03/21**	**mié 10/03/21**
16		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	mar 2/03/21	mar 2/03/21
17		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	mié 3/03/21	mié 3/03/21
18		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	jue 4/03/21	vie 5/03/21
19		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**sáb 6/03/21**	**mié 10/03/21**
20		Cambio de herrajes	3 días	sáb 6/03/21	lun 8/03/21
21		Verificación de sistema de tierras	1 día	sáb 6/03/21	sáb 6/03/21
22		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	sáb 6/03/21	dom 7/03/21
23		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	sáb 6/03/21	dom 7/03/21
24		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	lun 8/03/21	mar 9/03/21
25		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	mié 10/03/21	mié 10/03/21
26		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	mié 10/03/21	mié 10/03/21
27		**SANTA MARTA**	**9 días**	**jue 11/03/21**	**vie 19/03/21**
28		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	jue 11/03/21	jue 11/03/21
29		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	vie 12/03/21	vie 12/03/21

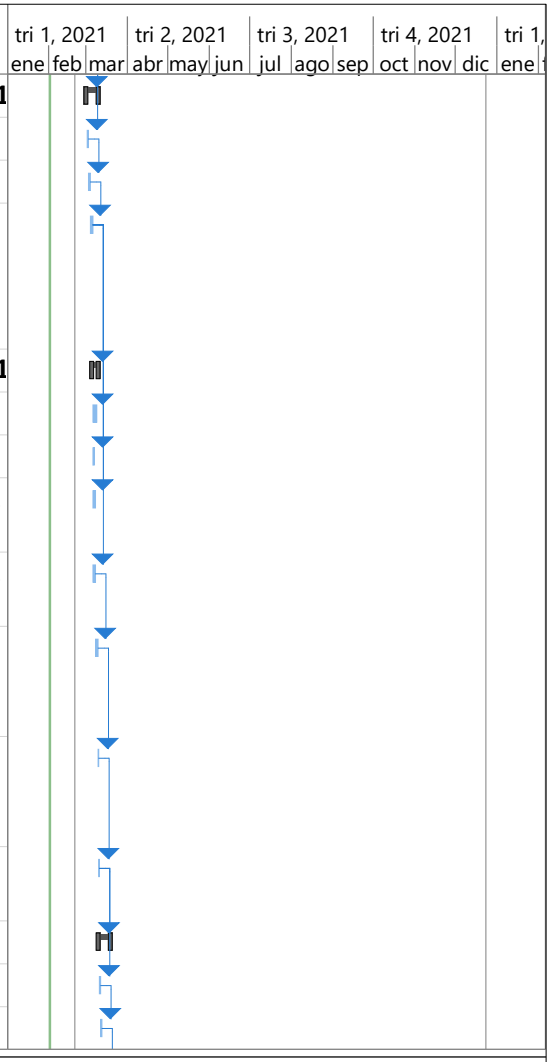

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
30		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	sáb 13/03/21	dom 14/03/21
31		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**lun 15/03/21**	**vie 19/03/21**
32		Cambio de herrajes	3 días	lun 15/03/21	mié 17/03/21
33		Verificación de sistema de tierras	1 día	lun 15/03/21	lun 15/03/21
34		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	lun 15/03/21	mar 16/03/21
35		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	lun 15/03/21	mar 16/03/21
36		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	mié 17/03/21	jue 18/03/21
37		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	vie 19/03/21	vie 19/03/21
38		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	vie 19/03/21	vie 19/03/21
39		**MONTERIA**	**9 días**	**sáb 20/03/21**	**dom 28/03/2**
40		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	sáb 20/03/21	sáb 20/03/21
41		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	dom 21/03/2	dom 21/03/2

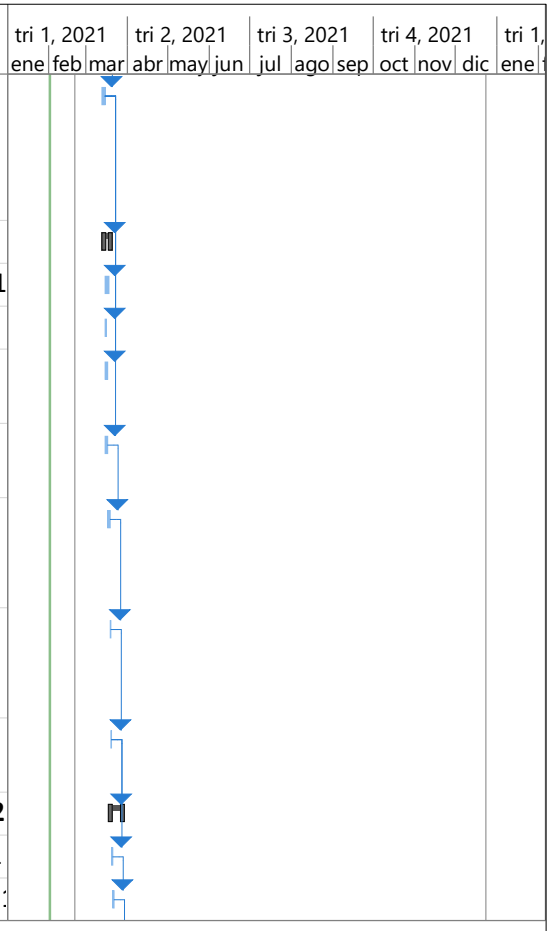

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
42		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	lun 22/03/21	mar 23/03/21
43		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**mié 24/03/21**	**dom 28/03/2**
44		Cambio de herrajes	3 días	mié 24/03/21	vie 26/03/21
45		Verificación de sistema de tierras	1 día	mié 24/03/21	mié 24/03/21
46		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	mié 24/03/21	jue 25/03/21
47		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	mié 24/03/21	jue 25/03/21
48		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	vie 26/03/21	sáb 27/03/21
49		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	dom 28/03/21	dom 28/03/21
50		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	dom 28/03/21	dom 28/03/21
51		**SAN ANDRES**	**9 días**	**lun 29/03/21**	**mar 6/04/21**
52		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	lun 29/03/21	lun 29/03/21
53		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	mar 30/03/21	mar 30/03/21

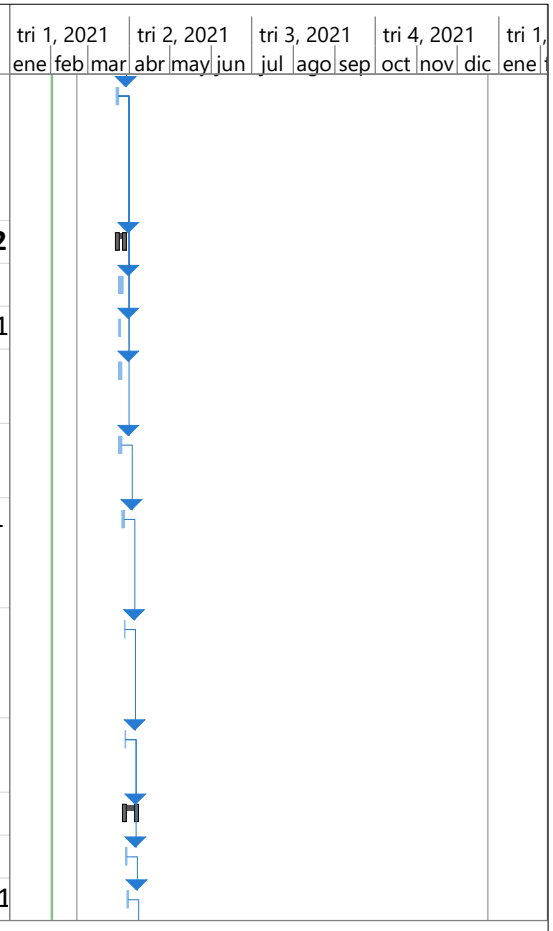

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
54		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	mié 31/03/21	jue 1/04/21
55		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**vie 2/04/21**	**mar 6/04/21**
56		Cambio de herrajes	3 días	vie 2/04/21	dom 4/04/21
57		Verificación de sistema de tierras	1 día	vie 2/04/21	vie 2/04/21
58		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	vie 2/04/21	sáb 3/04/21
59		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	vie 2/04/21	sáb 3/04/21
60		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	dom 4/04/21	lun 5/04/21
61		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	mar 6/04/21	mar 6/04/21
62		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	mar 6/04/21	mar 6/04/21
63		**QUIBDO**	**9 días**	**mié 7/04/21**	**jue 15/04/21**
64		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	mié 7/04/21	mié 7/04/21
65		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	jue 8/04/21	jue 8/04/21

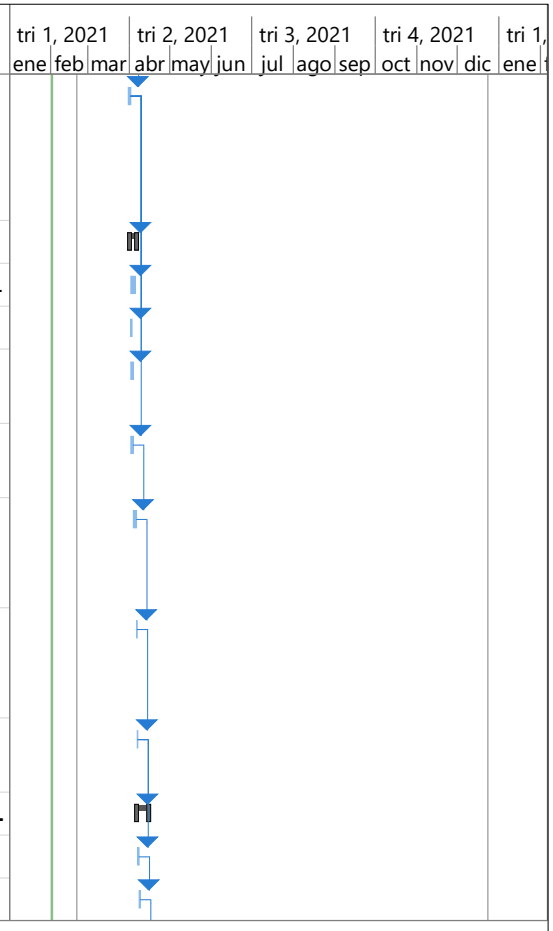

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
66		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	vie 9/04/21	sáb 10/04/21
67		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**dom 11/04/2**	**jue 15/04/21**
68		Cambio de herrajes	3 días	dom 11/04/2	mar 13/04/21
69		Verificación de sistema de tierras	1 día	dom 11/04/2	dom 11/04/2
70		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	dom 11/04/21	lun 12/04/21
71		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	dom 11/04/21	lun 12/04/21
72		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	mar 13/04/21	mié 14/04/21
73		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	jue 15/04/21	jue 15/04/21
74		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	jue 15/04/21	jue 15/04/21
75		**RIONEGRO**	**9 días**	**vie 16/04/21**	**sáb 24/04/21**
76		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	vie 16/04/21	vie 16/04/21
77		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	sáb 17/04/21	sáb 17/04/21

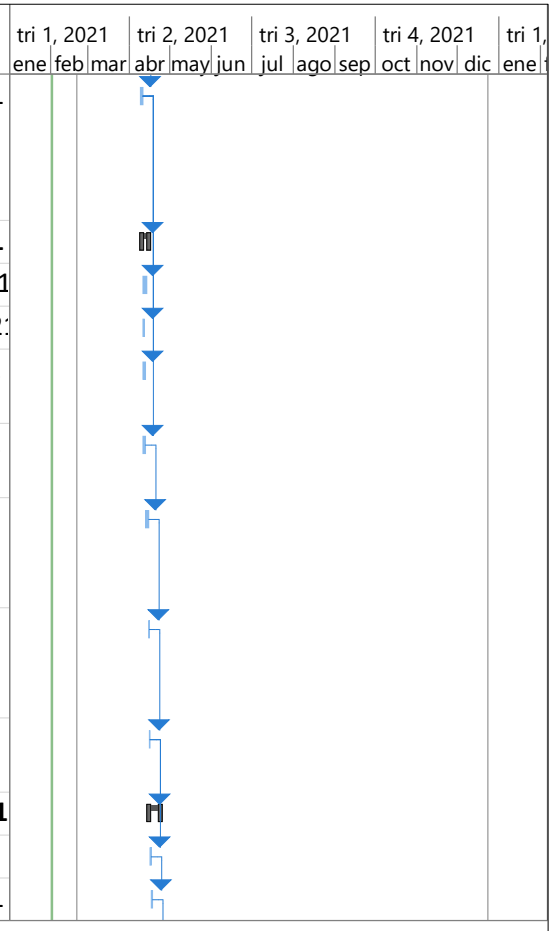

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
78		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	dom 18/04/21	lun 19/04/21
79		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**mar 20/04/21**	**sáb 24/04/21**
80		Cambio de herrajes	3 días	mar 20/04/21	jue 22/04/21
81		Verificación de sistema de tierras	1 día	mar 20/04/21	mar 20/04/21
82		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	mar 20/04/21	mié 21/04/21
83		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	mar 20/04/21	mié 21/04/21
84		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	jue 22/04/21	vie 23/04/21
85		Actualizacion MetConsole 3	2 días	jue 22/04/21	vie 23/04/21
86		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	sáb 24/04/21	sáb 24/04/21
87		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	sáb 24/04/21	sáb 24/04/21
88		**MANIZALES**	**9 días**	**dom 25/04/2**	**lun 3/05/21**
89		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	dom 25/04/2	dom 25/04/2
90		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	lun 26/04/21	lun 26/04/21

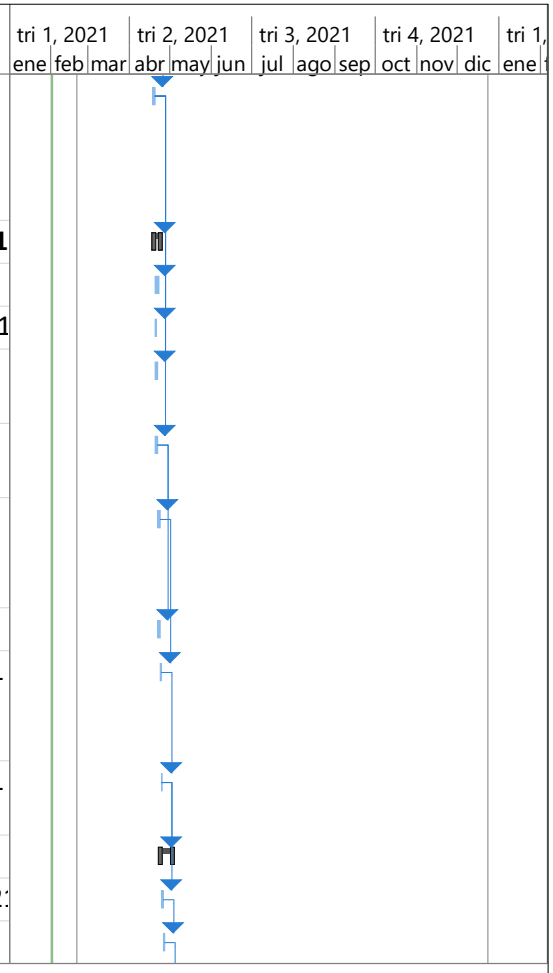

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
91		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	mar 27/04/21	mié 28/04/21
92		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**jue 29/04/21**	**lun 3/05/21**
93		Cambio de herrajes	3 días	jue 29/04/21	sáb 1/05/21
94		Verificación de sistema de tierras	1 día	jue 29/04/21	jue 29/04/21
95		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	jue 29/04/21	vie 30/04/21
96		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	jue 29/04/21	vie 30/04/21
97		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	sáb 1/05/21	dom 2/05/21
98		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	lun 3/05/21	lun 3/05/21
99		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	lun 3/05/21	lun 3/05/21
100		**PEREIRA**	**9 días**	**mar 4/05/21**	**mié 12/05/21**
101		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	mar 4/05/21	mar 4/05/21
102		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	mié 5/05/21	mié 5/05/21

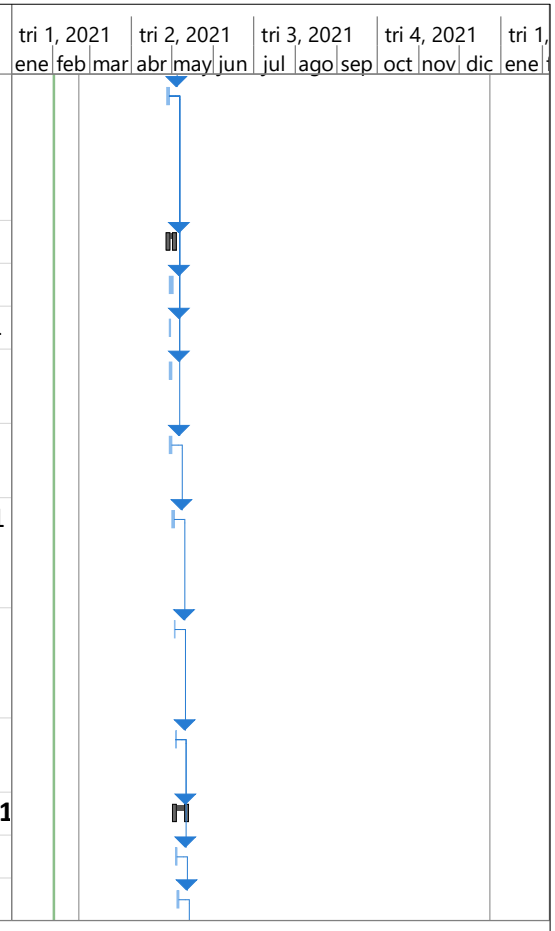

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
103		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	jue 6/05/21	vie 7/05/21
104		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**sáb 8/05/21**	**mié 12/05/21**
105		Cambio de herrajes	3 días	sáb 8/05/21	lun 10/05/21
106		Verificación de sistema de tierras	1 día	sáb 8/05/21	sáb 8/05/21
107		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	sáb 8/05/21	dom 9/05/21
108		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	sáb 8/05/21	dom 9/05/21
109		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	lun 10/05/21	mar 11/05/21
110		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	mié 12/05/21	mié 12/05/21
111		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	mié 12/05/21	mié 12/05/21
112		**CALI**	**9 días**	**jue 13/05/21**	**vie 21/05/21**
113		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	jue 13/05/21	jue 13/05/21
114		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	vie 14/05/21	vie 14/05/21

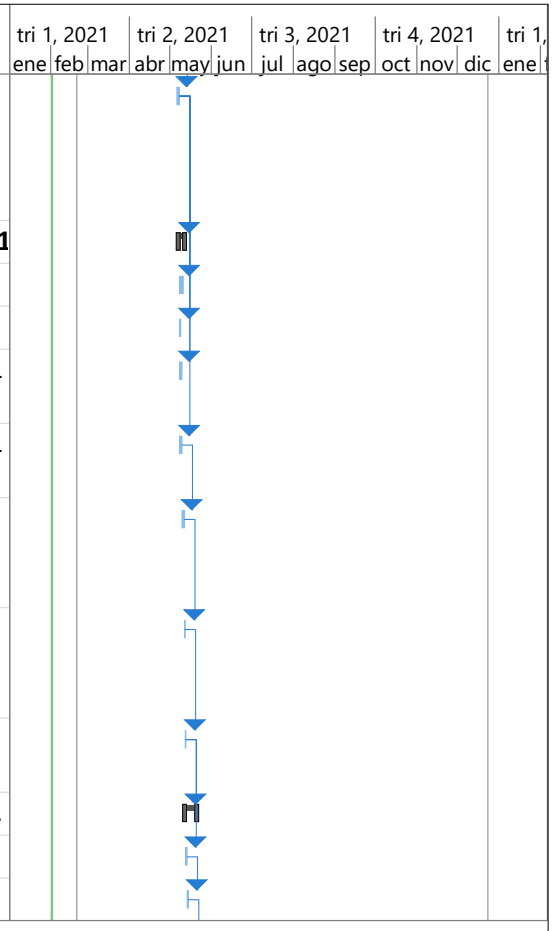

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
115		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	sáb 15/05/21	dom 16/05/21
116		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**lun 17/05/21**	**vie 21/05/21**
117		Cambio de herrajes	3 días	lun 17/05/21	mié 19/05/21
118		Verificación de sistema de tierras	1 día	lun 17/05/21	lun 17/05/21
119		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	lun 17/05/21	mar 18/05/21
120		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	lun 17/05/21	mar 18/05/21
121		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	mié 19/05/21	jue 20/05/21
122		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	vie 21/05/21	vie 21/05/21
123		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	vie 21/05/21	vie 21/05/21
124		**IPIALES**	**9 días**	**sáb 22/05/21**	**dom 30/05/2**
125		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	sáb 22/05/21	sáb 22/05/21
126		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	dom 23/05/2	dom 23/05/2

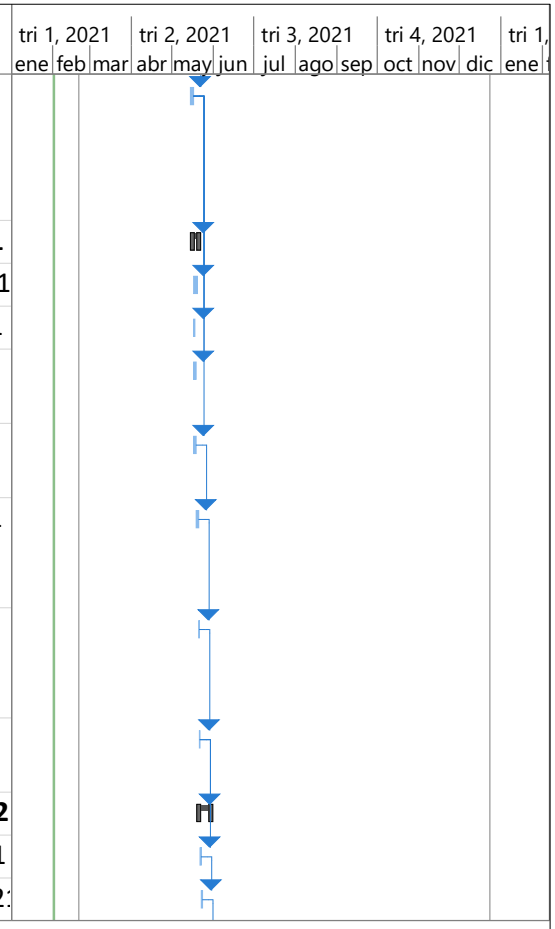

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
127		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	lun 24/05/21	mar 25/05/21
128		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**mié 26/05/21**	**dom 30/05/2**
129		Cambio de herrajes	3 días	mié 26/05/21	vie 28/05/21
130		Verificación de sistema de tierras	1 día	mié 26/05/21	mié 26/05/21
131		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	mié 26/05/21	jue 27/05/21
132		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	mié 26/05/21	jue 27/05/21
133		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	vie 28/05/21	sáb 29/05/21
134		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	dom 30/05/21	dom 30/05/21
135		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	dom 30/05/21	dom 30/05/21
136		**GUAPI**	**9 días**	**lun 31/05/21**	**mar 8/06/21**
137		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	lun 31/05/21	lun 31/05/21
138		Inspección de equipos e infraestructura	1 día	mar 1/06/21	mar 1/06/21

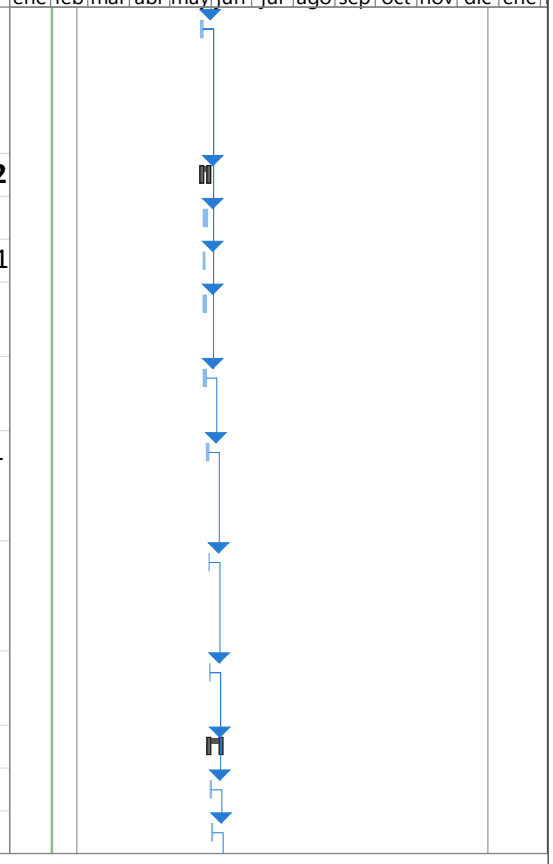

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
139		Inspección de sensores, radios, energía y equipos de cómputo. Con el fin de encontrar piezas averiadas y poner la respectiva orden de compra a sus	2 días	mié 2/06/21	jue 3/06/21
140		**Mantenimiento respectivo de la estación**	**5 días**	**vie 4/06/21**	**mar 8/06/21**
141		Cambio de herrajes	3 días	vie 4/06/21	dom 6/06/21
142		Verificación de sistema de tierras	1 día	vie 4/06/21	vie 4/06/21
143		Pintura de torres, cambio de pararrayos y limpieza a equipos	2 días	vie 4/06/21	sáb 5/06/21
144		Verificación de comunicaciones vía RF entre sensores y SCPIM	2 días	vie 4/06/21	sáb 5/06/21
145		Verificación de funcionamiento del Metconsole en servidores y estaciones de trabajo	2 días	dom 6/06/21	lun 7/06/21
146		Poner orden de compra de baterías para EMAS, estación de vientos, RVR y Ceilometro.	0,5 días	mar 8/06/21	mar 8/06/21
147		Poner orden de compra a Datum de los elementos Vaisala averiados.	0,5 días	mar 8/06/21	mar 8/06/21
148		ORDENES DE COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA SEGUNDA	90 días	mié 9/06/21	lun 6/09/21
149		**SEGUNDA VISITA**	**108 días**	**mar 7/09/21**	**jue 23/12/21**
150		**MONTERIA**	**9 días**	**mar 7/09/21**	**mié 15/09/21**
151		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	mar 7/09/21	mar 7/09/21

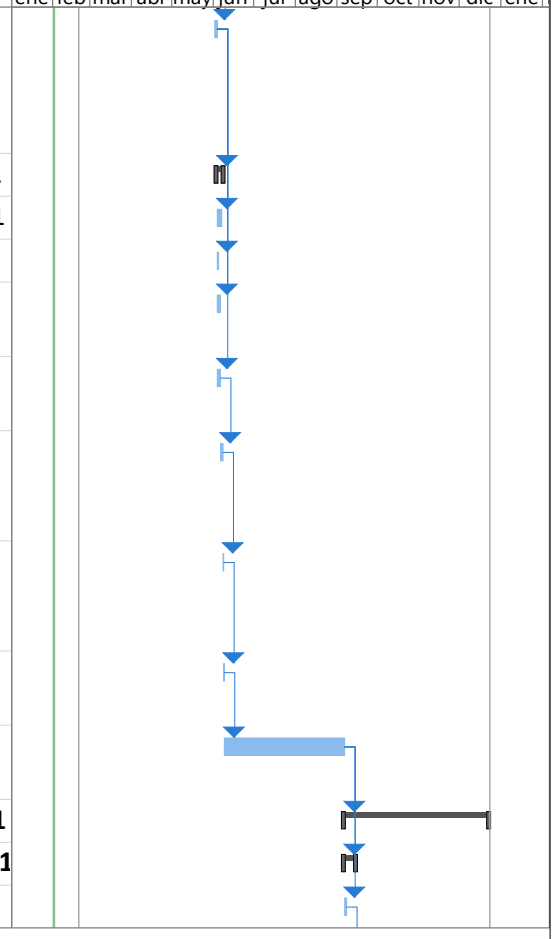

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
152		Instalación de elementos averiados incluyendo energías, radios y equipos de cómputo.	2 días	mié 8/09/21	jue 9/09/21
153		Calibración de sensores.	2 días	vie 10/09/21	sáb 11/09/21
154		Cambio de baterías para EMAS, estación de vientos y RVR o ceilometro según aplique.	1 día	dom 12/09/21	dom 12/09/21
155		Mantenimiento sistemas de cómputo en TWR, ACC, CNAP, Meteorología	1 día	lun 13/09/21	lun 13/09/21
156		Roseria.	1 día	mar 14/09/21	mar 14/09/21
157		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	mié 15/09/21	mié 15/09/21
158		**CARTAGENA**	**9 días**	**jue 16/09/21**	**vie 24/09/21**
159		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	jue 16/09/21	jue 16/09/21
160		Instalación de elementos averiados incluyendo energías, radios y equipos de cómputo.	2 días	vie 17/09/21	sáb 18/09/21
161		Calibración de sensores.	2 días	dom 19/09/2	lun 20/09/21
162		Cambio de baterías para EMAS, estación de vientos y RVR o ceilometro según aplique.	1 día	mar 21/09/21	mar 21/09/21
163		Mantenimiento sistemas de cómputo en TWR, ACC, CNAP, Meteorología	1 día	mié 22/09/21	mié 22/09/21
164		Roseria.	1 día	jue 23/09/21	jue 23/09/21
165		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	vie 24/09/21	vie 24/09/21
166		**BARRANQUILLA**	**9 días**	**sáb 25/09/21**	**dom 3/10/21**

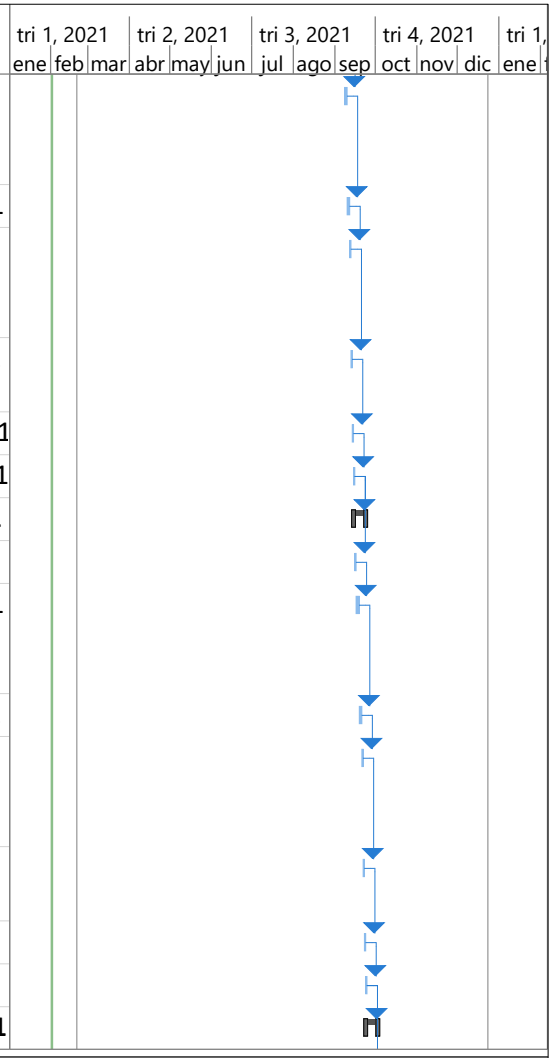

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
167		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	sáb 25/09/21	sáb 25/09/21
168		Instalación de elementos averiados inclu	2 días	dom 26/09/2	lun 27/09/21
169		Calibración de sensores.	2 días	mar 28/09/21	mié 29/09/21
170		Cambio de baterías para EMAS, estación	1 día	jue 30/09/21	jue 30/09/21
171		Mantenimiento sistemas de cómputo er	1 día	vie 1/10/21	vie 1/10/21
172		Roseria.	1 día	sáb 2/10/21	sáb 2/10/21
173		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	dom 3/10/21	dom 3/10/21
174		**SANTA MARTA**	**9 días**	**lun 4/10/21**	**mar 12/10/21**
175		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	lun 4/10/21	lun 4/10/21
176		Instalación de elementos averiados inclu	2 días	mar 5/10/21	mié 6/10/21
177		Calibración de sensores.	2 días	jue 7/10/21	vie 8/10/21
178		Cambio de baterías para EMAS, estación	1 día	sáb 9/10/21	sáb 9/10/21
179		Mantenimiento sistemas de cómputo er	1 día	dom 10/10/2	dom 10/10/2
180		Roseria.	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21
181		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	mar 12/10/21	mar 12/10/21
182		**SAN ANDRES**	**9 días**	**mié 13/10/21**	**jue 21/10/21**
183		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	mié 13/10/21	mié 13/10/21
184		Instalación de elementos averiados inclu	2 días	jue 14/10/21	vie 15/10/21
185		Calibración de sensores.	2 días	sáb 16/10/21	dom 17/10/2
186		Cambio de baterías para EMAS, estación	1 día	lun 18/10/21	lun 18/10/21
187		Mantenimiento sistemas de cómputo er	1 día	mar 19/10/21	mar 19/10/21
188		Roseria.	1 día	mié 20/10/21	mié 20/10/21

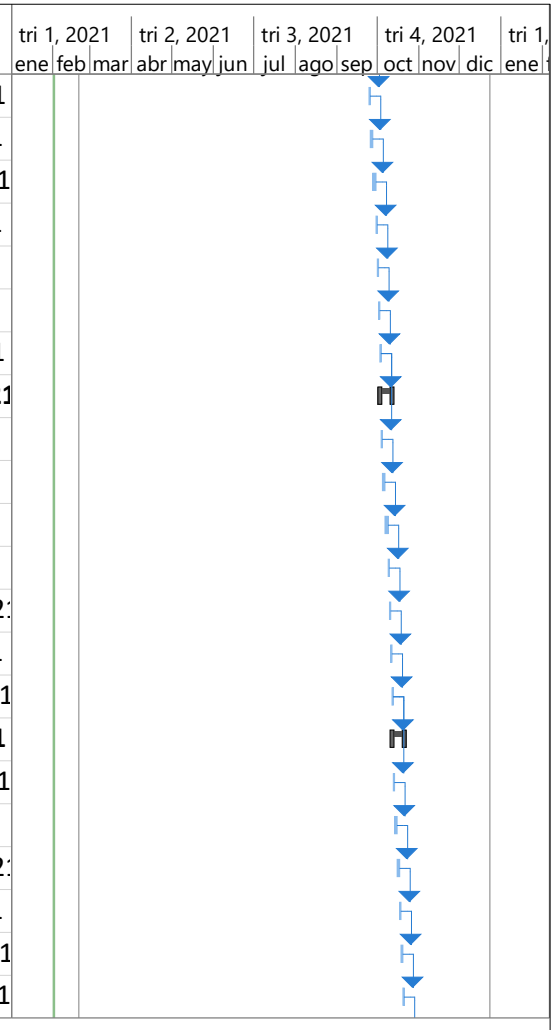

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
189		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	jue 21/10/21	jue 21/10/21
190		**QUIBDO**	**9 días**	**vie 22/10/21**	**sáb 30/10/21**
191		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	vie 22/10/21	vie 22/10/21
192		Instalación de elementos averiados inclu	2 días	sáb 23/10/21	dom 24/10/2
193		Calibración de sensores.	2 días	lun 25/10/21	mar 26/10/21
194		Cambio de baterías para EMAS, estación	1 día	mié 27/10/21	mié 27/10/21
195		Mantenimiento sistemas de cómputo er	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21
196		Roseria.	1 día	vie 29/10/21	vie 29/10/21
197		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	sáb 30/10/21	sáb 30/10/21
198		**RIONEGRO**	**9 días**	**dom 31/10/2**	**lun 8/11/21**
199		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	dom 31/10/2	dom 31/10/2
200		Instalación de elementos averiados inclu	2 días	lun 1/11/21	mar 2/11/21
201		Calibración de sensores.	2 días	mié 3/11/21	jue 4/11/21
202		Cambio de baterías para EMAS, estación	1 día	vie 5/11/21	vie 5/11/21
203		Mantenimiento sistemas de cómputo er	1 día	sáb 6/11/21	sáb 6/11/21
204		Roseria.	1 día	dom 7/11/21	dom 7/11/21
205		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	lun 8/11/21	lun 8/11/21
206		**MANIZALES**	**9 días**	**mar 9/11/21**	**mié 17/11/21**
207		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	mar 9/11/21	mar 9/11/21
208		Instalación de elementos averiados inclu	2 días	mié 10/11/21	jue 11/11/21
209		Calibración de sensores.	2 días	vie 12/11/21	sáb 13/11/21
210		Cambio de baterías para EMAS, estación	1 día	dom 14/11/2	dom 14/11/2

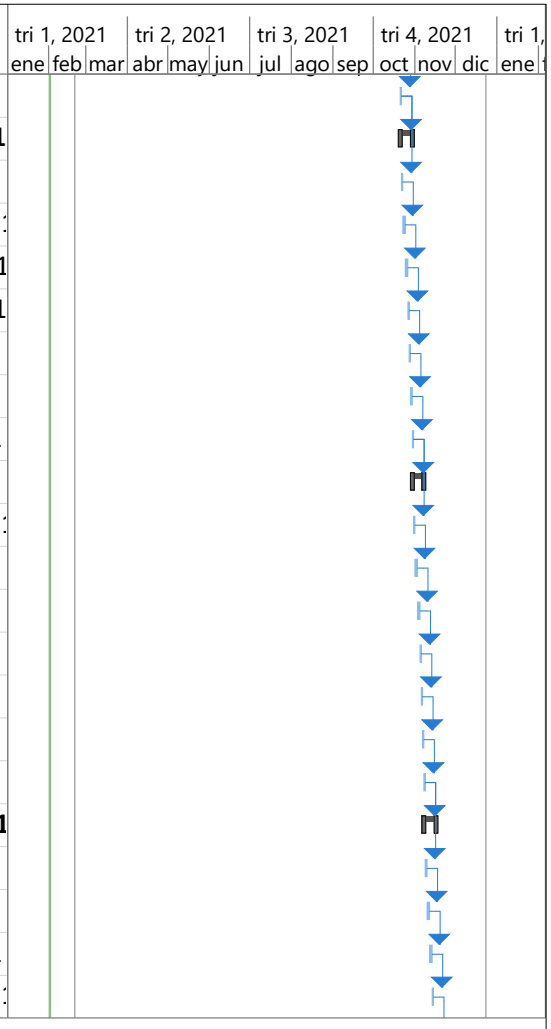

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
211		Mantenimiento sistemas de cómputo er	1 día	lun 15/11/21	lun 15/11/21
212		Roseria.	1 día	mar 16/11/21	mar 16/11/21
213		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	mié 17/11/21	mié 17/11/21
214		**PEREIRA**	**9 días**	**jue 18/11/21**	**vie 26/11/21**
215		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	jue 18/11/21	jue 18/11/21
216		Instalación de elementos averiados incluyendo energías, radios y equipos de cómputo.	2 días	vie 19/11/21	sáb 20/11/21
217		Calibración de sensores.	2 días	dom 21/11/2	lun 22/11/21
218		Cambio de baterías para EMAS, estación de vientos y RVR o ceilometro según aplique.	1 día	mar 23/11/21	mar 23/11/21
219		Mantenimiento sistemas de cómputo en TWR, ACC, CNAP, Meteorología	1 día	mié 24/11/21	mié 24/11/21
220		Roseria.	1 día	jue 25/11/21	jue 25/11/21
221		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	vie 26/11/21	vie 26/11/21
222		**CALI**	**9 días**	**sáb 27/11/21**	**dom 5/12/21**
223		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	sáb 27/11/21	sáb 27/11/21
224		Instalación de elementos averiados incluyendo energías, radios y equipos de cómputo.	2 días	dom 28/11/21	lun 29/11/21
225		Calibración de sensores.	2 días	mar 30/11/21	mié 1/12/21
226		Cambio de baterías para EMAS, estación	1 día	jue 2/12/21	jue 2/12/21
227		Mantenimiento sistemas de cómputo er	1 día	vie 3/12/21	vie 3/12/21

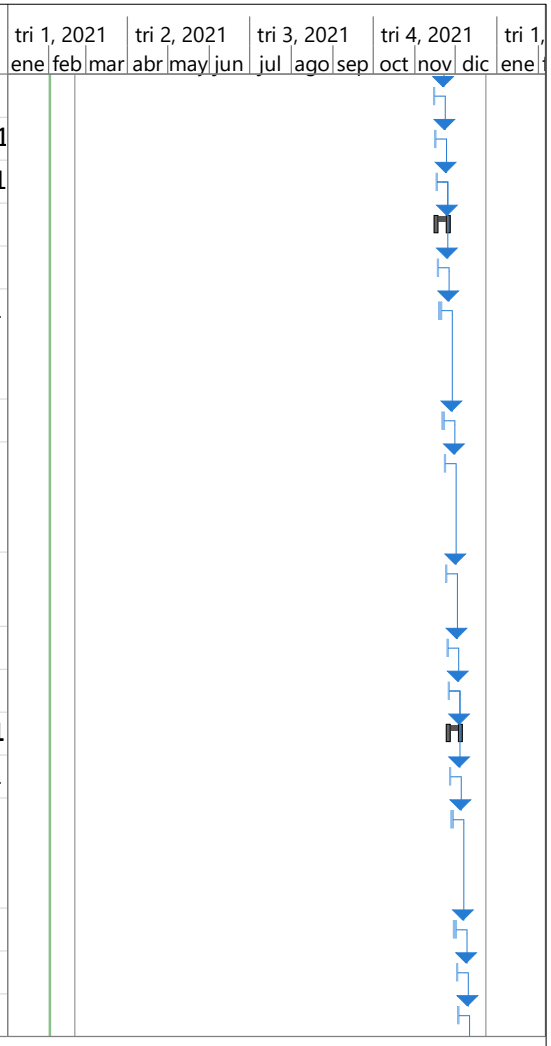

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
228		Roseria.	1 día	sáb 4/12/21	sáb 4/12/21
229		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	dom 5/12/21	dom 5/12/21
230		**IPIALES**	**9 días**	**lun 6/12/21**	**mar 14/12/21**
231		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	lun 6/12/21	lun 6/12/21
232		Instalación de elementos averiados incluyendo energías, radios y equipos de cómputo.	2 días	mar 7/12/21	mié 8/12/21
233		Calibración de sensores.	2 días	jue 9/12/21	vie 10/12/21
234		Cambio de baterías para EMAS, estación de vientos y RVR o ceilometro según aplique.	1 día	sáb 11/12/21	sáb 11/12/21
235		Mantenimiento sistemas de cómputo en TWR, ACC, CNAP, Meteorología	1 día	dom 12/12/21	dom 12/12/21
236		Roseria.	1 día	lun 13/12/21	lun 13/12/21
237		Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	mar 14/12/21	mar 14/12/21
238		**GUAPI**	**9 días**	**mié 15/12/21**	**jue 23/12/21**
239		Carnetizacion equipo de trabajo	1 día	mié 15/12/21	mié 15/12/21
240		Instalación de elementos averiados incluyendo energías, radios y equipos de cómputo.	2 días	jue 16/12/21	vie 17/12/21
241		Calibración de sensores.	2 días	sáb 18/12/21	dom 19/12/21
242		Cambio de baterías para EMAS, estación	1 día	lun 20/12/21	lun 20/12/21
243		Mantenimiento sistemas de cómputo er	1 día	mar 21/12/21	mar 21/12/21
244		Roseria.	1 día	mié 22/12/21	mié 22/12/21

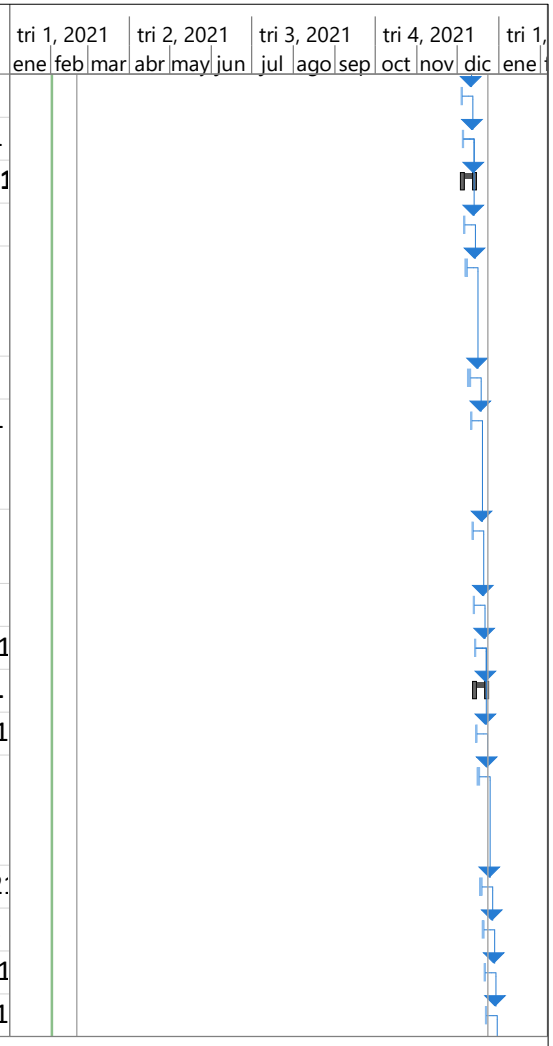

Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
245			Pruebas SAT con supervisor de Aerocivil	1 día	jue 23/12/21	jue 23/12/21



Proyecto: Cronograma manten
Fecha: mar 2/02/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	
