De:	grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A:	Edgar Gomez Rodriguez; Claudia Milena Toloza Patiño
Cc:	Notificacion Servicio Ciudadano; Sergio Samuel Jaimes Muñoz; Edgar Gomez Rodriguez; Claudia Milena Toloza Patiño; Claudia Patricia Cepeda Casta; Mauricio Javier Cuadros Rodriguez; Jasbleidy Ramírez Valencia; Edwin Yesidh Rios Contreras
Asunto:	CPE No. 9-2021-013833 - SOLICITUD PRÓRROGA EN TIEMPO CONTRATO NO 2529520
Fecha:	viernes, 23 de julio de 2021 16:31:19
Archivos adjuntos:	ATT00001.png C.E.(FRM) - 9-2021-013833-(68)-6895403 + SERGIO SAMUEL JAIMES MUÑOZ SOLICITU.html INFORME DE SUPERVISION PRORROGA DE TIEMPO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2021-0.pdf SOLICITUD PRORROGA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2021-02-210798 - 23-07-2021.pdf C.I.(FRM)-9-2021-013833-(68)----SOLICITUD PRÓRROGA EN TIEMPO CONTRATO NO 2529.html
Importancia:	Alta

Apreciado(a) Doctor(a) * SERGIO SAMUEL JAIMES MUÑOZ

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	**N.I.S.**	**Fecha**
9-2021-013833	2021-02-210798	23/07/2021 4:30:24 p. m.

Asunto	**Descripción del asunto**
SOLICITUDES	SOLICITUD PRÓRROGA EN TIEMPO CONTRATO NO 2529520

Cordial saludo Sergio:

Atendiendo lo establecido en el manual de contratación numeral 17.2 “Solicitud de modificación contractual”, se adjunta para el respectivo trámite de solicitud de adición en tiempo informe del supervisor que contiene el respectivo análisis:

Contrato No 2529520
Objeto: Compra de materiales de formación para el área de automatización del centro industrial y del desarrollo tecnológico vigencia 2021.

Valor del contrato: $5.000.000

Fecha de inicio: 25 de mayo de 2021
Fecha de finalización: 26 de julio de 2021
Prórroga: 12 días calendarios
Fecha nueva de finalización del contrato: 07 de agosto de 2021

Favor Anexar los documentos que se adjuntan en el presente

Atentamente,

Edgar Gomez Rodriguez
Subdirector de Centro

Atentamente,

SENA
Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Tienda Virtual De Electrónica
NIT. 900726280-7

Barrancabermeja, 22 de julio de 2021

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Ciudad.


REFERECIA: Solicitud de prórroga Por inconvenientes con dos item

Respetados señores:

Mediante la presente yo **ELKIN FABIAN CEDEÑO CHALA**, mayor de edad, domiciliado en Fusagasugá, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.069.733.345 de Fusagasugá, actuando en calidad de representante legal de la empresa VISTRONICA SAS identificada con el NIT 900726280-7 solicito antes ustedes facilitarme una prórroga por 12 días calendarios para realizar la entrega del contrato CO1.PCCNTR.2529520 ya que se nos presentaron problemas con los siguientes item:

- **Item 1 Bornera para montaje en riel DIN x 25 unidades**

Este item fue comprado y nos llego una marca diferente a la ofertada, por ende, se volvió a comprar en el mercado nacional exactamente a la tienda didácticas electrónica y hasta el dia de hoy fue despachado el paquete

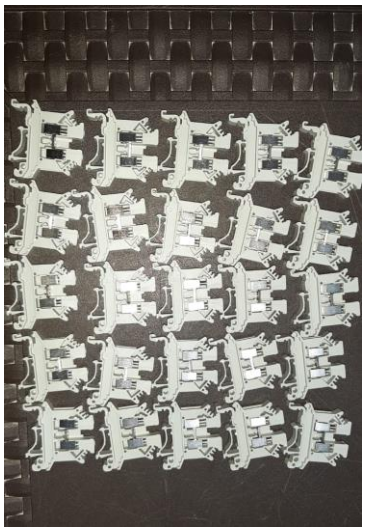

Calle 17ª # 14-76 Barrio piedra grande
Cel. 3118679028
Fusagasugá - Cundinamarca

- **Item 4 IR Thermal Sensors en Board x 1 unidad**

El producto se compró, en el mes de junio, demoro en ser despachado y entregado a pedidos usa, escribimos y llego el dia de ayer y hasta el dia de hoy lo despacharon desde estados unidos.

Adjunto pantallazo de orden de compra y fotos del producto en la bodega

MOUSER ELECTRONICS

Mansfield, TX 76063
USA
(800) 346-6873

Order Date: 17-Jun-21
Order Status: COMPLETE

Billing Address	Shipping Address
VISTRONICA SAS KR 2C #26-35 FUSAGASUGA Colombia	VISTRONICA 7305 NW 12TH ST MIAMI, FL 33126 United States

Payment Method	Shipping Method
Mastercard PO Number: 22349534	Shipping Method: UPS 2nd Day

Product Detail	Customer #	Order Qty.	Price (USD)	Ext. (USD)	Status	Date	Invoice #
Mouser #: 81-BLM21AG601SH1D Mfr. #: BLM21AG601SH1D Desc.: Ferrite Beads Ferrite Beads 0805 600ohms Gen Use Tape		50	$0.101	$5.05	50 Shipped		62653589
Mouser #: 926-LMP7702MA/NOPB Mfr. #: LMP7702MA/NOPB Desc.: Precision Amplifiers Precision Amplifiers PREC CMOS INPT RRIO WD SUP RNG DECMP AMP		15	$4.34	$65.10	15 Shipped		62653589
Mouser #: 603-CC603KRX7R9BB104 Mfr. #: CC0603KRX7R9BB104 Desc.: Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 0.1uF X7R 0603 10%		50	$0.059	$2.95	50 Shipped		62653589
Mouser #: 621-DMG6968UDM-7 Mfr. #: DMG6968UDM-7 Desc.: MOSFET MOSFET DUAL N-CHANNEL		5	$0.58	$2.90	5 Shipped		62653589
Mouser #: 926-LMP7721MA/NOPB Mfr. #: LMP7721MA/NOPB Desc.: Precision Amplifiers Precision Amplifiers 3 FEMTOAMPERE INPUT BIAS CURR PREC AMP		5	$6.61	$33.05	5 Shipped		62653589
Mouser #: 485-3622 Mfr. #: 3622 Desc.: Temperature Sensor Development Tools Temperature Sensor Development Tools Adafruit Thermal Camera FeatherWing		1	$44.95	$44.95	1 Shipped		62653589

Tienda Virtual De Electrónica
NIT. 900726280-7



Guía FUS0262123659 pedidos usa

Los artículos como se observan ya fueron comprados la demora es que lleguen a nuestra sede para ser despachados en su totalidad.

Agradezco la atención prestada, espero pronta respuesta.

Atentamente,

Vistronica
tienda virtual de electronica
NIT. 900.726.280-7

ELKIN FABIAN CEDEÑO CHALA
CC. 1.069.733.345 Fgga
REPRESENTANTE LEGAL
VISTRONICA SAS
NIT 900726280-7

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 2529520 del 21 DE MAYO DE 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ y VISTRONICA SAS, cuyo objeto es: "Compra de materiales de formación para el área de automatización del centro industrial y del desarrollo tecnológico vigencia 2021.", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga en tiempo del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	EDWIN YESIDH RIOS CONTRERAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A.
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 2529520
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de materiales de formación para el área de automatización del centro industrial y del desarrollo tecnológico vigencia 2021.
VALOR:	Cinco millones de pesos, mcte ($5.000.000)
CONTRATISTA:	VISTRONICA SAS
NIT:	900726280 -7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja, Santander
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 de mayo de 2021
FECHA DE INICIO:	25 de mayo de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 días

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco millones de pesos, mcte ($5.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cinco millones de pesos, mcte ($5.000.000)
PRÓRROGA No 1:	12 días calendarios a partir de la fecha final del contrato
ADICIÓN :	N.A.
SUSPENSIÓN:	N.A.
FORMA DE PAGO:	Único

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	17-44-101190864		
CERTIFICADO	N.A.		
FECHA EXPEDICIÓN	21 de mayo de 2021		
FECHA APROBACIÓN	21 de mayo de 2021		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	21/05/2021	22/01/2022	$500.000
Calidad y correcto funcionamiento del bien	21/05/2021	22/01/2022	$500.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la empresa VISTRONICA

SAS, con Nit. 900726280 -7, No ha soportado pagos de Seguridad Social,aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que NO se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales**.**

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Edwin Yesidh Rios Contreras mediante SECOP II de fecha 21 de mayo de 2021, desde el 25 de mayo de 2021 hasta el 26 de julio de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADO

A la fecha del presente informe, se certifica que no se han efectuado pagos del contrato del asunto.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	**0%**
Financiera	**0%**

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 2529520 DE 2021

La empresa Vistrónica S.A.S. solicita a la supervisión del contrato No CO1.PCCNTR. 2529520, prórroga en tiempo de 12 días calendarios a partir de la fecha de finalización del contrato argumentando lo siguiente:

Por medio de carta de solicitud de prórroga con fecha de elaboración del 22 de julio de 2021, informan que se les ha presentado inconvenientes con dos ítems que componen el contrato, identificados a continuación:

Item 1 Bornera para montaje en riel DIN x 25 unidades

Este item fue comprado y nos llego una marca diferente a la ofertada, por ende, se volvió a comprar en el mercado nacional exactamente a la tienda didácticas electrónica y hasta el dia de hoy fue despachado el paquete

Item 4 IR Thermal Sensors en Board x 1 unidad

El producto se compró, en el mes de junio, demoro en ser despachado y entregado a pedidos usa, escribimos y llego el dia de ayer y hasta el dia de hoy lo despacharon desde estados unidos.

Adjunto pantallazo de orden de compra y fotos del producto en la bodega

MOUSER ELECTRONICS

Mansfield, TX 76063
USA
(800) 346-6873

Order Date: 17-Jun-21
Order Status: COMPLETE

Billing Address	Shipping Address
VISTRONICA SAS KR 2C #26-35 FUSAGASUGA Colombia	VISTRONICA 7305 NW 12TH ST MIAMI, FL 33126 United States
Payment Method	**Shipping Method**
Mastercard PO Number: 22349534	Shipping Method: UPS 2nd Day

Product Detail	Customer #	Order Qty.	Price (USD)	Ext. (USD)	Status	Date	Invoice #
Mouser #: 81-BLM21AG601SH1D Mfr. #: BLM21AG601SH1D Desc.: Ferrite Beads Ferrite Beads 0805 600ohms Gen Use Tape		50	$0.101	$5.05	50 Shipped		62653589
Mouser #: 926-LMP7702MA/NOPB Mfr. #: LMP7702MA/NOPB Desc.: Precision Amplifiers Precision Amplifiers PREC CMOS INPT RRIO WD SUP RNG DECMP AMP		15	$4.34	$65.10	15 Shipped		62653589
Mouser #: 603-CC603KRX7R9BB104 Mfr. #: CC0603KRX7R9BB104 Desc.: Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 0.1uF X7R 0603 10%		50	$0.059	$2.95	50 Shipped		62653589
Mouser #: 621-DMG6968UDM-7 Mfr. #: DMG6968UDM-7 Desc.: MOSFET MOSFET DUAL N-CHANNEL		5	$0.58	$2.90	5 Shipped		62653589
Mouser #: 926-LMP7721MA/NOPB Mfr. #: LMP7721MA/NOPB Desc.: Precision Amplifiers Precision Amplifiers 3 FEMTOAMPERE INPUT BIAS CURR PREC AMP		5	$6.61	$33.05	5 Shipped		62653589
Mouser #: 485-3822 Mfr. #: 3822 Desc.: Temperature Sensor Development Tools Temperature Sensor Development Tools Adafruit Thermal Camera FeatherWing		1	$44.95	$44.95	1 Shipped		62653589

Guía FUS0262123659 pedidos usa

Conforme a lo anteriormente expuesto y observando los soportes presentados por la empresa Vistrónica S.A.S. la supervisión del contrato No CO1.PCCNTR. 2529520, solicita al ordenador del gasto Edgar Gómez Rodríguez la prórroga en tiempo de 12 días calendarios a partir de la fecha de finalización del contrato, 26 de julio de 2021, con lo cual la fecha de finalización del contrato será el 7 de agosto de 2021.

Para ésta fecha la empresa debe cumplir con la entrega de la totalidad de los materiales al Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico.

Se adjunta al presente informe Carta de solicitud de prórroga de la empresa Vistronica S.A.S.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 22 de julio de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

EDWIN YESIDH RIOS CONTRERAS
Supervisor de contrato No 2529520
