	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	19	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del CONVENIO.

ANTECEDENTES

CONVENIO No. 1750 **DE** 2020

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA “CLOMBIA RURAL”

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____ **DE** _____

INTERVENTOR: _____

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 (Día) Diciembre (Mes) **DE** 2020 (Año)

MODIFICACIONES: N/A

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS: N/A

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1750	30/12/2020	1/01/2021	31/12/2021

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: N/A

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A				

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 706.091.325,00 **50% EN SMMLV:** $ 388,59
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES: N/A

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 706.091.325,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	19	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

En cumplimiento de los lineamientos del programa Colombia rural, los entes territoriales deben cofinanciar el valor de la inversión programada en dinero, maquinaria amarilla o materiales granulares.

Mediante oficio 133040 el municipio de HATILLO DE LOBA (Bolivar), remite certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 21-02-19-01 expedido el 19/02/2021 por valor de $124,000,000.00) como aporte en dinero para el convenio específicamente en la "actividad de mejoramiento", el cual debe ser adicionado al valor del convenio aportado por invias, para un valor total de inversión programada de $830,091,325.

Se informa que el presente convenio no se encuentra suspendido toda vez que a la fecha no se ha iniciado ni el contrato de obra ni de interventoría derivado, por tal motivo, solo se encuentra en etapa administrativa y en cumplimiento de la cofinanciación a cargo de los entes territoriales.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE CONVENIO

Hasta el **19 de marzo de 2021** (mes anterior a la presente solicitud) de (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del **0,00%** (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DEL CONVENIO

Inversión programada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: NA (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ -
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor desembolso girado por INVIAS: $ 706.091.325,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : **100% Vr. Aportado por INVIAS** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: MARZO (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año)

Último mes facturado: 0 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **100% Vr. Aportado por INVIAS** (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PRORROGA

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Se requiere adicionar el valor del convenio con los recursos disponibles como reserva en dinero efectuada por el municipio de HATILLO DE LOBA (Bolivar) mediante CDP No. 21-02-19-01 de fecha 19/02/2021, en cumplimiento de lo pactado en el clausulado del convenio que permite aumentar la meta fisica programada en la "Actividad de Mejoramiento".

JURÍDICA:

Corresponde al cumplimiento de lo establecido en el clausulado del convenio así: PARAGRAFO SEGUNDO de la CLAUSULA PRIMERA y literal b) de la CLAUSULA NOVENA.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Para garantizar la cofinanciación a cargo del Ente Territorial.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

El municipio de HATILLO DE LOBA (Bolivar) reservó un valor de $124,000,000,00
CDP No. 21-02-19-01.
Rubro: Rehabilitacion de vías
Codigo A.9.3

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

N/A

OTRAS:

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	19	3	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Copia del oficio 133040 del municipio de fecha 08-03-2021, copia CDP No.21-02-19-01

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:
1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

OLEDIS ARIAS JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA (BOLIVAR)

CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
SUPERVISOR TERRITORIAL BOLIVAR - INVIAS

CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR- INVIAS

Vo.Bo.
EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO - SRT

Vo.Bo.
LEYDA MARGARITA AMAYA ARIAS
ABOGADA UNIDAD EJECUTORA – SRT GRUPO 1

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA
UNIDAD EJECUTORA - INVIAS

Elaboró: Ing. Edy Alexander Camargo Jimenez
Revisó: Ing. Patricia Ine Morales Padrón - Coordinadora Grupo 1.

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

Hatillo de Loba, Bolívar, 08 de marzo de 2021

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
E S D

Cordial saludo,

En atención al convenio en trámite el cual establece **COFINANCIAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1750 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO HATILLO DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL** el cual es de carácter vital para el desarrollo de nuestras comunidades, le solicitamos, de manera respetuosa, considerar que, dadas las contingencias judiciales, las dificultades fiscales estructurales de recursos que como municipio de sexta categoría nos afecta, las perspectivas de desaceleración económica que puedan derivarse de la actual crisis nacional y las disponibilidades de nuestro Plan Financiero, las posibilidades de cofinanciación por parte de nuestro municipio para dicho proyecto son de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($124.000.000) para la presente vigencia.

En ese sentido, estamos remitiendo la respectiva certificación de disponibilidad presupuestal, para efectos de continuar el trámite de tan importante proyecto.

Cualquier aclaración o complemento al respecto será gustosamente atendido.

Atentamente,

OLEDIS ARIAS JIMÉNEZ
Alcalde Municipal

CONFIANZA Y SEGURIDAD EN LA GESTION

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE HATILLO DE LOBA
NIT: 800.255.214 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP No.21-03-05-02

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL CONTROL DEL PRESUPUESTO
C E R T I F I C A:

Que en el Presupuesto de Gastos de inversion de la Vigencia Fiscal 2021 existe apropiaciòn disponible libre de afectación para atender la presente solicitud, así:

COD PPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR
A. 9. 3	SGP PROPÓSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN, LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ÚLTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR	*REHABILITACIÓN DE VIAS (INFRAESTRUCTURA)*	**$ 124.000.000**

CONCEPTO: **COFINANCIAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1750 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO HATILLO DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**

SE EXPIDE A SOLICITUD DE *DESPACHO DEL ALCALDE*

Hatillo de Loba, Bolivar, Fecha: 5 de marzo de 2021

JEFE DE PRESUPUESTO

Alcaldía Municipal de HATILLO DE LOBA
Oledis Arias Jiménez - Alcalde
Confianza y Seguridad en la Gestión

Escaneado con CamScanner

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E-27

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

DECLARAMOS

Que, OLEDIS ARIAS JIMENEZ con C.C. 73015563 ha sido elegido(a) **ALCALDE** por el Municipio de HATILLO DE LOBA - BOLIVAR, para el periodo de **2020** al **2023**, por el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO.

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en HATILLO DE LOBA (BOLIVAR), el martes 29 de octubre del 2019.

SAUL ALBERTO GONZALEZ MONDOL
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

DARIO MARTINEZ ORTEGA

JOSE CECILIO BARIOS CARO
SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

73015563
NUMERO

ARIAS JIMENEZ
APELLIDOS

OLEDIS
NOMBRES

Oledis Arias J.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1984
SAN MARTIN DE LOBA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

24-ENE-2002 HATILLO DE LOBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ PEREZ LOPEZ

P-0502900-30113254-M-0073015563-20030514 0407408135A 01 106742311

COPIA DEL ACTA DE POSESIÓN N° 293

En Hatillo de Loba, municipio perteneciente al Círculo Notarial de San Martín de Loba, departamento de Bolívar, República de Colombia, a los treinta (30) día del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019), por ante mí, ***DAIRO GUERRA TORRES****, Notario único del Círculo, compareció el señor* ***OLEDIS ARIAS JIMENEZ****, quien se identificó con la cédula de ciudadanía número 73.015.563 expedida en Hatillo de Loba, con el fin de tomar posesión del cargo de* ***ALCALDE*** *de este municipio, para el período comprendido entre* ***el primero (1°) de Enero del año dos mil veinte (2020) a treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veintitrés (2023);*** *para tal efecto presentó los siguientes documentos: Credencial de fecha 29-Oct- 2019, (E-27), fotocopia de la Cédula de Ciudadanía , Fotocopia Libreta Militar, Hoja de vida, Certificado Especial de Antecedes Disciplinarios de la Procuraduría, Certificado de Antecedes de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, Certificado de Antecedentes Penales y Requerimiento Judiciales de la Policía Nacional, Certificado de Inducción a la Administración Pública, Declaración Jurada de no tener proceso de alimento en su contra, Declaración Jurada sobre inhabilidad y/o incompatibilidad para ejercer el cargo de Alcalde, Declaración Jurada sobre el Monto de sus bienes y Renta, Declaración de Bienes y Rentas Formato Único, Declaración de Renta año gravable 2018, , RUT, Certificado de afiliación al sistema de seguridad social en Salud y Pensión, Certificado médico del estado físico y mental y Certificado de Carencia Nacional de Medidas Correctivas; Revisados los documentos y anexados a esta diligencia el posesionado manifestó:* ***"Juro a Dios y prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución Nacional, las Leyes de Colombia, las Ordenanzas y los Acuerdos".*** *Quedando en esta forma debidamente posesionado.*

EL COMPARECIENTE: Fdo: OLEDIS ARIAS JIMENEZ

EL NOTARIO: DAIRO GUERRA TORRES, firmado ilegible

Es fiel copia que se expide de su original, en San Martín de Loba, Bolívar, a los treinta (30) días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

DAIRO GUERRA TORRES
NOTARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DAIRO GUERRA TORRES - NOTARIO
NOTARÍA ÚNICA DE
SAN MARTÍN DE LOBA - BOLÍVAR

Notaría Única de San Martín de Loba- Bolívar
Notario: Dairo Guerra Torres.
Dirección: Carrera 13 N°. 8-20
Celular: 3116608650

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio:

1750 DE 2020

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – Y EL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "CLOMBIA RURAL"

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	SI	
SICO:	SI	
SEPRO:	SI	
CIFRA:		N/A
GESPROY:		N/A

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

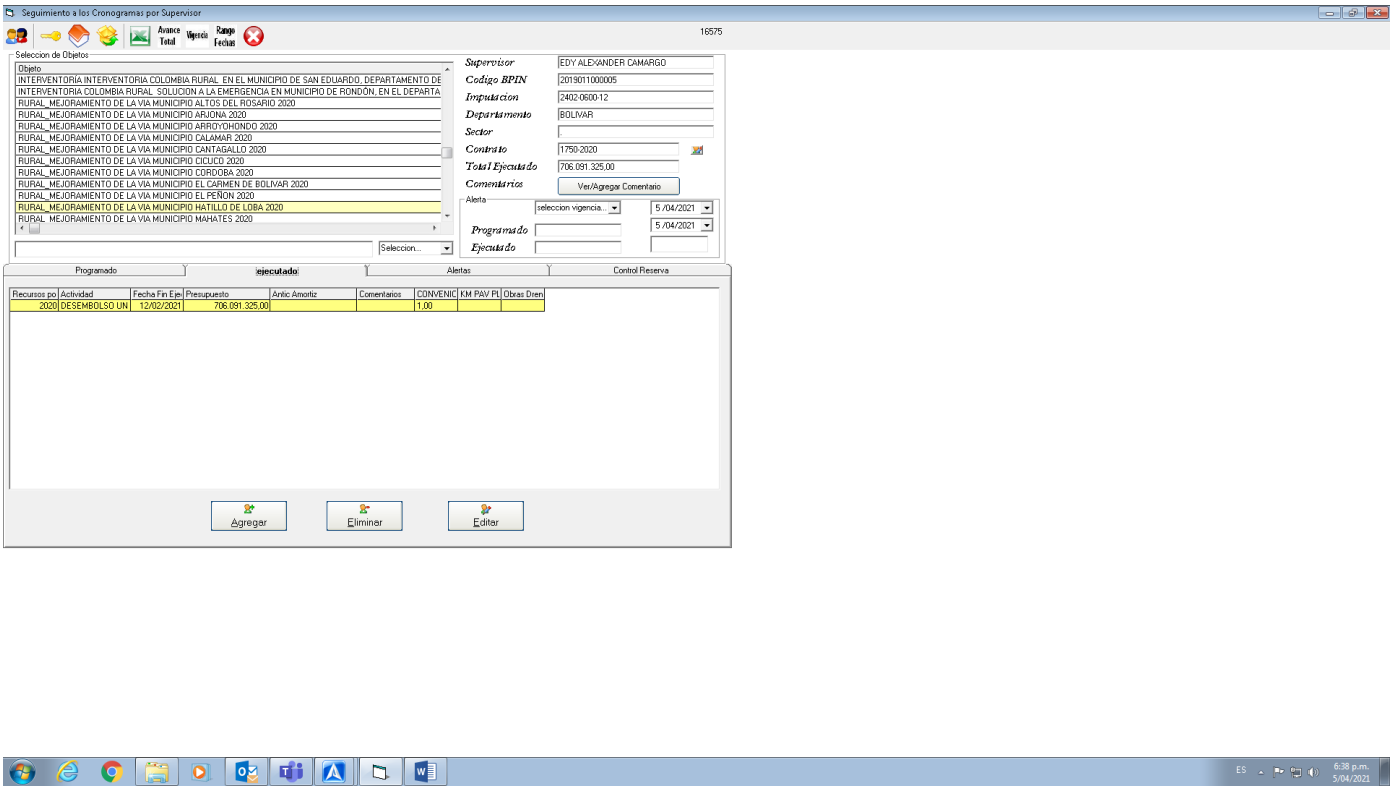
Dado en Bogotá, a los 5 días del mes de ABRIL año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Nombre:
Ricardo Antonio Corredor Parra
Subdirección:
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre:
Patricia Inés Morales Padrón
Subdirección:
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre:
Edy Alexander Camargo Jiménez
Subdirección:
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
16575
Seleccion de Objetos
Objeto
INTERVENTORIA INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE
INTERVENTORIA COLOMBIA RURAL SOLUCION A LA EMERGENCIA EN MUNICIPIO DE RONDÓN, EN EL DEPARTA
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO ALTOS DEL ROSARIO 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO ARJONA 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO ARROYOHONDO 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO CALAMAR 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO CANTAGALLO 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO CICUCO 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO CORDOBA 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO EL PEÑON 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO HATILLO DE LOBA 2020
RURAL_MEJORAMIENTO DE LA VIA MUNICIPIO MAHATES 2020
Seleccion...
Supervisor
EDY ALEXANDER CAMARGO
Codigo BPIN
2019011000005
Impulsacion
2402-0600-12
Departamento
BOLIVAR
Sector
Contrato
1750-2020
Total Ejecutado
706.091.325,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
5/04/2021
5/04/2021
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONVENIC
KM PAV PL
Obras Dren
2020
DESEMBOLSO UN
12/02/2021
706.091.325,00
1,00
Agregar
Eliminar
Editar

ES
6:38 p.m.
5/04/2021

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2089829
Número del Contrato	1750-2020
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NA MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA, DEPARTAM MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA RURAL
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	30/12/2020 4:15:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Qu*
Tiempo adiciones en días	365 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (•) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA

COLOMBIA, Hatillo De Loba

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco
MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA	BANCO BBVA

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*OLEDIS ARIAS JIMENEZ*	Fecha de aprobación:	*30/12/2020 12:37:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*Catalina Téllez Posada*	Fecha de aprobación:	*30/12/2020 4:11:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información del objeto

Tipo de proceso	CCE-16-Servicios_profesionales_gestion
Número del proceso	CD-DO-SRT-477-2020
Título del proceso	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NA MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA, DEPARTAM MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS COLOMBIA RURAL
Descripción	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NA MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA, DEPARTAM MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS COLOMBIA RURAL
Duración del contrato	3 (Días)
Unidad de contratación	Sudbirección Red Terciaria y Ferrea
Título de la oferta	
Tipo	Obra

Cuantía del contrato 706.091.325 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado (•) Sí ( ) No

Fecha de notificación de prorrogación 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quit*

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ( ) Sí (•) No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Si

¿Pago de anticipos? No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor
1	100	706.0

Total: 100.000000%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección:	Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central
Código postal:	

	Grados (º)	**Minu**
Latitud:		
Longitud:		

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección
1	VIA TERCIARIA MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2089829

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad
	1	72141100	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	1,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre de
Documentos para convenio Colombia Rural (1).pdf	Documer
1750-2020 HATILLO LOBA.pdf	1750-202

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	**Tipo de documento**	**Número de documento**
Supervisor	**Tipo de documento**	**Número de documento**

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha d
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	○ Sí ◉ No
Destinación del gasto	Inversión
Fuente de los recursos:	

Presupuesto General

Sistema General de Participaciones - SGP. N

Sistema Genera

Recursos Própios (Alcaldí

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación

Autónomas, Asignación Especial SGP para Res

Código BPIN 2019011000005

Año d
vigenci

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vige

Código	Tipo	Estado
179120	CDP	No validado

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor com
793020	Presupuestal (CDP)	-	No validado	70

Saldo de compromisos CDP	706.091.325 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Código de autorización
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
Orden inicio Hatillo sf.pdf	Orden inicio Hatillo sf.p
RP HATILLO DE LOBA.pdf	RP HATILLO DE LOB

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación
CO1.CTRMOD.5529418	Modificar el contrato	3/02/2021 8:01 PM *(UTC -5 horas)*

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: **1750** **Fecha:** **28 de diciembre de 2020**

Contratista: MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA - BOLIVAR

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA , DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ0RAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION
2	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIOS PREVIOS
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DOCUMENTOS DEL MUNCIPIO
4	CERTIFICACION BANCARIA	CUENTA DE AHORROS No. 330-014598 DEL BANCO BBVA
5	REGISTRO PRESUPUESTAL	No: 793020
6	ORDEN DE INICIACION	SRT 54180
7	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	SE SOLICITA PRORROGA HASTA EL 31/12/2021

TOTAL ANEXOS **7**

Fecha : 05-04-2021 16:59:37

Reporte: Co_Inf_Ficha_Tecnica

Generado Por : EACAMARGO
