

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**obra sena**	**53.81 días**	**lun 6/09/21**	**lun 8/11/21**
2		inicio	0 días	lun 6/09/21	lun 6/09/21
3		**PISOS**	**46 días**	**lun 6/09/21**	**jue 28/10/21**
4		DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO Y RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EN PISO	6 días	lun 6/09/21	lun 13/09/21
5		ALISTADO PISO E=4CM -1:5	5 días	jue 23/09/21	mié 29/09/21
6		Suministro e instalacion de porcelanato color beige antideslizante trafico pesado formato 56.6*56.6 incluye boquilla	8 días	mié 20/10/21	jue 28/10/21
7		**MESON EN GRANITO**	**12 días**	**lun 13/09/21**	**lun 27/09/21**
8		Suministro y construccion de MESON tipo ISLA EN LOSA DE GRANITO BLANCO HUILA INCLUYE PULIMIENTO, Ancho:1.20 m e:0.10 m instalado sobre muros en ladrillo structural, Pulido y con sellante brillado	12 días	lun 13/09/21	lun 27/09/21
9		**CIELO RASO**	**10 días**	**jue 7/10/21**	**mié 20/10/21**

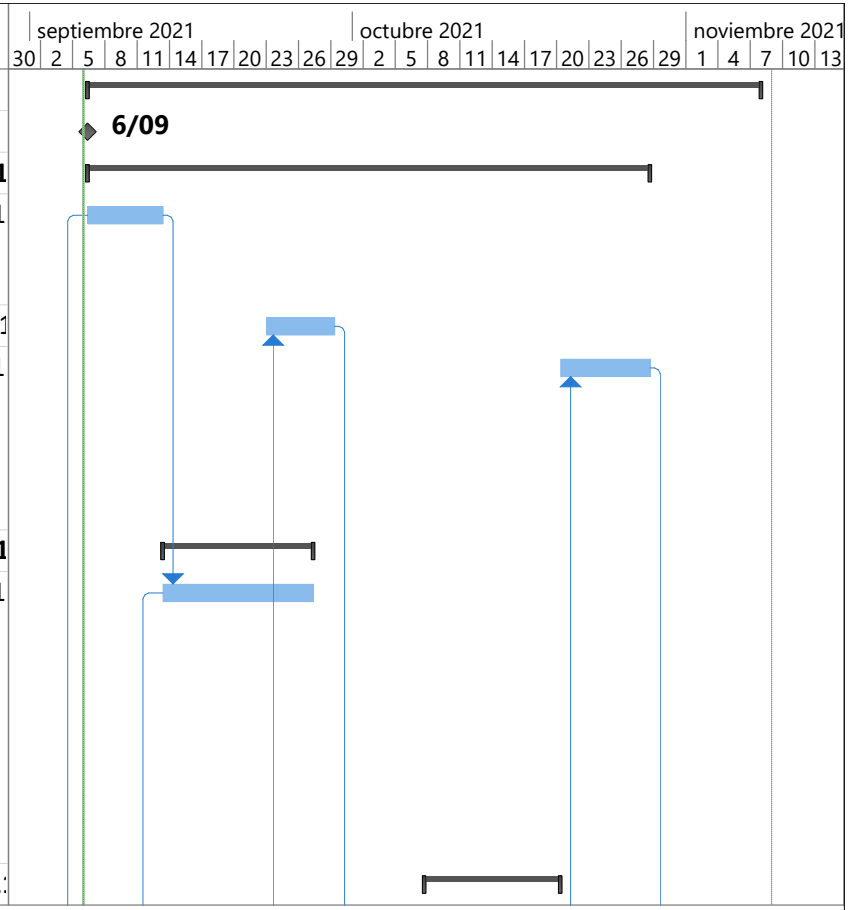

Proyecto: programacion remod
Fecha: lun 6/09/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
10		Suministro e instalacion de Cielo raso en lamina PVC horizontal de e=8.5 mm Ancho= 250 mm color blanco	10 días	jue 7/10/21	mié 20/10/21
11		**INSTALACION ELECTRICA**	**25 días**	**lun 13/09/21**	**mar 12/10/2**
12		Suministro e instalacion lampara led	3 días	jue 7/10/21	mar 12/10/2
13		SALIDA BIFASIC A TOMA TUBO MT1/2	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21
14		**MUROS**	**33 días**	**mié 29/09/2**	**vie 5/11/21**
15		Pañetes sobre muro 1:5	5 días	mié 29/09/21	mar 5/10/21
16		Estuco en muros	3 días	mar 5/10/21	jue 7/10/21
17		Pintura epoxica sobre muro	7 días	jue 28/10/21	vie 5/11/21
18		**PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO**	**4 días**	**jue 28/10/21**	**mié 3/11/21**
19		Suministro e instalacion de Puerta en vidrio templado 10 mm y pelicula Tipo sant Blasting, con cerradura y manija (docle hoja). Incluye el suministro de todos los accesorios en acero inoxidable y elementos requeridos para el correcto montaje. (suministro	4 días	jue 28/10/21	mié 3/11/21
20		**INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DUCTOS**	**19 días**	**vie 17/09/21**	**lun 11/10/21**

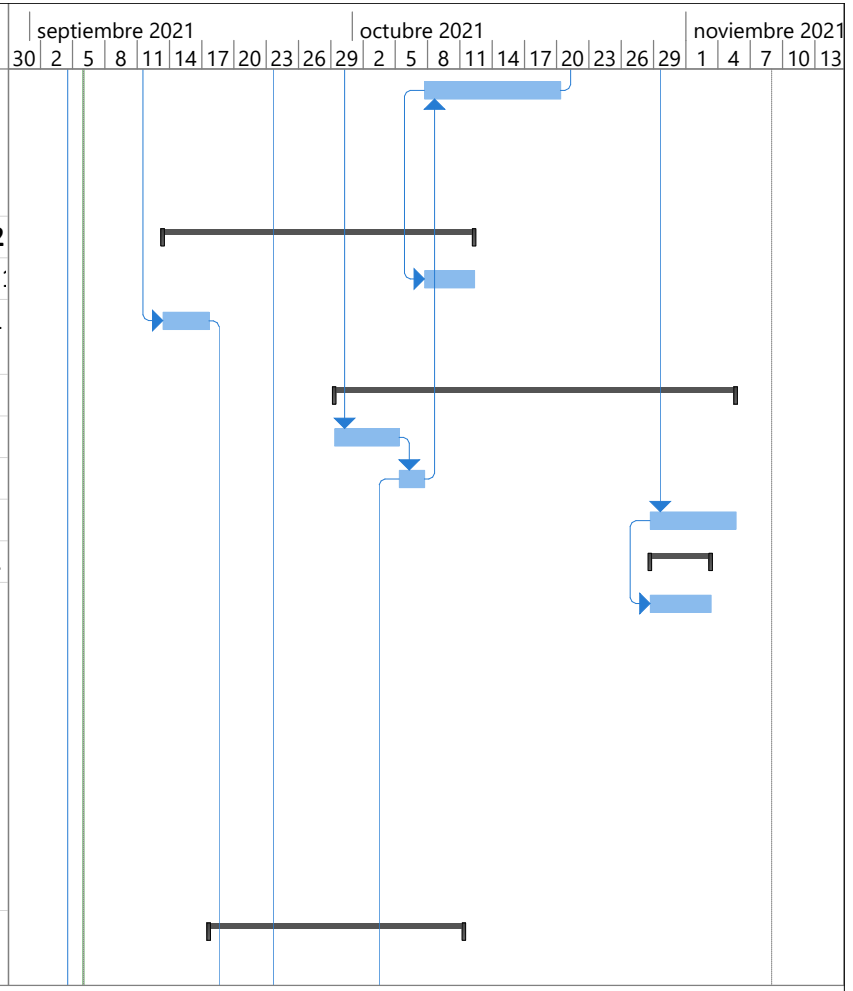

Proyecto: programacion remod
Fecha: lun 6/09/21


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
21		Punto hidraulico ½ “	3 días	vie 17/09/21	mié 22/09/21
22		Lavaplatos 62 cm * 48 cm sencillo empotrar acero inoxidable incluye llave y sifones de desagues y retiro del existente	5 días	mar 5/10/21	lun 11/10/21
23		SUMINIATRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIO D=2”	4 días	vie 17/09/21	mié 22/09/21
24		**CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE GASES**	**44 días**	**lun 6/09/21**	**mié 27/10/21**
25		Demolicion de ladrillo	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21
26		Excavacion	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21
27		MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MYS	8 días	mié 29/09/21	jue 7/10/21
28		PLACA BASE DE CONCRETO E = 10 CM 2500 PSI	15 días	vie 10/09/21	mié 29/09/21
29		PLACA MACIZA 21 MPa – (3000 PSI) E=0.10 MTS	15 días	jue 7/10/21	mar 26/10/21
30		Puerta en teja pintada con Seguro	1 día	mar 26/10/21	mié 27/10/21
31		fin	0 días	lun 8/11/21	lun 8/11/21

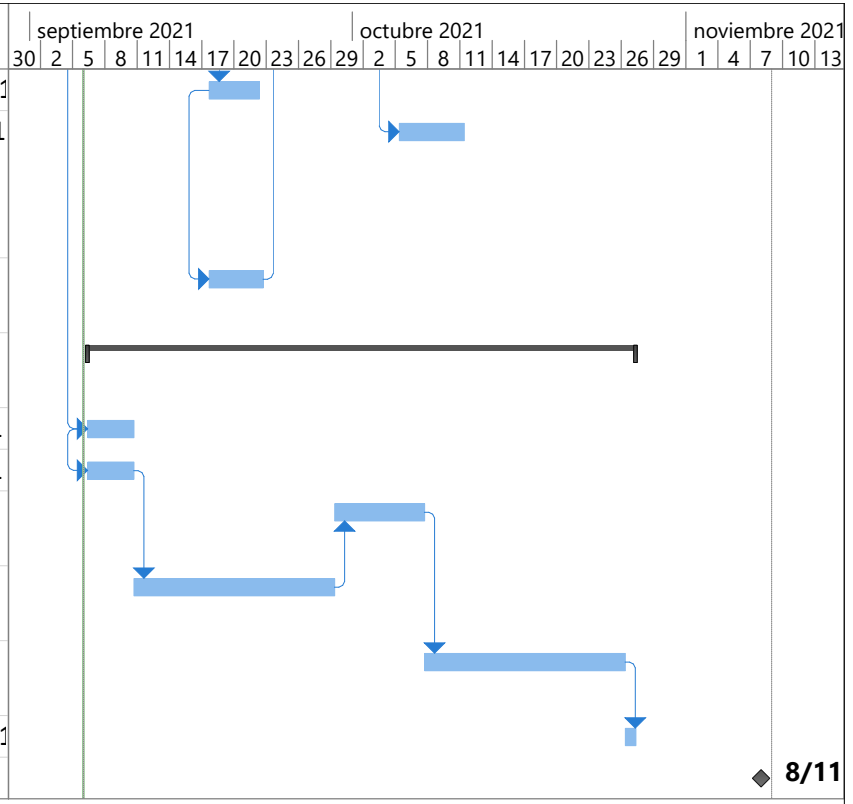


Proyecto: programacion remod
Fecha: lun 6/09/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

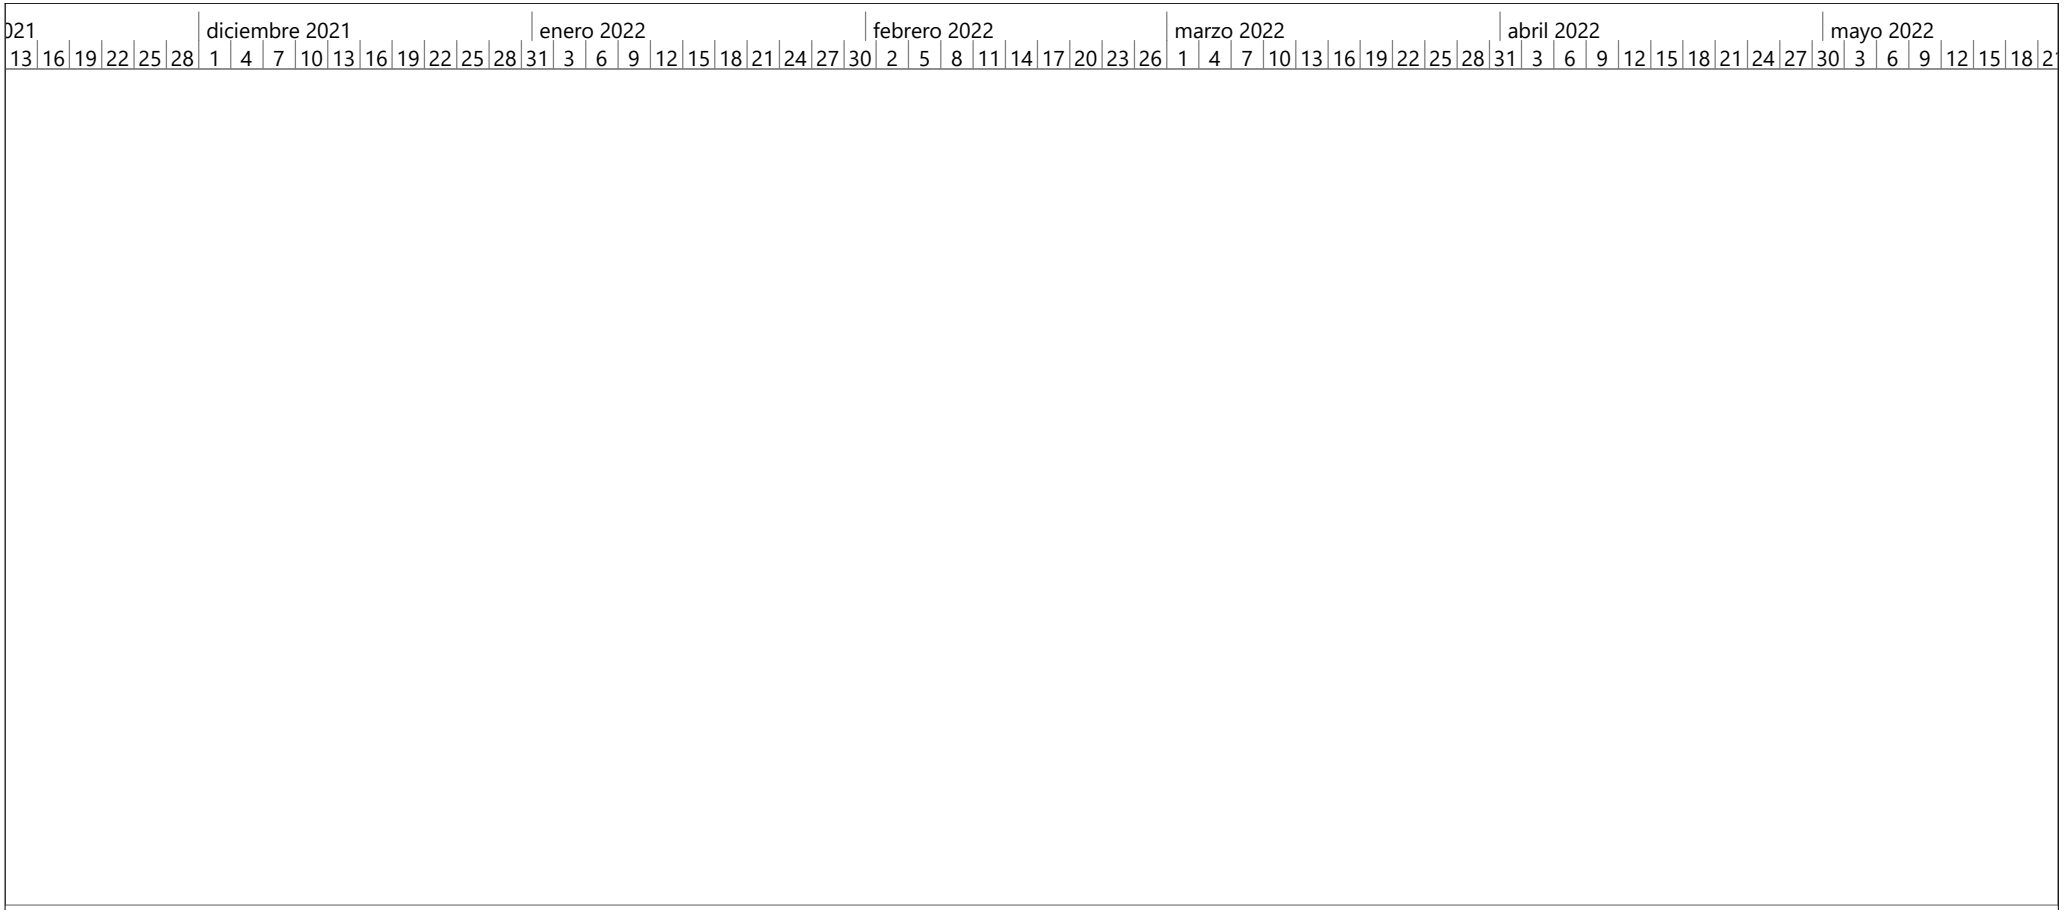


Proyecto: programacion remod
Fecha: lun 6/09/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

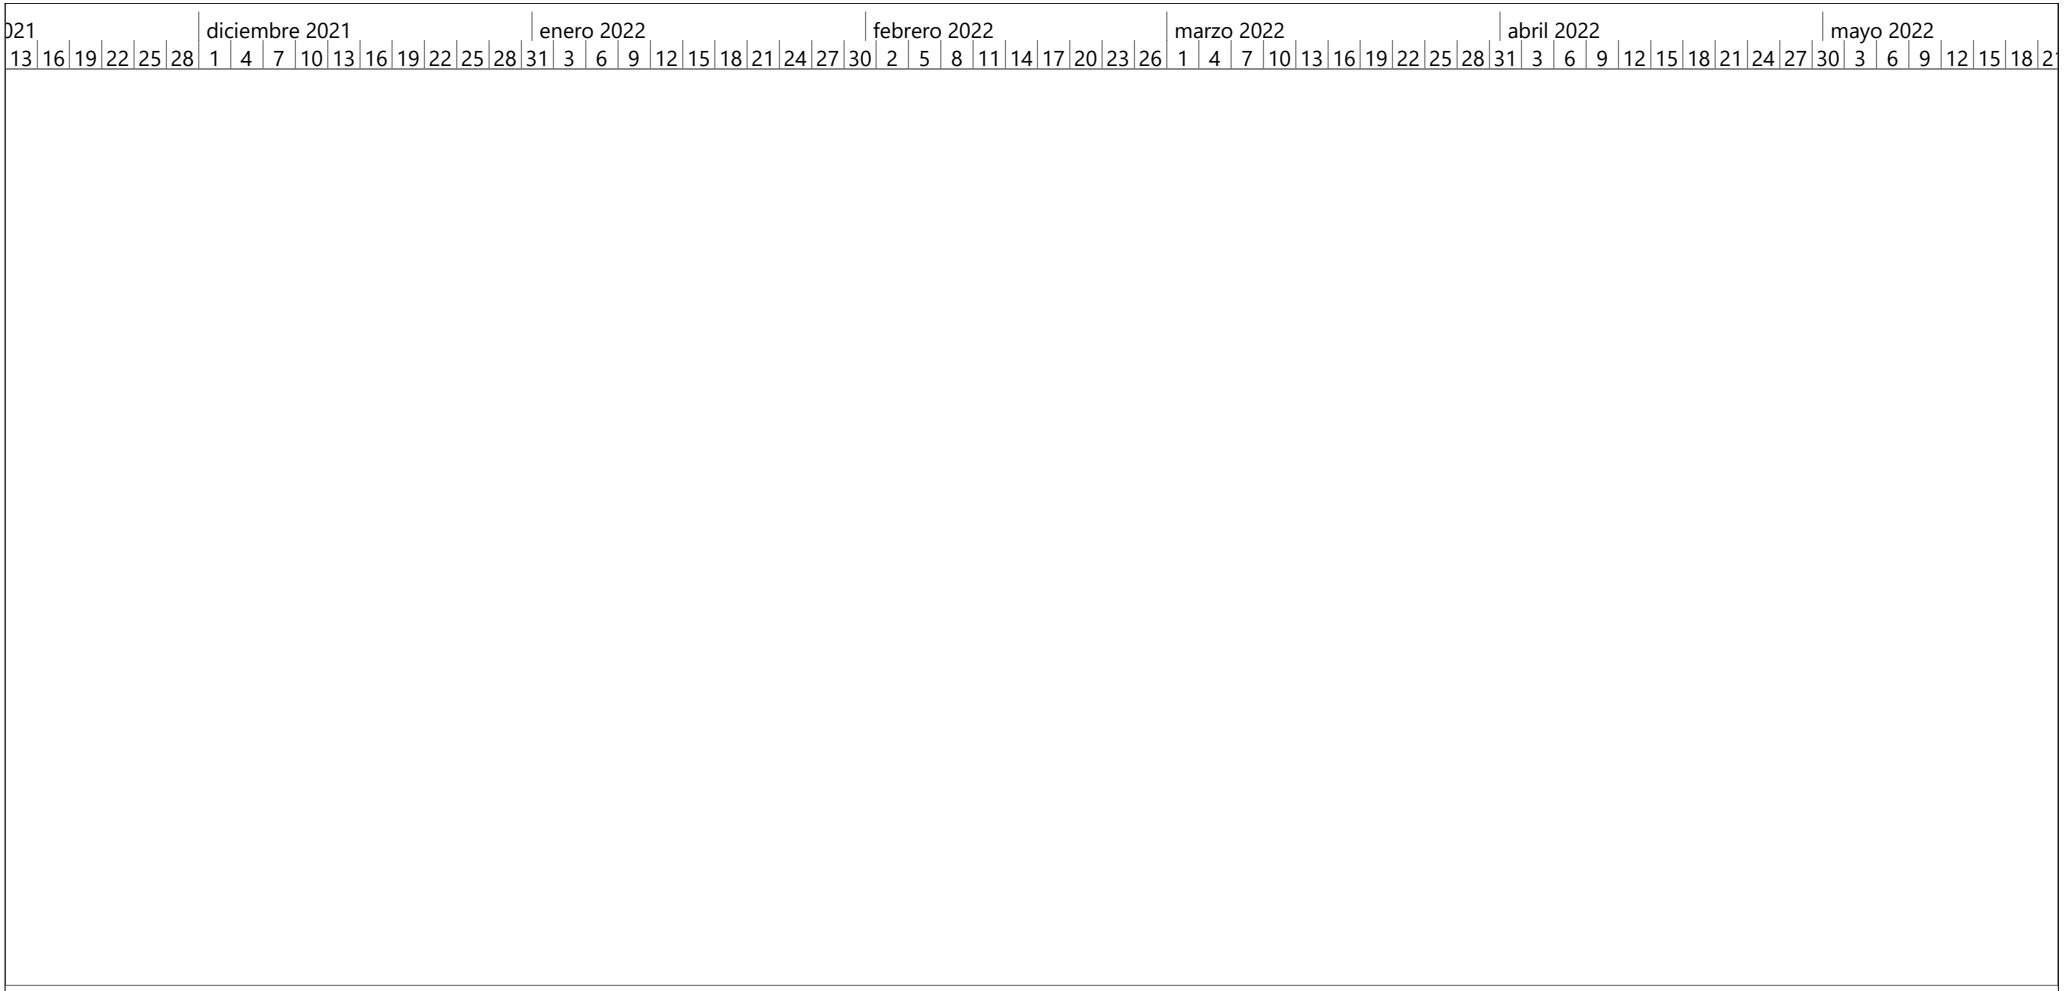

Proyecto: programacion remod
Fecha: lun 6/09/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



/11

Proyecto: programacion remod
Fecha: lun 6/09/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
