



Nombre del Comité: Segundo Comité Operativo Convenio 288 de 2021, suscrito entre ANH-CVS	
Tema/Proyecto/asunto: Socialización No. 2 avances de Plan de trabajo y cronograma de actividades realizadas fecha de corte 30/08/2021 convenio 288 de 2021.	**Fecha:**30/08/2021 **Hora de inicio:** 2:00 pm **Hora Fin:** 3:00 pm
Objetivo de la Reunión: Realizar la socialización de los avances del plan de trabajo y avances oficiales del convenio 288 de 2021.	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ	Supervisor CVS	
CARLOS ALBERTO MONTERO GUEVARA	Líder Proyecto CVS	
NELSON SOLER	Supervisor Convenio ANH	
HELMAN ALBERTO BERMUDEZ SALDARRIAGA	Delegado a Comité ANH	
SYLVIA DE LA HOZ ARISTIZABAL	Invitada ANH	

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo.
2. Presentación de los participantes.
3. Socialización del Plan de trabajo y avances.
4. Proposiciones y varios.
5. Cierre.

SEGUIMIENTO COMPROMISO REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Informar avances del convenio 288 de 2021 de manera periódica a todos los miembros del comité	CVS	100%	Se han presentado los informes de avance mensuales a ANH para su seguimiento.
Contratar y legalizar el proveedor de transporte para iniciar visitas de campo.	CVS	100%	N/A

DESARROLLO

Siendo las 02: 00 pm del día 30 de agosto del año 2021, se inició el segundo comité virtual del convenio 288 de 2021, se da inicio al orden del día y se procede por parte del líder del proyecto CVS, Ing. CARLOS ALBERTO MONTERO, a la socialización de los avances del plan de trabajo y cronograma de actividades en el marco del precitado convenio interadministrativo suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Corporación Autónoma regional del los valles del Sinú y del San Jorge CVS, resaltando las siguientes actividades.

1. El líder coordinador Carlos Montero indica que hay un avance significativo a la fecha para el convenio, en lo relacionado con la fase de identificación de determinantes ambientales. El 13 de agosto se terminaron las visitas en territorio en los 8 municipios, ya se tiene estructurado el documento técnico, se espera entregar esta semana el primer borrador a FUPAD con copia a ANH que contendrá toda la parte teórica y documental recopilada, para así proseguir con la parte de usos recomendados. A la fecha se lleva un avance del 95% en cuanto a la identificación de las determinantes ambientales.

2. Para usos recomendados también se adelantaron algunas actividades paralelamente con las visitas de determinantes, por lo cual a la fecha tiene un 30% de avance aproximadamente. Hay acciones por rectificar sobre todo con los municipios y con las falencias que se han encontrado en los POT debido a que la mayoría están un poco desactualizados y vencidos desde el 2009 y 2010, y en algunos casos, desde el 2005. Se están ajustando a la realidad, se encontraron zonas de interés que quizá a la fecha no son determinantes ambientales pero están susceptibles a convertirse en estos.

Este nuevo ítem de zonas de interés ambiental en varios municipios será incluido en el documento, destacando por ejemplo BUENAVISTA y PLANETA RICA, que hacen parte de la zona del alto San Jorge y las zonas costaneras, que están en los municipios de SAN ANTERO y SAN BERNARDO, PUERTO ESCONDIDO, LOS CORDOBAS Y CANALETE.

3. Se espera comenzar a mediados de este mes las visitas de usos recomendados y en cuanto a PQR del sector Hidrocarburos se tiene un avance del 50% para el seguimiento con empresas y un 70 % de las solicitudes se han atendido.

Por otra parte, la CVS solicita la redistribución del presupuesto del convenio teniendo en cuenta que por los tiempos de contratación se encuentran disponibles recursos correspondientes al rubro de personal, que se requieren asignar al rubro de talleres de divulgación y socialización.

Por lo anterior se establece la posibilidad de suscribir OTRO SÍ, con el fin de redistribuir los recursos así:

Tabla 1. Presupuesto financiero inicial

	Aprobado	Contratado	Saldo
Personal	$ 379.000.000	$ 372.834.000	$ 6.166.000
Viáticos y transporte	$ 31.000.000		
Talleres socialización y Divulgación	$ 10.000.000		

Tabla 2. Ajuste de presupuesto OTRO SÍ

	Nuevo presupuesto aprobado
Personal	$ 372.834.000
Viáticos y transporte	$ 31.000.000
Talleres socialización y Divulgación	$ 16.166.000

De acuerdo con lo anterior, el comité recomiendo realizar el trámite para la suscripción del otrosí.


CONCLUSIONES

-De acuerdo con el presupuesto se tiene planeado realizar dos (2) socializaciones de determinantes y usos recomendados a las comunidades y entes territoriales, en los cuales se deberá tener en cuenta los protocolos de bioseguridad. Este será tema de seguimiento para la próxima reunión de comité.

-La CVS informa que se cuenta con avance aproximado de 40% de los productos pactados en el convenio.

-La CVS informa que el documento de los determinantes ambientales será radicado ante a la ANH en la semana del 10 de septiembre; una vez se cuente con los usos recomendados se agregará un subíndice a cada uno de los municipios donde se incluye la información y la cartografía, para generar el documento final de determinantes y usos. Con relación a los conceptos técnicos de PQR, se menciona que están soportados en los informes de visita elaborados por parte de la Corporación.

REGISTRO FOTOGRAFICO

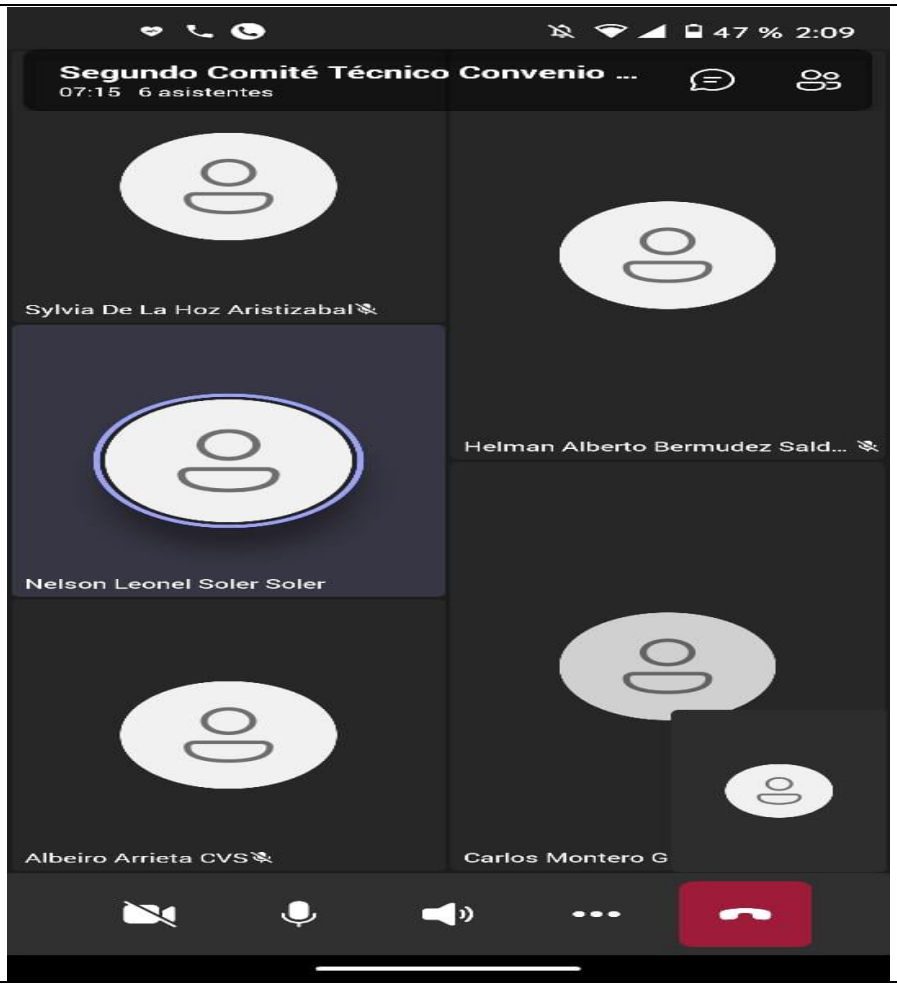

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir oficio y documento Técnico para evaluación del OTRO SI del convenio.	CVS	03/09/2021
Remitir Borrador de avances de documento Determinantes Ambientales FUPAD-ANH	CVS	03/09/2021
Tratar en próxima reunión la definición de la socialización de las determinantes y sus usos	CVS	07/10/2021
