

Cronograma CAM

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM).**	**26 mss**	**mié 3/11/21**	**mar 3/10/23**
2	**PLANEACION INTERNA**	**0,5 mss**	**mié 3/11/21**	**mar 16/11/21**
3	Firma de contrato - Acta de inicio	0 mss	mié 3/11/21	mié 3/11/21
4	Planeación contractual	0,3 mss	mié 3/11/21	mié 10/11/21
5	Incorporación (Si se requiere)	0,2 mss	mié 10/11/21	mar 16/11/21
6	Apertura de cuenta	0,1 mss	mié 3/11/21	vie 5/11/21
7	**DIAGNÓSTICO**	**0,3 mss**	**mié 10/11/21**	**jue 18/11/21**
8	Diagnóstico Contexto Social	0,3 mss	mié 10/11/21	jue 18/11/21
9	**CONSTRUCCIÓN**	**24,7 mss**	**mar 16/11/21**	**lun 11/09/23**
10	**Contrato de Obra**	**22,6 mss**	**mar 16/11/21**	**lun 17/07/23**
11	Elaboración de Necop	0,3 mss	mar 16/11/21	mié 24/11/21
12	Aprobación comité	0,3 mss	mié 24/11/21	jue 2/12/21
13	Proceso de Contratación	1 ms	jue 2/12/21	mié 29/12/21
14	Ejecución	21 mss	mié 29/12/21	lun 17/07/23
15	**Contrato de Interventoría**	**24,7 mss**	**mar 16/11/21**	**lun 11/09/23**
16	Elaboración de Necop	0,3 mss	mar 16/11/21	mié 24/11/21
17	Aprobación comité	0,4 mss	mié 24/11/21	sáb 4/12/21
18	Proceso de Contratación	1 ms	sáb 4/12/21	vie 31/12/21
19	Ejecución	23 mss	vie 31/12/21	lun 11/09/23
20	**EVALUACIÓN**	**1 ms**	**lun 17/07/23**	**sáb 12/08/23**
21	Evaluación proyecto	1 ms	lun 17/07/23	sáb 12/08/23
22	**LIQUIDACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	**0,8 mss**	**lun 11/09/23**	**mar 3/10/23**
23	Conciliación bancaria	0,4 mss	lun 11/09/23	jue 21/09/23
24	Pagar rendimientos y devolución de saldo	0,4 mss	jue 21/09/23	mar 3/10/23
25	Informe final del contrato	0,8 mss	lun 11/09/23	mar 3/10/23
26	Liquidación del contrato	0 mss	mar 3/10/23	mar 3/10/23

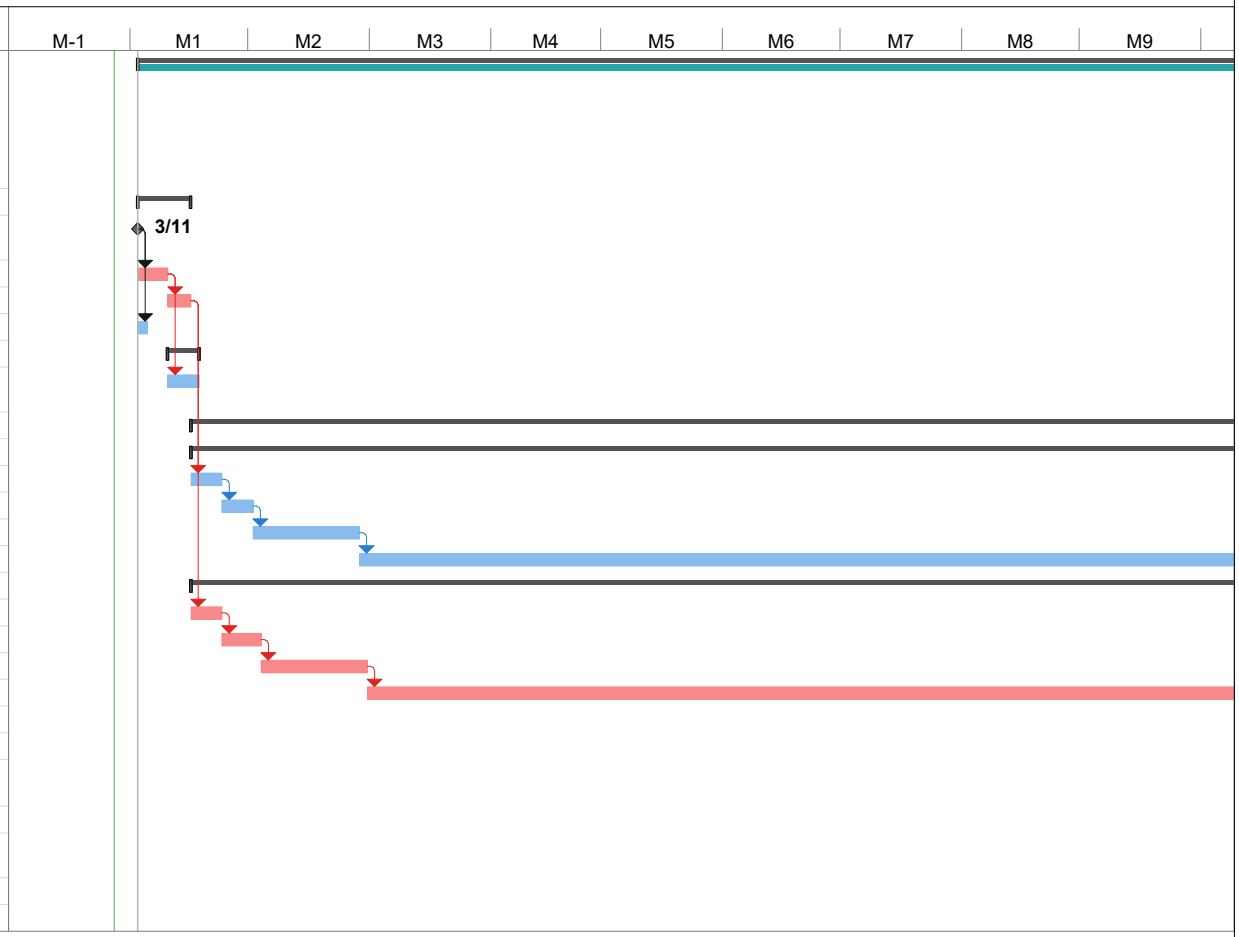

Entidad: Municipio Envigado
Fecha: 28/10/2021

Tarea	Tarea inactiva	Sólo el comienzo
División	Hito inactivo	Sólo fin
Hito	Resumen inactivo	Fecha límite
Resumen	Tarea manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Sólo duración	División crítica
Tareas externas	Informe de resumen manual	Progreso
Hito externo	Resumen manual	Progreso manual

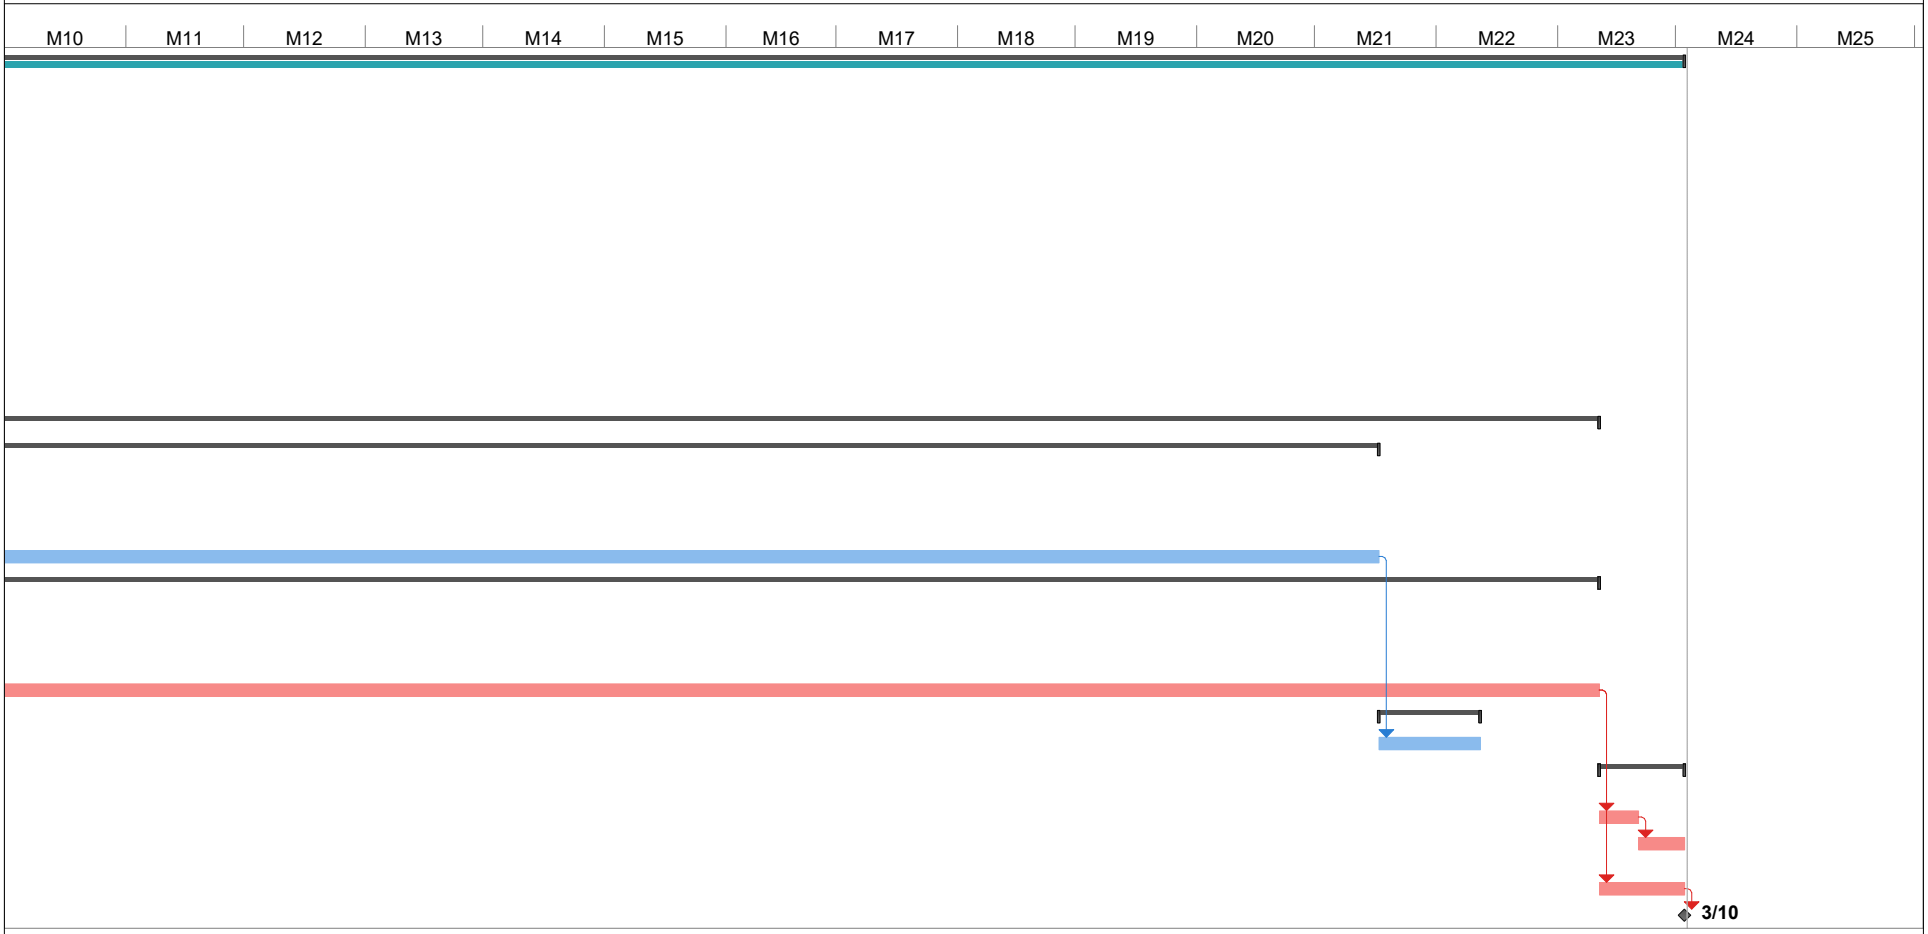

Entidad: Municipio Envigado
Fecha: 28/10/2021

Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo		Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	
