

Cronograma-ICFES_TYT-04-06-2021-v19_para plan operativo

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ICFES TYT**	**87 días**	**lun 26/04/21**	**mié 21/07/21**
2		Adjudicación	0 días	lun 26/04/21	lun 26/04/21
3		Firma de contrato	0 días	lun 3/05/21	lun 3/05/21
4		Reunión de apertura y firma acta de inicio	0 días	mié 5/05/21	mié 5/05/21
5		Icfes entrega de manuales e instructivos	1 día	jue 6/05/21	jue 6/05/21
6		Icfes entrega cuadro de examinadores	1 día	jue 6/05/21	jue 6/05/21
7		**Actividades preparatorias**	**44 días**	**jue 29/04/21**	**vie 11/06/21**
8		Elaboración del protocolo de seguridad para la custodia del material de examen	12 días	jue 29/04/21	lun 10/05/21
9		Elaboración del plan de contingencia en caso de fallas con la conectividad que suministra a los sitios.	12 días	jue 29/04/21	lun 10/05/21
10		**Entrega Producto 1: Manual operativo, plan de aseguramiento de calidad y cronograma de**	0 días	lun 10/05/21	lun 10/05/21
11		**Icfes entrega la matriz de asignación de salones y del cuadro de aplicación para la ejecución del**	0 días	mié 26/05/21	mié 26/05/21
12		Icfes entrega programación de entrega de kits	2 días	mar 8/06/21	mié 9/06/21
13		Entrega al Icfes de la cantidad de material para suplentes (manuales, escarapelas, credenciales e instrucciones específicas)	1 día	lun 31/05/21	lun 31/05/21
14		Entrega a Icfes proyección de viáticos y transporte de examinadores (diferentes roles)	1 día	lun 31/05/21	lun 31/05/21
15		Icfes entrega aprobación preliminar de viáticos	1 día	vie 11/06/21	vie 11/06/21
16		**Búsqueda y capacitación de personal**	**23 días**	**jue 27/05/21**	**vie 18/06/21**
17		Gestión de personal (coordinadores de sitio y bioseguridad, jefes de salón y auxiliares) con responsables de sitios (rectores)	9 días	jue 27/05/21	vie 4/06/21
18		Convocatoria apoyos personas con discapacidad	9 días	jue 27/05/21	vie 4/06/21
19		Confirmación apoyos personas con discapacidad	4 días	mar 1/06/21	vie 4/06/21
20		Convocatoria delegados	3 días	jue 27/05/21	sáb 29/05/21
21		Contacto con delegados, condiciones de contratación	3 días	jue 27/05/21	sáb 29/05/21
22		Entrega al Icfes del nombramiento delegados(Bogotá)	2 días	mié 2/06/21	jue 3/06/21
23		Entrega al Icfes el nombramiento delegados (país) y delegados técnicos	2 días	jue 3/06/21	vie 4/06/21
24		Confirmación de examinadores (delegados técnicos, coordinadores de sitio y bioseguridad, jefe de salón) y	10 días	jue 27/05/21	sáb 5/06/21
25		Capacitación a coordinadores de nodo Icfes (nivel 1)	3 días	lun 31/05/21	mié 2/06/21
26		Taller de capacitación plataforma SEICE a coordinadores de nodo Icfes	2 días	mié 2/06/21	jue 3/06/21
27		Reunión previa delegados con coordinador de nodo Icfes (Capacitación virtual)	2 días	jue 3/06/21	vie 4/06/21

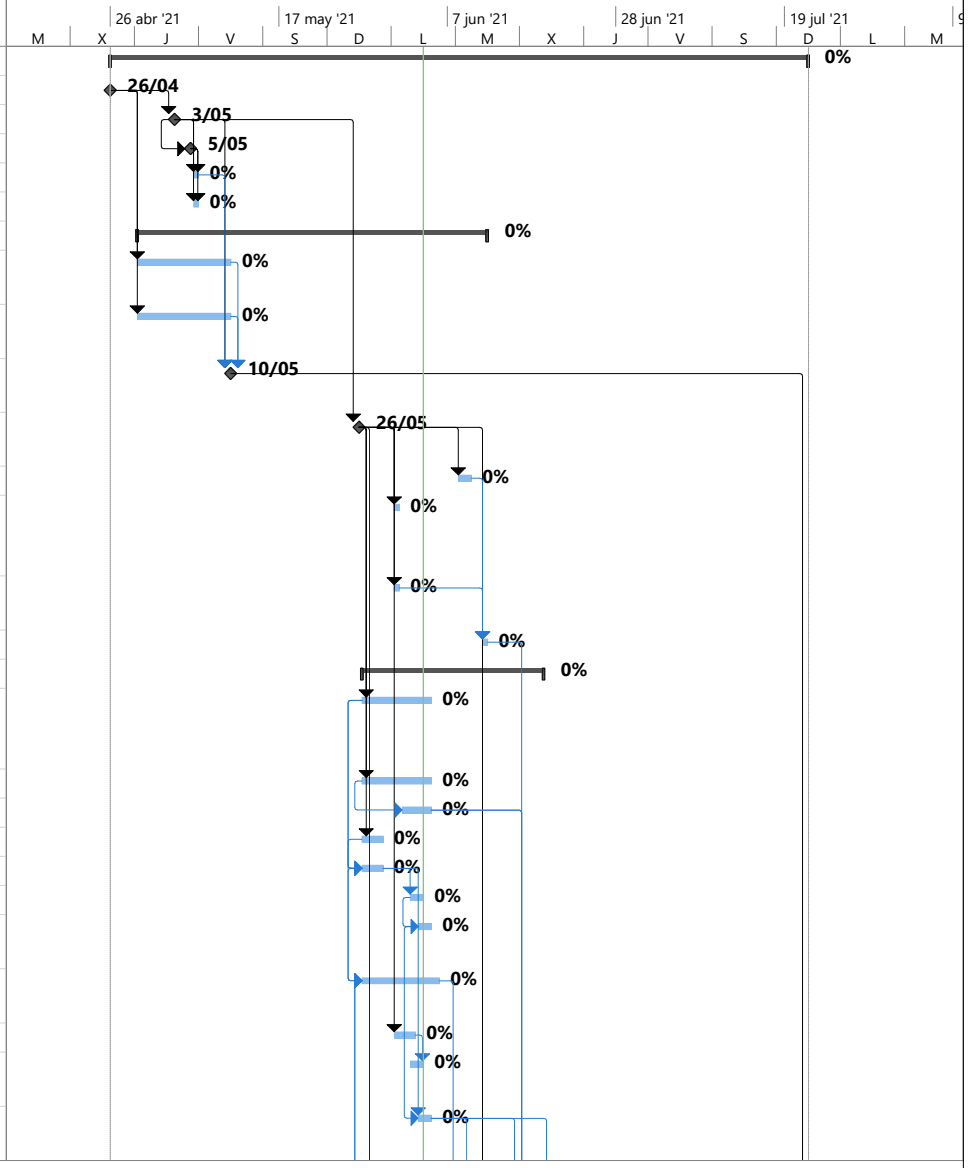


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
28		Georreferenciación y optimización de asignación.	2 días	vie 4/06/21	sáb 5/06/21
29		Entrega a Icfes del nombramiento examinadores centros de reclusión y nombramiento final de delegados en estructura para cargue	0 días	mar 8/06/21	mar 8/06/21
30		Reunión previa examinadores Bogotá	3 días	mié 9/06/21	vie 11/06/21
31		Reunión previa examinadores de todo el país	3 días	mar 15/06/21	jue 17/06/21
32		Reunión previa (coordinador técnico Icfes con delegados técnicos)	2 días	mar 8/06/21	mié 9/06/21
33		Nombramiento de delegados técnicos, apoyos personas con discapacidad, coordinadores de sitio y bioseguridad, y jefes de salón	4 días	mar 15/06/21	vie 18/06/21
34		Entrega a delegados nombramiento apoyos a personas con discapacidad	0 días	mié 16/06/21	mié 16/06/21
35		Entrega de itinerario de viaje a delegados y apoyos personas con discapacidad	0 días	mié 16/06/21	mié 16/06/21
36		Entrega al Icfes de la base de datos de nombramiento preliminar de examinadores (país)	1 día	mié 16/06/21	mié 16/06/21
37		Auditoría de convocatoria y nombramiento	2 días	mié 16/06/21	jue 17/06/21
38		Auditoría de convocatoria y nombramiento preliminar de examinadores	1 día	jue 17/06/21	jue 17/06/21
39		**Reporte de examinadores requeridos Vs examinadores confirmados con dispobibles para la**	**7 días**	**vie 28/05/21**	**vie 4/06/21**
40		Reporte 1	0 días	vie 28/05/21	vie 28/05/21
41		Reporte 2	0 días	mié 2/06/21	mié 2/06/21
42		Reporte 3	0 días	vie 4/06/21	vie 4/06/21
43		**Reporte de examinadores requeridos Vs examinadores nombrados**	**21 días**	**mié 2/06/21**	**mar 22/06/21**
44		Reporte avance	0 días	vie 4/06/21	vie 4/06/21
45		**Reportes de seguimiento de capacitación**	**16 días**	**mié 2/06/21**	**jue 17/06/21**
62		Reporte final	0 días	vie 18/06/21	vie 18/06/21
63		Reporte de actualización de los cambios realizados el día de la prueba	0 días	mar 22/06/21	mar 22/06/21
64		**Preparativos de la aplicación**	**8 días**	**vie 11/06/21**	**vie 18/06/21**
65		Entrega de kit de aplicación por parte del operador de kits a los delegados en las sedes de nodo y kits de bioseguridad en los sitios (Bogotá)	1 día	vie 11/06/21	vie 11/06/21
66		Entrega de kit de aplicación por parte del operador de kits a los delegados en las sedes de nodo y kits de bioseguridad en los sitios (Resto de país)	2 días	mié 16/06/21	jue 17/06/21

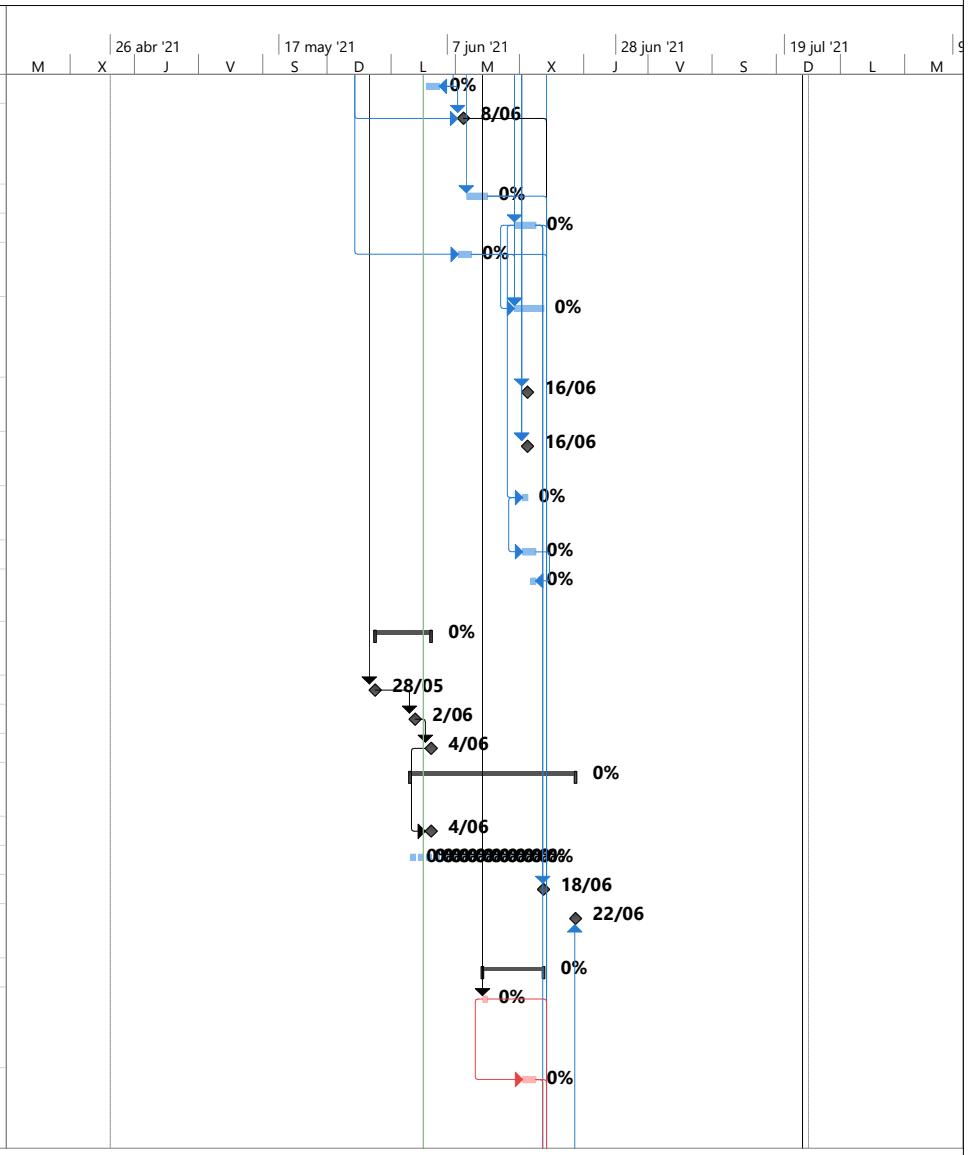


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
67		Visita a sitio de aplicación para verificación de equipos de cómputo, instalación y ejecución del DEMO, instalación módem (si aplica), llegada de kit de bioseguridad y aseo por parte de auxiliar.	1 día	vie 18/06/21	vie 18/06/21
68		Informe de novedades al coordinador de nodo, sobre condiciones del sitio de aplicación	1 día	vie 18/06/21	vie 18/06/21
69		**Aplicación**	**3 días**	**sáb 19/06/21**	**lun 21/06/21**
70		**Realización de pruebas TYT en instituciones**	2 días	sáb 19/06/21	dom 20/06/21
71		**Realización de pruebas TYT en sitios de reclusión**	1 día	lun 21/06/21	lun 21/06/21
72		Entrega a Icfes de novedades de nombramiento de delegados	3 días	sáb 19/06/21	lun 21/06/21
73		Elaboración del acta de notificación (cuando aplique)	3 días	sáb 19/06/21	lun 21/06/21
74		**Post aplicación**	**12 días**	**sáb 19/06/21**	**mié 30/06/21**
75		Diligenciamiento informe web (delegado al cierre de la aplicación o a más tardar el día siguiente, SEI	3 días	lun 21/06/21	mié 23/06/21
76		Recepción en sitio de aplicación de: (i) carpetas con informes de aplicación, (ii) listados de asistencia e identificación (empacados en sobre de manila), (iii) Actas de anulación y documentos soporte, (iv)	3 días	sáb 19/06/21	lun 21/06/21
77		Recepción en municipio sede de nodo de carpetas con informes de aplicación (+otros).	5 días	lun 21/06/21	vie 25/06/21
78		Recepción en sede central (Bogotá) de carpetas con informes de aplicación (+otros).	5 días	lun 21/06/21	vie 25/06/21
79		Solicitud de cajas al Icfes para almacenamiento de carpetas con informe de aplicación	0 días	mié 23/06/21	mié 23/06/21
80		Organización de material recibido para entrega a operador de kits, Icfes, disposición de pilas, etc.	7 días	mar 22/06/21	lun 28/06/21
81		Digitalización de carpetas de informe de aplicación	6 días	mié 23/06/21	lun 28/06/21
82		Entrega a Icfes de carpetas organizadas y agrupadas, y disco duro con la información digitalizada.	2 días	mar 29/06/21	mié 30/06/21
83		Entrega de los registros de asistencia e identificación al operador de kits	2 días	mar 29/06/21	mié 30/06/21
84		Entrega a Icfes de (i) actas de anulación y documentos soporte, (ii) Informe ejecutivo preliminar de la prueba (iii) carpetas de delegado con informe web impreso, (iv) formatos de visita a planta física.	2 días	mar 29/06/21	mié 30/06/21
85		Entrega de termómetros a Icfes	1 día	mar 29/06/21	mar 29/06/21
86		Ejecutar disposición final de las baterías	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
87		**Pagos**	**15 días**	**mié 16/06/21**	**mié 30/06/21**

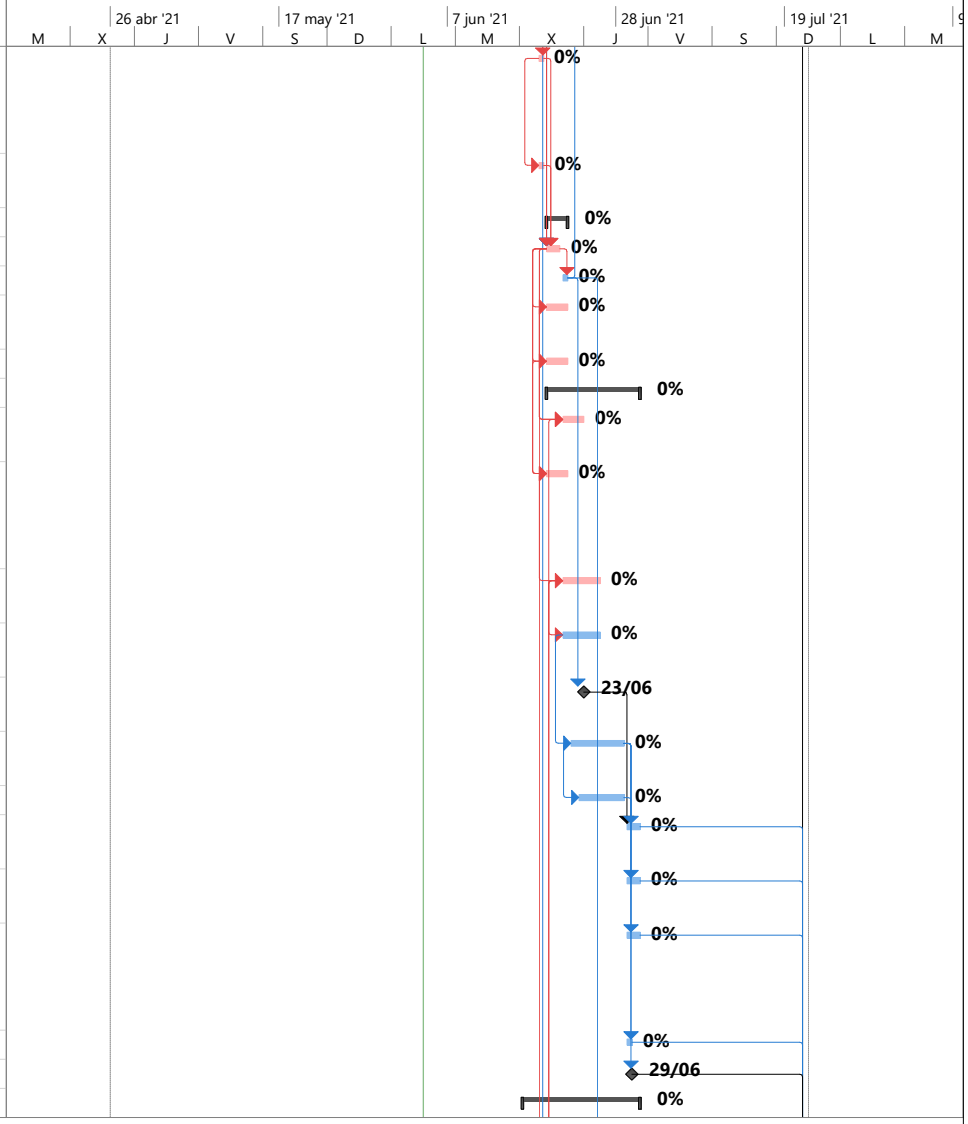

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
88		Giro y notificación de giro de viáticos a examinadores que se deben desplazar	3 días	mié 16/06/21	vie 18/06/21
89		Entrega al Icfes de la base de datos de giros de viáticos y transportes	1 día	lun 21/06/21	lun 21/06/21
90		Entrega al Icfes del consolidado de compra de tiquetes	1 día	mar 22/06/21	mar 22/06/21
91		Auditoría de pago de viáticos y transportes	3 días	mié 23/06/21	vie 25/06/21
92		Icfes entrega resultados de Auditoría de pago de viático	1 día	vie 25/06/21	vie 25/06/21
93		Reunión de validación y conciliación de viáticos	1 día	jue 24/06/21	jue 24/06/21
94		Recepción de reportes de examinadores que trabajaron	3 días	lun 21/06/21	mié 23/06/21
95		Elaboración de la base de datos de giro de pago de servicios técnicos	6 días	mar 22/06/21	dom 27/06/21
96		Elaboración y envío de los documentos soporte para pago de examinadores	1 día	jue 24/06/21	jue 24/06/21
97		Pago a delegados técnicos, coordinador de sitio y bioseguridad, jefe de salón, auxiliar y apoyo a	1 día	vie 25/06/21	vie 25/06/21
98		Entrega al Icfes de la base de datos de giro de pago de servicios técnicos	1 día	sáb 26/06/21	sáb 26/06/21
99		Entrega al Icfes de la base de datos de nombramientos de examinadores nivel nacional	1 día	lun 28/06/21	lun 28/06/21
100		Pago a delegados	2 días	mar 29/06/21	mié 30/06/21
101		Auditoría de pago de servicio a examinadores	3 días	lun 28/06/21	mié 30/06/21
102		Icfes entrega resultados de auditoría de pago de servicios técnicos	1 día	mié 30/06/21	mié 30/06/21
103		Icfes entrega resultados de auditoría de nombramiento f	1 día	mié 30/06/21	mié 30/06/21
104		Icfes genera Informe general de auditoría	1 día	mié 30/06/21	mié 30/06/21
105		**Reporte de gestión de pagos**	**7 días**	**vie 25/06/21**	**vie 2/07/21**
106		Reporte de avance de gestión de pagos realizados a los examinadores frente a los tres aspectos contemplados (transporte, viáticos y servicios técnicos)	0 días	vie 25/06/21	vie 25/06/21
107		Reporte final de gestión de pagos realizados a los examinadores frente a los tres aspectos contemplados (transporte, viáticos y servicios técnicos)	0 días	vie 2/07/21	vie 2/07/21
108		**Informes**	**87 días**	**lun 26/04/21**	**mié 21/07/21**
109		**Informes semanales**	**85 días**	**lun 26/04/21**	**lun 19/07/21**
123		Envío de mensaje a examinadores que tuvieron novedades en la prueba para descargos, entrega de actas para examinandos que requieren toma de huellas y anulaciones, actas de desempeño (físicas y en digital)	1 día	vie 2/07/21	vie 2/07/21
124		Entrega al Icfes del informe final de ejecución de la pru	1 día	mié 21/07/21	mié 21/07/21
125		Cierre	0 días	mié 21/07/21	mié 21/07/21

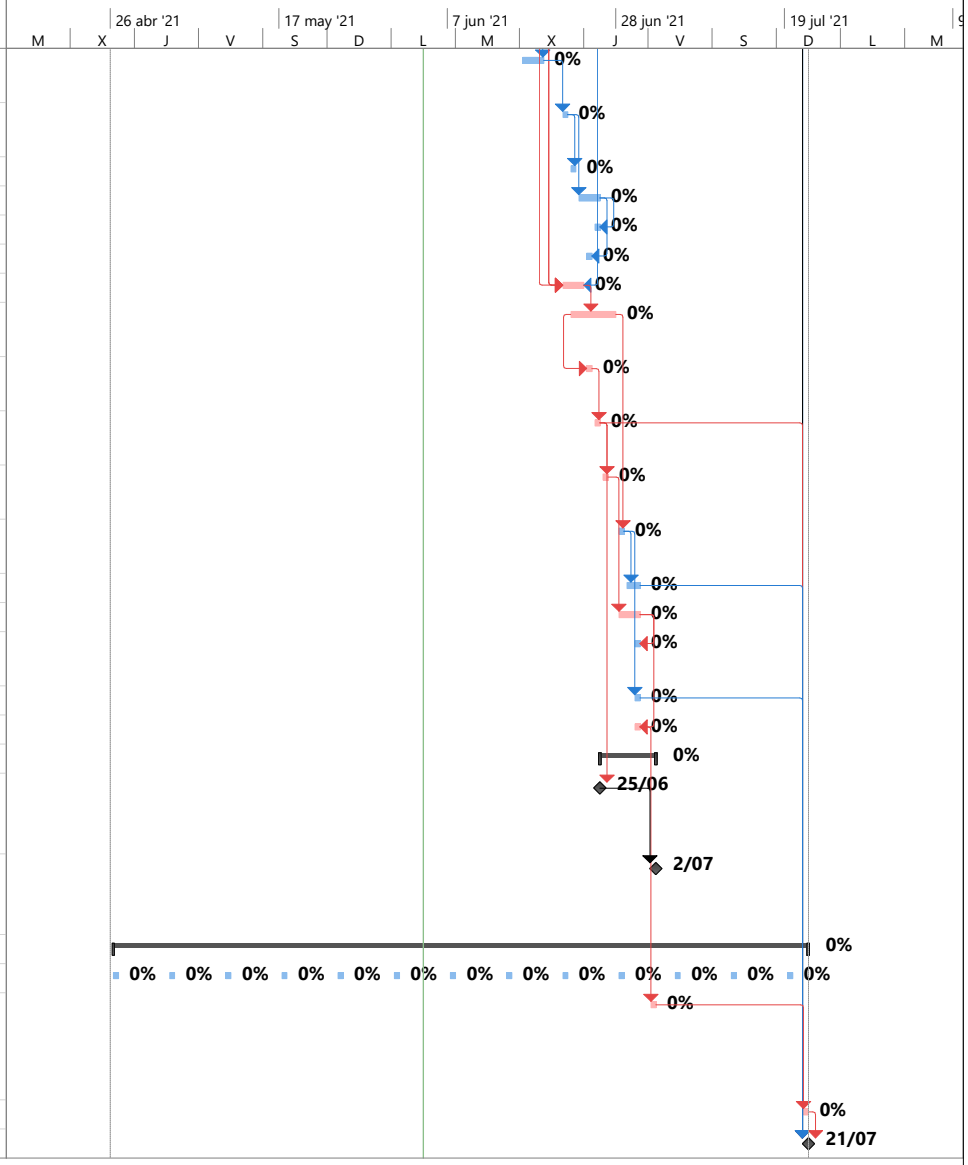

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
