320 550 5252
fundacionsportech@gmail.com
Calle 40 # 43 - 149 - Barranquilla

SEÑORES
INDERSANTANDER
DR. PEDRO CARRILLO
DIRECTOR
Ordenador del gasto


LIC. RAMIRO ANDRÉS PABON
supervisor

Asunto : **SOLICITUD DE PRORROGA**

Por medio de la presente y estando dentro del plazo de ejecución del presente proceso contractual me permito presentar a la entidad solicitud prórroga debido a las siguientes razones:

FICHA TECNICA

ÍTEM	DESCRIPCION
1	• Tatami Homologado W.T. • Suelo por sistema de puzzle. • Reversible para el entrenamiento y la competencia. • Densidad: 1,6 Kgf / cm3 tracción • Fuerza: 19,8 Kgf / cm 3 • Elongación: 120% • Tratamiento higiénico. • Acústica y aislantes humedad. • Composition: EVA (Etylene-vinilo-acetato)
2	Juego de colchonetas para lucha de 64 láminas de tamaño / medidas de 2 mts de largo * 1mts de ancho * 4cm de alto para área de 8mts* 8mts de lucha material en casata, Forro en lona Color: amarillo * Azul




Dentro de los especificaciones técnicas requeridas en el ítem no 1 (tatamis) estos deben venir homologados y avalados por la Federación internacional WKF, si bien es cierto son elementos de tránsito en el mercado nacional; en Colombia solo existe un solo importador y distribuidor que cumple con las exigencias técnicas requeridas en el pliego bajo una marca recocida mundialmente que es (DAEDO)

Las especificaciones técnicas solicitadas en este item (tatami) obedecen a que ellas al momento de acoplarse entre sí deben formar un octógono que es el área de competencia y juzgamiento. como se puede apreciar en la figura anexa.


JEREMÍAS
FUNDACIÓN

320 550 5252
fundacionsportech@gmail.com
Calle 40 # 43 - 149 - Barranquilla

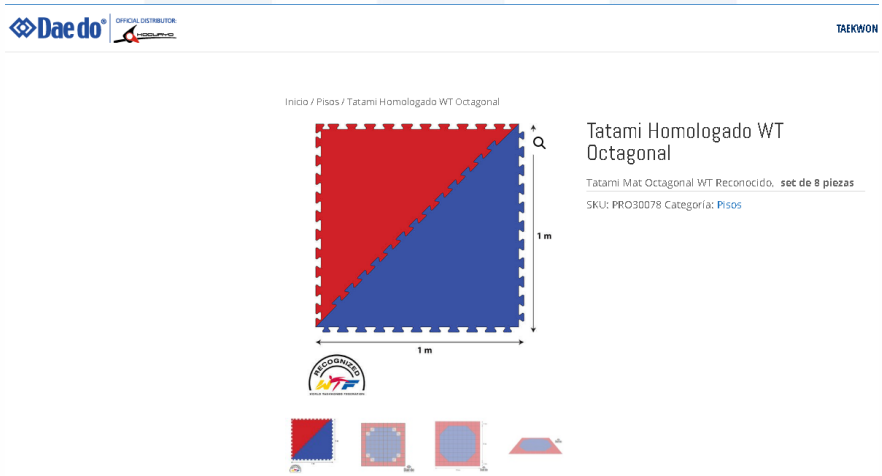

Son pocas las marcas avaladas para esta disciplina deportiva que contenga esta particularidad de forma. desde el inicio del proceso contractual nos comunicamos con dicho importador Kyuguro el cual nos informó que si tenían los tatamis pero no la cantidad requerida (244 piezas); que esta podía completarse en el mes de febrero 2022 ya que los contenedores con la importación estarían llegado para esa fecha

Por tal razón debimos acudir a un proveedor internacional que tuviera las características exigidas en la ficha técnica, además de que estos (tatamis) poseen una característica única en su acople (forma octogonal)

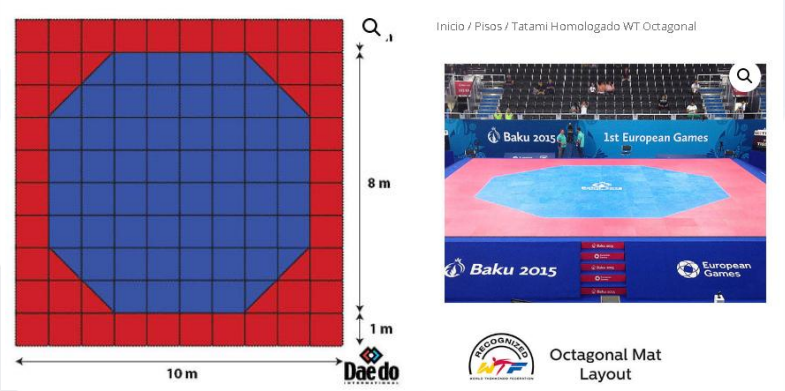

ANEXO IMAGEN

JEREMÍAS
FUNDACIÓN

320 550 5252
fundacionsportech@gmail.com
Calle 40 # 43 - 149 - Barranquilla

Si bien es cierto son varias las marcas que son avaladas por la WKF pero son pocas las que traen este tipo característica reduciendo el mercado para ellas. Hacemos énfasis en este tipo de estructura: ya se requirió de un periodo de

- tiempo para hallar el proveedor **SPORFIT** Que desarrollara este tipo de estructura de forma octogonal exigido además que contara con el aval de la WKF

- Tiempo de fabricación del material que requirió desde el momento del invoice el cual anexo

- Tiempo de transporte del material desde la empresa fabricante ubicado en la ciudad QUINGDAO en china a la empresa transportadora MAOYI ubicado en IUWU / china para su embalaje y próximo despacho

- el contrato establece un plazo de ejecución de 60 días contemplados para la adquisición de estos elementos, pero este periodo de tiempo es muy corto ya que no fue posible adquirirlo en el mercado local (Colombia) **NO ES POSIBLE** encontrar otro distribuir o importador que contenga este tipo de material y cantidad. por tal razón esta circunstancia conlleva a caso fortuito. así las cosas los tiempos que se evaluaron en el estudio previo no son los mismo por las razones de importación del objeto contractual, ya que se requiere de un tiempo de 120 días para su importación y legalización

- adicionalmente anexamos las razones de la trasportadora ya que los elementos del presente contrato han sido recibidos desde el pasado 15 septiembre en las instalaciones de la empresa maoyi en yiwu -china pero no ha sido posible su despacho por temas de represamiento de carga debido a la pandemia (covid19)

Por todas las razones expuestas le solicitaos contados respeto a la entidad un plazo de 40 días que es el tiempo de Transporte del contenedor más el tiempo de nacionalización es decir el 30 de diciembre del año en curso para su entrega e instalación

Anexo

Anexo Carta De La Compañía Intermediación Aduanera
Anexo Del Invoice

FUNDACION JEREMIAS
RL CARLOS ALEXADER PAREDES

JEREMÍAS
FUNDACIÓN

320 550 5252
fundacionsportech@gmail.com
Calle 40 # 43 - 149 - Barranquilla

SPORFIT QINGDAO SANHONG GLOBAL INDUSTRIAL CO.,LTD

PROFORMA INVOICE

Seller: Qingdao Sanhong Global Industrial Co.,ltd P/I NO:21SG0906
Buyer: Yosman
Address:河北省定州市李亲顾镇李辛庄周先生
15158983816

Marks & No.	Description of Goods	Quantity (pieces)	Unit Price (USD/pieces)	Total amount （USD）
		EXW 河北		
EVA MAT	WTF Taekwondo mat 1m x 1m x 25mm red and blue	244		
			Freight	
Total		244 PIECES		

Amount: SAY USD TWO THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY EIGHT POINT SIX EIGHT ONLY Time of production:
About 20days after received the advance payment.
Time of Delivery:4-5days
Package: Be packed with woven bag.
Terms of Payment:100% T/T payment in advance.

BANK INFORMATION:
Bank Name: AGRICULTURAL BANK OF CHINA, QINGDAO BRANCH
Bank Add: NO.21,HONGQI ROAD,PINGDU CITY,QINGDAO,CHINA
SWIFT: ABOCCNBJ380
Beneficiary: QINGDAO SANHONG GLOBAL INDUSTRIAL CO.,LTD
A/C NO.: 38160114040019478
Benefiiary Add:NO.17 CHANGJIANG ROAD PINGDU CITY QINGDAO CHINA

青岛三鸿体育用品有限公司

THE SELLER: QINGDAO SANHONG GLOBAL INDUSTRIAL CO.,LTD

Buyer: Yosman
Address:河北省定州市李亲顾镇李辛庄周先生
15158983816

JEREMÍAS
FUNDACIÓN

320 550 5252
fundacionsportech@gmail.com
Calle 40 # 43 - 149 - Barranquilla

MAOYI pacific

Señores

Fundación Jeremías

Ciudad

Asunto: Transporte y nacionalización

Yo Juan Fernando Monsalve Moreno. Representante legal de MAOYI PACIFIC bajo nit 900.627.104 dando respuesta a sus diferentes correos electrónicos y llamadas pongo a su conocimiento que la carga ha llegado a nuestra Bodega en Yiwu. Desde el 15 septiembre, pero por razones de colapso en las navieras por temas de represamiento de carga obedeciendo a lo acontecido por la pandemia (COVID-19) no tienen espacio en los buques, adicional a esto la escasez de contenedores está más compleja debido a las cargas de fin de año obligándonos a esperar las condiciones que establezcan las diferentes navieras para su despacho, por tal razón su carga no ha salido en la fecha prevista y la entrega del 30 octubre en Colombia no fue posible.

Estaremos embarcando contenedor la primera semana de noviembre (7) la carga estará entrando a Colombia / buenaventura en la primera / segunda semana de diciembre luego su nacionalización posterior entrega Bucaramanga.

Agradezco su comprensión.

Juan Fernando Monsalve Moreno
Maoyi pacific.

Centro Industrial San Jorge, B. 13 • Tel. (7)6914888
Anillo Vial vía Girón / Floridablanca
Girón - Santander

www.maoyipacific.com
info@maoyipacific.com

Av. Quebradaseca No. 18-32
Teléfono: (7) 6978385
Bucaramanga - Colombia
