	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	28	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1340 **DE** 2020

INTERVENTOR: INCOPLAN S.A
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001 de 2020

CONTRATISTA: TEKTON ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S (Firma contratada por el Municipio en el marco del convenio 1043 de 2020)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2020
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2020 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
NA		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	31/12/2020	14/03/2021
2	15/03/2021	31/03/2021
3	1/04/2021	30/04/2021

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	NA	5/04/2021	5/04/2021	4/05/2021	5/05/2021
1	1	30/04/2021	5/05/2021	5/06/2021	6/06/2021
1	2	4/06/2021	6/06/2021	4/07/2021	5/07/2021
1	3	2/07/2021	5/07/2021	19/07/2021	20/07/2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	28	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/08/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 154.817.046,00 **50% EN SMMLV:** 88,184
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	27/03/2021	$ 76.527.710,00	$ 908.526,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 231.344.756,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 2021-439-IDP-2430 de fecha 28 de julio de 2021 el Interventor solicita lo siguiente:

Prorroga del plazo del contrato de interventoría hasta el 31 de octubre de 2021

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales realizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia del contrato de obra suscrito por el Municipio Francisco Pizarro en el marco del convenio 1043 de 2020, en razon a la prórroga al contrato de obra objeto de supervision y control

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: junio (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) $ 89.114.935,00 Último mes facturado: feb-21 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 142.229.821,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD
(La justificación debe emitirse de manera precisa y detallada)

La firma INCOPLAN S.A, en ejecución contrato de interventoría 1340 de 2020, mediante oficio 2021-439-IPD-2430 del 28 de julio de 2021, solicita al Instituto la prórroga del contrato desde el 15 de agosto de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021 sin adición de recursos, argumentando que acepta y avala la solicitud de prórroga solicitada en el oficio TK-FPZ-63-2021 del 26 de julio de 2021 por la firma TEKTON ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S hasta el 31 de octubre de 2021 en el marco de ejecución del contrato No. LP-001-2020 derivado del convenio 1043 de 2020, el cual fue suscrito por esta firma y el Municipio Francisco Pizarro, solicitud que también fue avalada por el municipio, motivo por el cual se requiere el presente tramite para garantizar el seguimiento y control al contrato de obra derivado del convenio.

Por lo anterior y con el fin de continuar con el adecuado seguimiento, control y vigilancia del proyecto, se requiere, al igual que al contrato de obra, prorrogar el contrato de interventoría hasta el 31 de octubre de 2021, toda vez que tanto el municipio en calidad de ejecutor de los recursos del convenio 1043 de 2020 y contratante de las obras derivadas y la interventoría contratada por INVIAS consideran conveniente ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra hasta la fecha solicitada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	28	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA Solicitud de prórroga oficio 2021-439-IDP-2430 - Oficio TK-FPZ-63-2021

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)
Se aclara que la próroga solicitada por la interventoría no requiere adición de recursos

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **SANTIAGO PAEZ TALERO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No.

Firma
Nombre: **JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 05202-141806 ANT

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO**
Director Territorial Nariño (E)

Vo.Bo.Firma
Nombre: **GERMÁN ANDRÉS MONTES ROJAS**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.: 25202-112916 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ALEXANDER PATARROYO SAMUDIO**
Abogado Unidad Ejecutora

ROGER RODRIGUEZ MORENO
Firmado digitalmente por ROGER RODRIGUEZ MORENO
Firma
Nombre: **ROGER RODRÍGUEZ MORENO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 25202-117527 CND

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

Bogotá, julio 28 de 2021 2021-439-IDP-2430

Señores
Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Att: Dr. Roger Rodríguez
Sub-Dirección Marítima y Fluvial
Ciudad

Ref: Contrato 1340/2020. Interventoría al dragado de Mantenimiento de los esteros, Salahonda, Mariano y Punto Frio del municipio Francisco Pizarro, departamento de Nariño

Asunto: Solicitud prórroga del contrato de interventoría.

Cordial Saludo Ingeniero Roger,

Toda vez que el contratista de obra mediante oficio TK-FPZ-63-2021 del 26 de julio de 2021 solicitó a la alcaldía municipal de Francisco Pizarro prórroga del contrato de obra LP-001-2020 hasta el 31 de octubre de 2021, y que al evaluar la solicitud tanto el municipio como la interventoría consideran viable otorgar la prórroga, nos permitimos solicitarles a ustedes prorrogar el contrato de interventoría 1340 de 2020 hasta esta misma fecha, es decir el 31 de octubre de 2021, con el fin de continuar con la realización del adecuado seguimiento, control y vigilancia del contrato de obra antes mencionado.

Cabe mencionar que la prórroga del contrato de interventoría, no requiere adición de recursos.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO CERTUCHE
Director Interventoría

Anexo: carta TK-FPZ-063-2021, de Tekton.

fev/cc

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 800.099.085-3

Francisco Pizarro, 27 de julio de 2021

Doctora
CATALINA TELLEZ POSADA
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Doctor
ROGER RODRIGUEZ MORENO
SUBIRECTOR DE MARÍTMA Y FLUVIAL - INVIAS

Ref.: Solicitud de prorroga al contrato de interventoría al contrato de la licitación público LP 001 2021 resultante de la ejecución del CONVENIO 1043- 2020 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

Cordial saludo:

LUIS GERARDO VALENCIA CUENU, actuando en nombre y representación legal del Municipio de Francisco Pizarro, Nariño, de manera respetuosa ante Ustedes a fin de solicitar se sirva realizar otro si adicional en tiempo al contrato de interventoría de la licitación público LP 001 2021 del Convenio Interadministrativo No 1043 de 2020, suscrito entre INVIAS, el Departamento de Nariño y el Municipio Francisco Pizarro, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**.

Se debe tener presente que dentro de las obligaciones contractuales pactadas en el citado convenio se estableció como ejecutor de las obras al Municipio, el cual, en cumplimiento de lo anterior, adelantó el proceso de selección cuyo objeto es el **DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO**, cuya finalidad es la de contratar y ejecutar las obras de dragado y limpieza en estos esteros lo que permitiría el transito normal de embarcaciones de pasajeros y/o carga la mayor parte del año en condiciones seguras.

Conforme a lo anterior y como es de su conocimiento el contrato de obra pública suscrito, vence el 14 de agosto de 2021, no obstante nos hemos visto en la necesidad conforme a la solicitud expresada por la firma CONTRATISTA, el ampliar y prorrogar su ejecución en un tiempo prudencial, situación que fue analizada por el Municipio y debidamente avalada,

en tal sentido se realizo solicitud de prórroga al CONVENIO referenciado mismos que vence el 31 de agosto de 2021.

Así las cosas solicito a INVIAS se estudie la posibilidad de realizar la prorroga al contrato de Interventoría con la firma interventora INCOPLAN S.A de la OBRA PUBLICA No LP-001-2020. puesto que se encuentra respaldadas con las justificaciones técnicas, jurídicas, financieras, presupuestales y ambientales.

Por su amable y gentil atención.

Atentamente,

LUIS GERARDO VALENCIA CUENU
Alcalde Municipio de Francisco Pizarro

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1340 DE 2020

Objeto: INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:	X	
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 29 días del mes de julio del año 2021.

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MORENO ROGER

Nombre: ROGER RODRIGUEZ MORENO
Ordenador del Pago
Subdirección: Marítima y Fluvial
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


Nombre: HUMBERTO CALDERÓN CALDERÓN
Coordinador del Proyecto
Subdirección: Marítima y Fluvial
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


Nombre: GERMÁN ANDRÉS MONTES ROJAS
Gestor del Proyecto
Subdirección: Marítima y Fluvial
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


PANTALLAZOS APLICATIVOS TRÁMITE DE PRÓRROGA 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1340 DE 2020

SECOP II

Fecha de los pantallazos 28 de julio de 2021

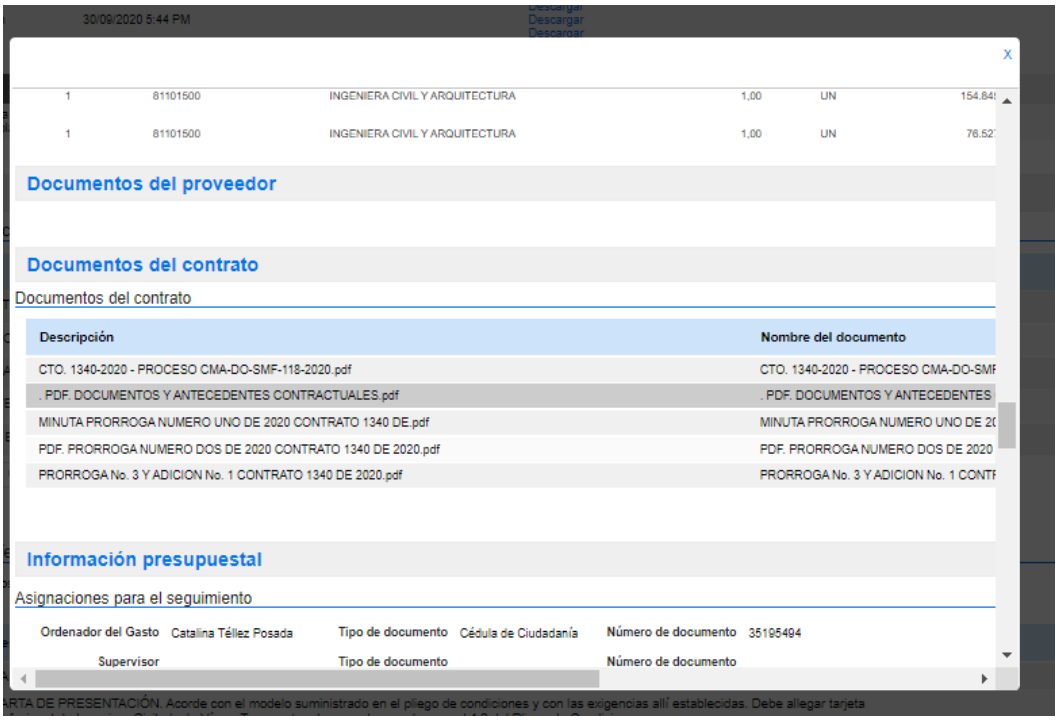


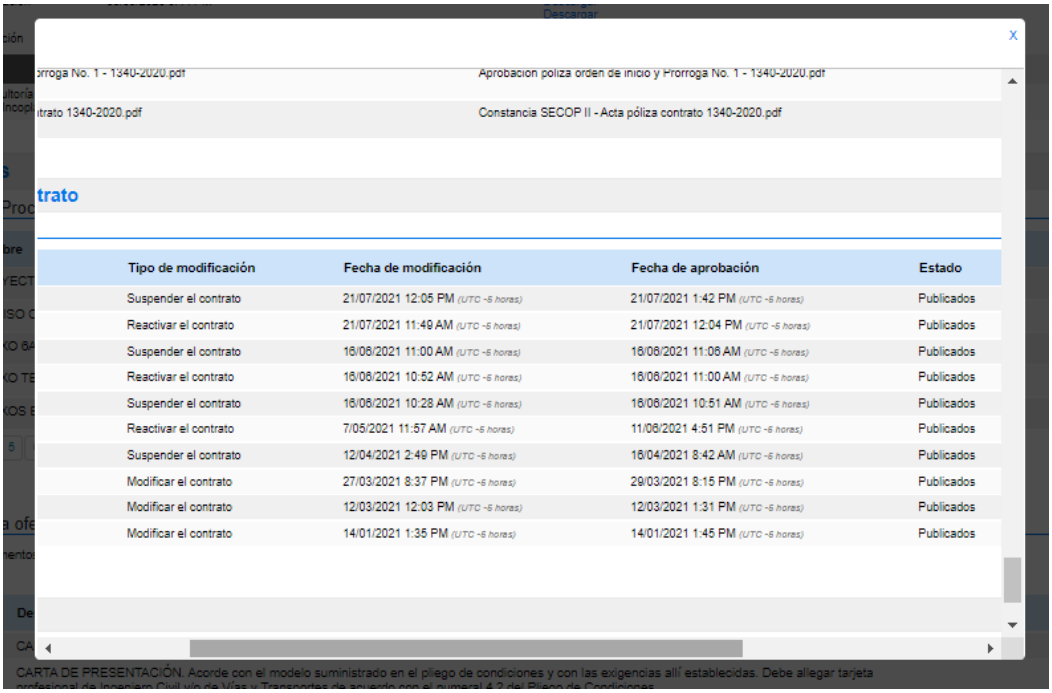

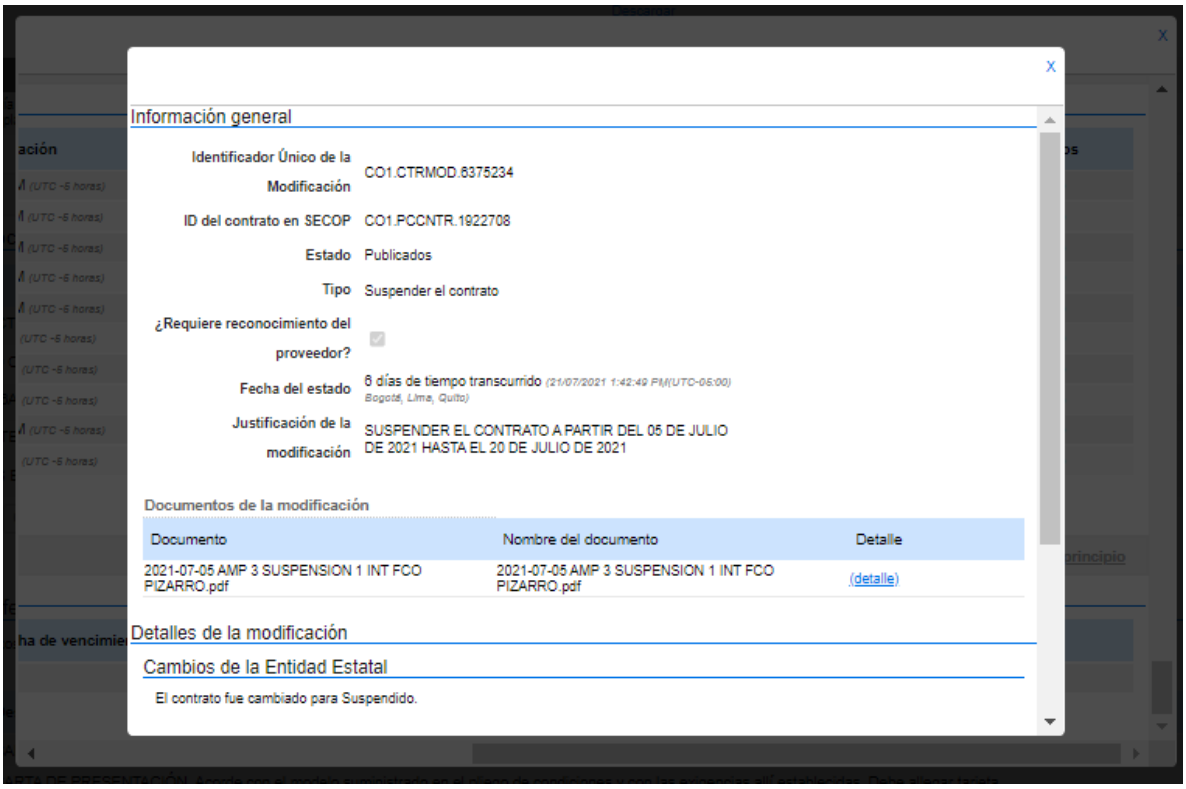

SICO

Fecha de los pantallazos 28 de julio de 2021

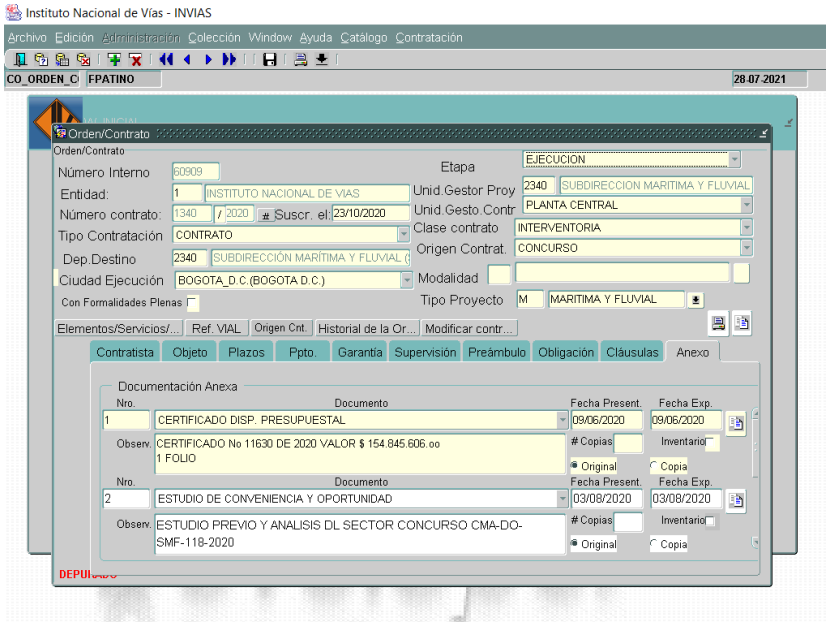

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Asesora Juridica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: 1340 **Fecha:** 30 de noviembre de 2020

Contratista: INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. INCOPLAN S.A.

Objeto: ¿INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRÍO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO¿

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:
Rec Adj:
Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CERTIFICADO No 11630 DE 2020 VALOR $ 154.845.606.oo 1 FOLIO
2	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	ESTUDIO PREVIO Y ANALISIS DL SECTOR CONCURSO CMA-DO-SMF-118-2020 61 FOLIOS
3	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	ANEXO TECNICO DEL PROYECTO CMA-DO-SMF-118-2020 17 FOLIOS
4	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMULARIO DE EXPERIENCIA PERSONAÑ 1 FOLIO
5	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	NORMATIVIDAD Y ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES 23 FOLIOS
6	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PRESUPUESTO OFICIAL 1 FOLIO
7	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMULARIO DE CAPACIDAD FINANCIERA 2 FOLIOS
8	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	MATRIZ DE RIESGOS 4 FOLIOS
9	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CIRCULAR EXTERNA No 002 MES DE ABRIL DE 2020 7 FOLIOS
10	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CIRCULAR EXTERNA No 003 DE 2020 11 FOLIOS
11	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	LISTADO DE PRECIOS REFERENCIA INSUMOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 1 FOLIO
12	AVISO DE PRENSA	AVISO DE CONVOCATORIA CONCURSO CMA-DO-SMF-118-2020 7 FOLIOS
13	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	APENDICE D GESTION AMBIENTAL PROCESO CMA-DO-SMF-118-2020 19 FOLIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Asesora Juridica

FICHA TECNICA

14	PLIEGO DE CONDICIONES	PLIEGO DE CONDICIONES CMA-DO-SMF-118-2020 131 FOLIOS
15	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	METODOLOGIA Y PLAN D ECARGAS DE TRABAJO CMA-DO-SMF-118-2020 29 FOLIOS
16	PLIEGO DE CONDICIONES	PLIEGO DEFINITIVOS DEL CPROCESO CMA-DO-SMF-118-2020 131 FOLIOS
17	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	APENDICE D GESTION AMBIENTAL DEFINITIVOS 19 FOLIOS
18	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO DEFINITIVOS 29 FOLIOS
19	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	ANEXO TECNICO DE PROYECTO DEFINITIVO CMA-DO-SMF-118-2020 17 FOLIOS
20	CERTIFICACION BANCARIA	CERTIFICACION BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No 219-01763-2 1 FOLIO
21	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	RUT DEL CONTRATIS Y SU REPRESNETANET LEGAL 2 FOLIOS
22	RESOLUCION DE ADJUDICACION	RESOLUCION No 2373 DEL 13-10-2020 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO CMA-DO-SMF-118-2020 3 FOLIOS
23	CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO No 1340 DE 2020 INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS SALAHONDA MUNICIPIO D EPIZARRO 6 FOLIOS
24	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION Y FIRMA DEL CONTRATO EN EL SECOP II 2 FOLIOS
25	MEMORANDO	DC 63976 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ REMITEN CONTRATO 2 FOLIOS
26	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PROYECCION DE PAGOS DEL CTO 1340-2020 1 FOLIO
27	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO No 628320 DE 2020 VALOR $ 154.817.046.oo 1 FOLIO
28	OFICIO	OFICIO NO 1769-DC-2020 REMITEN HOJAS DE VIDA 22 FOLIOS
29	OFICIO	SMF 46143 DE 2020 PARA SANTIAGO PAEZ OBSERVACIONES HOJA D EVIDA 1 FOLIO
30	OFICIO	OFICIO 1807-DC-2020 RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE HOJA DE VIDA 27 FOLIOS
31	OFICIO	SMF 48465 DE 2020 PARA SANTIAGO PAEZ APROBACION HOJAS DE VIDA 1 FOLIO
32	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ANEXO No 1 DE LA POLIZA No M-100127759 SEGUROS MUNDIAL 2 FOLIOS
33	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APORBACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO AMPARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Asesora Juridica


FICHA TECNICA

		1 FOLIO
34	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP II LA APROBACION D ELA POLIZA 1 FOLIO
35	MEMORANDO	DC 75639 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ REMITEN APORBACION POLIZA 2 FOLIOS
36	ORDEN DE INICIACION	SMF 51356 PARA SANTIAGO PAEZ ORDEN DE INICIO 2 FOLIO
37	MEMORANDO	SMA 63696 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ PROCEOS AMBIENTALES 2 FOLIOS
38	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOLICITU DE PRRROGA DE TRES MESES 11 FOLIOS
39	CONTRATO ADICIONAL	PRORROGA No UNO AL CONTRATO 1340-2020 PLAZO HASTA EL 14 DE MARZO DE 2021 2 FOLIOS
40	OFICIO	SMF 4559 PARA FABIO VILLAMIL SOLICITUD ANTICIPO CTO DE OBRA 1 FOLIO
41	OFICIO	DC 8266 DE 2021 PARA GERMAN MONTES DESIGNACION GESTOR TECNICO 2 FOLIOS
42	OFICIO	PARA JONNY FAJARDO REPORTE PRELIMINAR DE LOS ESTUDIOS PARA EL DRAGADO 5 FOLIOS
43	OFICIO	PARA MARIO CAICEDO PLAN LOGISTICO PARA LA NAVEGACION 1 FOLIO
44	OFICIO	PARA TEKTON ARQUITECTURA EQUIPO PARA EL DRAGADO 2 FOLIOS
45	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOLUCITUD DE PRORROGA 13 FOLIOS
46	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ANEXO No 5 DE MODIFICACION A LA POLIZA No M-100127759 SEGUROS MUNDIAL 2 FOLIOS
47	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN SECOP II APORBACION ANEXO 5 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 3 FOLIO
48	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CATA DE APORBACION GARANTIA AMPARA ORDEN DE INICIO, PRORROGA 1 1 FOLIO
49	MEMORANDO	DC 17463 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ REMITEN ACTA DE APORBACION POLIZA 2 FOLIOS
50	COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN	PRORROGA DOS AL CONTRATO 1340-2020 PLAZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 2 FOLIOS
51	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOLICITUD DE ADCION NY PRORROGA DEL CTO 1340-2020 13 FOLIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Asesora Juridica

FICHA TECNICA

52	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CERTIFICADO No 110221 VALOR $ 76.527.710.oo 1 FOLIO
53	CONTRATO ADICIONAL	ADICONAL No 1 Y PRORROGA No TRES PLAZO HASTA EL 30 DE ABRIL 2021 Y VALOR $ 76.527.710. 2 FOLIOS
55	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP CONTRATO ADICIONAL 1 FOLIO
56	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP 1 FOLIO
57	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 6 DE MODIFICACION A LA POLIZA No 100127759 SEGUROS MUNDIAL 3 FOLIOS
58	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO No 2974221 VALOR $ 76.527.710.oo 2 FOLIOS
59	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 6 FOLIOS
60	OFICIO	PARA EL MUNICIPIO SOLICITUD SUSPENSION CTO DE OBRA 3 FOLIOS
61	ACTA DE SUSPENSION	ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DERIVADO LP-001-2020 2 FOLIOS
62	ACTA DE SUSPENSION	ACTA DE SUSPENSION No 1 DESDE EL 5-4-21 HASTA EL 05-05-21 NUEVA FECHA VENCIMIENTO 30-05-2021 2 FOLIOS
63	OFICIO	PARA JONNY FAJARDO SOLICITUD SUSPENSION DEL CONTRATO 1 FOLIO
64	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 8 DE MODIFICACION A LA POLIZA No 100127759 SEGUROS MUNDIAL 4 FOLIOS
65	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP APROBACION POLIZAS 4 FOLIOS
66	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP APROBACION POLIZA ANEXO 8 4 FOLIOS
67	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APORBACION DE LA RAGIRANTIA AMPARA PRORROGA 2 Y ADICION 1 PRORROGA 3 1 FOLIOS
68	MEMORANDO	DC 25873 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ REMITEN ACTA APORBACION POLIZA 2 FOLIOS
69	MEMORANDO	DC 22625 DE 2021 PARA ROGER REMITEN PRRROGA DEL CONTRATO 2 FOLIOS
70	ACTA DE SUSPENSION	ACTA No 1 DE SUSPESNION DESDE 05-05-2021 HASTA 05-06-21 TERMINA EL 01-07-21 2 FOLIOS
71	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL GSTOR TECNICO DE PROYECTO 7 FOLIOS

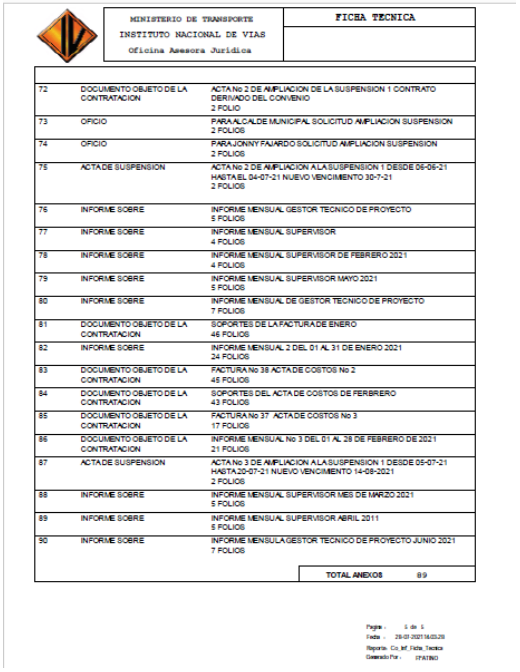

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Asesora Jurídica


FICHA TECNICA

72	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	ACTA No 2 DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION 1 CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 2 FOLIO
73	OFICIO	PARA ALCALDE MUNICIPAL SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION 2 FOLIOS
74	OFICIO	PARA JONNY FAJARDO SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION 2 FOLIOS
75	ACTA DE SUSPENSION	ACTA No 2 DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 1 DESDE 06-06-21 HASTA EL 04-07-21 NUEVO VENCIMIENTO 30-7-21 2 FOLIOS
76	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 5 FOLIOS
77	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR 4 FOLIOS
78	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DE FEBRERO 2021 4 FOLIOS
79	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR MAYO 2021 5 FOLIOS
80	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL DE GESTOR TECNICO DE PROYECTO 7 FOLIOS
81	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOPORTES DE LA FACTURA DE ENERO 46 FOLIOS
82	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL 2 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 24 FOLIOS
83	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FACTURA No 38 ACTA DE COSTOS No 2 46 FOLIOS
84	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOPORTES DEL ACTA DE COSTOS DE FERBRERO 43 FOLIOS
85	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FACTURA No 37 ACTA DE COSTOS No 3 17 FOLIOS
86	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	INFORME MENSUAL No 3 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 21 FOLIOS
87	ACTA DE SUSPENSION	ACTA No 3 DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 1 DESDE 05-07-21 HASTA 20-07-21 NUEVO VENCIMIENTO 14-08-2021 2 FOLIOS
88	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR MES DE MARZO 2021 5 FOLIOS
89	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR ABRIL 2011 5 FOLIOS
90	INFORME SOBRE	INFORME MENSULA GESTOR TECNICO DE PROYECTO JUNIO 2021 7 FOLIOS
		TOTAL ANEXOS 89

Pagina : 5 de 5
Fecha : 28-07-2021 16:03:29
Reporte Cc_Inf_Ficha_Tecnica
Generado Por : FFIETRO


SEPRO


Fecha del pantallazo 28 de julio de 2021

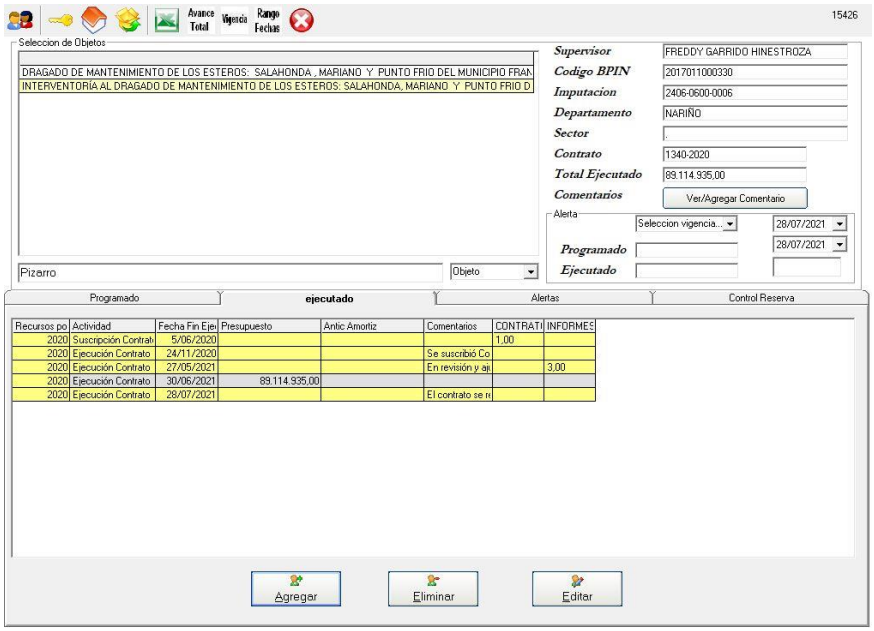


CIFRA


Fecha del pantallazo 28 de julio de 2021

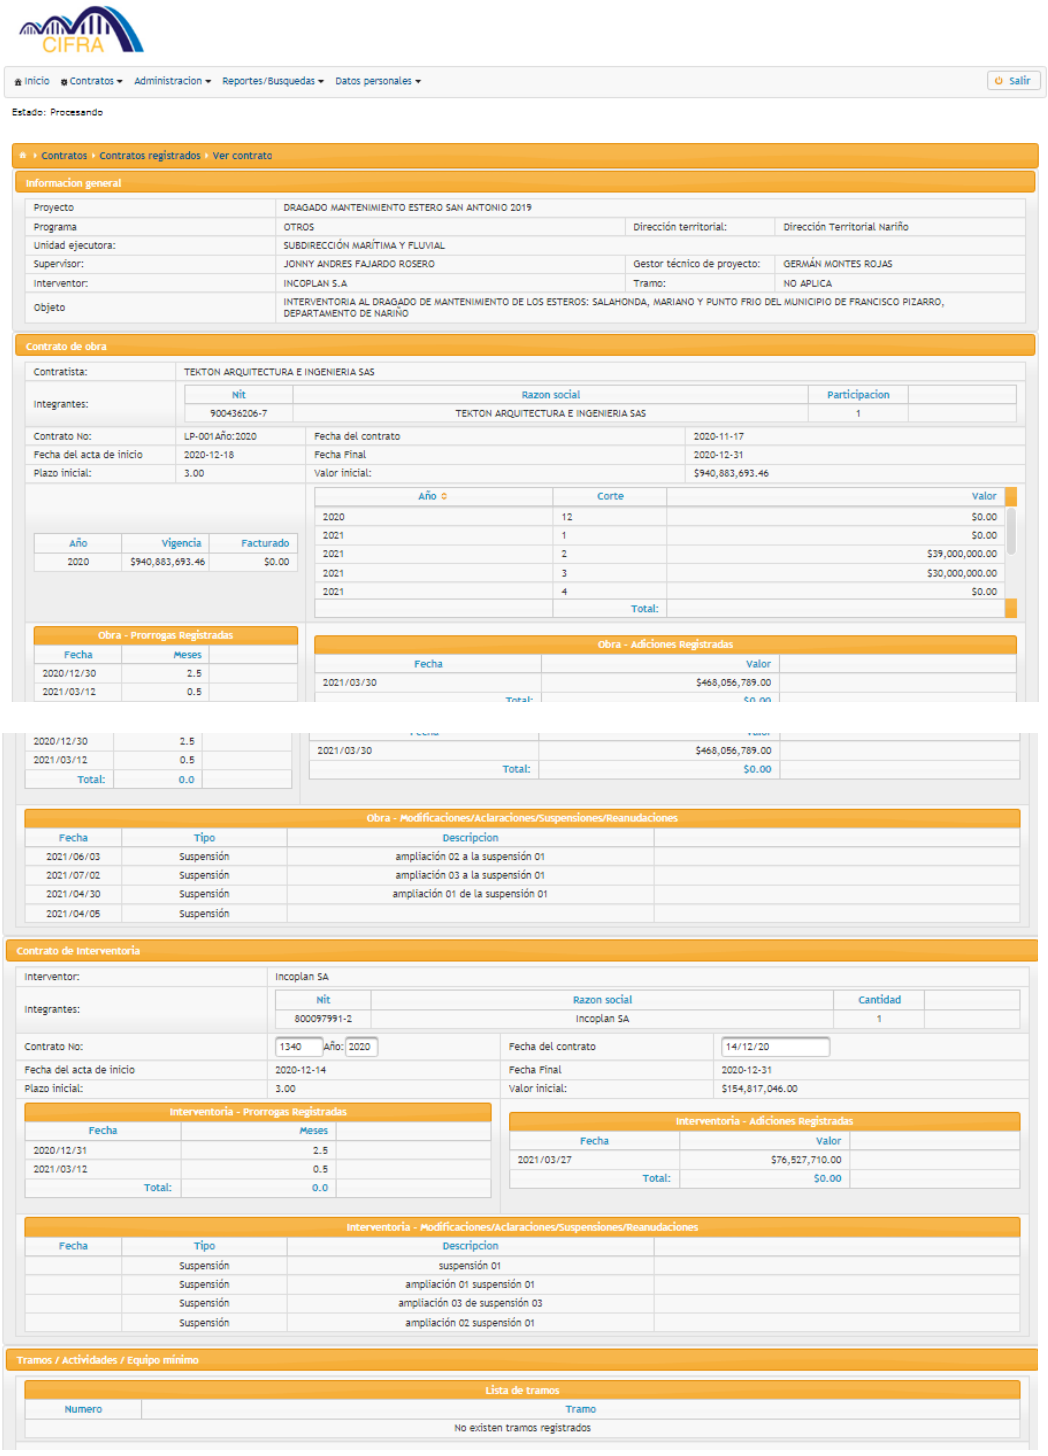

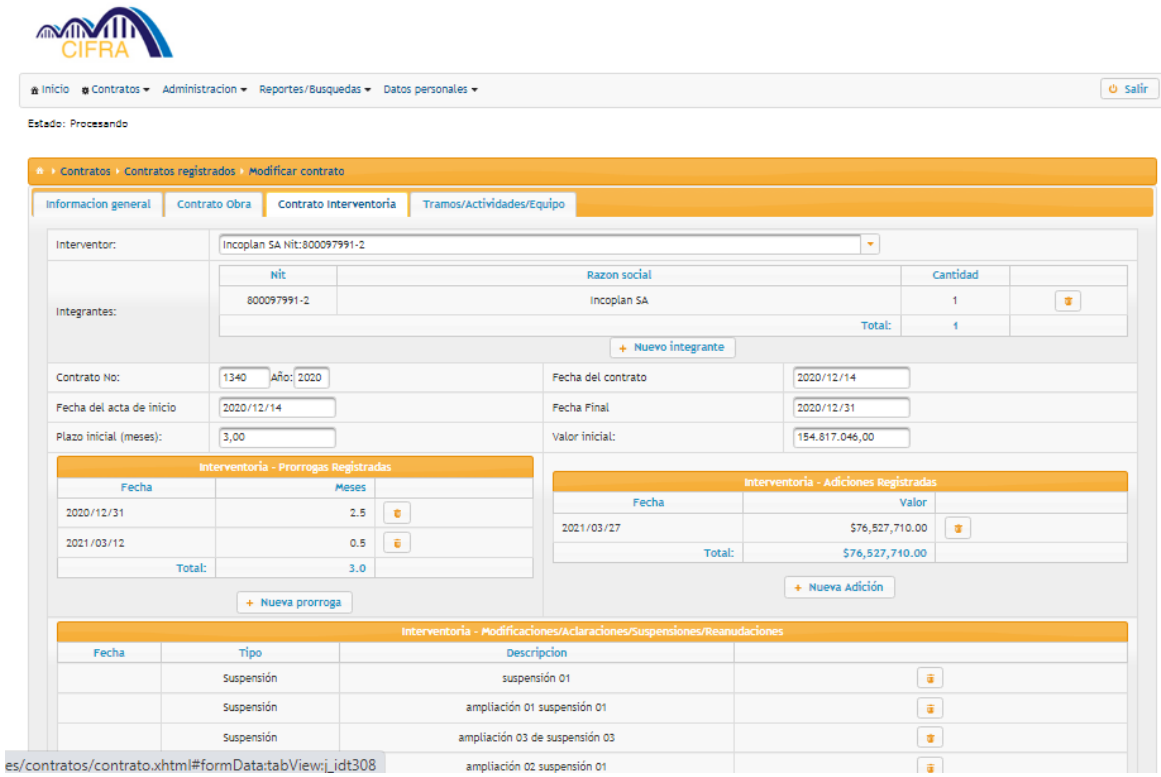

es/contratos/contrato.xhtml#formData:tabView:j_idt308

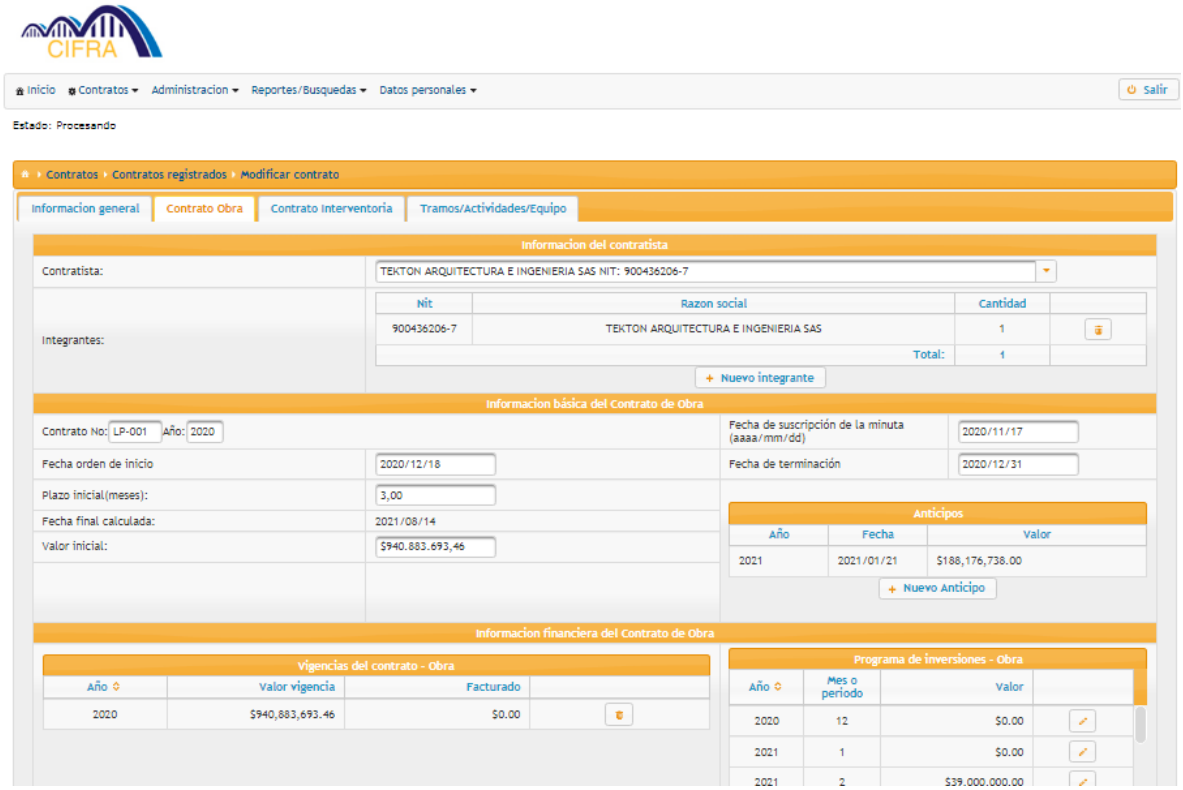

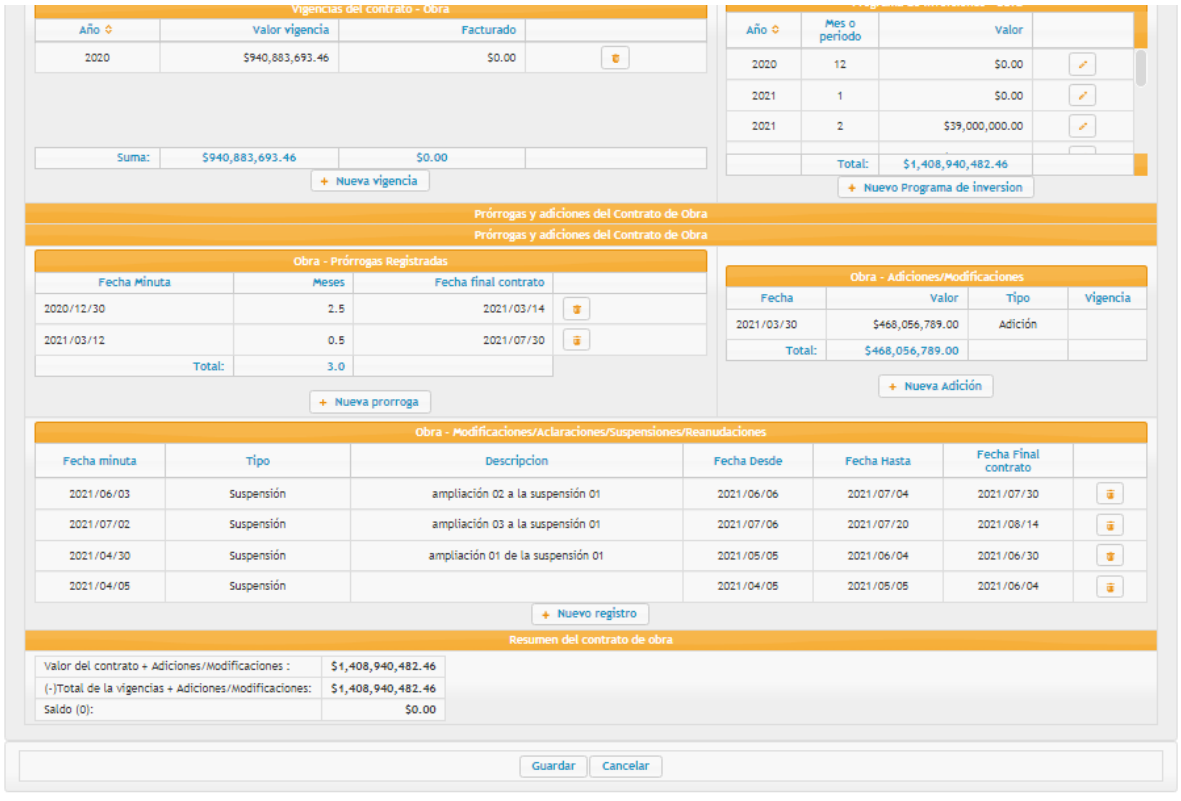

Vigencias del contrato - Obra

Año	Valor vigencia	Facturado	
2020	$940,883,693.46	$0.00	
Suma:	$940,883,693.46	$0.00	

+ Nueva vigencia

Año	Mes o periodo	Valor	
2020	12	$0.00	
2021	1	$0.00	
2021	2	$39,000,000.00	
	Total:	$1,408,940,482.46	

+ Nuevo Programa de inversion

Prórrogas y adiciones del Contrato de Obra

Prórrogas y adiciones del Contrato de Obra

Obra - Prórrogas Registradas

Fecha Minuta	Meses	Fecha final contrato	
2020/12/30	2.5	2021/03/14	
2021/03/12	0.5	2021/07/30	
Total:	3.0		

+ Nueva prorroga

Obra - Adiciones/Modificaciones

Fecha	Valor	Tipo	Vigencia
2021/03/30	$468,056,789.00	Adición	
Total:	$468,056,789.00		

+ Nueva Adición

Obra - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones


Fecha minuta	Tipo	Descripcion	Fecha Desde	Fecha Hasta	Fecha Final contrato	
2021/06/03	Suspensión	ampliación 02 a la suspensión 01	2021/06/06	2021/07/04	2021/07/30	
2021/07/02	Suspensión	ampliación 03 a la suspensión 01	2021/07/06	2021/07/20	2021/08/14	
2021/04/30	Suspensión	ampliación 01 de la suspensión 01	2021/05/05	2021/06/04	2021/06/30	
2021/04/05	Suspensión		2021/04/05	2021/05/05	2021/06/04	


+ Nuevo registro


Resumen del contrato de obra

Valor del contrato + Adiciones/Modificaciones :	$1,408,940,482.46
(-)Total de la vigencias + Adiciones/Modificaciones:	$1,408,940,482.46
Saldo (0):	$0.00

Guardar Cancelar

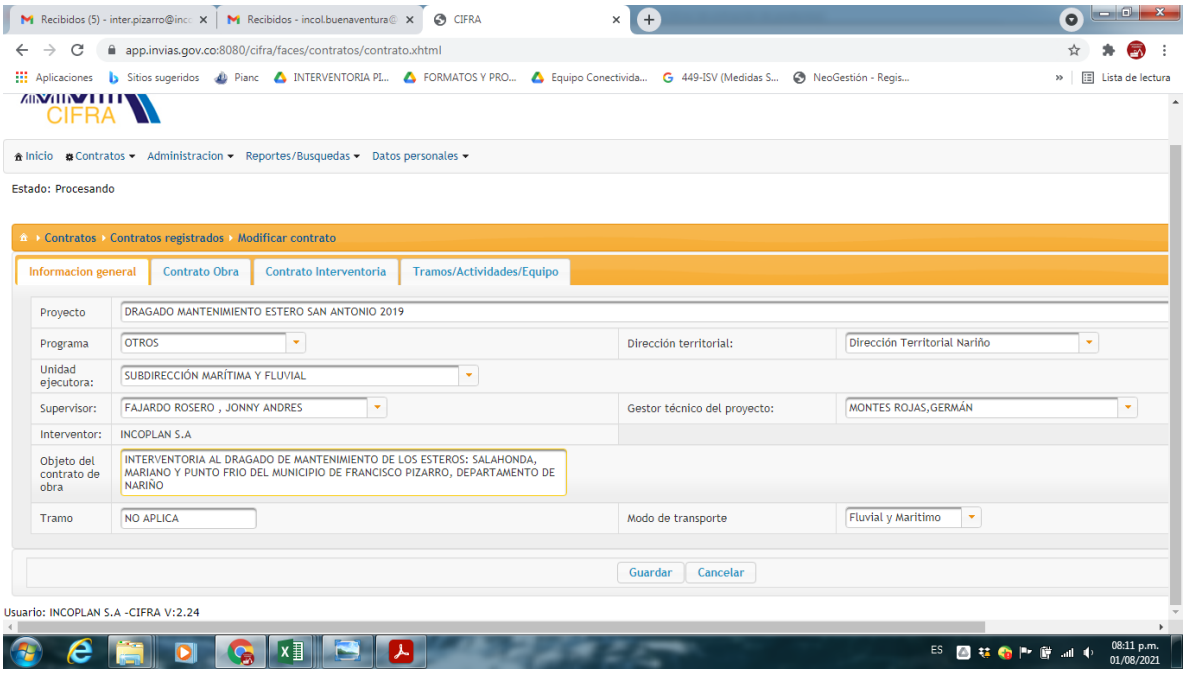

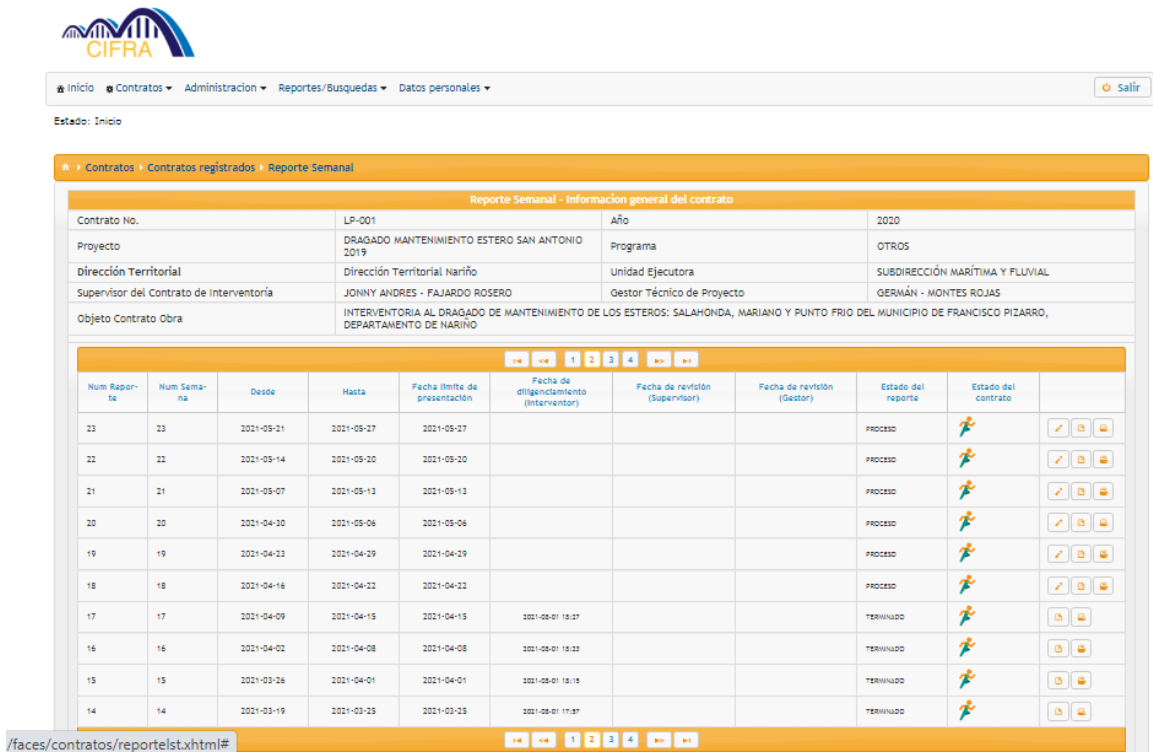
CIFRA
Inicio
Contratos
Administracion
Reportes/Busquedas
Datos personales
Salir
Estado: Inicio
Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal
Reporte Semanal - Informacion general del contrato
Contrato No.
LP-001
Año
2020
Proyecto
DRAGADO MANTENIMIENTO ESTERO SAN ANTONIO 2019
Programa
OTROS
Dirección Territorial
Dirección Territorial Nariño
Unidad Ejecutora
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Supervisor del Contrato de Interventoría
JONNY ANDRES - FAJARDO ROSERO
Gestor Técnico de Proyecto
GERMÁN - MONTES ROJAS
Objeto Contrato Obra
INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Num Reporte
Num Semana
Desde
Hasta
Fecha limite de presentación
Fecha de diligenciamiento (Interventor)
Fecha de revisión (Supervisor)
Fecha de revisión (Gestor)
Estado del reporte
Estado del contrato
23 23 2021-05-21 2021-05-27 2021-05-27 PROCESO
22 22 2021-05-14 2021-05-20 2021-05-20 PROCESO
21 21 2021-05-07 2021-05-13 2021-05-13 PROCESO
20 20 2021-04-30 2021-05-06 2021-05-06 PROCESO
19 19 2021-04-23 2021-04-29 2021-04-29 PROCESO
18 18 2021-04-16 2021-04-22 2021-04-22 PROCESO
17 17 2021-04-09 2021-04-15 2021-04-15 2021-05-01 15:27 TERMINADO
16 16 2021-04-02 2021-04-08 2021-04-08 2021-05-01 15:23 TERMINADO
15 15 2021-03-26 2021-04-01 2021-04-01 2021-05-01 15:15 TERMINADO
14 14 2021-03-19 2021-03-25 2021-03-25 2021-05-01 17:37 TERMINADO
/faces/contratos/reportelst.xhtml#

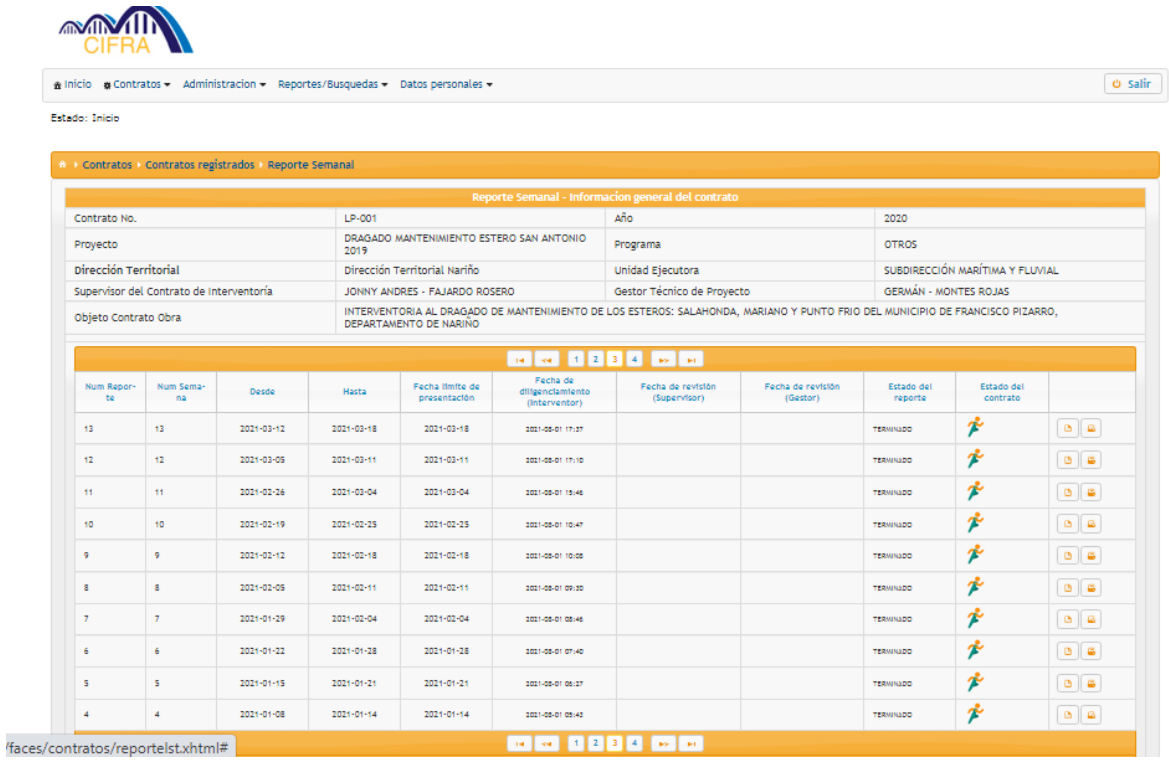
CIFRA
Inicio
Contratos
Administracion
Reportes/Busquedas
Datos personales
Salir
Estado: Inicio
Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal
Reporte Semanal - Informacion general del contrato
Contrato No.
LP-001
Año
2020
Proyecto
DRAGADO MANTENIMIENTO ESTERO SAN ANTONIO 2019
Programa
OTROS
Dirección Territorial
Dirección Territorial Nariño
Unidad Ejecutora
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Supervisor del Contrato de Interventoría
JONNY ANDRES - FAJARDO ROSERO
Gestor Técnico de Proyecto
GERMÁN - MONTES ROJAS
Objeto Contrato Obra
INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Num Reporte
Num Semana
Desde
Hasta
Fecha limite de presentación
Fecha de diligenciamiento (Interventor)
Fecha de revisión (Supervisor)
Fecha de revisión (Gestor)
Estado del reporte
Estado del contrato
13 13 2021-03-12 2021-03-18 2021-03-18 2021-05-01 17:37 TERMINADO
12 12 2021-03-05 2021-03-11 2021-03-11 2021-05-01 17:10 TERMINADO
11 11 2021-02-26 2021-03-04 2021-03-04 2021-05-01 15:46 TERMINADO
10 10 2021-02-19 2021-02-25 2021-02-25 2021-05-01 10:47 TERMINADO
9 9 2021-02-12 2021-02-18 2021-02-18 2021-05-01 10:08 TERMINADO
8 8 2021-02-05 2021-02-11 2021-02-11 2021-05-01 09:30 TERMINADO
7 7 2021-01-29 2021-02-04 2021-02-04 2021-05-01 08:46 TERMINADO
6 6 2021-01-22 2021-01-28 2021-01-28 2021-05-01 07:40 TERMINADO
5 5 2021-01-15 2021-01-21 2021-01-21 2021-05-01 06:27 TERMINADO
4 4 2021-01-08 2021-01-14 2021-01-14 2021-05-01 05:43 TERMINADO
/faces/contratos/reportelst.xhtml#



Inicio | Contratos | Administracion | Reportes/Busquedas | Datos personales | Salir

Estado: Inicio

Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	LP-001	Año	2020
Proyecto	DRAGADO MANTENIMIENTO ESTERO SAN ANTONIO 2019	Programa	OTROS
Dirección Territorial	Dirección Territorial Nariño	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Supervisor del Contrato de Interventoría	JONNY ANDRES - FAJARDO ROSERO	Gestor Técnico de Proyecto	GERMÁN - MONTES ROJAS
Objeto Contrato Obra	INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO		

|<< << 1 2 3 4 >> >>|

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
3	3	2021-01-01	2021-01-07	2021-01-07	2021-08-01 04:54			TERMINADO		
2	2	2020-12-25	2020-12-31	2020-12-31	2021-08-01 05:55			TERMINADO		
1	1	2020-12-18	2020-12-24	2020-12-24	2021-07-31 22:13			TERMINADO		

|<< << 1 2 3 4 >> >>|

Regresar

Usuario: INCOPLAN S.A -CIFRA V:2.24
