	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	8	10	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **NARIÑO**

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1340 **DE** 2020

INTERVENTOR: INCOPLAN S.A
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. LP-001 de 2020

CONTRATISTA: TEKTON ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S (Firma contratada por el Municipio en el marco del convenio 1043 de 2020)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2020
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2020 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
NA		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	31/12/2020	14/03/2021
2	15/03/2021	31/03/2021
3	1/04/2021	30/04/2021
4	15/08/2021	31/10/2021

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	NA	5/04/2021	5/04/2021	4/05/2021	5/05/2021
1	1	30/04/2021	5/05/2021	5/06/2021	6/06/2021
1	2	4/06/2021	6/06/2021	4/07/2021	5/07/2021
1	**3**	2/07/2021	5/07/2021	19/07/2021	20/07/2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	8	10	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 154.817.046,00 **50% EN SMMLV:** 88,184
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	27/03/2021	$ 76.527.710,00	$ 908.526,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 231.344.756,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 2021-439-IDP-3311 de fecha 8 de octubre de 2021 el Interventor solicita lo siguiente:

Prorroga del plazo del contrato de interventoría hasta el 31 de diciembre de 2021 y adición por la suma de $137.817.740

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales continuar con el adecuado seguimiento, control y vigilancia del contrato de obra suscrito por el Municipio Francisco Pizarro en el marco del convenio 1043 de 2020, en razon a la prórroga al contrato de obra objeto de supervision y control hasta el 31 de diciembre de 2021

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: septiembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) $ 126.689.185,00 Último mes facturado: mar-21 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 104.655.571,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD
(La justificación debe emitirse de manera precisa y detallada)

La firma INCOPLAN S.A, en ejecución contrato de interventoría 1340 de 2020, mediante oficio 2021-439-IPD-3311 del 08 de octubre de 2021, solicita al Instituto la prórroga del contrato desde el 01 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y una adición de recursos por la suma de $137.817.740, argumentando que teniendo en cuenta que el contratista de obra mediante oficio TK-FPZ-83-2021 del 24 de septiembre de 2021 solicitó al municipio de Francisco Pizarro prorroga al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2021 siendo ésta avalada por el Ente Territorial mediante oficio del 27 de septiembre de 2021 y que conforme a esto y al concepto emitido por la firma interventora emitido mediante oficio 2021-439-IDP-3268 del 06 de octubre de 2021 en donde también avala la prórroga solicitada por el contratista de obra, se requiere el presente trámite para continuar y garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia al contrato de obra derivado del convenio.

Por lo anterior y con el fin de continuar con el adecuado seguimiento, control y vigilancia del proyecto, se requiere, al igual que al contrato de obra, prorrogar el contrato de interventoría hasta el 31 de diciembre de 2021 y adicionarlo en la suma mencionada teniendo en cuenta que los recursos actualmente se encuentran proyectados y suficientes hasta el 31 de octubre de 2021, toda vez que tanto el municipio en calidad de ejecutor de los recursos del convenio 1043 de 2020 y contratante de las obras derivadas y la interventoría contratada por INVIAS consideran conveniente ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra hasta la fecha solicitada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	8	10	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA Solicitud de prórroga y adición cto de interventoría - oficio 2021-439-IDP-2430, Oficio TK-FPZ-83-2021- solicitud prorroga contrato de obra, oficio aval municipio, aval y aceptación prorroga interventoría - oficio 2021-439-IDP-3268

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **SANTIAGO PAEZ TALERO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No.

Firma
Nombre: **JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 05202-141806 ANT

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Nombre: **MARIA DEL PILAR CERÓN VENAVIDES**
Director Territorial Nariño

Vo.Bo.Firma
Nombre: **GERMÁN ANDRÉS MONTES ROJAS**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.: 25202-112916 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ALEXANDER PATARROYO SAMUDIO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por ROGER RODRIGUEZ MORENO
Firma
Nombre: **ROGER RODRÍGUEZ MORENO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 25202-117527 CND

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

Bogotá, 08 de octubre de 2021 **2021-439-IDP-3311**

Señores
Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Att: Dr. Roger Rodríguez
Sub-Dirección Marítima y Fluvial
Ciudad

Ref: Contrato 1340/2020. Interventoría al dragado de Mantenimiento de los esteros, Salahonda, Mariano y Punto Frio del municipio Francisco Pizarro, departamento de Nariño

Asunto: Solicitud de adición y prorroga contrato de interventoría en referencia

Apreciados señores:

Teniendo en cuenta que mediante comunicado No. TK-FPZ-83-2021 del 24 de septiembre de 2021, por el cual el contratista de obra solicitó al municipio prorroga al contrato de obra LP-001-2020 hasta el 31 de diciembre de 2021 y que mediante comunicado del 27 de septiembre de 2021 la alcaldía de Francisco Pizarro avala dicha solicitud, y que una vez revisados por esta interventoría los argumentos expresados por el contratista, se considera pertinente otorgar dicha prorroga, por tanto, se solicita lo siguiente:
Prorrogar el contrato de interventoría, del mismo modo que el contrato de obra, hasta el 31 de diciembre de 2021, con el fin de continuar el adecuado seguimiento, control y vigilancia del mencionado contrato y con esto, finalizar adecuadamente el objeto del contrato de interventoría.
En este sentido y teniendo en cuenta que los recursos asignados a la interventoría están proyectados hasta el 31 de octubre de 2021 conforme a la última prórroga otorgada, se requiere de recursos adicionales para llevar a cabo el adecuado seguimiento del contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2021. Por lo anterior solicitamos a INVIAS adicionar el contrato de interventoría la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DICIESIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($137.817.470,oo) MCTE, recursos que corresponden al personal y otros costos, que garantizarían llevar el contrato a la fecha propuesta.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO CERTUCHE.
Director Interventoría
c.c. Dr. Jonny Andrés Fajardo
Supervisor INVIAS

Dr German Andrés Montes
Gestor del proyecto

Cr/fev/

Bogotá, 06 de octubre de 2021 **2021-439-IDP-3268**

Señores
ALCALDIA DE FRANCISCO PIZARRO
Att: Dr. Luis Gerardo Valencia Cuenu
Alcalde Municipal
Francisco Pizarro

Ref: Contrato 1340/2020. Interventoría al dragado de Mantenimiento de los esteros, Salahonda, Mariano y Punto Frio del municipio Francisco Pizarro, departamento de Nariño

Asunto: Concepto interventoría solicitud de prórroga contrato de obra LP-001-2020 de la empresa TEKTON.

Apreciados señores,

Con fecha 18 de diciembre de 2020 se dio inicio al contrato LP-001-2020 de obra cuyo objeto DRAGADO MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS DE SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, celebrado entre la empresa TEKTON y la alcaldía de Francisco Pizarro.

Para ejercer la interventoría de esta obra se celebró el contrato 1340 de 2020 entre INVIAS e INCOPLAN SA.

Por diferentes circunstancias ajenas a las partes, el contrato de obra ha tenido que ser suspendido y prorrogado en la presente vigencia, corriendo con la misma suerte el contrato de interventoría, en donde, actualmente ambos contratos tienen fecha de terminación del 31 de octubre de 2021 conforme a la última prorroga otorgada.

La interventoría ha documentado a la alcaldía de Francisco Pizarro y a INVIAS la trazabilidad del cumplimiento del contrato desde su fecha de inicio a la fecha actual.

En reuniones entre las partes se ha considerado que este proyecto es conveniente para el beneficio de las comunidades, por lo cual se ha considerado prudente la prórroga del contrato de obra y por ende del contrato de interventoria.

En todo caso de común acuerdo con las entidades contratantes, el contratista TEKTON presentó solicitud una nueva prórroga mediante comunicado No. TK-FPZ-83-2021 del 24 de septiembre de 2021 que ha sido avalada por la alcaldía de Francisco Pizarro hasta el 31 de diciembre de 2021.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la alcaldía de Francisco Pizarro es la responsable del contrato de dragado y que ha emitido un concepto favorable para la prorroga

mencionada, esta interventoría, revisado la solicitud del contratista y el aval de la alcaldía, también emite concepto favorable para la prórroga solicitada.

Por lo anterior el contratista deberá entregar los documentos contractuales pertinentes a la alcaldía de Francisco Pizarro, incluyendo el cronograma de obra debidamente firmado por el representante legal del contratista.

Por su parte la interventoría enviará, la solicitud de adición y prorroga del contrato de interventoría 1340 de 2020 al INVIAS de manera oportuna teniendo en cuenta la aceptación de la prórroga del contrato de obra.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO CERTUCHE.
Director Interventoría

c.c. Dr Roger Rodríguez
Sub-dirección marítima y fluvial

Dr. Jonny Andrés Fajardo
Supervisor INVIAS

Dr German Andrés Montes
Gestor del proyecto

Anexos: Comunicado alcaldía Francisco Pizarro del 27 de septiembre de 2021
Comunicado TEKTON No. TK-FPZ-83-2021 .del 24 de septiembre de 2021

Cr/fev/

San Juan de Pasto, septiembre 24 de 2021

Señores:
MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
Att. LUIS GERARDO VALENCIA CUENU
Alcalde municipal
Francisco Pizarro, Nariño

Referencia: CONTRATO LP-001-2020 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Asunto: Solicitud de prórroga No 4 al contrato de obra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de manera respetuosa, me permito solicitar a Usted se autorice la prórroga para la ejecución del contrato de obra pública LP-001-2020, cuyo objeto es: "Dragado de mantenimiento de los esteros Salahonda, Mariano y Punto Frio del municipio de Francisco Pizarro, departamento de Nariño", bajo las siguientes consideraciones:

1. Que desde el 21 de julio fueron retomadas las actividades de trabajo en campo, sin embargo, ubicar el equipo, ponerlo en funcionamiento y calibrarlo operativamente tomo más tiempo del que se tenía contemplado en el programa, debido a la dificultad del acceso al estero, los niveles cambiantes del agua por mareas, presencia de materiales sobre el cauce del estero tales como palizadas y residuos en volúmenes superiores a los esperados.
2. Que una vez iniciadas las labores de dragado se detectó que la dureza del lecho del estero era superior a lo esperado, generando que los rendimientos del equipo esperados disminuyan de manera importante respecto a lo que se tenía previsto.
3. La dureza en el material de dragado, llevo a realizar modificaciones importantes en el equipo de corte para poder continuar con dicha actividad, modificación que debió realizarse en campo tomando un espacio de tiempo demasiado importante (cerca de 15 días) para dejar el equipo operativo para las condiciones del sitio.
4. La amplitud en la sección de dragado no permitió un correcto desplazamiento del equipo para funcionar en un estado ideal, motivo por el cual los rendimientos se disminuyeron al tener que realizar maniobras de movilización y desplazamiento del equipo en rangos demasiado cortos que limitaron el avance.
5. Algunas embarcaciones, a pesar de la señalización sobre el estero y las indicaciones del personal dispuesto para cumplir la función de paletero, hacen caso omiso a dichas señales preventivas y transitan a altas velocidades, ocasionando cortes en las tuberías de descarga, los cuales se han debido reparar de manera inmediata impidiendo el normal desarrollo del dragado.
6. Se ha realizado continuamente el levantamiento topográfico para verificar la profundidad y la sección de dragado, encontrando que se sedimenta el material y se continúa erosionando el talud de los costados, esto a causa de la circulación y tránsito a altas velocidades de las

cerca de 200 embarcaciones diarias, lo que ha producido retomar actividades de dragado en lugares donde ya se había realizado.

7. Al momento de ejecutar las acciones de dragado se ha establecido que el acopio de material se ha tomado más tiempo del previsto, toda vez que las distancias estimadas contempladas en el cronograma eran de 200 metros una de la otra, sin embargo, por razones operativas se encontró que era apropiado disponer de lugares de acopio con una distancia mayor, afectando el proceso y los tiempos de dragado.
8. En el trabajo de la draga se tenía programado realizar barridos de aproximadamente 30 centímetros cada uno hasta alcanzar una profundidad de 90 centímetros, dejando la sección trabajada en tres o cuatro barridos, sin embargo, por la dureza del material encontrado, se ha venido realizando barridos de 10 a 15 centímetros de profundidad a lo que se suma el incremento en 30 centímetros a la sección de dragado, teniendo así que realizar 10 a 12 barridos por sección, generando una pérdida considerable de tiempo para este proceso.

Todas las situaciones descritas anteriormente han ocasionado que los rendimientos del equipo de dragado y en si las actividades a ejecutar en obra no se hayan ejecutado con los rendimientos programados que se tenían proyectados hasta el día 31 de octubre de 2021, de acuerdo a esto, no se lograría cumplir con el objeto del contrato a esta fecha, y teniendo en cuenta que dichas circunstancias han surgido en desarrollo del contrato de obra de manera imprevisible, se solicita:

SOLICITUD:

De acuerdo al análisis y evaluación realizada por parte de nosotros como empresa contratista, consideramos un periodo de 2 meses adicionales como tiempo suficiente para dar cumplimiento al desarrollo de las obras, donde se trabajaría las 24 horas incluyendo los dominicales.
Así pues, recurro a su buen criterio y comprensión para que, tal como se ha expuesto en los comités técnicos y en comunicaciones previas, sea atendida la necesidad de prorrogar el contrato LP No. 001-2020, a partir del primero (1) de noviembre hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2021, tiempo que consideramos en este momento prudente para el desarrollo a cabalidad de todas las actividades programadas.

Agradezco de antemano su comprensión y colaboración para que el contrato suscrito pueda ser ejecutado de forma adecuada, aportando a la mejoría en la calidad de vida de la población del municipio de Francisco Pizarro, que es el fin último de nuestros esfuerzos conjuntos.

Sin otro particular, me suscribo de manera cordial.



JOHANA PAOLA CASTELLANOS ARIZA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
TÉKTON ARQUITECTURA E INGENIRÍA S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT: 800.099.085-3

Francisco Pizarro, septiembre 27 de 2021

Señores:
TEKTON ARQUITECTURA E INGENIERÌA
Atte. Arq. MARIO ANDRÈS CAICEDO EGAS
San Juan de Pasto, Nariño

Referencia: CONTRATO LP-001-2020 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Asunto: Respuesta a oficio TK-FPZ- 083-2021 del 24 de septiembre del 2021, solicitud de prórroga del contrato de obra LP-001-2020.

Cordial saludo,

En atención a su solicitud de prórroga del contrato de la referencia y teniendo en cuenta las consideraciones manifestadas por ustedes y tratadas en varios comités técnicos, esta alcaldía avala los argumentos expuestos por parte del contratista y da viabilidad a la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2021.

Atentamente

LUIS GERADO VALENCIA CUENÚ
Alcalde Francisco Pizarro

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1340 DE 2020

Objeto: INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:	X	
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 14 días del mes de octubre del año 2021.

RODRIGUEZ MORENO ROGER

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MORENO ROGER

Nombre: ROGER RODRIGUEZ MORENO
Ordenador del Pago
Subdirección: Marítima y Fluvial
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: GERMAN ANDRÉS MONTES ROJAS
Gestor del Proyecto
Subdirección: Marítima y Fluvial
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

PANTALLAZOS APLICATIVOS TRÁMITE DE PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1340 DE 2020

SECOP II

Fecha de los pantallazos 14 de octubre de 2021




Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presup

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1922708
Número del Contrato	1340-2020
Versión del contrato	5
Objeto del contrato:	"INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
Tipo	Interventoría
Fecha de inicio del contrato:	14/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	17 días para terminar *(31/10/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	154 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí ○ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	○ Sí Ⓝ No
Obligaciones ambientales	○ Sí Ⓝ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí Ⓝ No
Reversión	○ Sí Ⓝ No

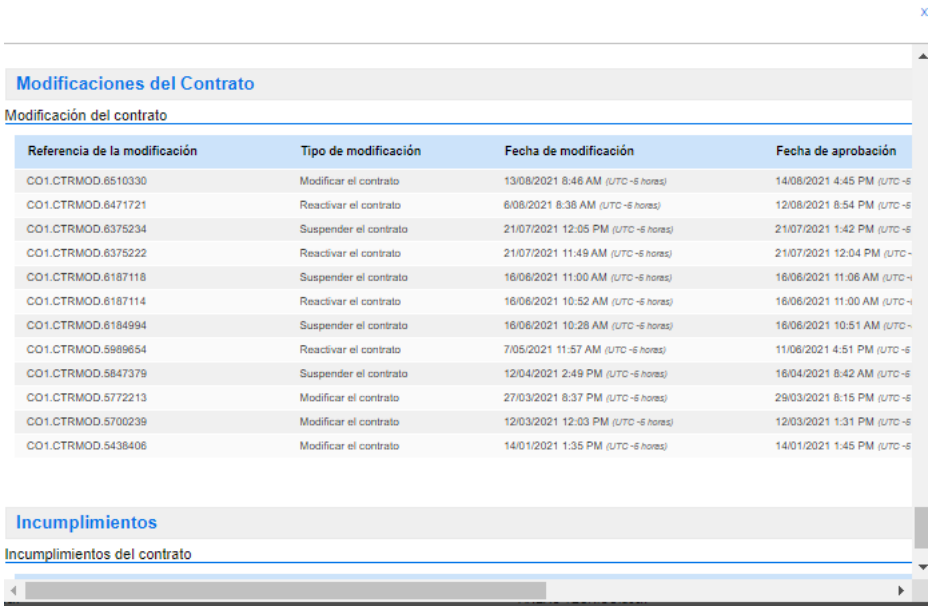


Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación
CO1.CTRMOD.6510330	Modificar el contrato	13/08/2021 8:46 AM *(UTC -5 horas)*	14/08/2021 4:45 PM *(UTC -5*)
CO1.CTRMOD.6471721	Reactivar el contrato	6/08/2021 8:38 AM *(UTC -5 horas)*	12/08/2021 8:54 PM *(UTC -5*
CO1.CTRMOD.6375234	Suspender el contrato	21/07/2021 12:05 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2021 1:42 PM *(UTC -5*
CO1.CTRMOD.6375222	Reactivar el contrato	21/07/2021 11:49 AM *(UTC -5 horas)*	21/07/2021 12:04 PM *(UTC -*
CO1.CTRMOD.6187118	Suspender el contrato	16/06/2021 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	16/06/2021 11:06 AM *(UTC -*
CO1.CTRMOD.6187114	Reactivar el contrato	16/06/2021 10:52 AM *(UTC -5 horas)*	16/06/2021 11:00 AM *(UTC -*
CO1.CTRMOD.6184994	Suspender el contrato	16/06/2021 10:28 AM *(UTC -5 horas)*	16/06/2021 10:51 AM *(UTC -*
CO1.CTRMOD.5989654	Reactivar el contrato	7/05/2021 11:57 AM *(UTC -5 horas)*	11/06/2021 4:51 PM *(UTC -5*
CO1.CTRMOD.5847379	Suspender el contrato	12/04/2021 2:49 PM *(UTC -5 horas)*	16/04/2021 8:42 AM *(UTC -5*
CO1.CTRMOD.5772213	Modificar el contrato	27/03/2021 8:37 PM *(UTC -5 horas)*	29/03/2021 8:15 PM *(UTC -5*
CO1.CTRMOD.5700239	Modificar el contrato	12/03/2021 12:03 PM *(UTC -5 horas)*	12/03/2021 1:31 PM *(UTC -5*
CO1.CTRMOD.5438406	Modificar el contrato	14/01/2021 1:35 PM *(UTC -5 horas)*	14/01/2021 1:45 PM *(UTC -5*

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

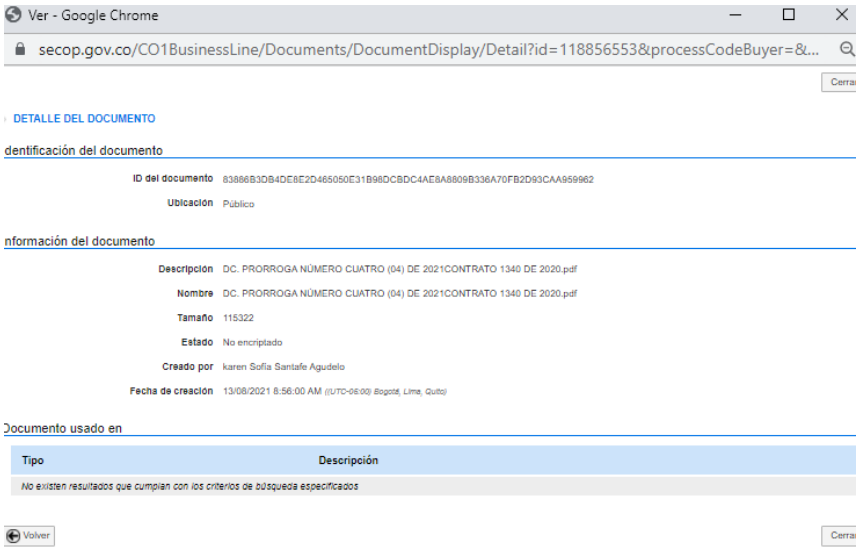



SICO

Teniendo en cuenta que la plataforma SICO ha presentado inconvenientes en los últimos días no se incluyen pantallazos actualizados de esta plataforma en el presente reporte. Como soporte se presenta el pantallazo del correo con fecha 12 de octubre de 2021 donde Soporte SIRI confirma dichos fallos.



En reemplazo de los pantallazos actualizados, se dejan aquellos presentados para la ultima actuación contractual que corresponde a la prorroga No. 4 del contrato.

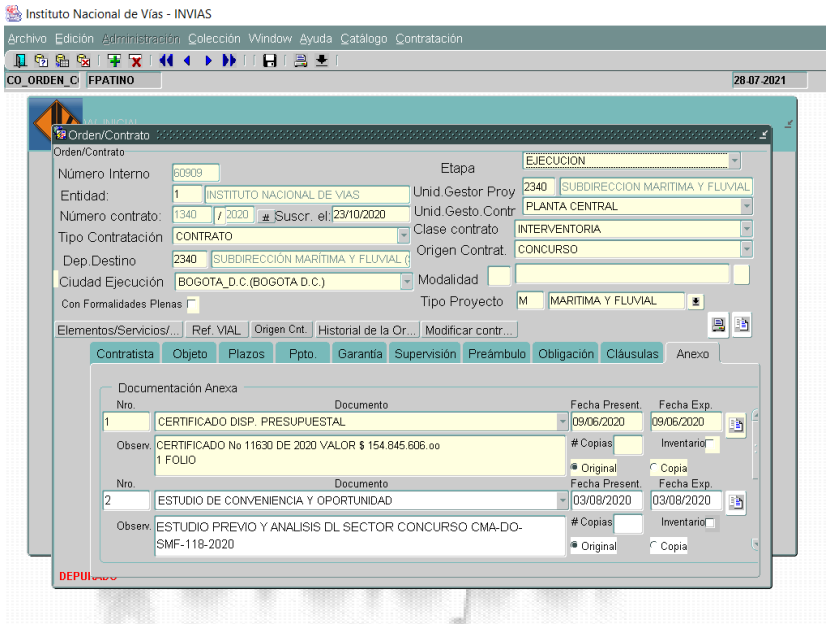

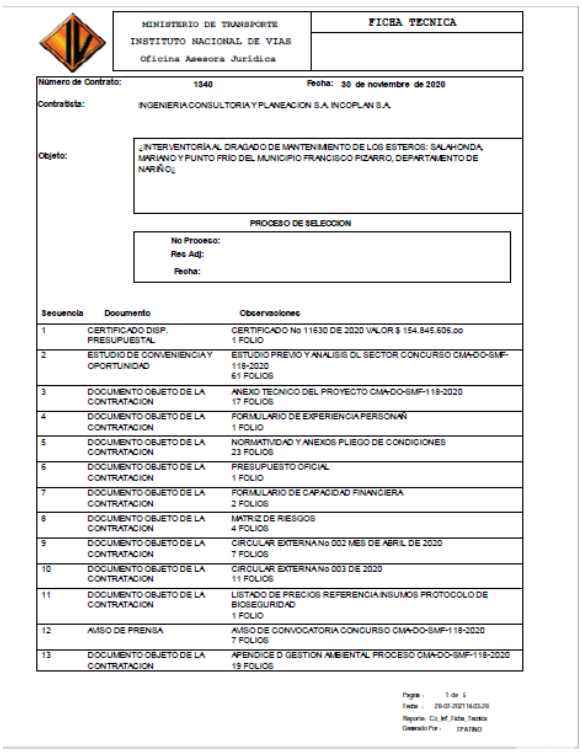

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Asesora Juridica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: 1340 **Fecha:** 30 de noviembre de 2020

Contratista: INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. INCOPLAN S.A.


Objeto: ¿INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRÍO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO¿

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:
Rec Adj:
Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CERTIFICADO No 11630 DE 2020 VALOR $ 154.845.606.oo 1 FOLIO
2	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	ESTUDIO PREVIO Y ANALISIS DL SECTOR CONCURSO CMA-DO-SMF-118-2020 61 FOLIOS
3	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	ANEXO TECNICO DEL PROYECTO CMA-DO-SMF-118-2020 17 FOLIOS
4	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMULARIO DE EXPERIENCIA PERSONAN 1 FOLIO
5	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	NORMATIVIDAD Y ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES 23 FOLIOS
6	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PRESUPUESTO OFICIAL 1 FOLIO
7	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMULARIO DE CAPACIDAD FINANCIERA 2 FOLIOS
8	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	MATRIZ DE RIESGOS 4 FOLIOS
9	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CIRCULAR EXTERNA No 002 MES DE ABRIL DE 2020 7 FOLIOS
10	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CIRCULAR EXTERNA No 003 DE 2020 11 FOLIOS
11	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	LISTADO DE PRECIOS REFERENCIA INSUMOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 1 FOLIO
12	AVISO DE PRENSA	AVISO DE CONVOCATORIA CONCURSO CMA-DO-SMF-118-2020 7 FOLIOS
13	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	APENDICE D GESTION AMBIENTAL PROCESO CMA-DO-SMF-118-2020 19 FOLIOS

Pagina : 1 de 5
Fecha : 28-07-2021 16:03:28
Reporte Co_Inf_Ficha_Tecnica
Generado Por : FPATINO

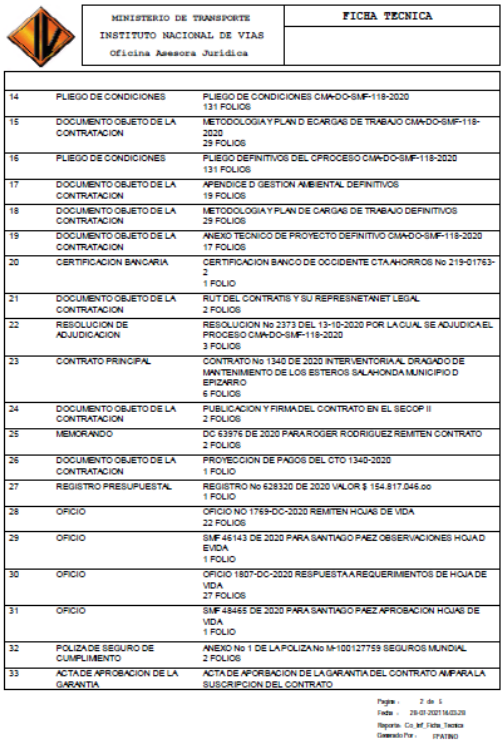

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Asesora Juridica

FICHA TECNICA

14	PLIEGO DE CONDICIONES	PLIEGO DE CONDICIONES CMA-DO-SMF-118-2020 131 FOLIOS
15	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	METODOLOGIA Y PLAN D ECARGAS DE TRABAJO CMA-DO-SMF-118-2020 29 FOLIOS
16	PLIEGO DE CONDICIONES	PLIEGO DEFINITIVOS DEL CPROCESO CMA-DO-SMF-118-2020 131 FOLIOS
17	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	APENDICE D GESTION AMBIENTAL DEFINITIVOS 19 FOLIOS
18	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO DEFINITIVOS 29 FOLIOS
19	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	ANEXO TECNICO DE PROYECTO DEFINITIVO CMA-DO-SMF-118-2020 17 FOLIOS
20	CERTIFICACION BANCARIA	CERTIFICACION BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS No 219-01763-2 1 FOLIO
21	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	RUT DEL CONTRATIS Y SU REPRESNETANET LEGAL 2 FOLIOS
22	RESOLUCION DE ADJUDICACION	RESOLUCION No 2373 DEL 13-10-2020 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO CMA-DO-SMF-118-2020 3 FOLIOS
23	CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO No 1340 DE 2020 INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS SALAHONDA MUNICIPIO D EPIZARRO 6 FOLIOS
24	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION Y FIRMA DEL CONTRATO EN EL SECOP II 2 FOLIOS
25	MEMORANDO	DC 63976 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ REMITEN CONTRATO 2 FOLIOS
26	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PROYECCION DE PAGOS DEL CTO 1340-2020 1 FOLIO
27	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO No 628320 DE 2020 VALOR $ 154.817.046.oo 1 FOLIO
28	OFICIO	OFICIO NO 1769-DC-2020 REMITEN HOJAS DE VIDA 22 FOLIOS
29	OFICIO	SMF 46143 DE 2020 PARA SANTIAGO PAEZ OBSERVACIONES HOJA D EVIDA 1 FOLIO
30	OFICIO	OFICIO 1807-DC-2020 RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE HOJA DE VIDA 27 FOLIOS
31	OFICIO	SMF 48465 DE 2020 PARA SANTIAGO PAEZ APROBACION HOJAS DE VIDA 1 FOLIO
32	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ANEXO No 1 DE LA POLIZA No M-100127759 SEGUROS MUNDIAL 2 FOLIOS
33	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APORBACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO AMPARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Pagina : 2 de 5
Fecha : 28-07-2021 16:03:28
Reporte Co_Inf_Ficha_Tecnica
Generado Por : FPATINO


		1 FOLIO
34	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP II LA APROBACION D ELA POLIZA 1 FOLIO
35	MEMORANDO	DC 75639 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ REMITEN APORBACION POLIZA 2 FOLIOS
36	ORDEN DE INICIACION	SMF 51356 PARA SANTIAGO PAEZ ORDEN DE INICIO 2 FOLIO
37	MEMORANDO	SMA63696 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ PROCEOS AMBIENTALES 2 FOLIOS
38	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOLICITU DE PRRROGA DE TRES MESES 11 FOLIOS
39	CONTRATO ADICIONAL	PRORROGA No UNO AL CONTRATO 1340-2020 PLAZO HASTA EL 14 DE MARZO DE 2021 2 FOLIOS
40	OFICIO	SMF 4559 PARA FABIO VILLAMIL SOLICITUD ANTICIPO CTO DE OBRA 1 FOLIO
41	OFICIO	DO 8266 DE 2021 PARA GERMAN MONTES DESIGNACION GESTOR TECNICO 2 FOLIOS
42	OFICIO	PARA JONNY FAJARDO REPORTE PRELIMINAR DE LOS ESTUDIOS PARA EL DRAGADO 5 FOLIOS
43	OFICIO	PARA MARIO CAICEDO PLAN LOGISTICO PARA LA NAVEGACION 1 FOLIO
44	OFICIO	PARA TEKTON ARQUITECTURA EQUIPO PARA EL DRAGADO 2 FOLIOS
45	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOLICITUD DE PRORROGA 13 FOLIOS
46	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ANEXO No 5 DE MODIFICACION A LA POLIZA No M-100127759 SEGUROS MUNDIAL 2 FOLIOS
47	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN SECOP II APORBACION ANEXO 5 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 3 FOLIO
48	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CATA DE APORBACION GARANTIA AMPARA ORDEN DE INICIO, PRORROGA 1 1 FOLIO
49	MEMORANDO	DC 17453 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ REMITEN ACTA DE APORBACION POLIZA 2 FOLIOS
50	COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN	PRORROGA DOS AL CONTRATO 1340-2020 PLAZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 2 FOLIOS
51	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOLICITUD DE ADCION NY PRORROGA DEL CTO 1340-2020 13 FOLIOS

52	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CERTIFICADO No 110221 VALOR $ 76.527.710.oo 1 FOLIO
53	CONTRATO ADICIONAL	ADICONAL No 1 Y PRORROGA No TRES PLAZO HASTA EL 30 DE ABRIL 2021 Y VALOR $ 76.527.710. 2 FOLIOS
55	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP CONTRATO ADICONAL 1 FOLIO
56	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP 1 FOLIO
57	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 6 DE MODIFICACION A LA POLIZA No 100127759 SEGUROS MUNDIAL 3 FOLIOS
58	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO No 2974221 VALOR $ 76.527.710.oo 2 FOLIOS
59	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 6 FOLIOS
60	OFICIO	PARA EL MUNICPIO SOLICITUD SUSPENSION CTO DE OBRA 3 FOLIOS
61	ACTA DE SUSPENSION	ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DERIVADO LP-001-2020 2 FOLIOS
62	ACTA DE SUSPENSION	ACTA DE SUSPENSION No 1 DESDE EL 5-4-21 HASTA EL 05-05-21 NUEVA FECHA VENCIMIENTO 30-05-2021 2 FOLIOS
63	OFICIO	PARA JONNY FAJARDO SOLICITUD SUSPENSION DEL CONTRATO 1 FOLIO
64	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 8 DE MODIFICACION A LA POLIZA No 100127759 SEGUROS MUNDIAL 4 FOLIOS
65	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP APROBACION POLIZAS 4 FOLIOS
66	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION EN EL SECOP APROBACION POLIZA ANEXO 8 4 FOLIOS
67	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APORBACION DE LA RAGIRANTIA AMPARA PRORROGA 2 Y ADICION 1 PRORROGA 3 1 FOLIOS
68	MEMORANDO	DC 25873 DE 2020 PARA ROGER RODRIGUEZ REMITEN ACTA APORBACION POLIZA 2 FOLIOS
69	MEMORANDO	DC 22625 DE 2021 PARA ROGER REMITEN PRRROGA DEL CONTRATO 2 FOLIOS
70	ACTA DE SUSPENSION	ACTA No 1 DE SUSPESNION DESDE 05-05-2021 HASTA 05-06-21 TERMINA EL 01-07-21 2 FOLIOS
71	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL GSTOR TECNICO DE PROYECTO 7 FOLIOS

72	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	ACTA No 2 DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION 1 CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 2 FOLIO
73	OFICIO	PARA ALCALDE MUNICIPAL SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION 2 FOLIOS
74	OFICIO	PARA JONNY FAJARDO SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION 2 FOLIOS
75	ACTA DE SUSPENSION	ACTA No 2 DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 1 DESDE 06-06-21 HASTA EL 04-07-21 NUEVO VENCIMIENTO 30-7-21 2 FOLIOS
76	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 5 FOLIOS
77	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR 4 FOLIOS
78	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR DE FEBRERO 2021 4 FOLIOS
79	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR MAYO 2021 5 FOLIOS
80	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL DE GESTOR TECNICO DE PROYECTO 7 FOLIOS
81	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOPORTES DE LA FACTURA DE ENERO 46 FOLIOS
82	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL 2 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 24 FOLIOS
83	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FACTURA No 38 ACTA DE COSTOS No 2 45 FOLIOS
84	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOPORTES DEL ACTA DE COSTOS DE FERBRERO 43 FOLIOS
85	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FACTURA No 37 ACTA DE COSTOS No 3 17 FOLIOS
86	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	INFORME MENSUAL No 3 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 21 FOLIOS
87	ACTA DE SUSPENSION	ACTA No 3 DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 1 DESDE 05-07-21 HASTA 20-07-21 NUEVO VENCIMIENTO 14-08-2021 2 FOLIOS
88	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR MES DE MARZO 2021 5 FOLIOS
89	INFORME SOBRE	INFORME MENSUAL SUPERVISOR ABRIL 2011 5 FOLIOS
90	INFORME SOBRE	INFORME MENSULA GESTOR TECNICO DE PROYECTO JUNIO 2021 7 FOLIOS
		TOTAL ANEXOS 89


SEPRO


Fecha del pantallazo 14 de octubre de 2021

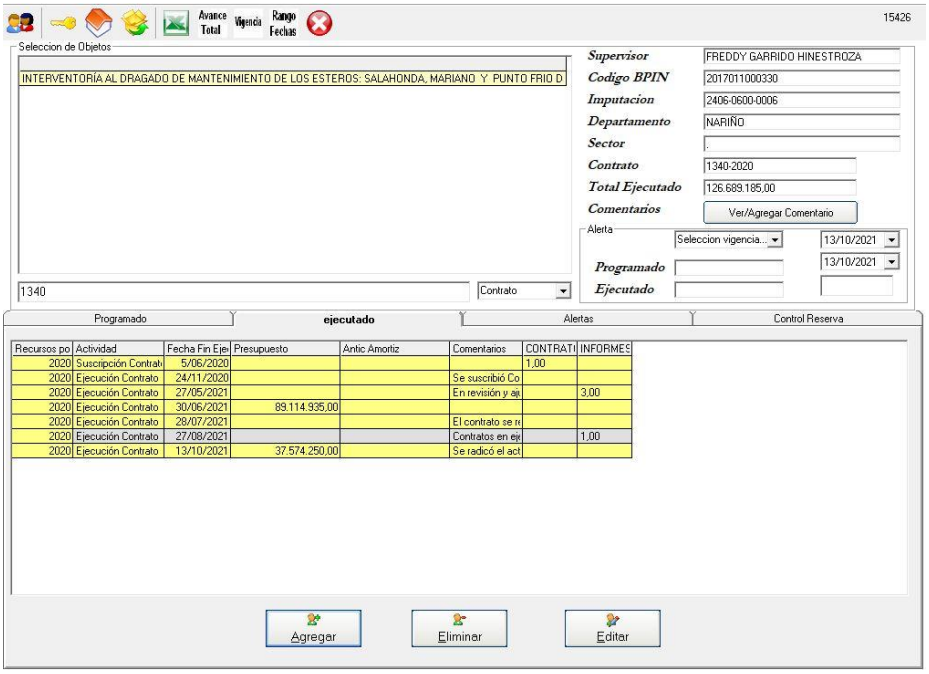

CIFRA

Fecha del pantallazo 13 de octubre de 2021

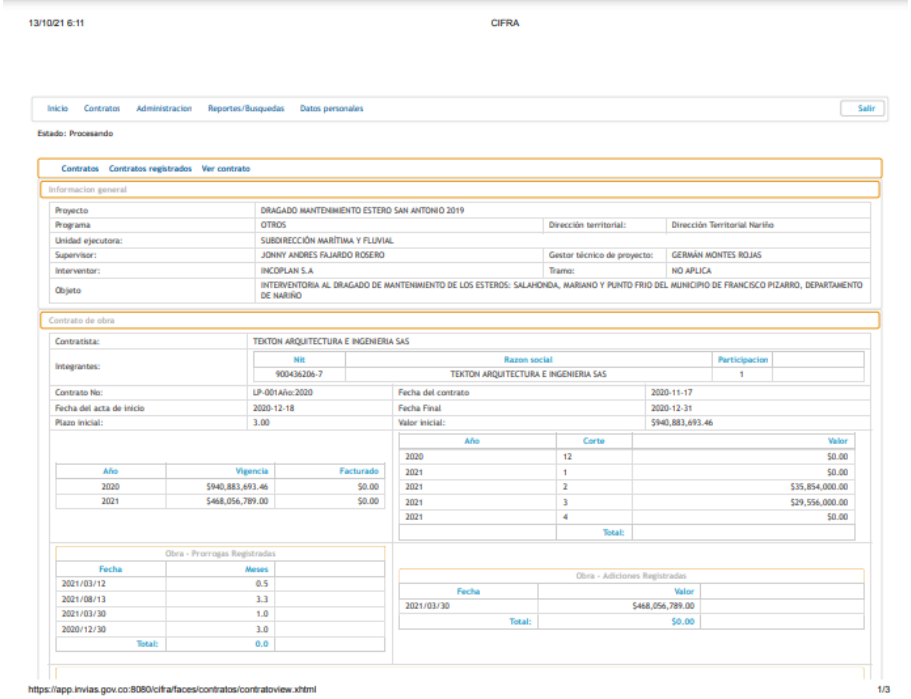

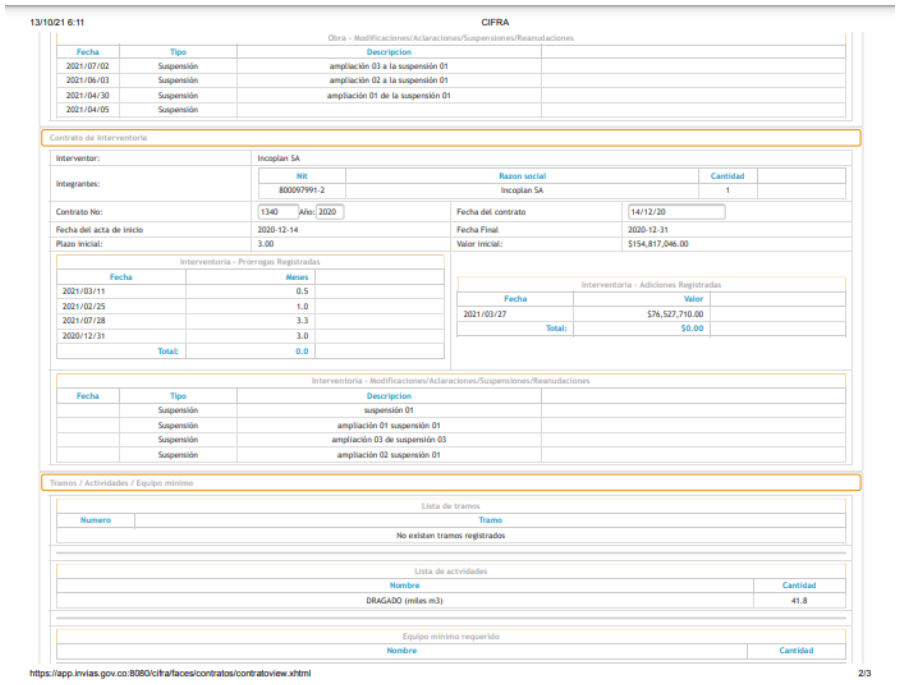

13/10/21 6:11 CIFRA

Obra - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones

Fecha	Tipo	Descripcion	
2021/07/02	Suspensión	ampliación 03 a la suspensión 01	
2021/06/03	Suspensión	ampliación 02 a la suspensión 01	
2021/04/30	Suspensión	ampliación 01 de la suspensión 01	
2021/04/05	Suspensión		

Contrato de Interventoría

Interventor:	Incoplan SA		
Integrantes:	NIT: 800097991-2	Razon social: Incoplan SA	Cantidad: 1
Contrato No:	1340 Año: 2020	Fecha del contrato	14/12/20
Fecha del acta de inicio	2020-12-14	Fecha Final	2020-12-31
Plazo inicial:	3.00	Valor inicial:	$154,817,046.00

Interventoría - Prorrogas Registradas

Fecha	Meses
2021/03/11	0.5
2021/02/25	1.0
2021/07/28	3.3
2020/12/31	3.0
Total:	0.0

Interventoría - Adiciones Registradas

Fecha	Valor
2021/03/27	$76,527,710.00
Total:	$0.00

Interventoría - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones

Fecha	Tipo	Descripcion	
	Suspensión	suspensión 01	
	Suspensión	ampliación 01 suspensión 01	
	Suspensión	ampliación 03 de suspensión 03	
	Suspensión	ampliación 02 suspensión 01	

Tramos / Actividades / Equipo mínimo

Lista de tramos

Numero	Tramo
No existen tramos registrados	


Lista de actvidades

Nombre	Cantidad
DRAGADO (miles m3)	41.8

Equipo mínimo requerido

Nombre	Cantidad

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/faces/contratos/contratoview.xhtml 2/3

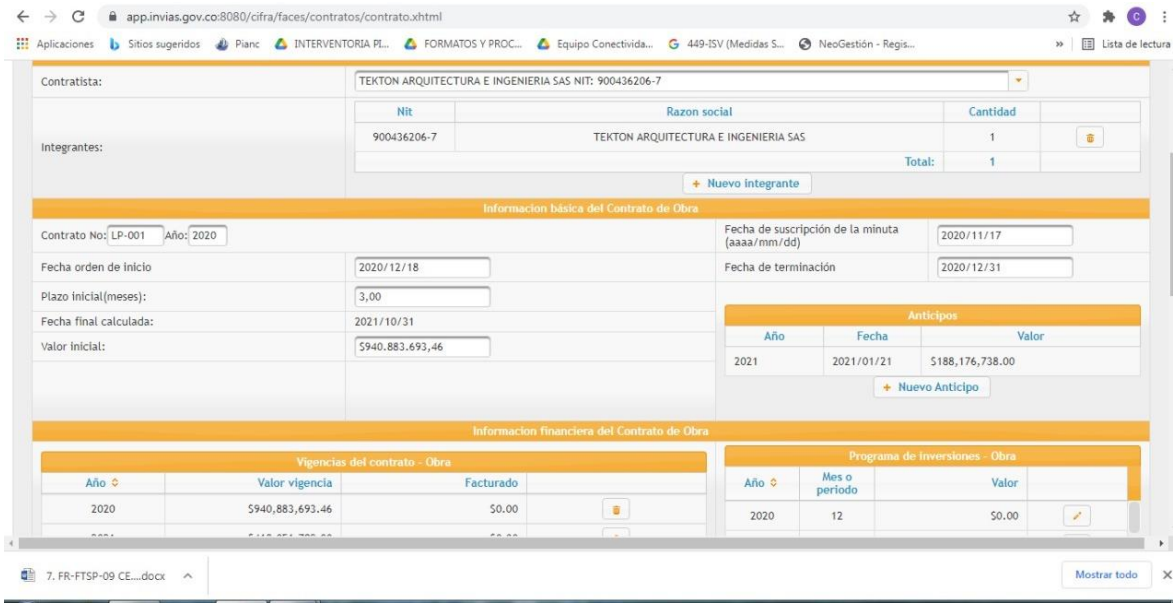

app.invias.gov.co:8080/cifra/faces/contratos/contrato.xhtml

Aplicaciones | Sitios sugeridos | Pianc | INTERVENTORIA PI... | FORMATOS Y PROC... | Equipo Conectivida... | 449-ISV (Medidas S... | NeoGestión - Regis... | Lista de lectura

Contratista: TEKTON ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS NIT: 900436206-7

Integrantes:

Nit	Razon social	Cantidad	
900436206-7	TEKTON ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	1	
	Total:	1	

+ Nuevo integrante

Informacion básica del Contrato de Obra

Contrato No: LP-001 Año: 2020		Fecha de suscripción de la minuta (aaaa/mm/dd)	2020/11/17
Fecha orden de inicio	2020/12/18	Fecha de terminación	2020/12/31
Plazo inicial(meses):	3,00		
Fecha final calculada:	2021/10/31		
Valor inicial:	$940.883.693,46		

Anticipos

Año	Fecha	Valor
2021	2021/01/21	$188,176,738.00

+ Nuevo Anticipo

Informacion financiera del Contrato de Obra

Vigencias del contrato - Obra

Año	Valor vigencia	Facturado	
2020	$940,883,693.46	$0.00	

Programa de Inversiones - Obra

Año	Mes o periodo	Valor	
2020	12	$0.00	

7. FR-FTSP-09 CE....docx Mostrar todo

Inicio Contratos Administracion Reportes/Busquedas Datos personales Salir

Estado: Inicio

Contratos Contratos registrados Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	LP-001	Año	2020
Proyecto	DRAGADO MANTENIMIENTO ESTERO SAN ANTONIO 2019	Programa	OTROS
Dirección Territorial	Dirección Territorial Nariño	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Supervisor del Contrato de Interventoría	JONNY ANDRES - FAJARDO ROSERO	Gestor Técnico de Proyecto	GERMÁN - MONTES ROJAS
Objeto Contrato Obra	INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO		

1 2 3 4

Num Report-te	Num Sema-na	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
33	33	2021-07-30	2021-08-05	2021-08-05	2021-10-13 05:13					
32	32	2021-07-23	2021-07-29	2021-07-29	2021-10-13 04:56					
31	31	2021-07-16	2021-07-22	2021-07-22	2021-10-13 04:27					
30	30	2021-07-09	2021-07-15	2021-07-15	2021-10-13 04:13					
29	29	2021-07-02	2021-07-08	2021-07-08	2021-10-12 20:43					
28	28	2021-06-25	2021-07-01	2021-07-01	2021-10-12 20:31					
27	27	2021-06-18	2021-06-24	2021-06-24	2021-10-12 20:22					
26	26	2021-06-11	2021-06-17	2021-06-17	2021-10-12 16:25					
25	25	2021-06-04	2021-06-10	2021-06-10	2021-10-12 16:18					
24	24	2021-05-28	2021-06-03	2021-06-03	2021-10-12 16:09					

1 2 3 4

Regresar
