	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

	FECHA	11	11	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONVENIO No. 01161 DE 2020

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE AIPE
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EI INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y EI MUNICIPIO DE AIPE - HUILA PARA INTERVENIR LA VÍA TERCIARIA A CARGO DEL INSTITUTO, CON CÓDIGO 20831, AIPE - LA CINTA - POTRERILLOS, "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A **DE**

INTERVENTOR: N/A

CONTRATO DE OBRA No. N/A **DE** 2020

CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: 31/12/2020
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 8 (Día) 9 (Mes) **DE** 2020 (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
PRORROGA NÚMERO UNO (1) DE 2020	15/12/2020	31/12/2020	31/12/2021

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: N. A. **50% EN SMMLV:** N. A.
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: N. A.
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Se requiere la prórroga hasta el 31/12/2022, con el fin de garantizar la ejecución de las metas físicas, la puesta en servicio y entrega del corredor, así como la liquidación del convenio 1161 de 2020, teniendo en cuenta las sigueintes consideraciones:

• Que con oficio No. DT-HUI 63470 del 10/11/2021, la Territorial Huila - INVIAS solicitó al Municipio de AIPE información sobre el estado de los contratos derivados y su pronunciamiento en caso de requerir la prórroga del convenio 1161 de 2020, mediante el cual el INVIAS autoriza al municipio de AIPE la intervención LA VÍA TERCIARIA A CARGO DEL INSTITUTO, CON CÓDIGO 20831, que se atiende con el contrato de obra No. 001 de 2020 y el contrato de interventoría número 001 de 2020. En respuesta, a través de la secretaria de infraestructura, el municipio de Aipe solicitó la ampliación del plazo por 12 meses, es decir hasta el 31/12/2022.

• Mediante oficio sin numero de fechas 10 de noviembre de 2021 el municipio, el municipio de Aipe (Huila) solicitó la prorrogá del convenio teniendo en cuenta que el contrato de obra actualmente se encuentra en ejecución con el 30% y para alcanzar la meta física supera la fecha de vencimiento actual que es el 31/12/2021.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las obras objeto del contrato 001 de 2020 que se requieren ejecutar en el plazo adicional solicitado, son las siguientes:

construccion de 5 alcantarillas faltantes en las veredas: 1 en San Antonio 1 en Potreritos y 3 en el tesoro

construccion de 10 bateas en las veredas: 5 en san antonio 2 en el tesoro 2 en potreritos y 1 en ventanas

construccion de 18 parte patas en las veredas: 7 en san antonio 3 el tesoro y 8 en potreritos

construccion de 3 box coulvert en las veredas: 1 en san antonio y 2 en potreritos

construccion de 2 cunetas en las veredas: 2 en potreritos

AVANCE FÍSICO DE OBRA

N.A. (mes anterior a la presente solicitud) (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del N.A.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: N.A
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: N.A
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): N.A.
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N. A. (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N. A. (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : N. A. (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: N. A. (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ - Último mes facturado: N. A. (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): N. A.
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

SE REQUIERE LA PRÓRROGA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO Y LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL RECIBO DEFINITIVO Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO MARCO A FIN DE GARANTIZAR LA CONSTRUCCIÓN EN TOTALIDAD DE LA META FÍSICA.

JURÍDICA:

LA PRESENTE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONVENIO SE CONCEDE POR SOLICITUD EXPRESA DEL MUNICIPIO TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE OBRA, LA CUAL EXIGE QUE EL CONVENIO PERMANEZCA VIGENTE PARA QUE EL MUNICIPIO DE AIPE PUEDA INTERVENIR LEGALMENTE LA VÍA.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO REQUIERE EROGACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL INVIAS, ES DECIR, PARA LA SUSCRIPCIÓN NO SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEBIDO A LA NATURALEZA DEL MISMO.

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO TIENE INVERSIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL INVIAS, LO CUAL NO GENERA LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A CARGO DE LAS PARTES.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

N. A.

OTRAS:

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: Oficio de fecha 10-11-2021 remitido vía correo electrónico mediante el cual el Municipio de Aipe solicita prórroga del conveio.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
OCTAVIO CONDE LASSO
Alcalde
Municipio de Aipe

Vo. Bo. Firma
DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del Convenio
INVIAS
Matrícula No. 70202-288563 TLM

Vo. Bo. Firma
Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial

Vo. Bo. Firma
JAVIER MONTOYA MARTINEZ
Gestor Técnico de Proyecto

Vo. Bo. Firma
HÉCTOR HUGO BERMUDEZ ALVARADO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma
Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de Vías Regionales
Matrícula No. 01106-0831

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

Aipe, 10 de noviembre de 2021

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
atencionciudadano@invias.gov.co
Calle 25G No. 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá

Asunto: Solicitud Prórroga al Convenio No. 01161 de 2020, Suscrito entre INVIAS y el municipio de Aipe (Huila).

Respetado ingeniero Corredor Parra.
En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, el cual tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA PARA INTERVENIR LA VÍA TERCIARIA A CARGO DEL INSTITUTO, CON CÓDIGO 20831, AIPE – LA CINTA -POTRERITOS, "CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE" y cuyo plazo de ejecución se encuentra estipulado hasta el 31 de diciembre de 2021, de manera atenta solicito se estudie la posibilidad de ampliar el plazo actual del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta:

1. Que dando cumplimiento a las obligaciones contraídas por parte del Municipio y a fin de terminar las obras derivadas del Convenio No. 01161 de 2020, mediante el cual se celebró la licitación pública No. 002 de 2019 con cuyo resultado, se celebró el contrato de obra No. 001 de 2020
2. Que el Municipio de Aipe adelantó el proceso de selección del contratista de Interventoría para que realizará la supervisión y control a las obras derivadas del Convenio Interadministrativo No. 01161 de 2020.
3. Aunque los procesos derivados de obra e interventoría se iniciarán en año anterior, a la presente fecha la obra lleva un avance del 30% de ejecución.

Por lo anterior, es necesario ampliar el plazo del Convenio en doce (12) meses, ya que el término restante del convenio es insuficiente para lograr tanto la ejecución de las metas físicas contempladas en el presupuesto oficial de las obras derivadas, como el recibo a satisfacción de las mismas y con ello, el trámite de recibo y liquidación del referido convenio, lo que permite sanear la relación contractual con INVIAS.

De antemano agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

OCTAVIO CONDE LASSO
Alcalde Municipal
Municipio de Aipe

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. de Convenio Interadministrativo: 1161 de 2020

Objeto:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EI INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y EI MUNICIPIO DE AIPE - HUILA PARA INTERVENIR LA VÍA TERCIARIA A CARGO DEL INSTITUTO, CON CÓDIGO 20831, AIPE - LA CINTA - POTRERILLOS, "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE.

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:		X
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 22 días del mes de noviembre año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Ordenador del Pago
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

FLORANGELA PARRA CHANCHI
Coordinadora del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

JAVIER MONTOYA MARTÍNEZ
Gestor del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


Javier Montoya Martinez

De: Edison Francisco Ramirez Garcia
Enviado el: lunes, 22 de noviembre de 2021 9:57 a. m.
Para: Javier Montoya Martinez
Asunto: RE: EVIDENCIA REGISTRO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1161-2020 - MUNICIPIO DE AIPE, HUILA.

Buen día Ingeniero:

Dando respuesta a su solicitud le informo que una vez revisado el contrato

1161 de 2020 se encuentra el aplicativo al día, por tal motivo tiene mi Vo.Bo.

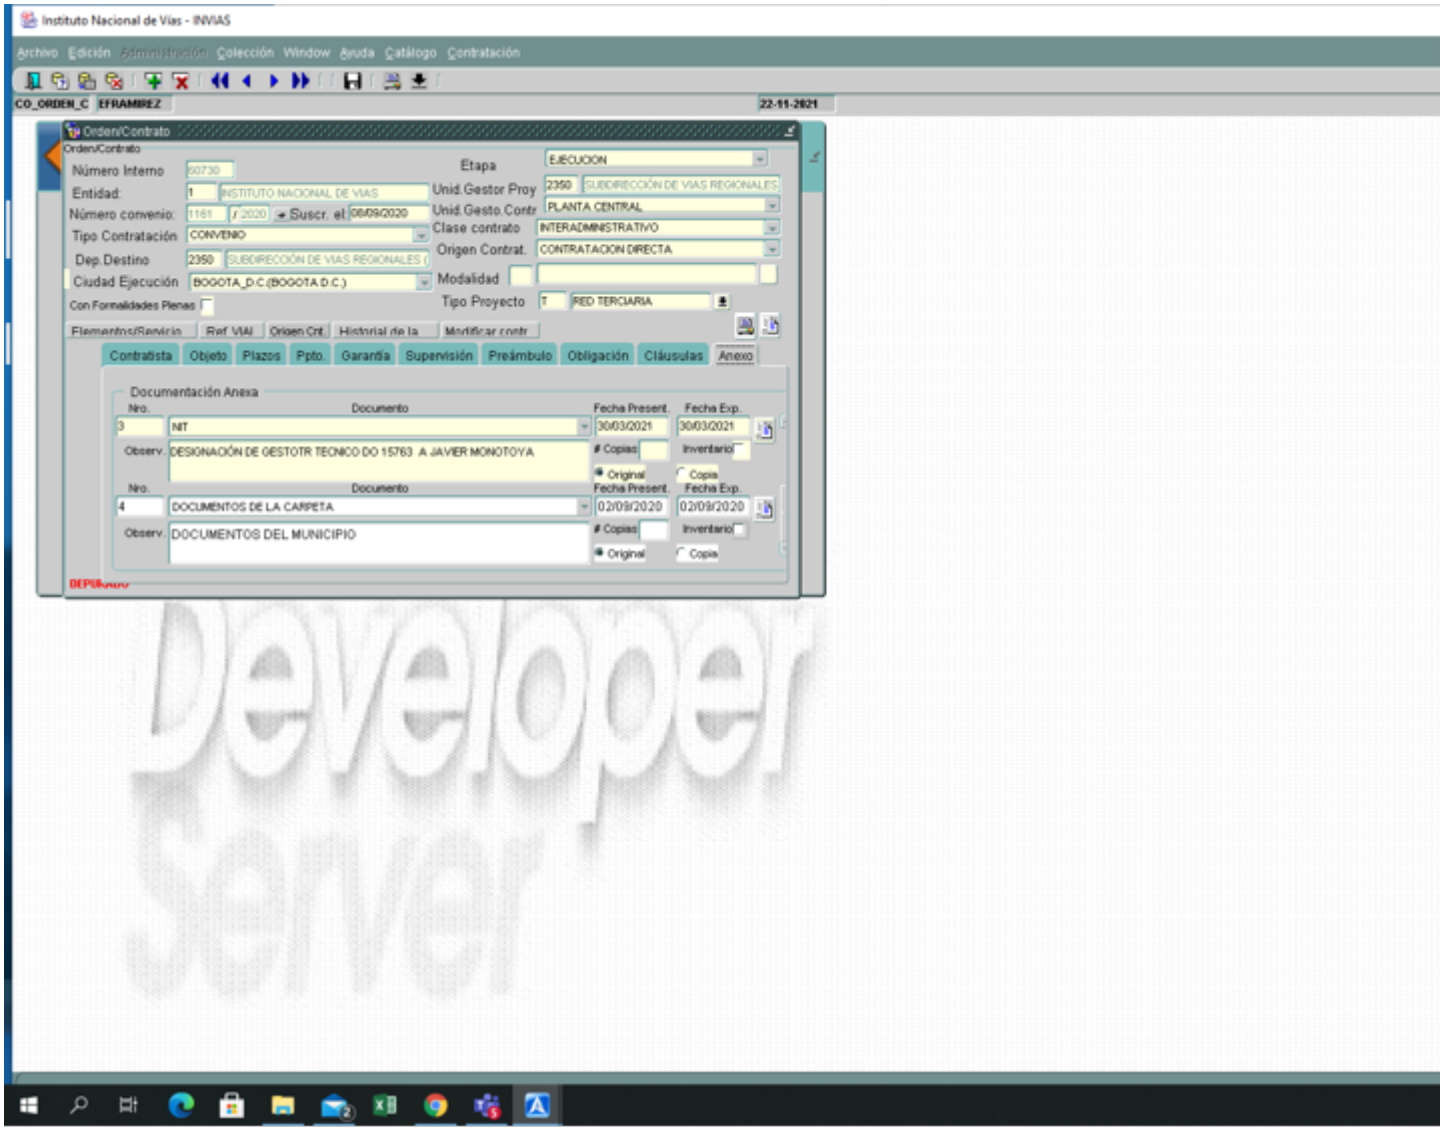

EDISON RAMIREZ GARCIA
CONTRATISTA
Subdirección de Vías Regionales
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Calle 25g # 73b 90
Bogotá D.C.

De: Javier Montoya Martinez
Enviado: jueves, 18 de noviembre de 2021 2:53 p. m.
Para: Edison Francisco Ramirez Garcia
Asunto: EVIDENCIA REGISTRO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1161-2020 - MUNICIPIO DE AIPE, HUILA.

Estimado Edison Ramirez buen día:

Con el objetivo de tramitar la Prórroga 2 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1161 DE 2020, me puedes generar evidencia del registro del Convenio en SICO para adjuntar a la Certificación de Aplicativos.

Se aclara que es un convenio de intervención donde el INVIAS autoriza al MUNICIPIO DE AIPE (HUILA) a intervenir una vía terciaria cargo del INVIAS, por lo cual, tanto interventoría como obra son contratadas por el MUNICIPIO, por consiguiente no se tienen documentos como la orden de inicio, pólizas, informes mensuales, etc.

Cordialmente,

ING. JAVIER MONTOYA MARTÍNEZ
Subdirección de Vías Regionales
Gestor Técnico de Proyectos
jmontoya@invias.gov.co
(1) 377 0600 Ext. 1636
Calle 25G No. 73B – 90, Piso 6
www.invias.gov.co

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1827008
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/09/2020 12:11:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1161-2020
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ¿ INVIAS Y EL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA PARA INTERVENIR LA VÍA TERCIARIA A CARGO DEL INSTITUTO, CON CODIGO 20831, AIPE - LA CINTA - POTRERILLOS, CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE AIPE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	112 Días
Fecha de inicio de contrato	8/09/2020 10:45:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE

COLOMBIA, Aipe
Número de documento 891180070

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OCTAVIO CONDE LASSO* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2020 6:44:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Guillermo Toro Acuña* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2020 10:41:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_1827008_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Sudbirección Red Terciaria y Ferrea
Proceso de Contratación	CD-DO-SRT-311-2020
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	0 COP

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombi **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modifica

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.5334169	Modificar el contrato	28/12/2020 4:41 PM *(UTC -5 horas)*	28/12/2020 7:41 PM *(UTC -5 horas)*	Aceptado por el proveedor	-	Sin documento

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modifica

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	0,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >
