Santa Rosa de Cabal, diciembre 27 de 2021

Doctora:
SANDRA ASTRID LÓPEZ GODOY
Secretaria Jurídica
Santa Rosa de Cabal

Asunto: Solicitud de Prórroga

Referencia: Contrato de Obra No. 567-2021

Cordial saludo,

En calidad de Supervisor del **Contrato de Obra Nro. 567 de 2021** suscrito entre el Municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y **DISEÑO-CONSTRUCCIÓN-INTERVENTORÍA DICOIN S.A.S.,** con **NIT 816004314-6**, cuyo representante legal es el señor **FRANCISCO J. LONDOÑO F.,** identificado con cédula de ciudadanía **N°118.591.794**, respetuosamente le solicito su autorización para prorrogar al contrato en mención, cuyo objeto es: ***"REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURE, SEDE ESCUELA SAN VICENTE-SEDE ESCUELA ANEXA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL RISRALDA",*** de conformidad a lo siguiente:

El día catorce (14) de diciembre de 2021 se firmó acta de inicio entre las partes, para adelantar la ejecución del contrato de obra actualmente mencionado, por lo cual en mesa técnica realizada el día veintidós (22) de diciembre de 2021, se revisa avance de obra para lo cual se evidencia que, las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato y debido a las condiciones del alcantarillado de los baños que conectan al primer piso, el cual requiere reparación; actividad complementaria que, se puede incluir dentro del presupuesto contractual, para un buen funcionamiento y brindar mejores condiciones de bienestar y seguridad a los estudiantes.

Que por lo anteriormente expuesto se advierte la necesidad actual y verificando la solicitud presentada por el contratista **DISEÑO-CONSTRUCCIÓN-INTERVENTORÍA DICOIN S.A.S.,** con **NIT 816004314-6**, solicito ***visto bueno*** para ***Prorrogar*** el contrato de obra **No. 567 de 2021** por el término de veinte (20) días calendario más; debido a que el plazo de ejecución es necesario para terminar a cabalidad las actividades relacionadas con las actividades no previstas y que requieren de ejecución, para que se realice a cabalidad la obra y así cumplir con el objeto contractual para el mantenimiento de la Institución Educativa Labouré, Sede Anexa Escuela San Vicente, del Municipio, instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.

Atentamente;

Nombre: ***JHON HAROL GIRALDO CASTAÑO.***
Cargo: *Subsecretario de Obras Públicas*
Supervisor de contrato

REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURE, SEDE ESCUELA SAN VICENTE-SEDE ESCUELA ANEXA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL RISRALDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO






FOTOS 1 y 2 (Cambio de alcantarillado principal)





FOTOS 3 y 4 (Revisión del estado del alcantarillado de los baños del primer piso)



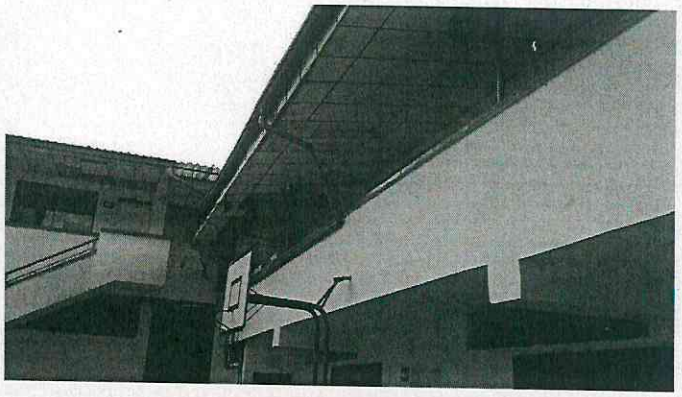

FOTOS 5 y 6 (Revisión del estado del alcantarillado de los baños del primer piso)

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL
Radicación No:-7459-2021
Fecha:24/12/2021-09:59:05
Origen: Claudia Ximena
mina Bedoya
Destino: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DICOIN SAS
DISEÑO-CONSTRUCCION-INTERVENTORIA

NIT. 816004314-6

Santa Rosa de Cabal, 23 de diciembre de 2021

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL
ING. JOHN HAROL GIRALDO CASTAÑO
secretario de Infraestructura
Santa Rosa de Cabal

Ref.: Solicitud prorroga contrato N.º 567 de 2021

Cordial Saludo

Con el fin de solicitar prórroga de ejecución al contrato **N.º 567 de 2021**, cuyo objeto es **"Realizar mantenimiento en la institución educativa Laboure sede escuela San Vicente- sede escuela La Anexa del municipio de Santa Rosa de Cabal-Risaralda"**; lo anterior debido a la disponibilidad en el mercado de algunos materiales necesarios para la ejecución de dicho contrato.

La cerámica 1 ra. De 20 x 20 para piso solicitada en el presupuesto no se consigue en el mercado.

De los 30 Sanitarios solicitados se adquirió una parte y estamos pendientes de la segunda entrega para la primera semana de enero.

La prórroga solicitada es de 20 días contados a partir de la fecha de finalización del contrato en mención.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente,

Ing. Francisco J Londoño F
Representante Legal DICOIN S.A.S

Email: dicoin2001@yahoo.com
Dirección: Calle 12 No. 13-21 Santa Rosa de Cabal – Cel. 312 554 6732
