INFORME TÉCNICO No. 09

Programa IRACA

E-2020-2203-183706 2020-08-24 02:14:14 PM
DPS-Dirección de Inclusión Productiva - Juan
Juan Manuel Erazo Urrea

Sobre 5



5.280

HOGARES

Fecha de Corte del Informe: 30/05/2020

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
ETAPA DE ALISTAMIENTO: 7
PROCESO: Selección y contratación del Equipo Zonal y Local 7
PROCESO: Transferencia al equipo Local 8
ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN: 11
PROCESO: Socialización y Concertación con Autoridades 11
Puerto Inírida: 12
Guapi – Timbiquí: 12
Cumaribo: 13
Puerto Carreño – La Primavera: 14
Ricaurte: 15
San Andrés de Tumaco: 16
El Charco: 17
Barbacoas: 18
PROCESO: Socialización a Comunidades 19
ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACIÓN: 24
PROCESO: Vinculación de hogares 24
PROCESO: Caracterización de Entrada 30
ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS: 32
PROCESO: ICOE de entrada 32
PROCESO: Visión de Desarrollo 41
PROCESO: Diagnóstico Comunitario 50
PROCESO: Formulación de Proyectos 65
COMITES TÉCNICOS REGIONALES 68
OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA: 69
SOCIALIZACIÓN A AUTORIDADES EN EL MARCO DEL COVID-19 70
CONTRA- PARTIDA APORTADA POR LA UNIÓN TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA 70
SITUACIÓN HUMANITARIA Y DE ORDEN PÚBLICO 82
MATRIZ DE RIESGO ACTUALIZADO 86

Ilustración 1 Meta programada – meta alcanzada del Equipo Zonal Iraca z1 contratado 7
Ilustración 2 Meta programada – meta alcanzada del Equipo Local Iraca z1 contratado 7
Ilustración 3 Evidencias fotográficas 2da jornada de transferencia 10
Ilustración 4 Socialización y Concertación a Autoridades - Guainía 12
Ilustración 5 Socialización y Concertación a Autoridades – Cauca 12
Ilustración 6 Socialización y Concertación a Autoridades – Cumaribo, Vichada 13
Ilustración 7 Socialización y Concertación a Autoridades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada 14

Ilustración 8 Socialización y Concertación a Autoridades – Ricaurte, Nariño 15
Ilustración 9 Socialización y Concertación a Autoridades – Tumaco, Nariño 16
Ilustración 10 Socialización y Concertación a Autoridades – El Charco, Nariño 17
Ilustración 11 Socialización y Concertación a Autoridades – Barbacoas, Nariño 18
Ilustración 12 Socialización a Comunidades - Guainía 19
Ilustración 13 Socialización a Comunidades - Cauca 20
Ilustración 14 Socialización a Comunidades Municipio de Cumaribo - Vichada 21
Ilustración 15 Socialización a comunidades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada 22
Ilustración 16 Socialización a Comunidades – Tumaco, Nariño 23
Ilustración 17 Socialización a Comunidades – El Charco y Barbacoas - Nariño 23
Ilustración 18 Socialización A Comunidades por Departamentos 24
Ilustración 20 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento del Cauca 25
Ilustración 21 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento de Nariño 26
Ilustración 22 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamentos de Vichada y Guainía 26
Ilustración 23 Vinculados Inscritos en KOKAN, IRACA Zona 1 27
Ilustración 25 Ejercicio de Vinculación de Hogares (Consejo Comunitario Tribuna del Pueblo – El Charco – Departamento de Nariño) 27
Ilustración 26 Jefe de Hogar por Genero 28
Ilustración 27 Media de edad por Genero miembros de Hogar 28
Ilustración 28 Nivel de Escolaridad Población beneficiaria programa IRACA 29
Ilustración 29 Pantallazo Buch On avance Zona 1 31
Ilustración 30 Total hogares caracterizados y validados en Kokan 32
Ilustración 31 ICOEs Municipio Puerto Inírida - Guainía 34
Ilustración 32 Gráfico 28 Resultado ICOE Puerto Inírida - Guainía 34
Ilustración 33 ICOEs – Cauca 35
Ilustración 34 Resultados ICOEs - Cauca 36
Ilustración 35 ICOEs – Vichada 36
Ilustración 36 Resultados de ICOE - Vichada 37
Ilustración 37 ICOEs – Nariño 38
Ilustración 38 Resultados ICOEs - Nariño 39
Ilustración 39 Actividad de ICOE (Consejo Comunitario Bajo Mira y frontera – Tumaco- Departamento de Nariño) 40
Ilustración 40 Visión de Desarrollo Municipio Puerto Inírida - Guainía 44
Ilustración 41 Resultados Visión de Desarrollo - Guainía 44
Ilustración 42 Visiones de Desarrollo – Cauca 45
Ilustración 43 Resultados Visión de Desarrollo - Cauca 46
Ilustración 44 Visión de Desarrollo – Vichada 46
Ilustración 45 Resultados Visión de Desarrollo - Vichada 47
Ilustración 46 Visión de Desarrollo – Nariño 48
Ilustración 47 Resultados Visión de Desarrollo – Nariño 48
Ilustración 48 Desarrollo de la Actividad de Visión de Desarrollo (Consejo Comunitario Renacer Negro – Timbiquí- Departamento del Cauca) 49
Ilustración 49 Diagnósticos Comunitarios realizados – Guainía 51
Ilustración 50 Acciones necesarias por componente – Guainía 51
Ilustración 51 Diagnósticos Comunitarios Realizados – Cauca 52
Ilustración 52 Diagnósticos comunitarios por territorio colectivo – Cauca 53
Ilustración 53 Acciones necesarias por componente - Cauca 54
Ilustración 54 Diagnósticos Comunitarios - Vichada 55
Ilustración 55 Acciones necesarias por componente, Municipio de Puerto Carreño, Vichada 58
Ilustración 56 Acciones necesarias por componente, Municipio La Primavera – Vichada 59
Ilustración 57 Acciones necesarias por componente, Municipio de Cumaribo – Vichada 60

Ilustración 58 Diagnósticos Comunitarios - Nariño 60
Ilustración 59 Acciones necesarias por componente, El Charco – Nariño 63
Ilustración 60 Acciones necesarias por componentes, Tumaco – Nariño 64
Ilustración 61 Situación de conflicto armado en el cauca 82
Ilustración 62 Situación de conflicto en Guapi - Cauca 83
Ilustración 63 Secuestro de contratistas en el Cauca 83
Ilustración 64 Situación de conflicto armado en el Cauca 83
Ilustración 65 Situación de conflicto armado en Nariño y Cauca 84
Ilustración 66 Municipios sin energía eléctrica 84
Ilustración 67 Personas desplazadas en Guapi - Cauca 85
Ilustración 68 Desplazamiento forzado en Guapi Cauca 85

Tabla 1 Primera Transferencia metodológica al Equipo Local 8
Tabla 2 Segunda Transferencia metodológica al Equipo Local 10
Tabla 3 Resumen del Estado de las Vinculaciones de Hogares Zona 1 25
Tabla 5 Territorios Colectivos pendientes por ICOE de entrada 33
Tabla 6 Territorios Colectivos pendientes por Visión de Desarrollo 42
Tabla 7 Visión de desarrollo realizados en los 4 Departamentos 43
Tabla 8 Diagnósticos Comunitarios por Territorio Colectivo – Vichada 56
Tabla 9 Diagnósticos comunitarios realizados en Nariño 61

Carpetas Drive

- Transferencia Metodológica
- Socialización y Concertación con Autoridades Étnicas
- Socialización y Concertación con comunidades
- Vinculaciones y Caracterizaciones
- ICOES de Entrada
- Visión de Desarrollo
- Diagnostico Comunitario

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

INFORME TÉCNICO No. 09
Programa Iraca
Intervención No 4
Fecha de Corte del Informe: 30/05/2020

Convenio No.	**213 de 2019**
Suscrito entre:	**Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1**
Fecha inicio de Convenio:	17/09/2019
Fecha fin de Convenio:	**28/12/2020**
Valor total de Convenio:	$ 46.281.342.831
Valor total Recursos PS Desembolsados	**$ 11.602.904.961,40**
Zona:	1 (Uno)
No. Total, de Hogares a Atender:	**5.280**
No. de Informe:	009

INTRODUCCIÓN

El convenio de asociación 213 del 17 de septiembre de 2019, firmado entre el Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, tiene por objeto: "Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL—y el ASOCIADO, dirigidos a la implementación del Programa IRACA en aras de disminuir las afectaciones de acceso a alimentos, debilitamiento comunitario y generación de ingresos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas producidas por el conflicto armado focalizados por PROSPERIDAD SOCIAL ". Estos beneficiarios se focalizaron para la zona 1 en los Departamentos y municipios:

- Nariño: El Charco, Barbacoas, San Andrés de Tumaco, y Ricaurte
- Cauca: Guapi y Timbiquí
- Vichada: Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo
- Guainía: Puerto Inírida.

Para el cumplimiento del presente objeto, el programa se desarrolla en etapas, procesos, indicadores y metas que se encuentran vinculadas y aprobadas en el Plan Operativo Anual (POA), enmarcándose en la cronología del programa o línea de tiempo y el presupuesto dado para el mismo, el cual permite su ejecución.

Aprobado el POA, se convalidan las diferentes etapas, procesos, indicadores y metas que corresponden a las gestiones desarrolladas en el mes de Mayo de 2020 y que convergen dentro de la estructura del mismo para el logro de los objetivos trazados del programa, este permite realizar el respectivo seguimiento cronológico de cada una de sus actividades, sin dejar atrás la situación presentada durante los últimos días del mes de marzo, Abril y todo el mes de Mayo, las cuales a causa de la pandemia COVID-19 afectó a la humanidad, al punto que el Gobierno Colombiano declaró el estado emergencia sanitaria en todo el territorio

80



nacional, y, en virtud de la misma, adoptó serias medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, y mitigar sus efectos. A su vez el Decreto 457 de 2020, "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", ordenó en su artículo primero el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a su vez, mediante Circular Externa 0018 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se emitieron una serie de instrucciones relativas a las "acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias", ordenó "Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias personas para evitar el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y COVID-19", por otra parte la Resolución No. 00639 del 30 de marzo de 2020, emitida por Prosperidad Social, se expresa: "Los contratistas, operadores y Asociados de Prosperidad Social, no podrán suspender o terminar anticipadamente, contratos laborales, contratos de prestación de servicios personales y profesionales, y de apoyo a la gestión celebrados para la ejecución de los programas y proyectos contratados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, hasta que la emergencia sanitaria sea superada, salvo que la suspensión y terminación anticipada sea solicitada por el contratista o se presente alguna de las causales de terminación anticipada"

De acuerdo a la situación presentada y a lo anteriormente expuesto, Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1 suscribieron Otrosí No. 1 que modifica las Obligaciones y compromisos específicos del asociado, y las obligaciones y compromisos de las partes, en el cual a su vez se concertó con Prosperidad Social los correspondientes ajustes al anexo técnico del programa, guía operativa y matriz de seguimiento POA, esto a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Gobierno nacional en la aplicación de protocolos de Bioseguridad en la realización de las actividades en campo.

Por otra parte, el socio implementador Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, para la ejecución de las actividades del programa adoptó el modelo gerencial KAIZEN – MEJORAMIENTO CONTINUO –, el cual a través de los procesos denominados P. H. R. A. (Planear, Hacer, Revisar y Actuar), y basados en la exigencia para mantener altos estándares de gestión, aprovechamiento del tiempo y aumento en la producción de cada funcionario, nos permitirá avanzar en la correcta realización de las actividades del programa con la pandemia actual que afecta a la humanidad, y con esto dar cumplimiento a las metas establecidas.

A continuación, se evidencia el estado de ejecución de las actividades en campo a corte 31 de Mayo de 2020:

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

ETAPA DE ALISTAMIENTO:

ETAPA: ALISTAMIENTO
PROCESO: *Selección y contratación del Equipo Zonal y Local*
INDICADOR: *Número de personas contratadas*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Matriz de Excel con la relación del personal contratado, hojas de vida y copia escaneada de los contratos suscritos.*
META PROGRAMADA: *177 personas*
META EJECUTADA: *177 personas*

De acuerdo a lo contractualmente establecido, y a lo definido en la matriz POA, para el presente proceso se contempló la contratación de 17 personas a fin de conformar el equipo zonal y 160 personas a fin de conformar el equipo local del programa, para lo cual el socio implementador para el actual periodo logró el cumplimiento de la meta establecida en un 100%, tal como se grafica a continuación:

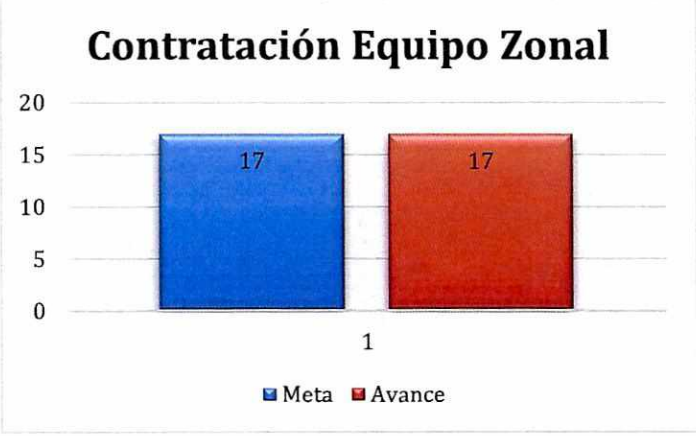


Ilustración 1 Meta programada – meta alcanzada del Equipo Zonal Iraca z1 contratado

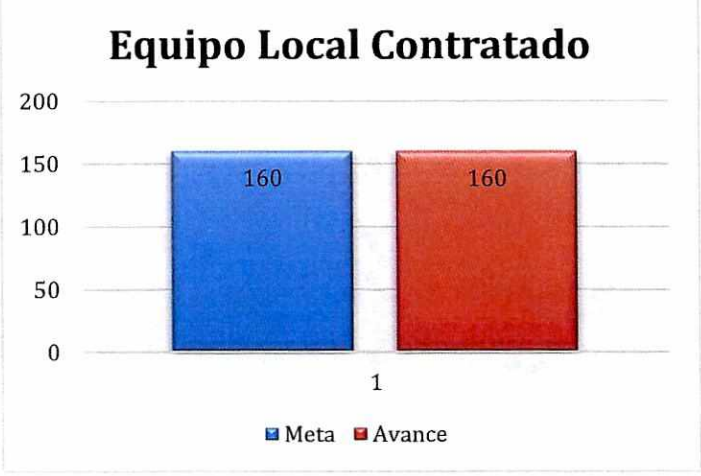


Ilustración 2 Meta programada – meta alcanzada del Equipo Local Iraca z1 contratado

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Las anteriores graficas ilustran meta establecida versus el avance logrado en la ejecución del proceso de contratación del equipo zonal y local, a su vez, el detalle se encuentra soportado en los diferentes informes financieros remitidos a Prosperidad Social y las diferentes bases de contratación remitida

Evidencia que soporta el proceso:

- Informes técnicos mensuales
- Base de datos de profesionales contratados remitidas en los informes financieros
- Informes financieros que dan muestra del personal contratado.

ETAPA: ALISTAMIENTO
PROCESO: *Transferencia al equipo Local*
INDICADOR: *Número de talleres*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Documento metodológico, Programación Informe de la actividad, registro fotográfico, y listados de asistencia.*
META PROGRAMADA: 5
META EJECUTADA: 5

Se realizaron 5 jornadas de transferencia metodológica en dos diferentes momentos. Inicialmente se alcanzó el 100% de la transferencia a los 4 equipos locales (Cauca, Nariño, Vichada y Guainía), en el mes de noviembre de 2019, como se resume a continuación:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA TRANSFERENCIA	LUGAR DEL EVENTO	No. PARTICIPANTES
CAUCA	GUAPI	15 y 16 DE NOVIEMBRE	Instituto de Investigación Ambiental del Pacifico Calle 4 No. 1-19	17
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	17 y 18 DE NOVIEMBRE	Hotel Sultana Calle 14 No.9B-112	27
GUAINIA Y VICHADA	VILLAVICENCIO – META	25 y 26 DE NOVIEMBRE	Hotel El Caimito, Carrera 35 No. 26ª-16	18

Tabla 1 Primera Transferencia metodológica al Equipo Local

Esta Transferencia Metodológica a los equipos locales, iniciaron el día 15 de noviembre en el municipio de Guapi Cauca y terminaron el 26 de noviembre en el municipio de Villavicencio Meta en jornadas de dos días, con el equipo local de Guainía y Vichada, tal como lo muestra la tabla anterior, cumpliendo con lo establecido en el Plan Operativo Anual.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Las jornadas contaron con la participación activa de los Gestores Sociales, Gestores Productivos, Profesionales Sociales y Profesionales Productivos, y coordinadores locales de cada uno de cada una de las regiones a intervenir. Cada actividad estructuro una agenda de trabajo, documento metodológico y obtuvo listados de asistencia.

El equipo zonal y de la Unión Temporal del programa Iraca Z1, fue el encargado de transmitir la información del programa a los asistentes, realizando la presentación del programa con todos sus componentes en la fase pre y operativa, entregando físicamente los formatos que deben ser utilizados en campo y la explicación del diligenciamiento de cada uno de ellos, realizando durante la jornada talleres prácticos que facilitarían en desarrollo de las actividades en campo, igualmente fue creado el correo electrónico IRACAZ12019N@GMAIL.COM, suministrando la clave para que desde allí pudieran obtener todas las memorias de la transferencia y los formatos a utilizar en las actividades propias de cada uno de los componentes.

Adicionalmente fue realizada una Transferencia Metodológica virtual a los Coordinadores Locales de los Departamentos de Cauca, Guainía, Nariño y Vichada, junto con el Especialista Pecuario entrante, el día 7 de noviembre de 2019 a partir de las 9:00 A.M. en las instalaciones del Hotel Golden Tag, ubicado en la Carrera 40 No.25-05 de la ciudad de Bogotá, donde contamos con el apoyo de prosperidad social, en cabeza de la supervisora del programa Mauren Mendivelso y el apoyo de la parte técnica del funcionario Edwin Gutiérrez.

En una segunda Jornada de transferencia del componente metodológico con énfasis para la Etapa de Formulación de Proyectos, se desarrolló esta actividad con cada uno de los 4 equipos locales, alcanzando un 100% de la meta programada en el mes de marzo de 2020, como se resume a continuación:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO DE REALIZACIÓN	FECHA TRANSFERENCIA	LUGAR DEL EVENTO	No. PARTICIPANTES
NARIÑO	EL CHARCO	14 – 15 de Marzo	Casa de Gobierno Consejo Comunitario Mayor Prodefensa – Rio tapaje	12
	SAN ANDRES DE TUMACO	18– 19 de Marzo	Oficina de la UT PROSPERIDAD IRACA	25
GUAINIA	PUERTO INIRIDA	22-23 de Marzo	Oficina de la UT PROSPERIDAD – modo virtual	12

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

VICHADA	LA PRIMAVERA	17– 19 de Marzo	Oficina de la UT PROSPERIDAD IRACA	12
CAUCA	GUAPI	15 de Abril	Virtual	22
	TIMBIQUI	21 de Abril	Virtual	15

Tabla 2 Segunda Transferencia metodológica al Equipo Local

La segunda Transferencia Metodológica al equipo local se realizó en los municipios de El Charco y Tumaco del departamento de Nariño y La Primavera del Departamento de Vichada de modo presencial en las oficinas del socio implementador UT prosperidad IRACA Z1, y de modo virtual la transferencia al equipo local del Departamento de Guainía y Cauca, tal como lo muestra la tabla anterior, dando así, cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Anual, donde se contó con la participación activa de los Gestores Sociales, Gestores Productivos, Profesionales Sociales y Profesionales Productivos, y coordinadores locales de las regiones focalizadas en la zona 1.

El equipo zonal de la Unión Temporal del programa Iraca Z1, fue el encargado de transmitir la información del programa a los asistentes, realizando la presentación del programa con todos sus componentes con énfasis en la Formulación de Proyectos, haciéndoles entrega física de los formatos que deben ser utilizados en campo y la explicación del diligenciamiento de cada uno de ellos, realizando durante la jornada talleres teórico-prácticos que facilitarían en desarrollo de las actividades en campo.



Ilustración 3 Evidencias fotográficas 2da jornada de transferencia

Evidencia que soporta el proceso:

- Documento Metodológico
- Listado de Asistencia
- Agenda
- Presentación - Videos
    - Primera Parte: https://youtu.be/vUUlFQwefAw
    - Segunda Parte: https://youtu.be/zwq-i7c4NU4
    - Tercera Parte: https://youtu.be/0SUEjZ0iKak
    - Cuarta Parte: https://youtu.be/7nGX13B2Umw

- Quinta Parte: https://youtu.be/A2LqNRq-678
- Sexta Parte: https://youtu.be/wZPhaFotXqw
- Séptima Parte: https://youtu.be/E934YsSb6gI
- Octava Parte: https://youtu.be/fKeletNFWNg
- Novena Parte: https://youtu.be/0z_owFj9kMM
- Décima Parte: https://youtu.be/BiboKk3MBPo
- Onceava Parte: https://youtu.be/V6VreaF6sHY
- Doceava Parte: https://youtu.be/wMKv-kt1YwU
- Treceava Parte: https://youtu.be/tI6CQOj7TqM
- Catorceava Parte: https://youtu.be/38hfgwXHdko

- Evidencias del proceso de realización: https://drive.google.com/drive/folders/1uflNL1eGSO3EmcErb7vqrvhqRXGZU2wn?usp=sharing

ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN:

ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN
PROCESO: *Socialización y Concertación con Autoridades*
INDICADOR: Número de encuentros de socialización del programa IRACA y concertación de entrada al territorio con las autoridades
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de socialización y concertación IRACA, Registro Fotográfico y Listados de asistencia
META PROGRAMADA: 40 Territorios colectivos
META EJECUTADA: 40 Territorios colectivos

El presente proceso se encuentra en un 100% de cumplimiento de la meta establecida, el cual a su vez fue remitido a Prosperidad Social para su revisión y se encuentra con un estado actual de "Aprobado", con un total de 40 territorios colectivos socializados y concertados con Autoridades étnicas para los Resguardos indígenas y Consejos Comunitarios de los Departamentos de Cauca, Nariño, Vichada y Guainía.

A continuación, se presentan los territorios colectivos por municipio, donde se realizó la socialización y concertación a autoridades.

En el siguiente grafico se observa los dos territorios colectivos socializados y concertados con las autoridades en el municipio de Puerto Inírida, departamento de Guainía. En el Resguardo Indígena Paujil se contó con la presencia del gobernador y los capitanes de las comunidades microfocalizadas (Cucurital, Platanillal y Cimarrón). En el Resguardo Atabapo, se socializó y concertó con el Capitán y líderes de la comunidad Concordia. Esta comunidad presenta una particularidad: inicialmente solicitó ser admitida por el Resguardo Almidón y no fue aceptada; Posteriormente, se realizó la misma solicitud al Resguardo Atabapo y en

octubre de 2019, se contaba con la aceptación por parte del cabildo, sin embargo, el proceso no estaba 100% legalizado.

Puerto Inírida:


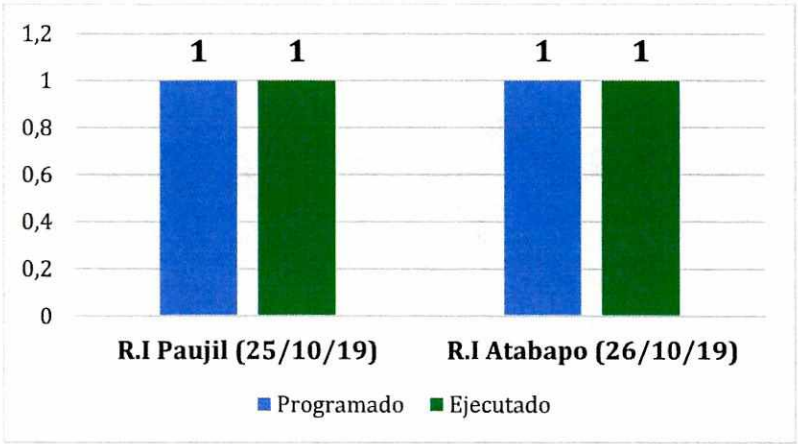


Ilustración 4 Socialización y Concertación a Autoridades - Guainía

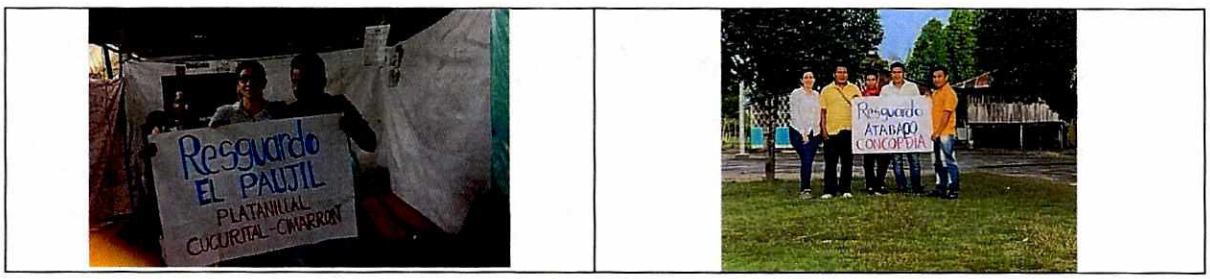

En el departamento de Cauca, se realizó la socialización y concertación a autoridades en 5 Consejos Comunitarios del municipio de Guapi y uno en el municipio de Timbiquí, tal como se muestra a continuación:

Guapi – Timbiquí:

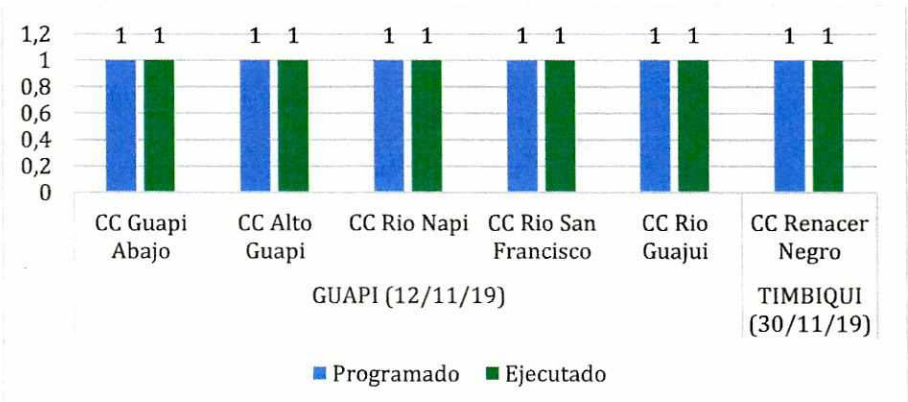


Ilustración 5 Socialización y Concertación a Autoridades – Cauca



En el departamento de Vichada, esta actividad se llevó a cabo en los nueve (9) resguardos indígenas distribuidos en los municipios de Cumaribo, Puerto Carreño y La Primavera.

En el siguiente gráfico, se presentan los Resguardos Indígenas del municipio de Cumaribo, donde se desarrolló la socialización y concertación con autoridades y líderes comunitarios.

Cumaribo:


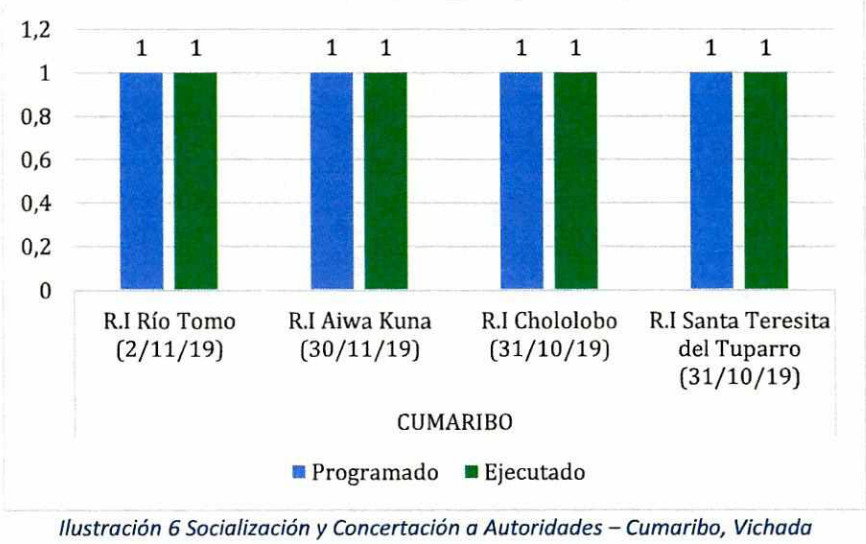


Ilustración 6 Socialización y Concertación a Autoridades – Cumaribo, Vichada

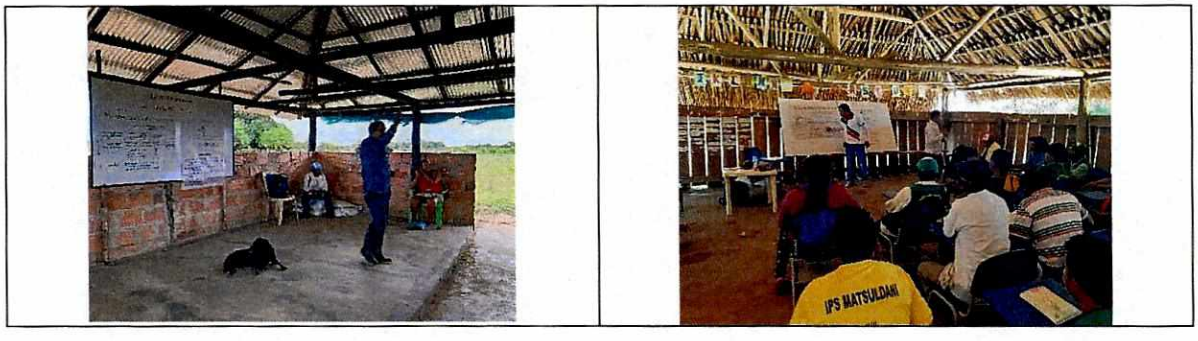

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

En el municipio de Puerto Carreño, se socializó y concertó con las autoridades y líderes comunitarios de los Resguardos Indígenas de Caño Guaripa y Caño Mesetas Dagua. De igual manera, en los resguardos El Trompillo, Campoalegre y Riapialito y Yajota del municipio de La Primavera.

Puerto Carreño – La Primavera:

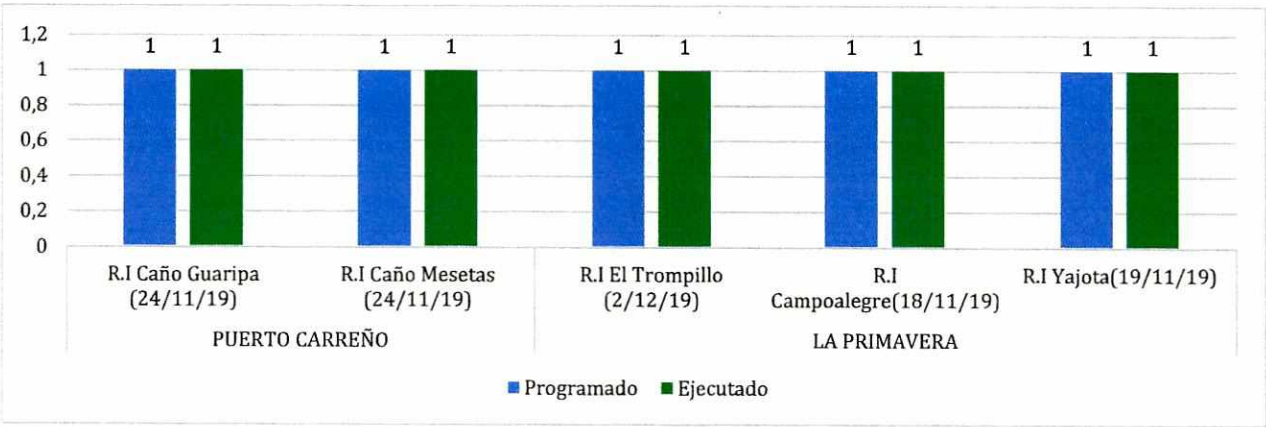


Ilustración 7 Socialización y Concertación a Autoridades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada



En el departamento de Nariño, esta actividad se llevó a cabo en veintitrés (23) territorios colectivos pertenecientes a los municipios de Ricaurte, Tumaco, El Charco y Barbacoas.

En el municipio de Ricaurte, en el mes de noviembre de 2019 se realizó la socialización y concertación con los Gobernadores Mayores y menores de los once (11) resguardos, en la casa comunitaria de la Asociación CAMAWARI, de la cual todos hacen parte, donde manifestaron que las decisiones en torno al Programa IRACA, serán tomadas en conjunto.

Ricaurte:


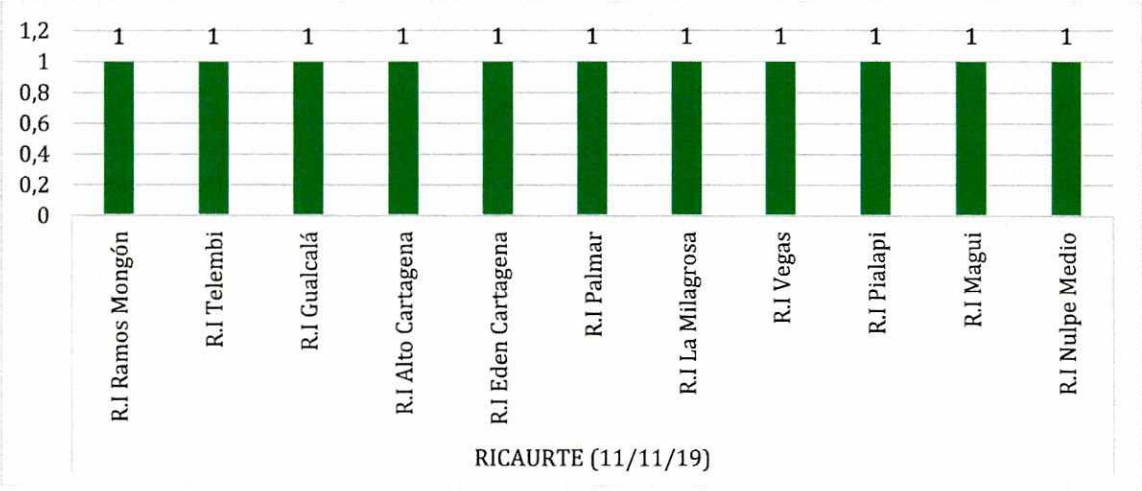


Ilustración 8 Socialización y Concertación a Autoridades – Ricaurte, Nariño

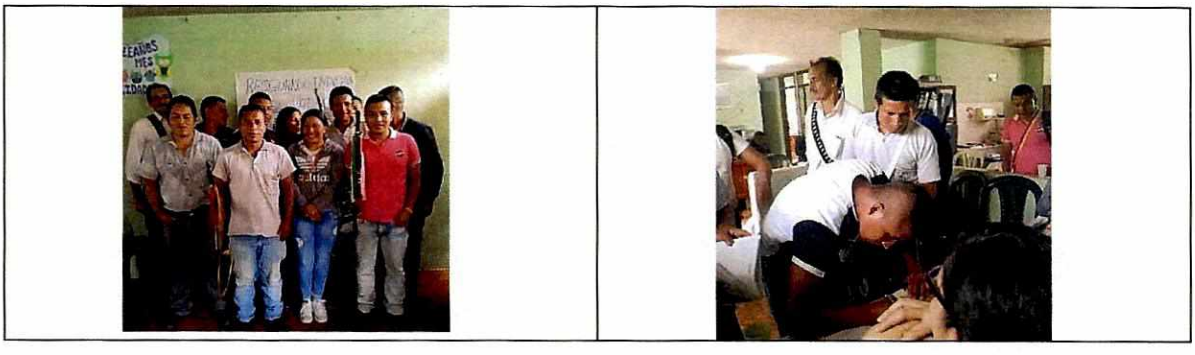

A pesar que, la socialización y concertación fue exitosa, en los meses de Diciembre y Enero, hubo cambio de Gobernadores y los actuales solicitaron aclaración de dudas, solicitud de un coordinador para Ricaurte y que para la selección del equipo de gestores deben ser tenidos en cuenta los técnicos y profesionales de los resguardos. Para ello, se llevo a cabo una reunión el día 23 de Enero de 2020, dirigida por la coordinadora local, en la que también solicitaban 2 enlaces más.

Posteriormente, se convocó a una nueva reunión el 29 de Febrero del presente año, donde se aclararon las dudas y se acordó que el personal para ejercer el cargo de Gestor, sería de los resguardos o en su defecto del municipio de Ricaurte, contando con el aval de los gobernadores, y cumpliendo con el perfil exigido en el anexo técnico del programa. Para ello, se tiene en cuenta el decreto 1083 de 2015 de Convalidación de Títulos y el decreto 2365 de 2019, que reglamenta la contratación de jóvenes profesionales sin experiencia laboral. Además, solicitaron 2 enlaces adicionales: uno para el resguardo Palmar y otro para el resguardo Pialapí, argumentando la distancia entre comunidades y dispersión de hogares.

En el municipio de Tumaco, se realizó en el mes de noviembre de 2019 la socialización y concertación a autoridades en el Consejo Comunitario Bajo Mira y los cinco (5) Resguardos Indígenas: Inda Sabaleta, Inda Guacaray, La Brava – El cedro, Peña Alegría y Pulgande Campoalegre, ver ilustración.

San Andrés de Tumaco:


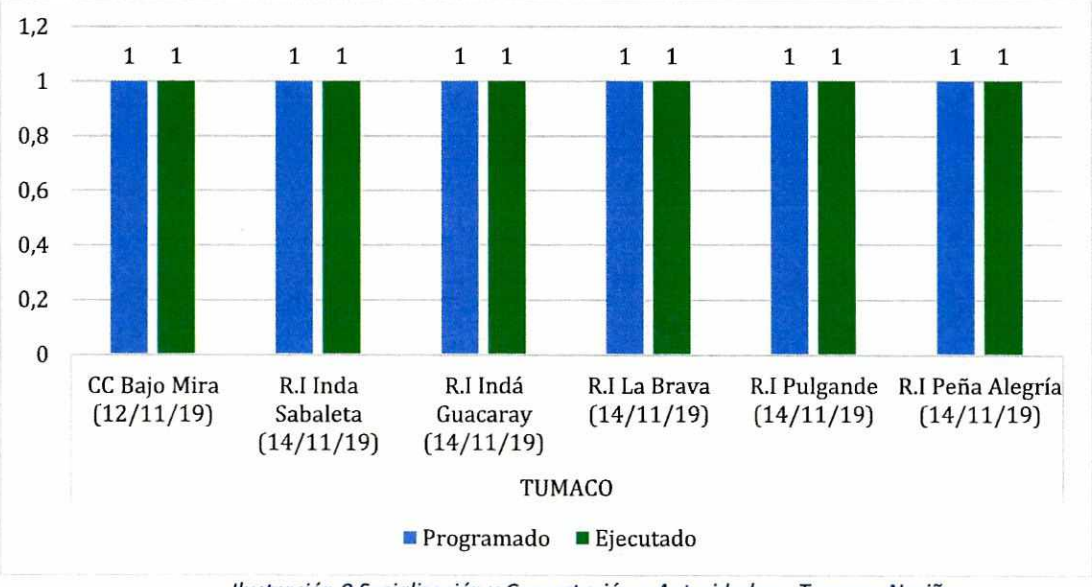


Ilustración 9 Socialización y Concertación a Autoridades – Tumaco, Nariño

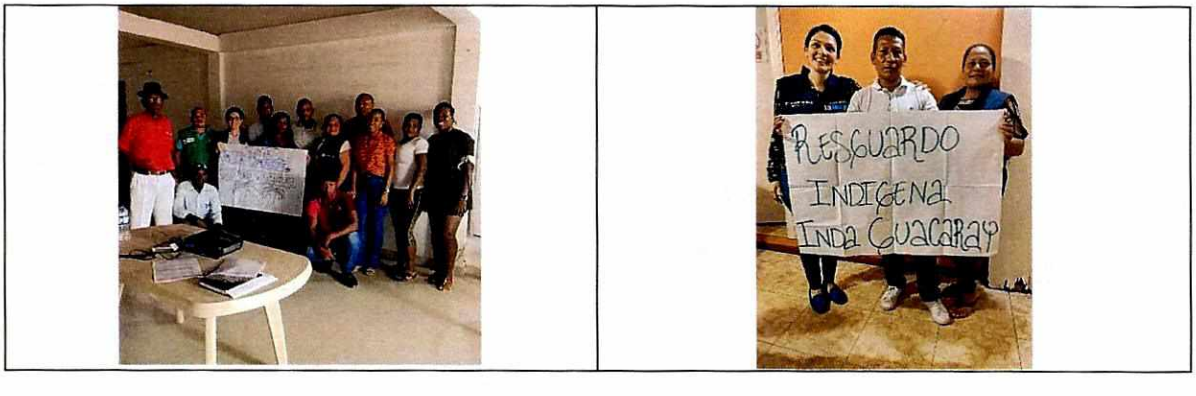

A pesar que la socialización y concertación a los gobernadores de los resguardos de Tumaco fue un éxito, los gobernadores enviaron la distribución de los 600 cupos de (contrapartida) el día 29 de enero de 2020, de forma diferente a la propuesta por Prosperidad Social, situación que atraso la intervención de estos territorios colectivos hasta tanto no se aclaró con cuantos cupos quedaban asignados en cada Resguardo Indígena. De modo que para el mes de febrero de 2020 se iniciaron las actividades pertinentes de la etapa de Alistamiento expuestas en la ruta operativa del programa.

Para el mismo mes de noviembre, se realizó la socialización y concertación a los cinco consejos comunitarios, pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor Prodefensa del Río Tapaje del Municipio de El Charco. ver ilustración.

El Charco:

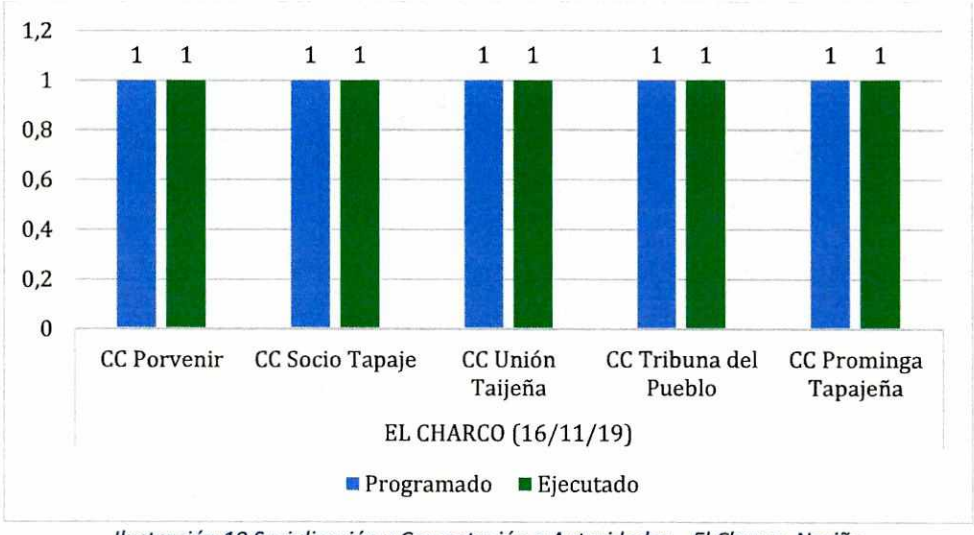


Ilustración 10 Socialización y Concertación a Autoridades – El Charco, Nariño



En el municipio de Barbacoas, se realizó la socialización y concertación con el Gobernador y líderes comunitarios del Resguardo Indígena El Hojal – La Turbia en el mes de Diciembre de 2019, dejando claro que estaban de acuerdo con las actividades del programa, sin embargo estaban insatisfechos por la contratación del socio operador, manifestando su interés en operar el programa en su territorio. Esta situación atraso la intervención del territorio para iniciar con la etapa de Alistamiento del Programa.

De modo que el socio implementador UT Prosperidad Iraca Z1 logro luego de varios acercamientos, concertar una nueva reunión el día 06 de Marzo de 2020, en la cual se acordó que el equipo de gestores productivos y sociales deben tener el aval del gobernador y

solicitaron 2 nuevos enlaces étnicos, argumentando la distancia que existe entre las comunidades y la dispersión de los hogares, ver ilustración.

Barbacoas:



Ilustración 11 Socialización y Concertación a Autoridades – Barbacoas, Nariño



Ricaurte:

Las actividades de socialización a comunidades, caracterización y vinculación realizadas en meses anteriores, se encuentran los productos en revisión de calidad para ser presentadas a Prosperidad en el próximo informe

Evidencia que soporta el proceso:

- Actas de Socialización y Concertación con Autoridades realizadas en campo
- Actas y evidencias de los procesos realizados para aprobación: https://drive.google.com/drive/folders/1TcwsC158vunqlL7ZKeP96eEOcsDA-QLy?usp=sharing
  (Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización)

ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN
PROCESO: *Socialización a Comunidades*
INDICADOR: Número de encuentros de socialización del programa IRACA con las comunidades.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de socialización y vinculación comunitaria, Registro Fotográfico y Listados de asistencia
META PROGRAMADA: 100% comunidades socializadas (252)
META EJECUTADA: 92.29% comunidades socializadas (234 comunidades)
META EN PROCESO: 7.71% (18 comunidades) Novedades Territoriales

Para el desarrollo de esta actividad, al corte del 31 de Mayo de 2020 el avance en la entrega de los soportes que evidencia la realización de este proceso es del 92.29%, para lo cual se realizó control de calidad de la información cargada a la plataforma.

En el departamento de Guainía, se socializaron las comunidades de Cucurital, Cimarrón y Platanillal del Resguardo Paujil. En el Resguardo Atabapo, se realizó la socialización a la comunidad de Concordia.

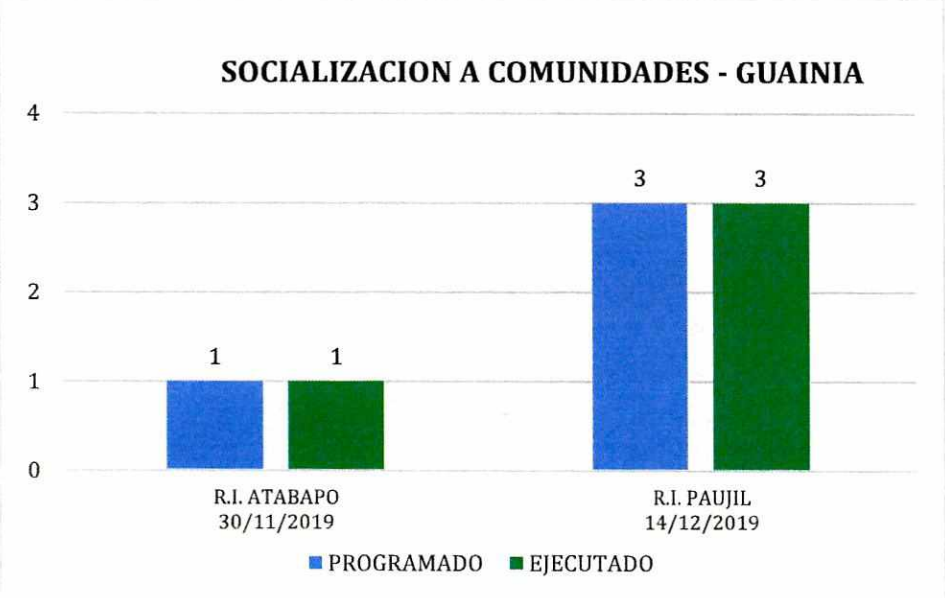


Ilustración 12 Socialización a Comunidades - Guainía

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Para el periodo comprendido del 01 a 30 de mayo, se logró la subsanación de 8 actas que soportan la realización de esta actividad en el departamento de cauca, las cuales se encuentras distribuidas de la siguiente manera:

- 2 Consejo comunitario Rio Napi
- 4 Consejo comunitario Rio Guajui
- 1 Consejo comunitario Renacer Negro
- 1 Consejo comunitario Alto Guapi

De acuerdo a lo anterior, el socio implementador cuenta con una entrega de 47 de las 49 establecidas para el departamento del Cauca, las 2 faltantes están en control de calidad y se entregaran en el mes de Junio:

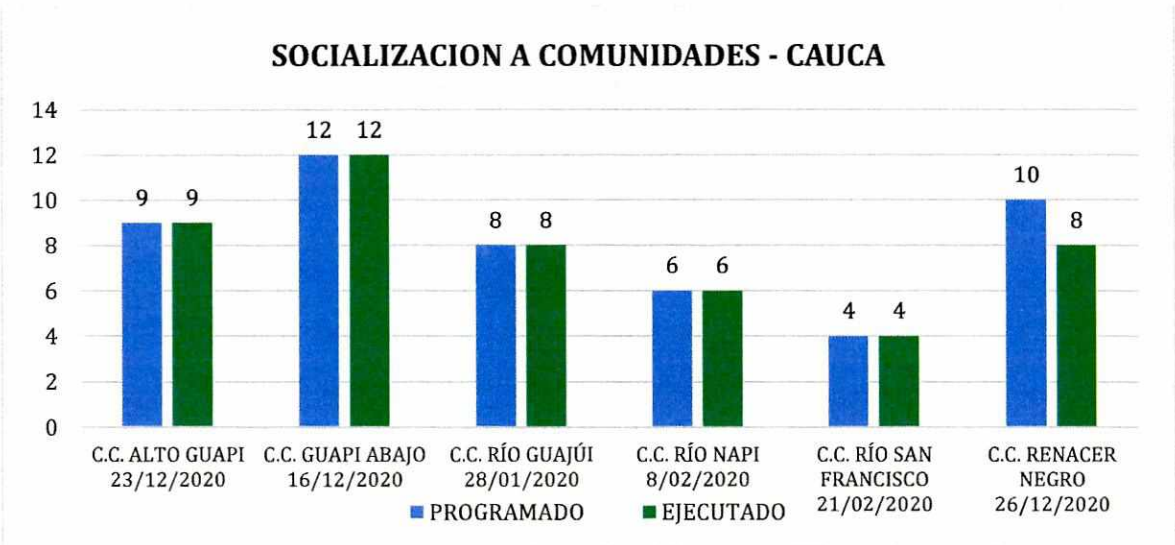


Ilustración 13 Socialización a Comunidades - Cauca

En el Municipio de Cumaribo del departamento del Vichada, se socializaron las comunidades de los Resguardos Indígenas de Rio Tomo, Aiwa Kuna, Chololobo y Santa Teresita del Tuparro, logrando con esto el cumplimiento de la meta programada para la presente actividad.

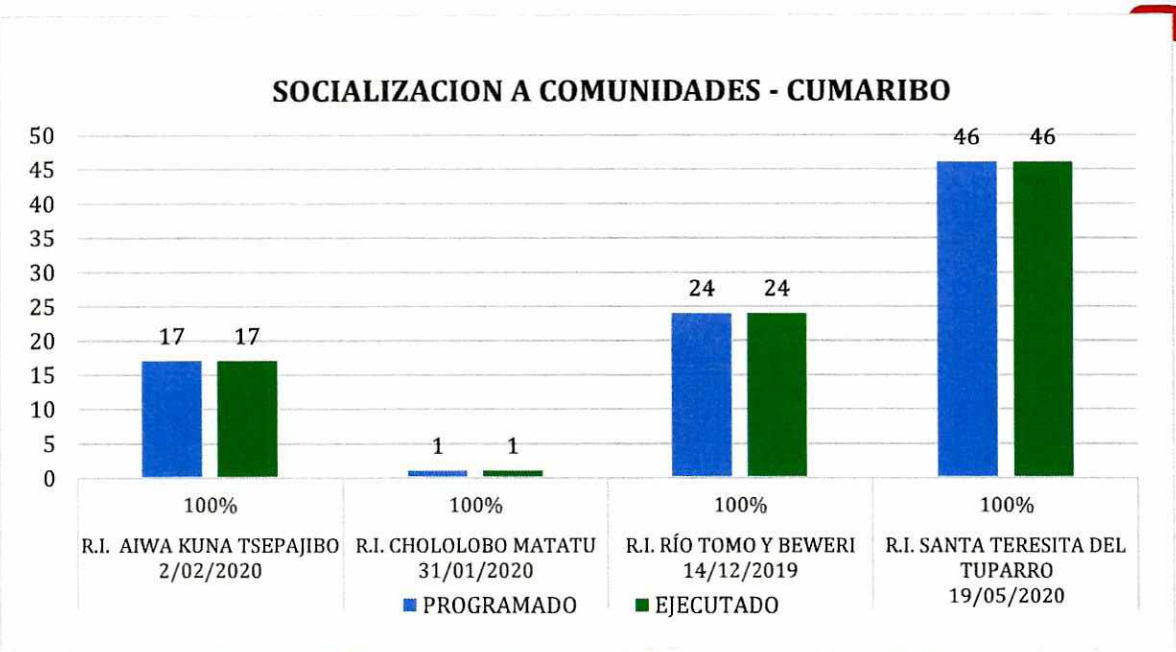


Ilustración 14 Socialización a Comunidades Municipio de Cumaribo - Vichada

Para los municipios de Puerto Carreño y la Primavera, se procedió a la socialización de las siguientes comunidades:

- Puerto Carreño:
  - Resguardo Indígena Caño Guaripa
  - Resguardo Indígena Caño Mesetas

- La Primavera:
  - Resguardo Indígena de Trompillo
  - Resguardo Indigena de Yajota

Con lo anterior, dando cumplimiento a la meta programada para la presente actividad en estos dos municipios, tal como se evidencia a continuación:

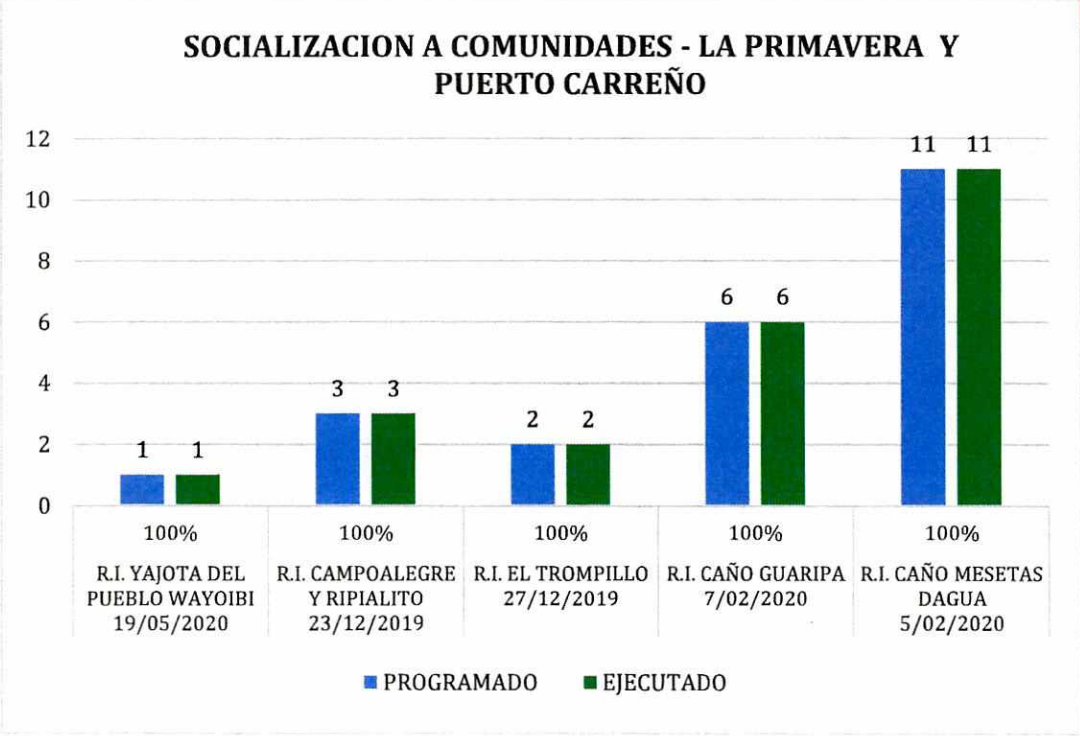


Ilustración 15 Socialización a comunidades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada

En el Municipio de Tumaco del departamento de Nariño, se socializaron las comunidades de los Resguardos Indígenas de Indá Zabaleta, Indá Guacaray, La Brava, Pulgande y Peña Alegría y las comunidades del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera, logrando con esto un avance de 33 de las 37 socializaciones propuestas para la presente actividad, tal como se muestra en la ilustración. Las 4 faltantes están en control de calidad y se entregaran en el mes de Junio.

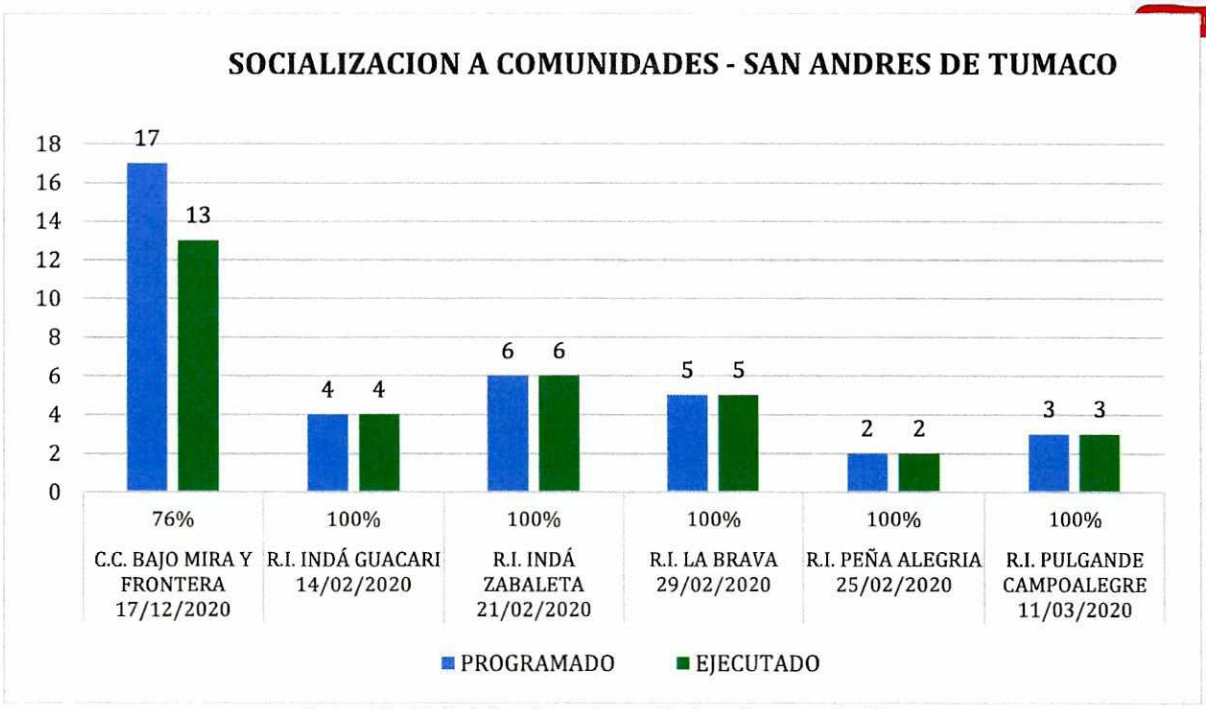


Ilustración 16 Socialización a Comunidades – Tumaco, Nariño

En el Municipio de El Charco departamento de Nariño, se socializaron las comunidades de los Consejos Comunitarios de El Porvenir, Socio Tapaje, Unión Taijeña, Tribuna del Pueblo y Prominga Tapajeña. Referente al municipio de Barbacoas se logró la socialización de 14 comunidades de las 14 programadas, logrando con esto un 100% de avance en el cumplimiento de la meta programada para los municipios de Charco y Barbacoas.

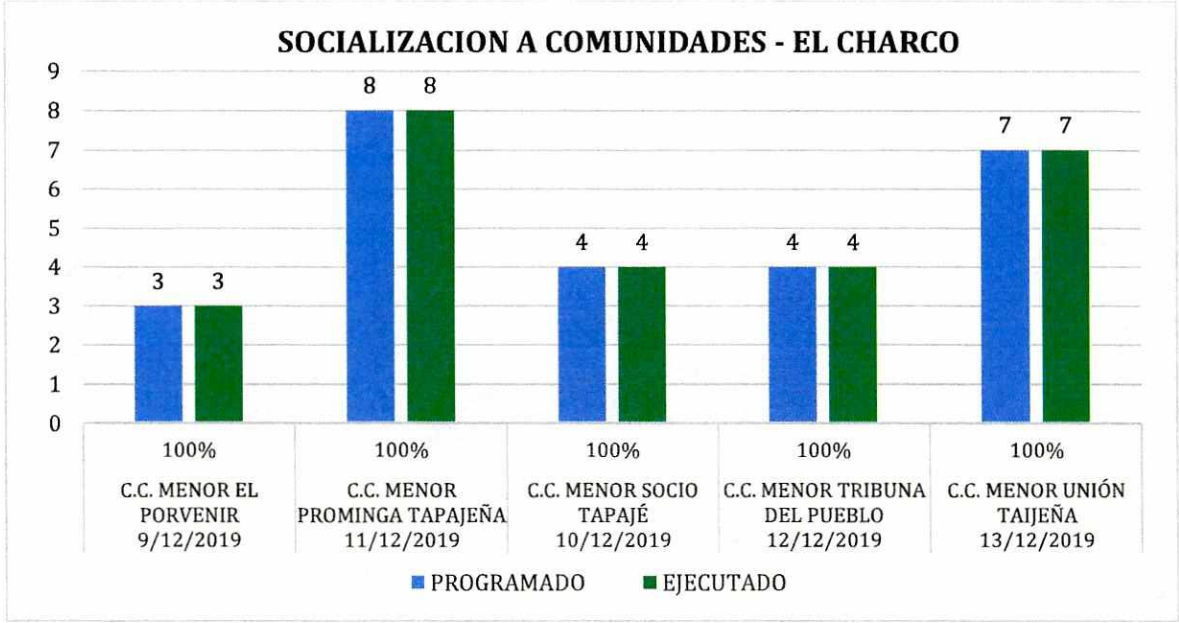


Ilustración 17 Socialización a Comunidades – El Charco y Barbacoas - Nariño

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

A continuación, se grafica de forma consolidado la meta programada versus el avance ejecutado en la realización de la presente actividad.

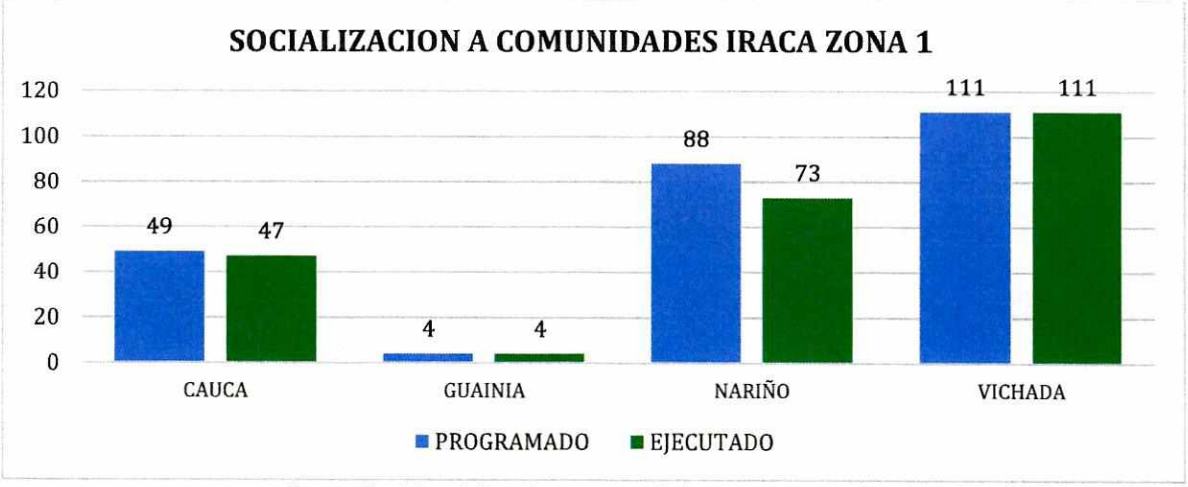


Ilustración 18 Socialización A Comunidades por Departamentos

De acuerdo a lo anterior, nos permitimos relacionar a continuación el estado de las evidencias que soportan la realización del actual proceso:

Estado del proceso	Cantidad
Meta asignada	252
Enviadas anteriormente a Prosperidad Social	192
Enviadas a Prosperidad Social como anexo a este informe	42

Evidencia que soporta el proceso:

- Socialización a Comunidades realizadas en campo.
- Actas y evidencias de los procesos realizados para aprobación: https://drive.google.com/drive/folders/1CFSEJtPyzYdY8zgnyCOmGddF0OCdWcKZ?usp=sharing

ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACIÓN:

ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACIÓN
PROCESO: *Vinculación de hogares*
INDICADOR: Número de hogares vinculados y cargados en el aplicativo KOKAN
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de vinculación del hogar y reporte de cargue en el KOKAN.
META PROGRAMADA: 5280 hogares
META EVIDENCIADA: 4088 hogares (77.42%)
META EN PROCESO: 1192 hogares (22.58%) Novedades Territoriales

Para el presente proceso el Socio Implementador ha logrado en campo la realización de 4088 vinculaciones de hogares, las cuales se encuentran en el siguiente estado:

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

ESTADO	CANTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Validadas por Prosperidad Social	4088	- Actas remitidas y validadas por Prosperidad Social en informes anteriores
En el Módulo INTERCAMBIO	516	- Registros pendientes de preinscribirse en KOKAN
Remitidas en el presente informe	674	- Actas de vinculación anexas al presente informe
Consolidado remitido	3938	- Consolidado de Actas de vinculación hogar remitidas a Prosperidad Social
En proceso de revisión y control de calidad	553	- Actas cargadas en el sistema de información SION.
Total de vinculaciones impactas en campo	4.618	- Actas cargadas en el sistema de información SION.

Tabla 3 Resumen del Estado de las Vinculaciones de Hogares Zona 1

A fin de medir el porcentaje de actas de vinculación remitidas a Prosperidad Social con los hogares validados en KOKAN con fecha de corte 31 de Mayo de 2020, se tiene:

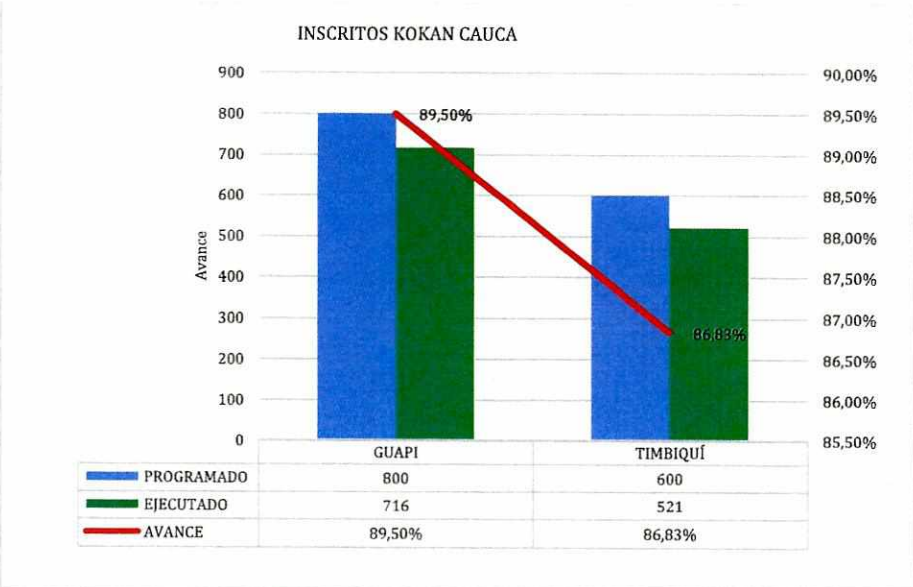


Ilustración 19 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento del Cauca

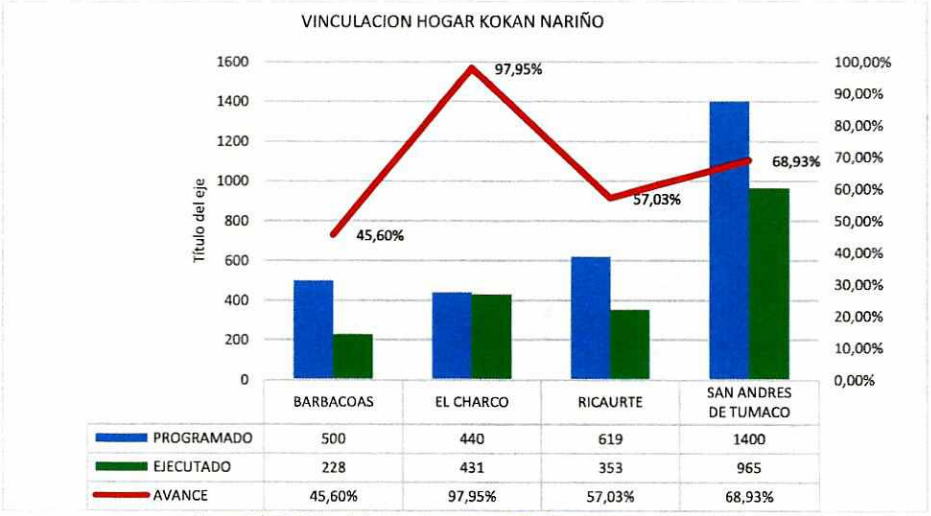


Ilustración 20 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento de Nariño

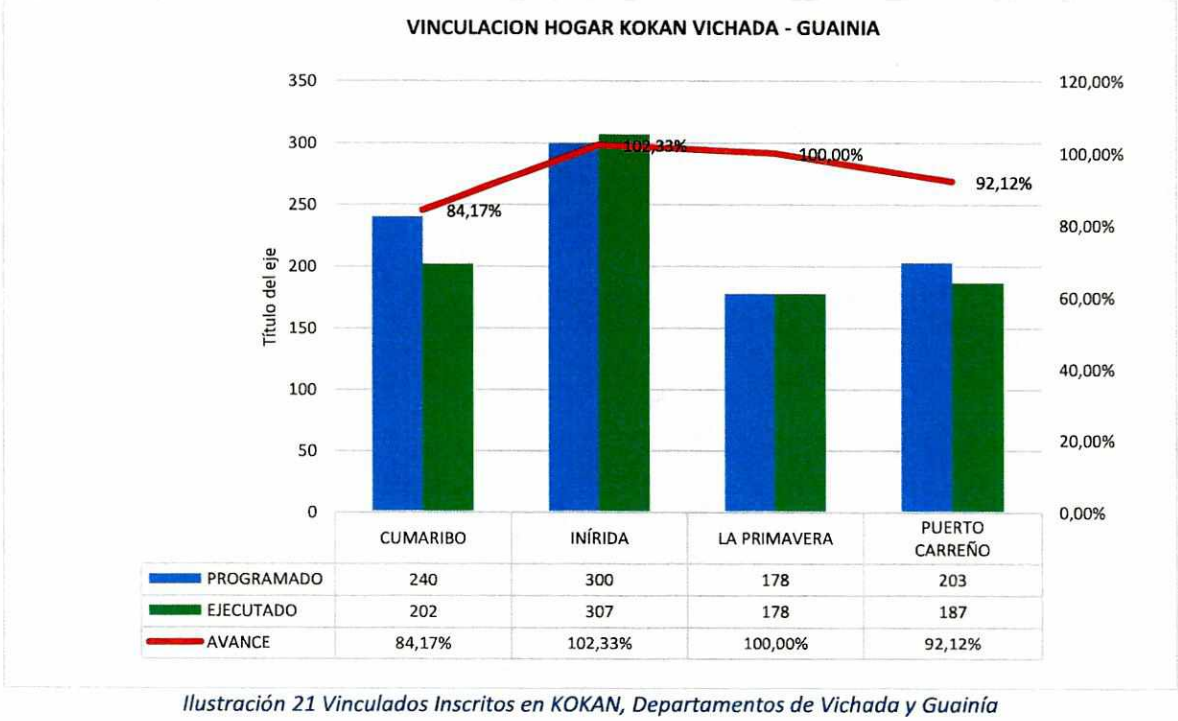


Ilustración 21 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamentos de Vichada y Guainía

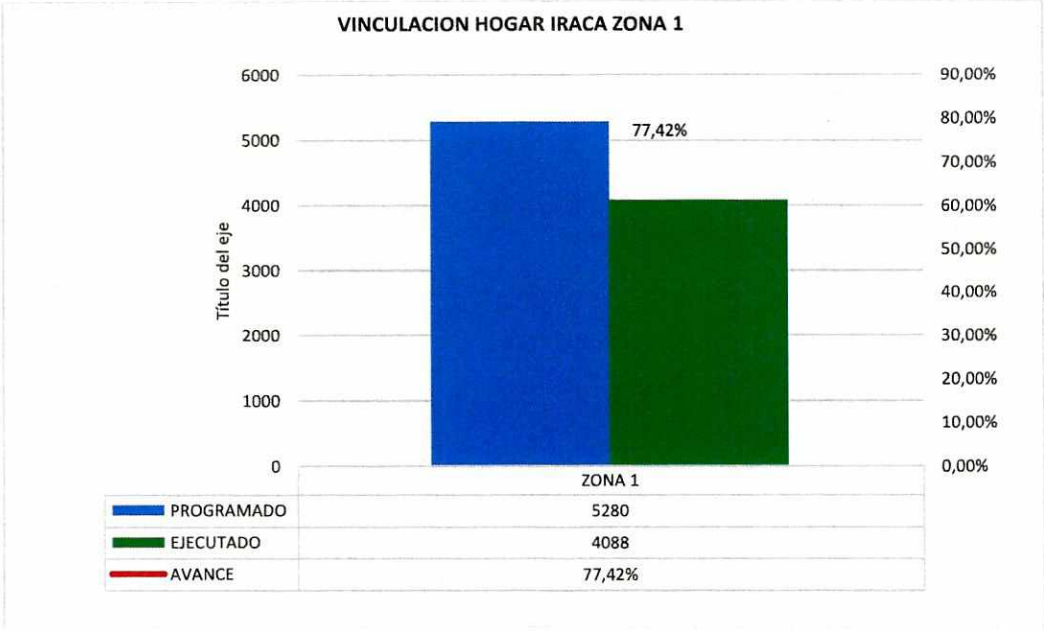


Ilustración 22 Vinculados Inscritos en KOKAN, IRACA Zona 1



Ilustración 23 Ejercicio de Vinculación de Hogares (Consejo Comunitario Tribuna del Pueblo – El Charco – Departamento de Nariño)

De acuerdo a las vinculaciones de hogar inscritas en KOKAN por el Socio Implementador a Prosperidad Social, se tiene que, de los 4.088 hogares, fueron designados como jefe de hogar a 1.820 hombres, equivalentes al 45% y 2268 mujeres, equivalente al 55%, tal como lo muestra la siguiente gráfica:

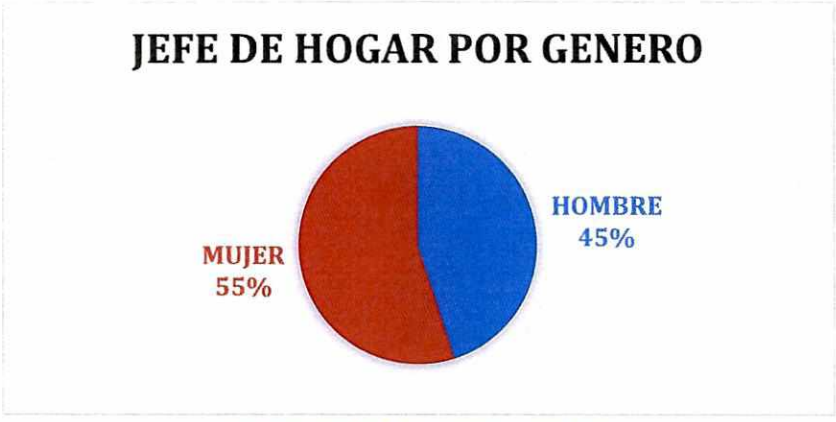


Ilustración 24 Jefe de Hogar por Genero

La media de edad de los miembros del hogar incluyendo al titular del hogar, se encuentran en rango entre 20 y 40 años.

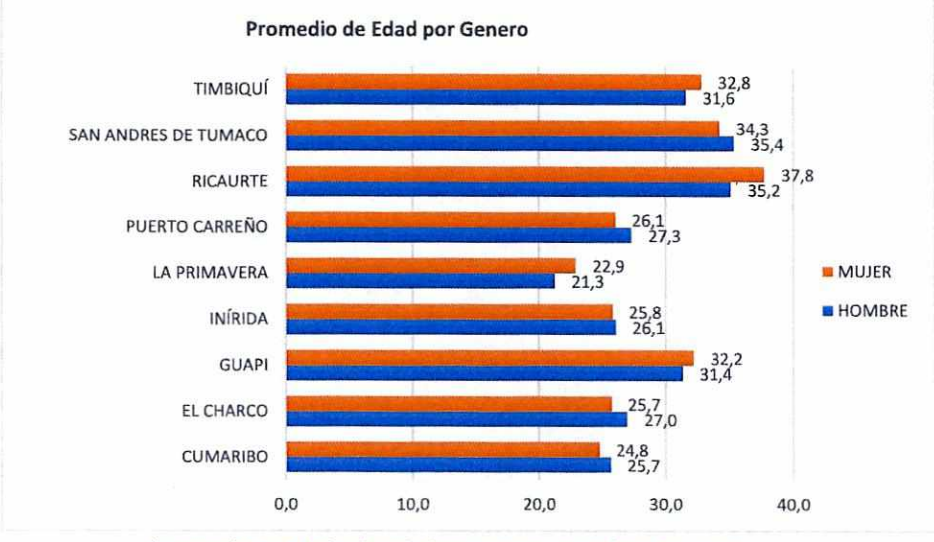


Ilustración 25 Media de edad por Genero miembros de Hogar

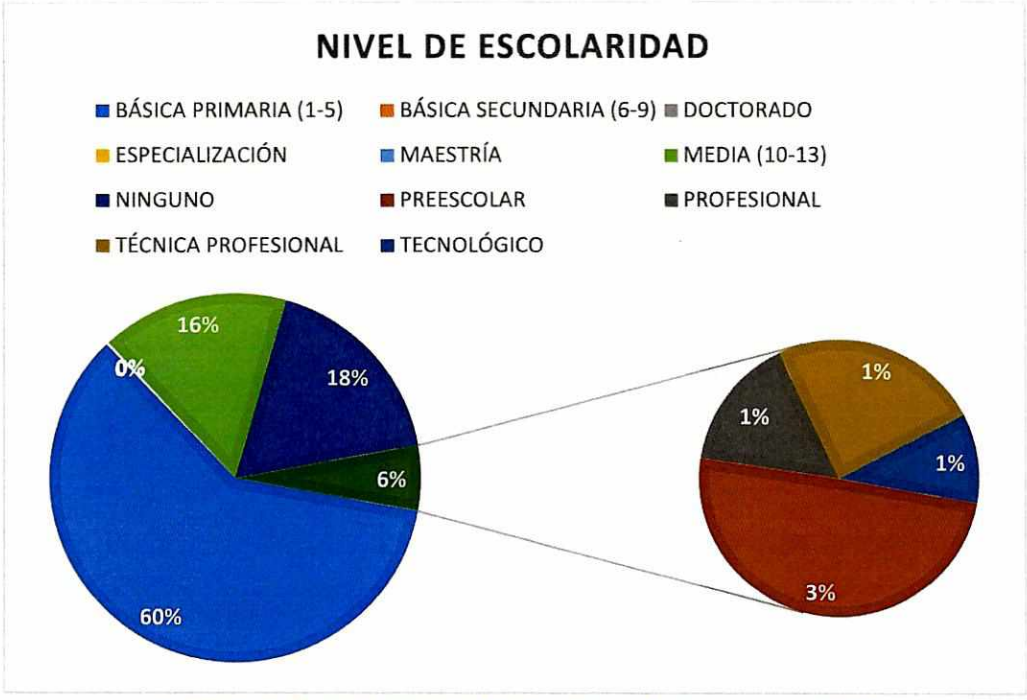


Ilustración 26 Nivel de Escolaridad Población beneficiaria programa IRACA

De acuerdo a la solicitud de Prosperidad Social de finalizar la meta de vinculación de hogares a 31 de Mayo de 2020, nos permitimos manifestar que actualmente los territorios, y los Departamentos beneficiados en la zona 1, desde el pasado 23 de marzo del 2020, atraviesa una condición de aislamiento obligatorio a causa el COVID-19, decretado por el Gobierno Nacional a raíz de la emergencia sanitaria que atraviesa el País, lo cual limito los desplazamientos a los territorios y la normal ejecución de las actividades, por tanto, el Socio Implementador tras recibir resolución 607 del 24 de marzo de 2020 y resolución 00639 del 30 de marzo de 2020 de Prosperidad Social, en referencia a la ejecución de las actividades en campo, remitió propuesta de ejecución para la realización de las actividades del Programa, aporto propuestas de protocolo trabajo en aislamiento completo e inteligente para los procesos del programa Iraca presentes en el Anexo Técnico, con el ánimo de finalizar las actividades pendientes de vinculación en el mes de mayo, aplicando el respectivo protocolo aprobado y formalizado por Prosperidad Social.

Se implemento un Plan de Choque para finalizar el proceso de vinculación y caracterización de hogares, realizando seguimiento semanal, mediante tablero de control junto con Prosperidad, avanzando significativamente en la meta, con el propósito de cerrar este proceso entre los meses de Junio y Julio.

A continuación, se relaciona por Departamento y Municipio la cantidad de actas de vinculación remitidas a la supervisión en proceso inscripción en el aplicativo KOKAN y su Validación Final:

BARBACOAS	228
EL CHARCO	7

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

GUAPI	44
INÍRIDA	2
RICAURTE	159
SAN ANDRES DE TUMACO	202
TIMBIQUÍ	32
TOTAL	**674**

Para lo anterior, se adjunta en la carpeta "Vinculación de Hogar", documento Excel "que contiene la relación de cedulas de los beneficiarios remitidos para aprobación, el cual contiene pestaña CTRL que permite realizar la retroalimentación por parte de Prosperidad Social.

Evidencia que soporta el proceso:

- Actas de vinculación de hogar remitidas para la validación de registros preinscritos en KOKAN, alojadas en los siguientes link:

  Link 1:
  https://drive.google.com/drive/folders/115f5fVnxoe11ZV62mctz9BdsHHndhGoz?usp=sharing
  Link 2:
  https://drive.google.com/drive/folders/1vX5yEDlTB5tUePSP3RfbxiV3YZtAwcKs?usp=sharing
  Link 3:
  https://drive.google.com/drive/folders/1vX5yEDlTB5tUePSP3RfbxiV3YZtAwcKs?usp=sharing

  (Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización)

ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACIÓN
PROCESO: *Caracterización de Entrada*
INDICADOR: Número de hogares caracterizados y cargados en el aplicativo KOKAN
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Reporte generado por KOKAN.
META PROGRAMADA: 5280 Caracterizaciones en KOKAN
META EJECUTADA: 4088 hogares (77.42%)
META EN PROCESO: 1192 hogares (22.58%) Novedades Territoriales

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Para el proceso de caracterización de entrada en Buch-ON, el Socio Implementador a realizado el proceso de cargue con 5.162 instrumentos catalogadas como "Completa" por dicha plataforma, tal como lo refleja la imagen relacionada a continuación, de las cuales, a fecha del presente informe, se encuentran migradas a KOKAN 4088, encontrándose una diferencia de 1.074 registros que a la fecha el socio Implementador está adelantando los procesos de control y calidad para proceder con la correspondiente migración y así lograr una nivelación entre lo reflejado en BUCH ON y la plataforma KOKAN.

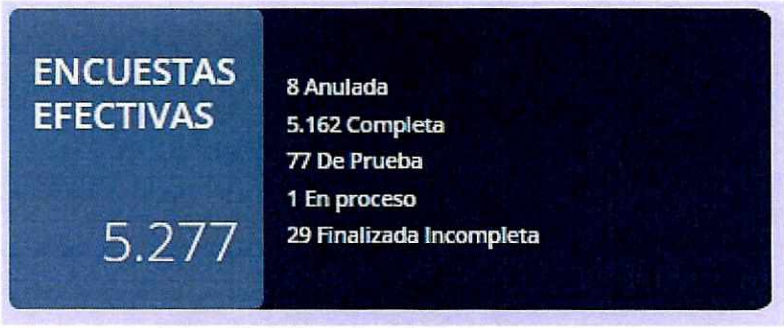


Ilustración 27 Pantallazo Buch On avance Zona 1

A continuación, se describe las cantidades de caracterizaciones de acuerdo al estado en que se encuentra:

Ítem	Cantidad
Meta	5280
Cargado en Buch On	5162
Cargado en KOKAN	4088
En intercambio en KOKAN	516
Por transferir y cargar	553

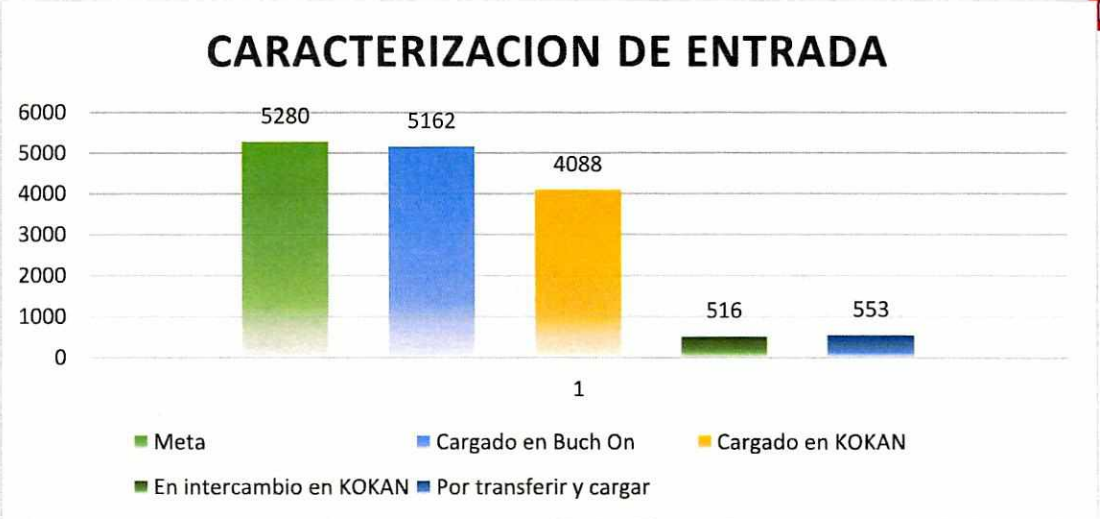


Ilustración 28 Total hogares caracterizados y validados en Kokan

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS:

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO: *ICOE de entrada*
INDICADOR: *Territorios colectivos con ICOE de entrada*
MEDIO DE VERIFICACIÓN*: Ficha de ICOE de entrada diligenciada por territorio colectivo.*
META PROGRAMADA*: 40*
META EJECUTADA: *28 (70%)*
META EN PROCESO: *12 (30 %) Novedades territoriales*

Para el presente periodo de corte, se revisó 1 ICOE del departamento de Vichada, correspondiente al territorio indígena Yajota, el cual está ubicado en el municipio de La Primavera, por tanto, se alcanzó una meta del 70%. El 30% faltante corresponde a los ICOEs que no se han realizado en los territorios colectivos de los Municipios de Ricaurte y Barbacoas. En la siguiente tabla, se presenta las novedades territoriales y el cumplimiento proyectado de este proceso.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO COLECTIVO	NOVEDAD TERRITORIAL	CUMPLIMIENTO PROYECTADO
	Ricaurte (11 R. I.)	R.I: La Milagrosa, Vegas, Palmar, Edén Cartagena, Alto Cartagena, Telembí, Gualcalá, Ramos Mongón, Pialapí, Magui, Nulpe	El 29 de Febrero los gobernadores aceptaron la reapertura del programa. Se cuenta con personal contratado y con el nuevo anexo técnico oficial se iniciará las actividades respectivas. En territorio se mantiene la comunicación telefónica con las autoridades, enlaces y gestores.	Junio 24-2020

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Nariño		Medio		
	Barbacoas (1 R.I)	Resguardo Indígena Hojal La Turbia	El 6 de Marzo, el cabildo en pleno aceptó la reapertura del programa. Se cuenta con personal contratado y con el nuevo anexo técnico oficial se iniciará las actividades respectivas. En territorio se mantiene la comunicación telefónica con las autoridades, enlaces y gestores.	Junio 26-2020

Tabla 4 Territorios Colectivos pendientes por ICOE de entrada

El Índice de Capacidades Organizativas Étnicas (ICOE) es un instrumento que mide la capacidad administrativa y de gestión de los cabildos y juntas directivas de los consejos comunitarios. Esta herramienta toma en cuenta 3 subíndices que son el de percepción, el de condiciones y atributos y el de oportunidades de contexto. Es necesario resaltar que los subíndices de percepción y el de condiciones y atributos evalúan los mismos componentes (que son estructura de la organización sociopolítica, gobernabilidad interna, identidad y cohesión comunitaria y desarrollo comunitario y medios de vida), sólo que el primero se refiere a cómo las comunidades hacen una lectura de la gestión que llevan a cabo las autoridades étnicas (mide la confianza), mientras que el segundo indica de manera "tangible" o documental cuáles son los requisitos con los que cuentan las organizaciones étnicas para su buen funcionamiento (por ejemplo, el contar con la resolución que reconoce el territorio como resguardo o consejo comunitario, la existencia de planes de etnodesarollo o de vida, el registro documental de las reuniones que tienen, entre otros). En cuanto a las oportunidades de contexto, este subíndice evalúa cuál es la incidencia que tienen los territorios en los planes de gobierno municipales y el cómo son vistas estas poblaciones étnicas desde actores externos (tanto legales como ilegales).

Para la interpretación de este índice, de acuerdo al instructivo de ICOE, las organizaciones étnicas se clasifican según sus capacidades en los siguientes rangos:

0 al 25% Bajo y 26% al 45% Medio-Bajo

46% al 60% Medio

61% al 71% Medio Alto

72% al 100% Alto

En el departamento de Guainía, se realizaron los ICOEs en el Resguardo Indígena Paujil y en la Comunidad Concordia del Resguardo Atabapo, par aun cumplimiento del 100% de la meta programa para Guainía

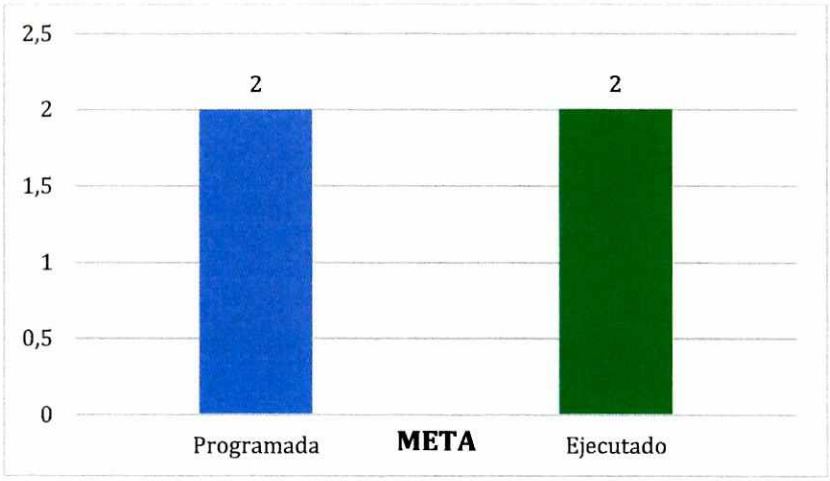


Ilustración 29 ICOEs Municipio Puerto Inírida - Guainía

Se analizaron los dos ICOEs del departamento de Guainía y que hacen parte del departamento de Puerto Inírida. Cabe anotar que el programa IRACA en el resguardo Atabapo, sólo hace presencia en la comunidad de Concordia, la cual es nueva y cuyos integrantes son desplazados de otras zonas.

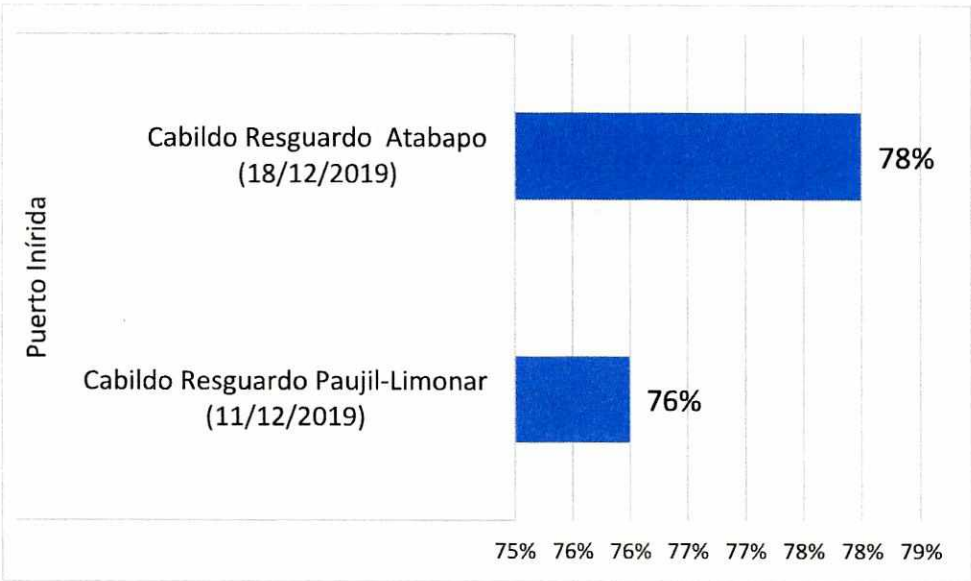


Ilustración 30 Gráfico 28 Resultado ICOE Puerto Inírida - Guainía

En la Ilustración 32 se observa que, tanto el cabildo del resguardo Paujil como el de Atabapo obtuvieron ICOEs de rango alto. En el caso de Paujil, la organización étnica mostró su mayor fortaleza en el subíndice de condiciones y atributos (100%), mientras que sus más fuertes debilidades las obtuvo en el subíndice de percepción (53%) y en el de complejidades del contexto (51%).

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

En el departamento de Cauca se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en los municipios de Guapi y Timbiquí.

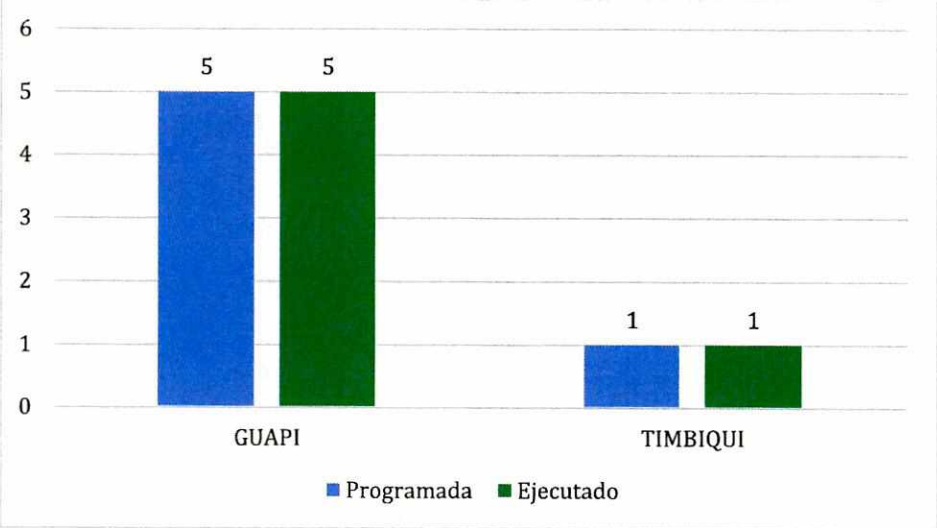


Ilustración 31 ICOEs – Cauca

En la ilustración 33, se muestran los resultados totales obtenidos del ICOE, en cada uno de los consejos comunitarios del departamento de Cauca.

Según la ilustración, las juntas directivas de los consejos comunitarios de Alto Guapi (66%), Río Guajuí (69%) y Renacer Negro (71%) tienen su ICOE general en un rango medio-alto. De Alto Guapi, su subíndice de condiciones y atributos es el que obtuvo el puntaje más bajo (61%) lo que indica que hay que fortalecer el desarrollo comunitario y medios de vida y la identidad y cohesión comunitarias. El subíndice de percepción tanto de Río Guajuí como el de Renacer Negro fue el que obtuvo el menor puntaje (67% y 59% respectivamente), en el primero se requiere reforzar la estructura de la organización socio-política y la gobernabilidad interna, mientras que en el segundo se precisa mejorar un poco el desarrollo comunitario y medios de vida, la gobernabilidad interna y la estructura de la organización socio-política.

Las juntas directivas de los Consejos Comunitarios de Río Napi (80%), de Río San Francisco (75%) y de Guapi Abajo (74%) obtuvieron ICOEs que los posicionan en un rango alto (80%, 75% y 74% respectivamente). Todas estas organizaciones étnicas mostraron debilidad en el subíndice de percepción. De Río Napi, en dicho subíndice hay que reforzar un poco el desarrollo comunitario y medios de vida, mientras que en Río San Francisco hay que mejorar la gobernabilidad interna y el desarrollo comunitario y medios de vida y finalmente en Guapi Abajo se hay que reforzar los componentes de gobernabilidad interna y de estructura de la organización sociopolítica.

110

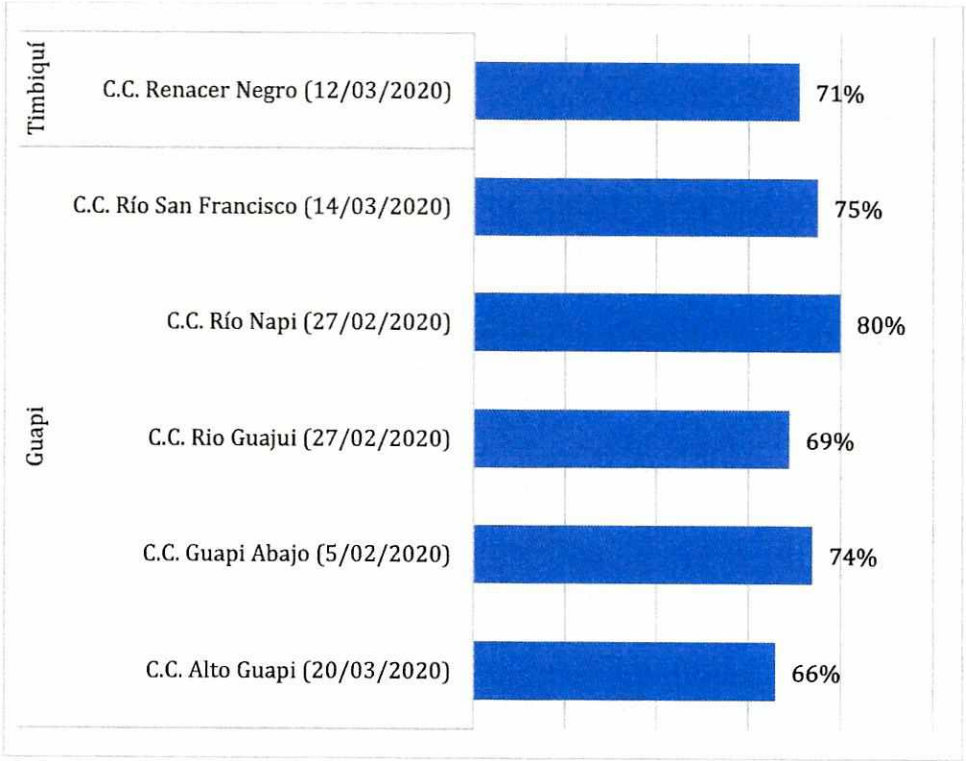


Ilustración 32 Resultados ICOEs - Cauca

En el departamento de Vichada se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo.

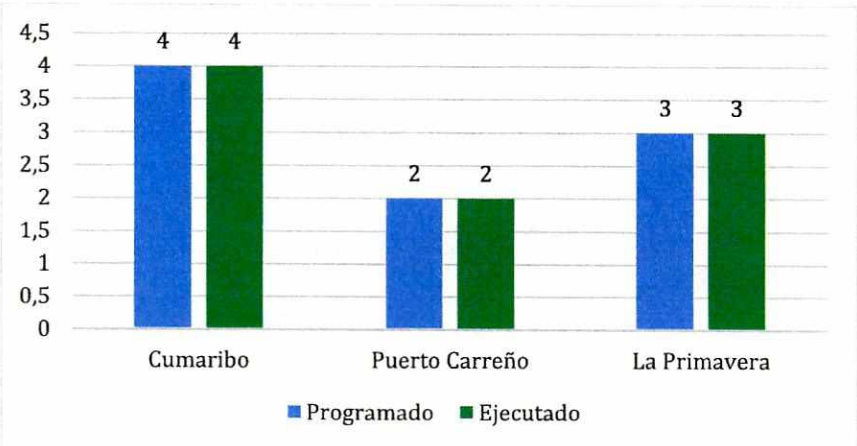


Ilustración 33 ICOEs – Vichada

En la ilustración 35, se muestran los resultados totales obtenidos del ICOE, en cada uno de los resguardos del departamento.

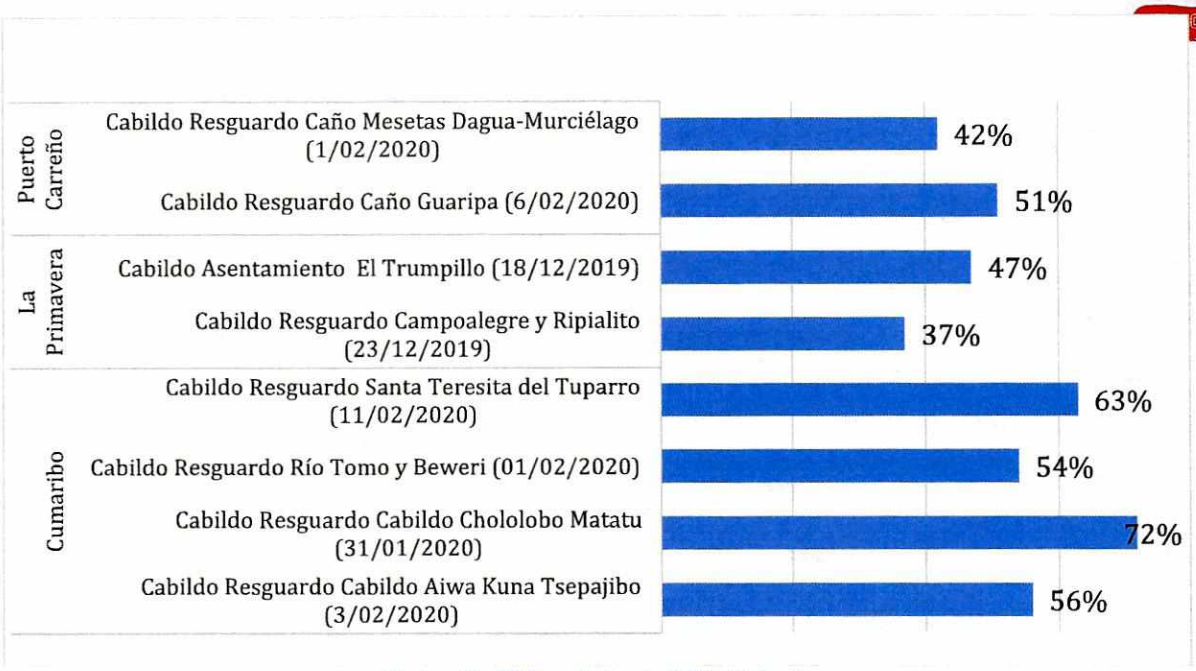


Ilustración 34 Resultados de ICOE - Vichada

Los cabildos cuyas capacidades organizativas obtuvieron un rango medio-bajo fueron los de los resguardos de Campoalegre y Ripialito (37%) y Caño Mesetas Dagua (42%). Parte del peso de este resultado en Campoalegre se debe a los subíndices de condiciones y atributos (23%) y de oportunidades de contexto (40%). En cuanto al primer subíndice, este territorio requiere ser reforzado en la estructura de la organización política, la gobernabilidad interna, la cohesión comunitaria y el desarrollo comunitario y medios de vida. Con respecto al segundo subíndice, la capacidad organizativa del municipio afecta la participación de las autoridades indígenas para posicionar las necesidades que viven en su territorio. Por otro lado, en el territorio de Caño Mesetas, su mayor debilidad se encuentra en el subíndice de condiciones y atributos (35%) ya que no cuentan con varios documentos de la organización o registro de las actividades que llevan a cabo internamente.

Los cabildos de los resguardos Aiwa una Tsepajibo (56%), Caño Guaripa (51%), Río Tomo y Beweri (54%) y el del asentamiento El Trumpillo (47%) obtuvieron una clasificación de rango medio en sus capacidades étnicas. La organización étnica del resguardo Aiwa Kuna presenta debilidades en los subíndices de oportunidades de contexto (44%) y en el de condiciones y atributos (48%). En el primer caso, las autoridades indígenas carecen de impacto para mostrar la visibilidad de sus territorios en entidades territoriales como el municipio o departamento; en el segundo caso, la debilidad se manifiesta en la falta de algunos documentos que le permiten ordenar su territorio (gobernabilidad interna) y en el funcionamiento a media marcha de sus capacidades de cohesión comunitaria y en el desarrollo comunitario y medios de vida.

Los cabildos de Caño Guaripa y Río Tomo tienen en común que el subíndice de oportunidades de contexto es el que tiene los puntajes más bajos (46% y 36%

respectivamente) lo que indica su debilidad para incidir sobre las instituciones públicas y privadas que operan en sus municipios y sobre otro tipo de actores (como por ejemplo los ilegales o los colonos) para posicionarse como autoridades étnicas.

En cuanto al cabildo del asentamiento indígena de El Trumpillo los puntajes del subíndice de condiciones y atributos y el de oportunidades de contexto requieren ser reforzados, principalmente porque este territorio aún no se formaliza para ser como resguardo, lo que le resta capacidad para acceder a algunos beneficios del Estado y así mismo, porque el municipio de La Primavera no ofrece suficientes oportunidades para la participación de las comunidades indígenas.

El cabildo del resguardo de Santa Teresita del Tuparro (63%) se encuentra clasificado como una organización de rango medio-alto. La mayor debilidad organizativa de este cabildo la tiene en el subíndice de oportunidades de contexto (43%), debido a que sus necesidades no se ven reflejadas en los planes de gobierno del municipio o no tienen mucho impacto en las entidades públicas o privadas que se encuentran en la región.

El territorio de Yajota a la fecha no está constituido como resguardo, lo cual tiene incidencia en los resultados que reporta la herramienta ICOE. En términos generales el cabildo se encuentra en un rango medio bajo (42%) y de sus subíndices el de mejor resultado es el de percepción (rango medio-alto), seguido de las oportunidades de contexto (rango medio) y finalmente, el de menor puntaje es el de condiciones y atributos (rango bajo). Éste último subíndice refleja que la organización étnica carece de la documentación que le facilitaría su gestión para administrar el territorio.

En el departamento de Nariño se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en los municipios de Tumaco y El Charco. En los municipios de Ricaurte y Barbacoas por sus condiciones anteriormente expuestas, no se ha realizado esta herramienta con las autoridades.

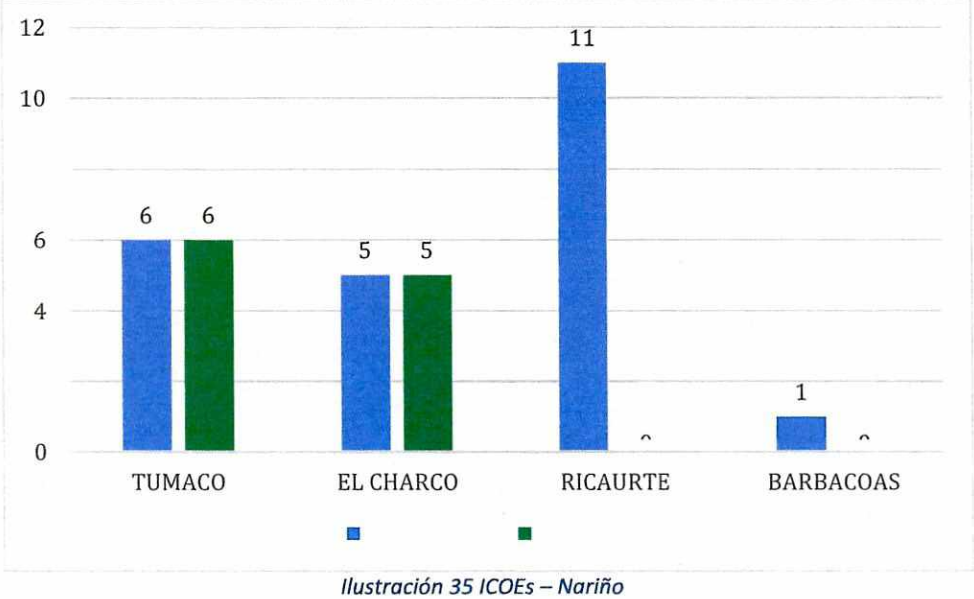


Ilustración 35 ICOEs – Nariño

En la ilustración 37, se presentan los resultados totales obtenidos del ICOE, en cada uno de los territorios colectivos del departamento de Nariño por municipio.



Ilustración 36 Resultados ICOEs - Nariño

De acuerdo con la gráfica anterior, la organización étnica que obtuvo un puntaje medio-bajo en su ICOE es el Cabildo del resguardo Peña Alegría y de los subíndices, el que mayor refuerzo requiere es el de condiciones y atributos (35%) porque las autoridades indígenas no llevan actividades de gestión ante entidades públicas o privadas.

Los porcentajes de ICOE de las juntas directivas de los Consejos Comunitarios Menores de Unión Taijeña (48%), Prominga Tapajeña (47%) y Tribuna del Pueblo (47%) y del cabildo del resguardo El Cedro-La Brava (58%) se posicionaron en un rango medio de capacidades organizativas. En los territorios de Unión Taijeña y Tribuna del Pueblo su principal debilidad la manifestó el subíndice de percepción (46% y 42%), lo que indica que hay que mejorar los mecanismos que permiten la construcción de confianza entre las autoridades étnicas y sus comunidades, mientras que en Prominga Tapajeña los subíndices con los menores puntajes fueron el de condiciones y atributos (43%) y el de oportunidades de contexto (47%). Cabe anotar que los consejos comunitarios menores de El Charco cuyas comunidades atiende IRACA, centralizan sus acciones a través del Consejo Comunitario Pro-defensa del río Tapaje, lo que posiblemente tenga incidencia en cómo las comunidades perciben a sus autoridades étnicas y así mismo, esto puede tener incidencia en los beneficios que reciben directamente del Estado. La principal debilidad del cabildo de El Cedro-La Brava lo presenta el subíndice de percepción (36%), lo que indica que en esta organización hay que reforzar su presencia ante la comunidad, mejorar el modo en que coordina la participación de sus

habitantes y mejorar su capacidad de gestión, así mismo cabe anotar que en este caso el programa IRACA tiene incidencia únicamente sobre una parte del resguardo.

Los consejos comunitarios menor de Socio Tapaje y el de Bajo Mira y Frontera, junto con los cabildos de los resguardos Inda Guacaray y Pulgande-Campoalegre obtuvieron porcentajes que los posicionaron en sus capacidades organizativas étnicas en un rango medio-alto. Las autoridades de Socio Tapaje obtuvieron puntaje bajo en el subíndice de condiciones y atributos (59%), lo que está relacionado con que se trata de una parte de un consejo comunitario mayor, que es el que cuenta con la documentación requerida para funcionar como organización étnica.

Por otro lado, Bajo Mira tuvo el porcentaje más bajo en el subíndice de oportunidades de contexto (60%), un territorio cuyo difícil acceso a sus diferentes comunidades evidencia en parte la ausencia del Estado. El territorio de Inda Guacaray obtuvo los menores puntajes en los subíndices de percepción y en el de condiciones y atributos (juntos del 66%) y en ambos, sus debilidades se manifestaron ligeramente en desarrollo comunitario y medios de vida (formulación y gestión de proyectos) y en la gobernabilidad interna (implementación de planes). Finalmente en el resguardo Pulgande-Campoalegre el puntaje que presenta un ligero porcentaje menor que el de su ICOE general es el subíndice de Condiciones y Atributos (63%), dado que requiere reforzar las actividades que promuevan la cohesión comunitaria en los últimos años y realizar algunas acciones que redunden en el desarrollo comunitario (por ejemplo, en participación en convocatorias que les financien proyectos).

Finalmente, con rangos altos de capacidades organizativas étnicas se encuentran los territorios del Consejo Comunitario El Porvenir y el resguardo de Inda Zabaleta, ambos con un porcentaje del 75%. El Consejo Comunitario Menor de El Porvenir, hace parte de la junta directiva del Consejo Comunitario Pro-defensa del Río Tapaje, cuya mayor debilidad la tiene en el subíndice de oportunidades de contexto (44%), lo que significa que hay que mejorar su impacto sobre los actores externos públicos y privados. En cuanto al cabildo de Inda Zabaleta el subíndice con el más bajo porcentaje fue el de oportunidades de contexto (70%), es decir, aquel que se relaciona con los beneficios que ofrecen las entidades públicas a los territorios étnicos



Ilustración 37 Actividad de ICOE (Consejo Comunitario Bajo Mira y frontera – Tumaco- Departamento de Nariño)

Evidencia que soporta el proceso:

- Acta ICOE
- Listado de Asistencia
- Documento Excel - ICOE
- ICOE remitidos anexos al presente informe para revisión: https://drive.google.com/drive/folders/1c1OgGqI_vhDOsInQvN3B274pXbRj8PnY?usp=sharing
  (Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización)

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO: *Visión de Desarrollo*
INDICADOR: *Territorios colectivos con Visión de Desarrollo*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Registro fotográfico, listados de asistencia y Visión de Desarrollo.*
META PROGRAMADA: *40*
META EJECUTADA: *28 (70%)*
META EN PROCESO: *12 (30 %) Novedades territoriales*

Para el presente periodo de corte, se realizó la Visión en el Resguardo Indígena de Yajota, municipio de la Primavera, alcanzando un 70% de avance. El 30% corresponde a los territorios colectivos donde no se ha realizado esta actividad, en los Resguardos de Ricaurte y Barbacoas. Como el ICOE y la Visión de Desarrollo se realizan en el mismo día, se presenta en la relacionada a continuación, la misma novedad territorial y cumplimiento proyectado para llegar al 100% en este proceso.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO COLECTIVO	NOVEDAD TERRITORIAL	CUMPLIMIENTO PROYECTADO
Nariño	Ricaurte (11 R. I.)	R.I: La Milagrosa, Vegas, Palmar, Edén Cartagena, Alto Cartagena, Telembí, Gualcalá, Ramos Mongón, Pialapí, Magui, Nulpe Medio	El 29 de Febrero los gobernadores aceptaron la reapertura del programa. Se cuenta con personal contratado y con el nuevo anexo técnico oficial se iniciará las actividades respectivas. En territorio se mantiene la comunicación telefónica con las autoridades, enlaces y gestores.	Junio 24-2020
			El 6 de Marzo, el cabildo en pleno aceptó la reapertura	

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

	Barbacoas (1 R.I)	Resguardo Indígena Hojal La Turbia	del programa. Se cuenta con personal contratado y con el nuevo anexo técnico oficial se iniciará las actividades respectivas. En territorio se mantiene la comunicación telefónica con las autoridades, enlaces y gestores.	Junio 26-2020

Tabla 5 Territorios Colectivos pendientes por Visión de Desarrollo

En la siguiente tabla, se observan los territorios colectivos donde se realizó la visión de desarrollo.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO	FECHA VISION DE DESARROLLO
GUAINIA	PUERTO INIRIDA	Resguardo Indígena Atabapo	18-12-2019
		Resguardo Indígena Paujil	19-12-2019
NARIÑO	EL CHARCO	Consejo Comunitario Unión Taijeña	27-01-2020
		Consejo Comunitario Prominga Tapajeña	27-01-2020
		Consejo Comunitario Tribuna del Pueblo	29-01-2020
		Consejo Comunitario Socio Tapaje	29-01-2020
		Consejo Comunitario Porvenir	17-03-2020
	SAN ANDRES DE TUMACO	Resguardo Indígena Inda – Guacaray	17-03-2020
		Resguardo Indígena Inda – Zabaleta	14-03-2020

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

		Resguardo Indígena Peña Alegría	17-03-2020
		Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera	05-03-2020
		Resguardo Indígena La Brava	05-03-2020
		Resguardo Indígena Pulgande Campoalegre	17-03-2020
CAUCA	GUAPI	Consejo Comunitario Guapi abajo	05-02.2020
		Consejo Comunitario Alto Guapi	20-03-2020
		Consejo Comunitario Rio San Francisco	15-03-2020
		Consejo Comunitario Rio Guajui	22-02-2020
		Consejo Comunitario Rio Napi	28-02-2020
	TIMBIQUI	Consejo Comunitario Renacer Negro	16-03-2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	Resguardo Indígena Caño Guaripa – murciélago	06-02-2020
		Resguardo Indígena Caño Mesetas – Dagua	02-02-2020
	LA PRIMAVERA	Resguardo Indígena Campoalegre y Ripialito	08-02-2020
		Resguardo Indígena El Trumpillo	20-02-2020
	CUMARIBO	Resguardo Indígena Aiwa Kuna	19- 05- 2020
		Resguardo Indígena Chololobo Matatu	03-02-2020
		Resguardo Indígena Río Tomo Beweri	30-01-2020
		Resguardo Indígena Santa Teresita del Tuparro	20-02-2020

Tabla 6 Visión de desarrollo realizados en los 4 Departamentos

Del departamento de Guainía los datos de Visión de Desarrollo son del 100% de los territorios, que son los provenientes de los resguardos de Atabapo (comunidad Concordia) y de Paujil (comunidades de Cucurital, Platanillal y Cimarrón).

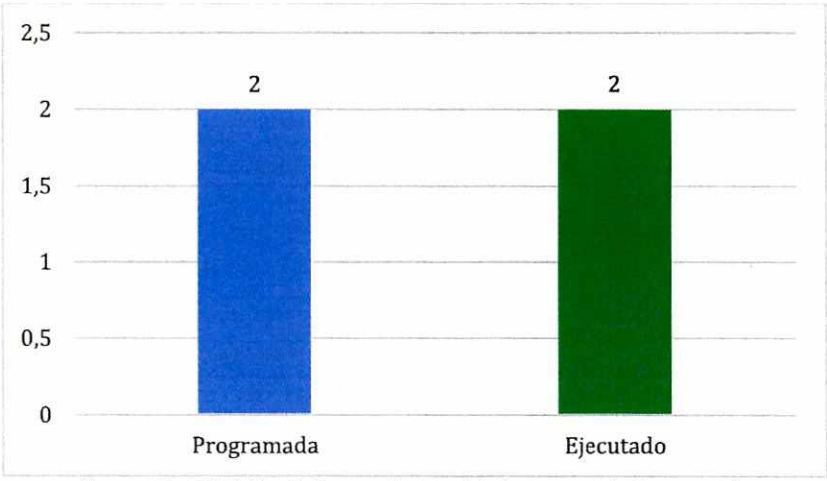


Ilustración 38 Visión de Desarrollo Municipio Puerto Inírida - Guainía

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes plasmados por las comunidades en cada una de las visiones proyectadas a 2025

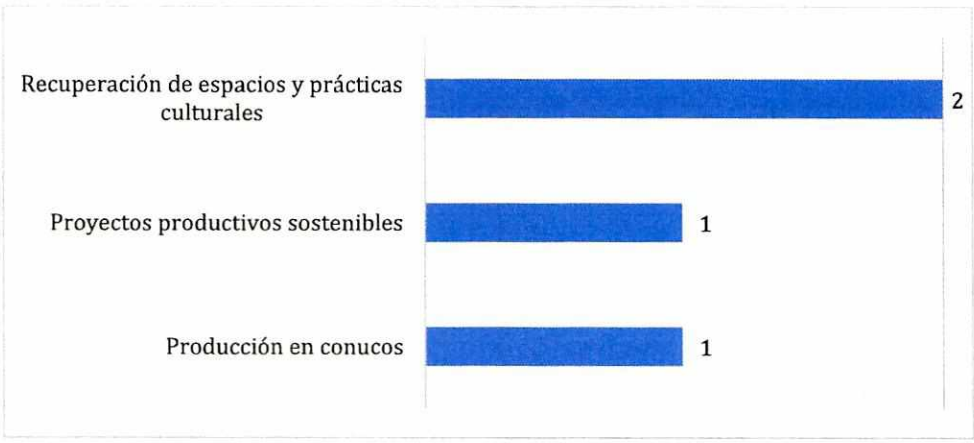


Ilustración 39 Resultados Visión de Desarrollo - Guainía

Según la ilustración anterior, los intereses futuros de estas comunidades quieren centrar sus acciones en: la producción de conucos o huertas indígenas (resguardo Atabapo), las cuales hacen parte la seguridad alimentaria; la generación de proyectos productivos sostenibles (resguardo Paujil) y la recuperación de espacios y prácticas culturales (ambos resguardos), dado que en esta región hay una gran preocupación por la paulatina pérdida de lenguas nativas (como son el cubeo, puinave, curripaco, entre otras) y de costumbres.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

En el departamento de Cauca, se llegó al 100% de la meta programada de Visión de Desarrollo en los municipios de Guapi y Timbiquí. Ver ilustración 42

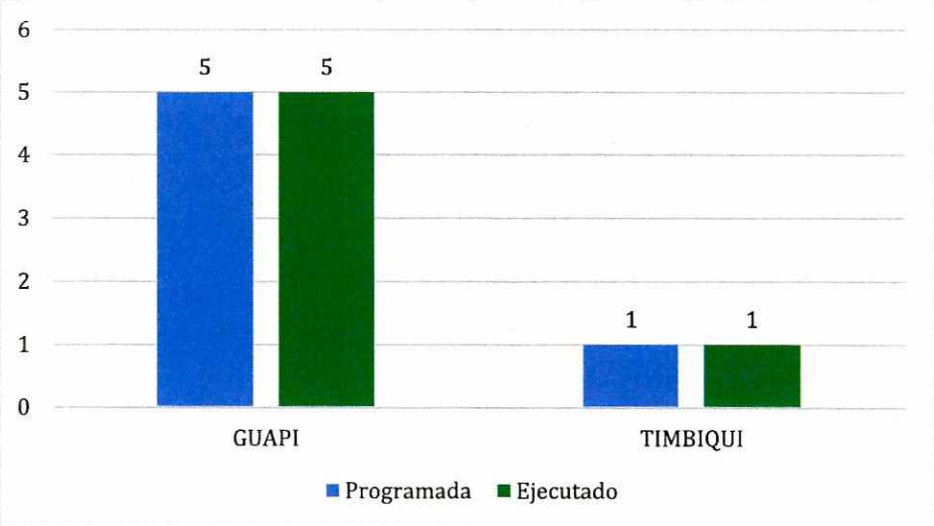


Ilustración 40 Visiones de Desarrollo – Cauca

En la ilustración 43, se presentan los aspectos más relevantes que los consejos comunitarios plasmaron en su visión de desarrollo a 2025.

Se evidencia que los temas de salud, educación y proyectos productivos se reportaron en los Consejos Comunitarios de Guapi Abajo, Alto Guapi, Río San Francisco y Renacer Negro

La cultura y la recreación, el fortalecimiento de la organización étnica y la paz se mencionaron en 2 territorios, siempre presente entre ellos Alto Guapi. En el primer tema, además fue reportado Guapi Abajo; en el segundo Río Napi y en el tercero, Río San Francisco.

El mejoramiento de las viviendas y el acceso a servicios públicos (energía), sólo fue reportado en el Consejo Comunitario del Río San Francisco y Renacer negro, así mismo el tratamiento de aguas residuales.

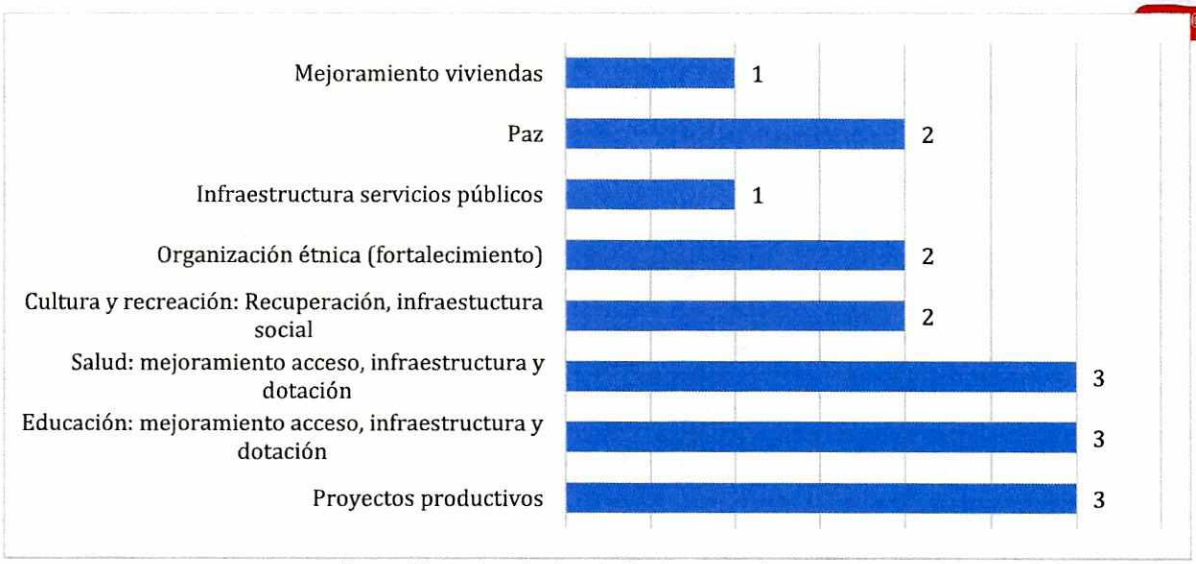


Ilustración 41 Resultados Visión de Desarrollo - Cauca

En el Consejo Comunitario Renacer Negro proyectan una educación técnica dentro del territorio, una infraestructura para la transformación de productos agropecuarios y empresas con capacidad de empleo y de producción de bienes y servicios.

En el departamento de Vichada se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en los municipios de Puerto Carreño. Ver ilustración 44.

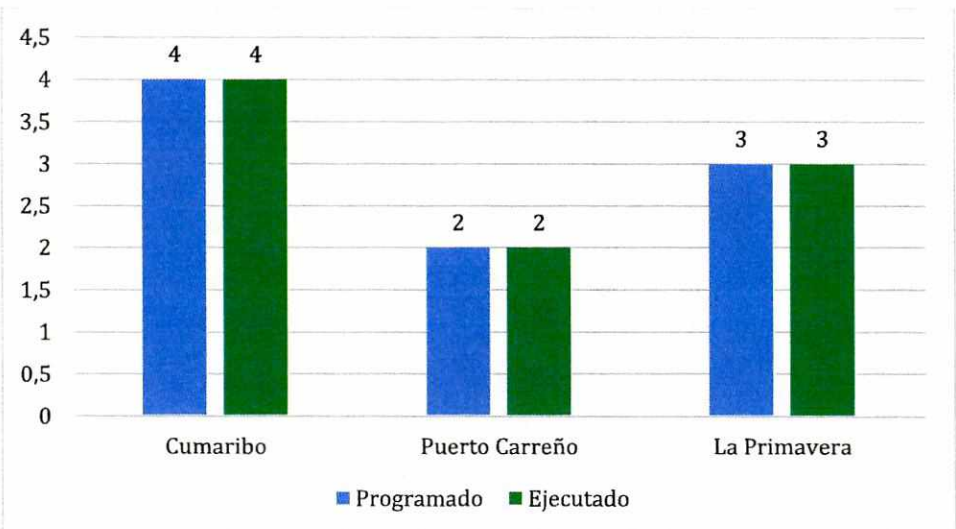


Ilustración 42 Visión de Desarrollo – Vichada

En la siguiente gráfica se presentan los aspectos más relevantes de las visiones de desarrollo de los 8 resguardos indígenas, las cuales fueron proyectadas entre 2024 y 2028.

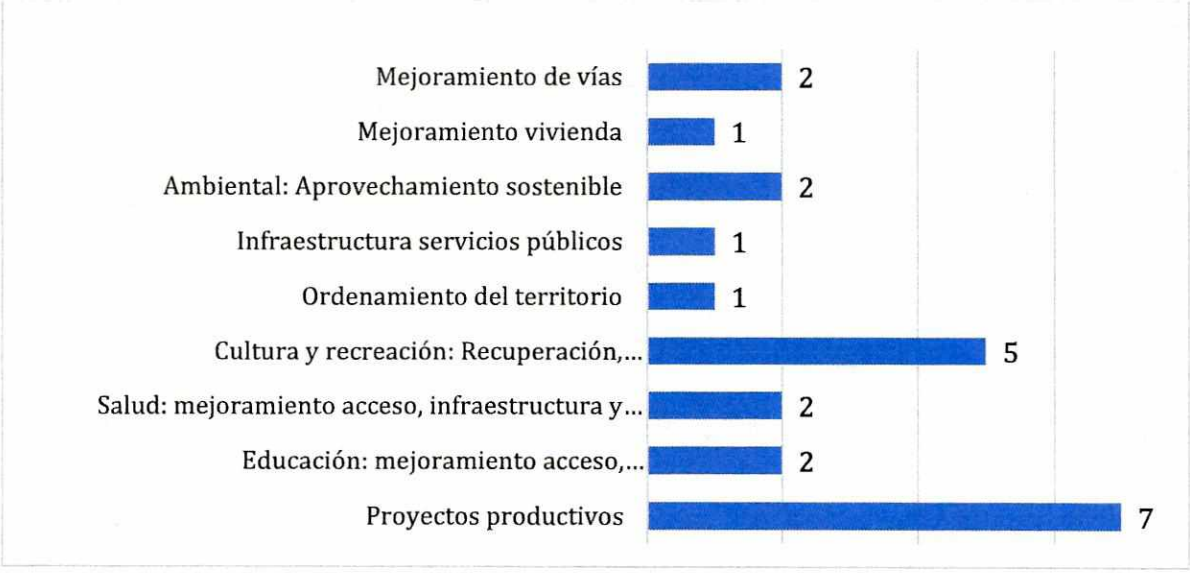


Ilustración 43 Resultados Visión de Desarrollo - Vichada

Los proyectos productivos fueron mencionados en todos los territorios de este departamento, excepto en el asentamiento indígena de El Trumpillo, el cual queda ubicado prácticamente en la cabecera municipal de La Primavera. La producción y comercialización de productos específicos dentro de la visión de desarrollo se detallaron en los resguardos de Campoalegre y Ripialito (producción de yuca, cacao, caña y ganadería), Chololobo Matatu (ají) y Santa Teresita del Tuparro (yuca amarga). Cabe mencionar que en los resguardos de Cumaribo (excepto en Aiwa Kuna Tsepajibo), se resalta la importancia de que sus territorios al llegar al año proyectado cuenten con asociaciones productivas fortalecidas.

El segundo tema más común es el relacionado con la cultura y recreación, el cual se presentó en 5 territorios, todos ellos pertenecientes a la etnia sikuani (asentamiento El Trumpillo y los resguardos de Caño Mesetas Dagua, Chololobo Matatu, Río Tomo Beweri y Santa Teresita del Tuparro), porque hace referencia a espacios de interacción social (incluyendo infraestructura) y de encuentro colectivo. Dentro de los temas culturales se encuentra el trabajo en unuma, que es una forma de trabajo colectivo que destaca la reciprocidad y el ofrecimiento de comida y bebida a quienes participan en esta actividad. Así mismo, se busca el fortalecimiento de la cultura, atendiendo a la ley de origen sikuani.

Los temas de salud y educación fueron un tema de interés para los resguardos de Caño Mesetas y Aiwa Kuna Tsepajibo. En ellos se incluye la cobertura, dotación e incluso el mejoramiento o adquisición de un lugar dentro de sus territorios donde se puedan atender las enfermedades.

El tema ambiental fue resaltado en los resguardos de Chololobo Matatu y de Río Tomo Beweri, indicando que el respeto a "la madre tierra" y vivir en "paz y armonía" con la naturaleza son fundamentales para la reproducción cultural sikuani.

El mejoramiento de vías fue reportado en los resguardos de Campoalegre y Ripialito y de Aiwa Kuna Tsepajibo. Cabe anotar que la mayoría de los territorios indígenas de Vichada carecen de vías de acceso o las que tienen se encuentran en mal estado.

El mejoramiento de vivienda e infraestructura agua se mencionó sólo en el resguardo de Campoalegre y Ripialito, y el tema de fortalecimiento de la organización étnica (resguardo organizado a nivel regional) sólo se nombró en el resguardo de Caño Guaripa.

En el departamento de Nariño se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en los municipios de Tumaco y El Charco. No se ha realizado la Visión de desarrollo en los municipios de Ricaurte y Barbacoas por sus condiciones anteriormente expuestas. Ver ilustración 46.

Las visiones de desarrollo de estos territorios se proyectaron entre el 2023 y 2030. A continuación, la ilustración 47 se muestra la clasificación de temas y el número de territorios que lo reportaron.

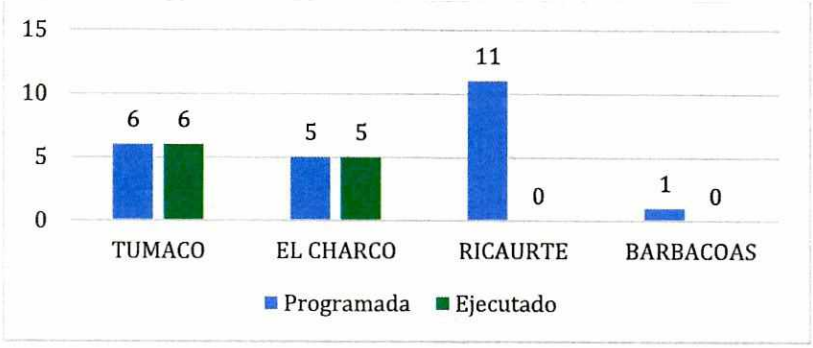


Ilustración 44 Visión de Desarrollo – Nariño

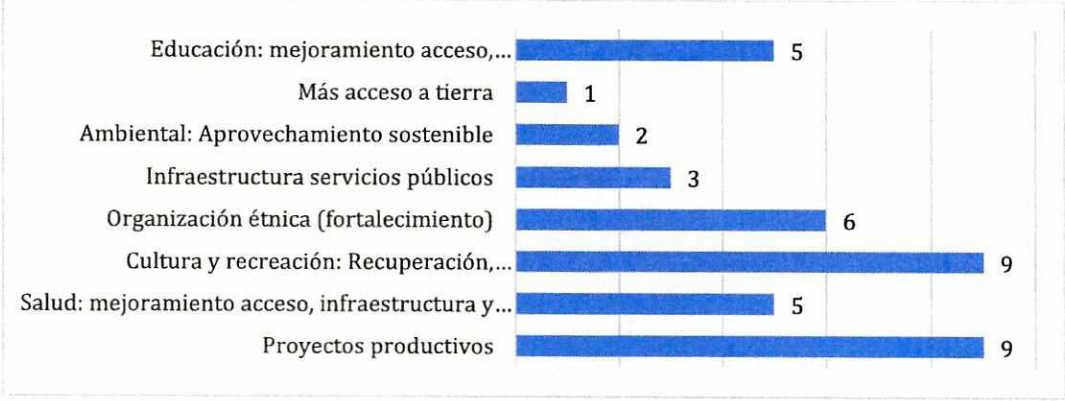


Ilustración 45 Resultados Visión de Desarrollo – Nariño

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Los temas más recurrentes fueron los de proyectos productivos (9) y lo relacionado con cultura y recreación (9). El primer tema fue mencionado en los consejos comunitarios menores del municipio de El Charco (excepto en el territorio de Prominga Tapajeña), el Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera y en los resguardos de El Cedro-La Brava, Peña Alegría y Pulgande Campoalegre. Del consejo comunitario menor de Unión Taijeña, el tema productivo especifica productos como el plátano, la yuca y la papa china; se incluyeron los centros de acopio en los territorios de Socio Tapaje, Bajo Mira y Frontera y Unión Taijeña; y se mencionó únicamente en el fortalecimiento de la asociatividad en el resguardo Pulgande Campoalegre y en Socio Tapaje.

En cuanto al tema cultural, éste se enfocó en el rescate de tradiciones y saberes ancestrales y fue reportado en los consejos comunitarios de Unión Taijeña, Prominga Tapajeña, Socio Tapaje y Bajo Mira y Frontera y en los resguardos de El Cedro-La Brava, Inda Guacaray e Inda Zabaleta, cabe mencionar que sólo Pulgande Campoalegre y Peña Alegría incluyeron el tema de una infraestructura para la recreación. Adicionalmente se proyectó que en el rescate cultural se incluya infraestructura social como casas de cultura en los territorios de Unión Taijeña, Prominga Tapajeña y Socio Tapaje.

El fortalecimiento de las organizaciones étnicas se describió en los territorios de Unión Taijeña, Tribuna del Pueblo, Prominga Tapajeña, Bajo Mira y Frontera, Inda Guacaray e Inda Sabaleta.

Los temas educación y salud se mencionaron en estos 5 territorios: Consejos Comunitarios de Tribuna del Pueblo, Prominga Tapajeña y Socio Tapaje (éste último especificó un Centro de Desarrollo Infantil - CDI) y los resguardos de Peña Alegría y Pulgande.

Las visiones de desarrollo que incluyeron los servicios públicos se reportaron en los territorios de El Charco de Tribuna del Pueblo, Prominga Tapajeña y Socio Tapaje. Los servicios reportados fueron agua, energía, alcantarillado y comunicaciones.



Ilustración 46 Desarrollo de la Actividad de Visión de Desarrollo (Consejo Comunitario Renacer Negro – Timbiquí-Departamento del Cauca)

El manejo sostenible de los recursos naturales se mencionó en Socio Tapaje e Inda Sabaleta. Finalmente, el acceso a la tierra se reportó únicamente en el resguardo Peña Alegría el cual carece de espacio para cultivar.

Evidencia que soporta el proceso:

- Acta de Reunión
- Listado de Asistencia
- Cartografía Social a futuro
- Visión de Desarrollo
- Evidencias de visión de Desarrollo anexas al presente informe: https://drive.google.com/drive/folders/1u7_qhcW1j_tCiorkgB2H6J49ixV8Cd33?usp=sharing (Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización)

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO: *Diagnóstico Comunitario*
INDICADOR: *Territorios colectivos participantes en el proceso de Diagnóstico Comunitario, el cual debe incluir los hogares vinculados al programa.*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Informe de diagnóstico comunitario, listados de asistencia y registro fotográfico.*
META PROGRAMADA: *40*
META EJECUTADA: *28 (70%)*
META EN PROCESO: *12 (30%) Novedades Territoriales*

Para el presente periodo de corte se construyeron, revisaron y analizaron 7 nuevos Diagnósticos Comunitarios, de los Municipios de Tumaco, el Charco y La Primavera, alcanzando un total de 28 Diagnósticos hasta el momento, que corresponden al 70% de la meta programada.

El 30% corresponde a los diagnósticos no realizados en los 11 Resguardos del municipio de Ricaurte y al Resguardo Hojal la Turbia del municipio de Barbacoas.

En el municipio de Ricaurte y Barbacoas, no se ha llegado a la etapa de Diagnóstico y Formulación, debido a que en sus resguardos se está en la etapa de Vinculación y Caracterización de hogares. Se proyecta que para Junio 30, se obtenga el 100% de la meta cumplida en estos municipios.

De acuerdo con los diagnósticos realizados hasta fecha, se observa que en el departamento de Guainía se cumplió con el 100% de la meta programada. Ver ilustración 49.

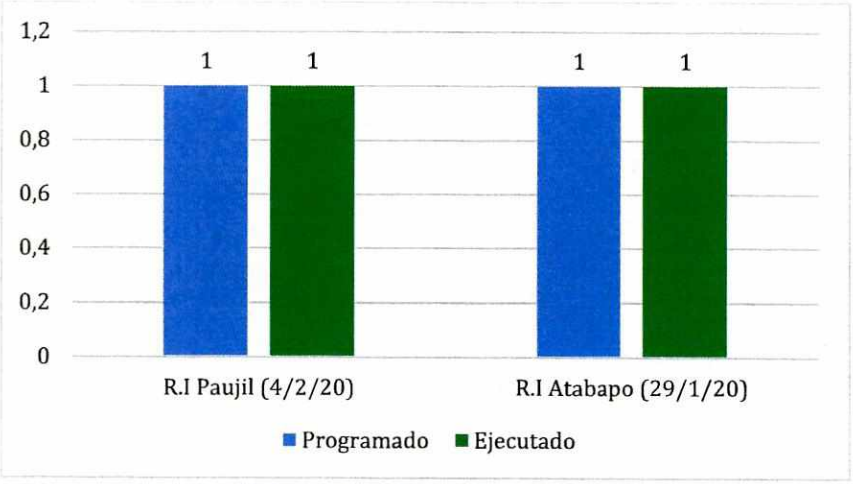


Ilustración 47 Diagnósticos Comunitarios realizados – Guainía

Como resultados del Diagnóstico comunitario se pudo evidenciar que los hogares identificaron las siguientes debilidades en sus territorios: suelos con baja fertilidad, falta de acompañamiento técnico, disminución de recursos naturales y afectaciones por el cambio climático, falta de herramientas e insumos para cultivo, falta de herramientas para pesca artesanal, pérdida de las artes en la pesca artesanal, pérdida de semillas nativas: Yuca brava, piña, ají, tupiro (lulo silvestre), especialmente en la comunidad de Concordia, Yuca brava, yuca dulce, plátano, ají, maíz, mapuey, ñame en el resguardo Paujil.

En el aspecto social se logró identificar: afectación al sentido de pertenencia y afectación cultural, dificultad para gestionar proyectos, débil articulación interinstitucional y de redes de apoyo, vías en mal estado, falta de acceso a agua potable, existen fallas en la aplicabilidad del reglamento interno, incremento del consumo de sustancias psicoactivas entre la población joven, conexiones sanitarias irregulares que llegan a las fuentes de agua que se utilizan en el territorio y disposición final de residuos sólidos a campo abierto.

A continuación, se describen las acciones más relevantes que las comunidades desean trabajar en cada uno de los componentes: Seguridad alimentaria, proyectos productivos y fortalecimiento social y comunitario para el departamento de Guainía.

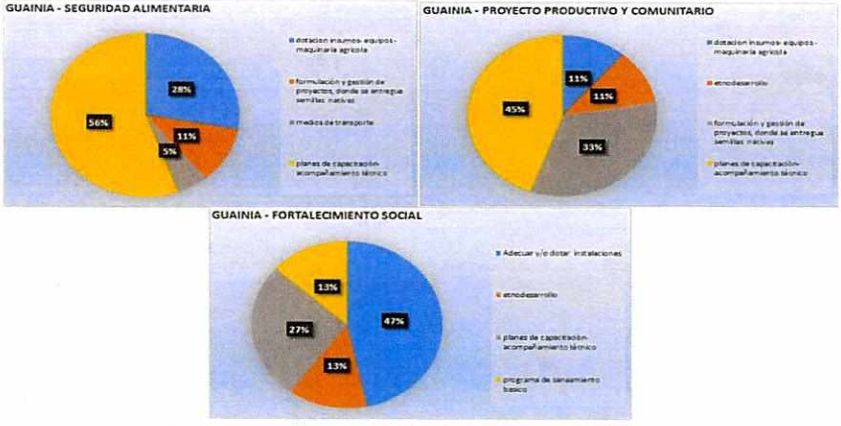


Ilustración 48 Acciones necesarias por componente – Guainía

En el componente Seguridad Alimentaria se logró evidenciar que la mayor necesidad se presenta en la implementación y desarrollo de planes de capacitación y acompañamiento técnico en temas como pesca, cultivos ancestrales, agropecuario, recursos naturales, seguido de la dotación de insumos y herramienta y maquinaria agrícola.

Para el componente de proyectos productivos, se evidencia que la mayor necesidad está representada en el desarrollo de Planes de capacitación y acompañamiento técnico en proyectos como "Modistería, corte y confección, elaboración de productos orgánicos, temas de liderazgo y estrategias de educación e información, seguido por temas de formulación y gestión de proyectos, y de la implementación de prácticas y alternativas de propagación de especies nativas vegetales de pancoger en los espacios tradicionales o conucos, acompañado de planes de prevención y mitigación a los efectos del cambio climático.

En fortalecimiento social y comunitario se pudo evidenciar que la mayor necesidad presentada en esta comunidad, tiene que ver con la adecuación, dotación y mejoramiento de instalaciones, con un 47%, específicamente para el espacio cultural (maloka), espacio para la venta y exhibición y comercialización de artesanías, y la adecuación de pozos acuíferos.

En el departamento de Cauca se realizó el diagnóstico en (1) un consejo comunitario, el de Alto Guapi del municipio de Guapi, alcanzando el 100% de la meta en Cauca.

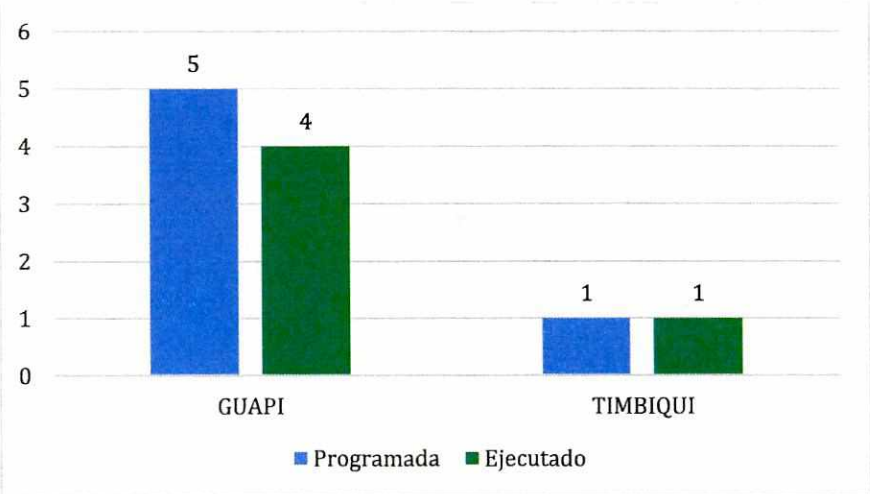


Ilustración 49 Diagnósticos Comunitarios Realizados – Cauca

En la ilustración 52, se presentan cada uno de los territorios por municipio en donde se realizó el diagnóstico comunitario con su respectiva fecha.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO	FECHA
CAUCA	GUAPI	ConsejoComunitario Guapi Abajo	27/02/2020
		Consejo Comunitario Rio San Francisco	14/03/20
		Consejo Comunitario Rio Guajuí	03/03/2020
		Consejo Comunitario Rio Napi	21/03/2020
	TIMBIQUI	Consejo Comunitario Alto Guapi	20/03/2020

Ilustración 50 Diagnósticos comunitarios por territorio colectivo – Cauca

En este periodo de corte se encontró en El Consejo Comunitario de Alto Guapi, que está constituido por 10 comunidades ubicadas en la parte alta y media de la cuenca del rio Guapi, dentro de él, se encuentran asentadas 1.171 familias de las cuales 564 de ellas están dentro del territorio y 607 se encuentran fuera del mismo anotando que la mayoría fueron desplazadas víctimas del conflicto armado. El consejo comunitario cuenta con una gran biodiversidad y riqueza natural, especialmente a nivel hídrico por sus ríos y bastas quebradas, donde en sus riveras desarrollan actividades agrícolas que están enmarcadas en los productos de pan coger; La única vía de acceso es a nivel fluvial, por lo tanto, la única forma de transporte está limitada a la utilización de embarcaciones como son el potrillo, la canoa con motor fuera de borda y en general se hace de manera personal, lo cual genera un alto costo del mismo ya que las comunidades no cuentan con líneas de transporte comercial.

Siguiendo este proceso, la comunidad decidió inclinarse en las líneas de proyecto, de la siguiente manera: En el proyecto de seguridad alimentaria ven la necesidad de fortalecer el sector agrícola con dotación en herramientas e insumos que les permita elaborar un banco de semillas con materia prima nativa; a nivel del del proyecto productivo comunitario dirigieron sus necesidades en adquirir herramientas, equipos y materiales que ayuden a realizar de una mejor manera, las actividades de siembra, cosecha, conservación y transformación de los productos generados por la comunidad; a nivel del componente social, requieren mejorar las instalaciones escolares, medicas e infraestructura de abastecimiento de agua potable.

En la ilustración 53, se describen las acciones más relevantes que las comunidades de los 6 Consejos Comunitarios desean trabajar en cada uno de los componentes: Seguridad alimentaria, proyectos productivos y fortalecimiento social y comunitario para el departamento de Cauca.

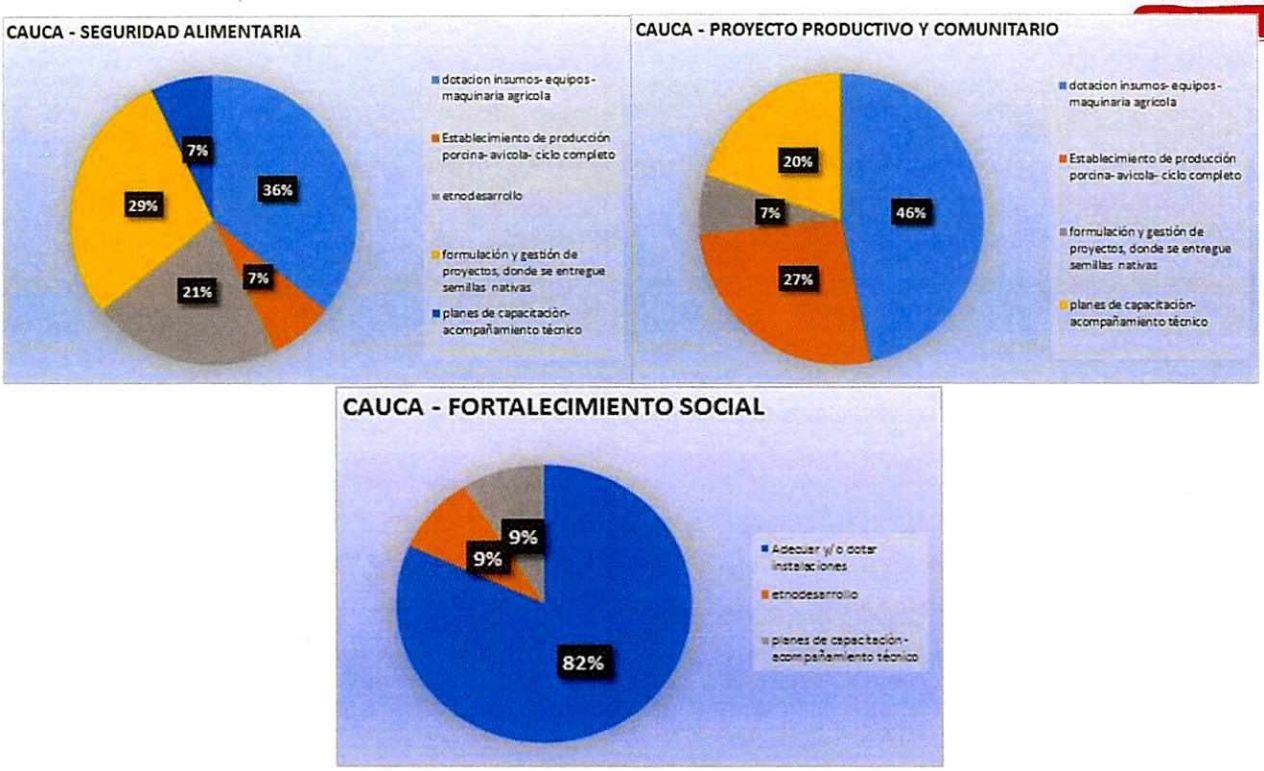


Ilustración 51 Acciones necesarias por componente - Cauca

El componente de seguridad alimentaria en general es débil por la falta de recursos, se evidencia desnutrición infantil, falta de asistencia técnica, falta de financiamiento para iniciativas productivas, puestos de salud abandonados y sin recursos económicos, se carece de instituciones educativas especializadas que le aporten a las necesidades de los territorios, presencia de grupos armados al margen de la ley, que trae como consecuencia el desplazamiento forzado, presencia de cultivos ilícitas, minería ilegal, entre otros. Los territorios carecen de energía continua y acceso a agua potable. Además, manifiestan una pérdida parcial de las prácticas y saberes ancestrales. La mayor necesitad se presenta en temas de Formulación y gestión de proyectos con un 36% seguido de dotación insumos, equipos y maquinaria agrícola.

En el componente productivo se evidencia que la mayor necesidad presentada en el este componente consiste en Dotar insumos de equipos y maquinaria agrícola 46% seguido de planes de planes de capacitación y acompañamiento técnicos hasta el final del proyecto Social" están destinadas a realizar acciones de consistentes en adecuar y/o dotar instalaciones, (escuelas, centros de salud, canchas deportivas, casas comunitarias, malocas), mientras que el 9% están dedicadas a realizar planes de capacitación y acompañamiento técnico, y solo el 9% fue destinado a realizar actividades destinadas al Etnodesarrollo, entiéndase como la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, utilizando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica, y los recursos reales y potenciales de su cultura.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Además, se encontró que las principales acciones que presentó el Concejo Comunitario Renacer negro, en cuanto al componente "Fortalecimiento social" tienen que ver con la adecuación y/o dotación de instalaciones tales como la casa comunitaria y el restaurante escolar. Con relación al Componente Productivo y Seguridad alimentaria, los mayores porcentajes de acciones están encaminados al establecimiento de una granja ecológica fundamentando la integración de las familias con la rotación de semillas y recuperación de prácticas ancestrales, y la adquisición de maquinaria, equipos e insumos para la transformación de materia prima del territorio, como suplemento alimenticio en las explotaciones animales.

En el departamento de Vichada, se cumplió con el 100% de la meta programada en los municipios de Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño.

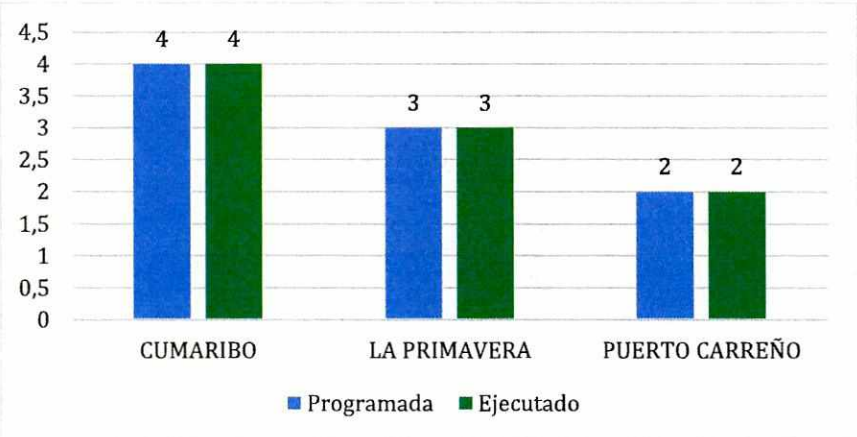


Ilustración 52 Diagnósticos Comunitarios - Vichada

La comunidad de los Yajotja Waüpijiwi, tal vez por las circunstancias de desplazamiento forzado que han vivido, se caracterizan por ser muy apacibles y atentos; se encuentran asentadas en este lugar alrededor de 60 personas pertenecientes a algo más de 16 familias, esta comunidad es considerada seminómada y única en su tipo, cultura y dialecto. El principal problema que se identifica, es una especie de desarraigo al territorio, les ha sido muy difícil adoptar como propio el lugar donde habitan, sumado a esto, tienen la dificultad de estar sitiados en un espacio con muy poca extensión territorial, que no les permite desarrollar sus prácticas agrícolas y pecuarias; En la zona no hay mayor área de importancia ambiental como nacederos de agua o relictos boscosos, simplemente es un centro de sabana con pastura natural la mayoría. Esta comunidad trata de compensar la ausencia de recursos naturales en el territorio a través de trabajo en fincas aledañas en donde ganan a través de los jornales recursos para comprar elementos básicos como el jabón, azúcar, sal, entre otros.

Lo anteriormente descrito y sumado a otras necesidades hacen que esta comunidad se incline a nivel del proyecto de seguridad alimentaria en Implementar una parcela con varias especies agrícolas para proveer diversidad en la dieta alimentaria; en cuanto a el proyecto productivo comunitario requieren implementar infraestructura desmontable y funcional para empezar a producir bienes de calidad y establecer alianzas comerciales; para el proyecto social y

130

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

comunitario ven la necesidad de dotar a la comunidad con medios de transporte como las bicicletas equipadas con parrillas para transportar incluso leña y materias primas.

En la tabla 8, se muestra los territorios colectivos de cada uno de los municipios, que ya cuentan con informe de diagnóstico.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO	FECHA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	Resguardo Indígena Caño Guaripa – murciélago	02/02/2020
		Resguardo Indígena Caño Mesetas – Dagua	06/02/2020
	LA PRIMAVERA	Resguardo Indígena Campoalegre y Ripialito	08/02/2020
		Resguardo Indígena El Trompillo	20/02/2020
		Resguardo Indígena Yajota	20/05/2020
	CUMARIBO	Resguardo Indígena Aiwa Kuna	04/02/2020
		Resguardo Cholobolo Matatu	30/01/2020
		Resguardo Río Tomo y Beweri	02/02/2020
		Resguardo Santa Teresita del Tuparro	20/02/2020

Tabla 7 Diagnósticos Comunitarios por Territorio Colectivo – Vichada

De acuerdo con los resultados encontrados en esta etapa para el departamento de Vichada, se puede concluir que la gran mayoría de los resguardos indígenas están legalmente constituidos, a excepción del **Resguardo El Trompillo**, quien figura ante las entidades públicas como asentamiento indígena, es decir, el territorio no está constituido legalmente como resguardo indígena, por tanto, son excluidos de los beneficios que el estado brinda a este sector.

Por otra parte, se puede evidenciar que comparten amenazas muy similares, en cuanto a catástrofes naturales, marcados inconvenientes en épocas de verano e invierno, contaminación y perdida de recursos ambientales, especialmente deterioro de fuentes hídricas necesarias para el consumo humano y desarrollo de actividades agropecuarias, presencia activa de grupos al margen de la ley, problemática que genera desplazamientos a zonas urbanas y desarrollo de cultivos ilícitos que reemplazan las prácticas agrícolas

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

tradicionales. Los integrantes de algunos de los resguardos lamentablemente no tienen el ánimo del trabajo grupal, se ven afectados con la falta de un buen servicio médico y una mala oferta educativa, se evidencia marcadamente el mal manejo que les dan a los desechos o residuos generales, procediendo a la contaminación del agua y la tierra, generando así ambientes idóneos para el desarrollo de reservorios de vectores portadores de enfermedades. En algunos casos se pudo observar comunidades que tienen conciencia en el manejo de los recursos de flora y fauna, generando mutualismo, aunque en excepciones se ve exceso de tala indiscriminada, caza y pesca sin control, aprovechando insosteniblemente ese ecosistema biodiverso con el que cuentan en su mayoría.

Con el desarrollo de varias herramientas metodológicas utilizadas en esta fase, se pudo verificar el acompañamiento constante de algunas entidades públicas y privadas, con las que se pueden pactar alianzas para el cumplimiento de las metas en este programa, mitigando debilidades muy comunes como falta de asistencia técnica, poca capacitación a nivel social, técnico y ambiental, apoyo con insumos, herramientas y equipos para la transformación de la materia prima y productos generados en las comunidades, buscando darles valor agregado y crear canales de comercialización, fortaleciendo las capacidades sociales y culturales mediante el acompañamiento en capacitaciones y materiales.

A continuación, se describen las acciones más relevantes que las comunidades desean trabajar en cada uno de los componentes.

En el municipio de Puerto Carreño, a nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que la mayor necesidad de los resguardos es el acompañamiento técnico agropecuario para aumentar los indicadores productivos de lo generado en sus territorios; en el componente social se cuenta con una necesidad compartida que es la de energía permanente para su desarrollo colectivo y para tecnificar las producciones, transformado sus productos y generando valor agregado; a nivel de proyecto productivo comunitario se necesita fortalecer la cadena de comercialización, con la adquisición de centros de acopio donde se permita el almacenamiento, transformación y comercialización de los productos generados por la comunidad. Ver ilustración 55.

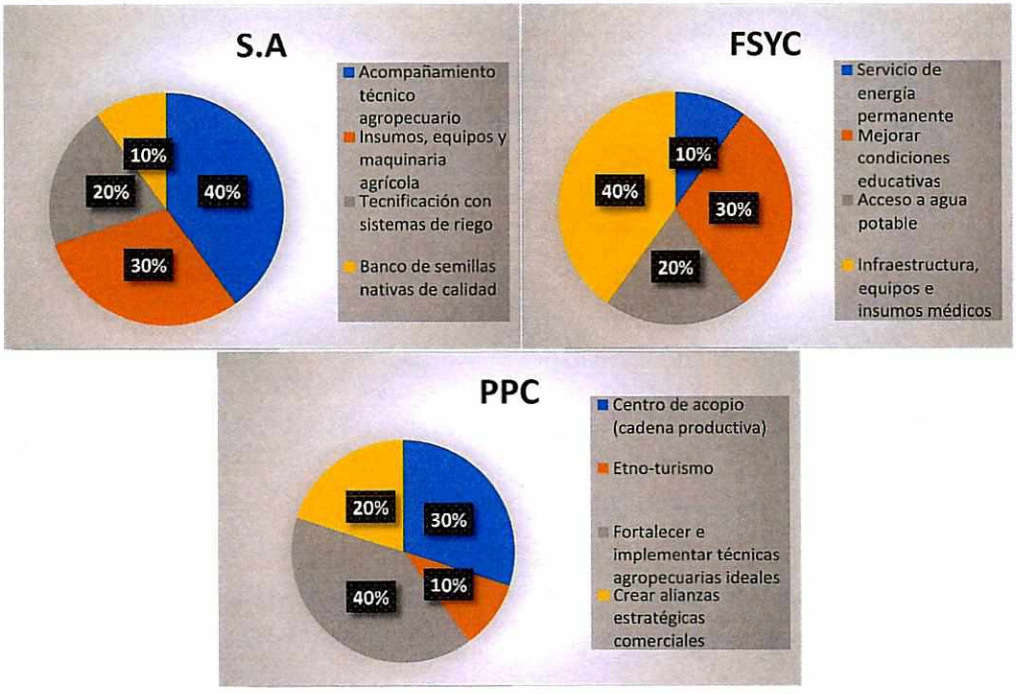


Ilustración 53 Acciones necesarias por componente, Municipio de Puerto Carreño, Vichada

Por otra parte en el municipio La Primavera, a nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que el enfoque de los resguardos es la necesidad de capacitación y acompañamiento técnico agropecuario para aumentar los indicadores productivos de lo que se genera en sus territorios; en el componente social es necesario el fortalecimiento del sistema educativo, con la construcción y reparación de infraestructura escolar, dotación de enseres-puestos sanitarios y la adecuación de espacios ludicopedagógicos que permitan generar armonía en las instituciones educativas; a nivel de proyecto productivo comunitario es necesario el aporte con insumos, materiales, herramientas, equipos e infraestructura que permitan darle un valor agregado a los productos mediante la transformación y conservación de estos.

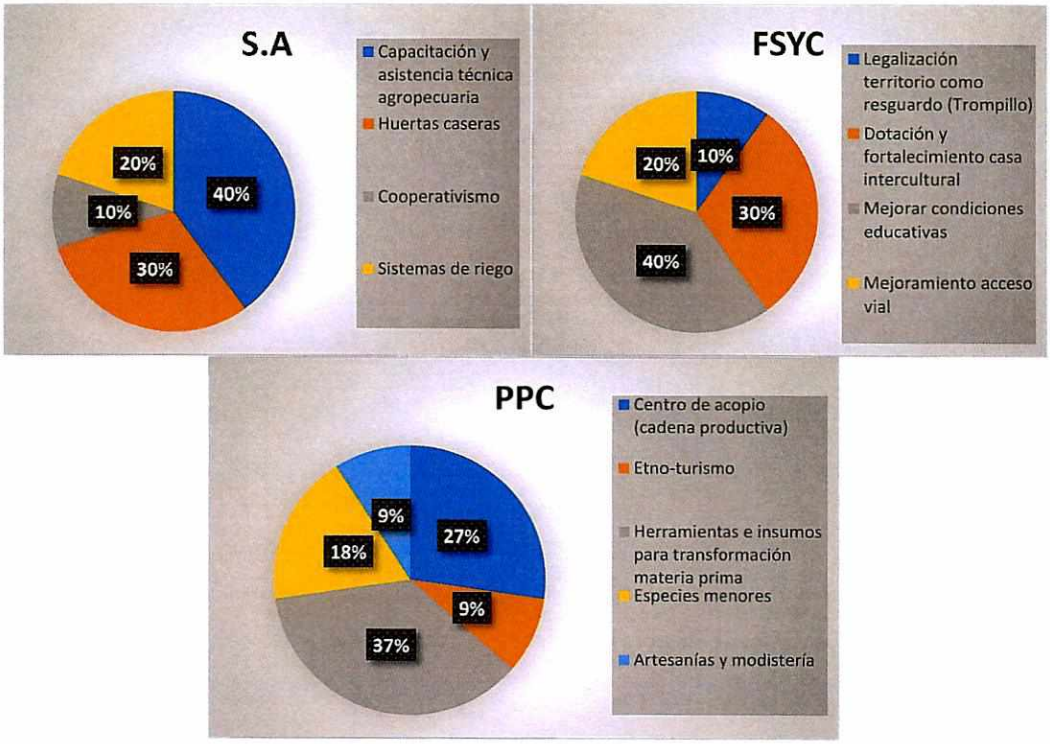


Ilustración 54 Acciones necesarias por componente, Municipio La Primavera – Vichada

En el municipio de Cumaribo, a nivel del componente de seguridad alimentaria en los resguardos del municipio de La Primavera, es necesaria la creación de un banco de semillas nativas, garantizando su calidad con la implementación de técnicas en su colecta, conservación, sanidad, brotación y demás necesidades, mediante el acompañamiento técnico profesional constante; en el componente social es necesario el fortalecimiento o la creación del plan etnoeducativo en el cual se articulen temáticas como la familia, el rol de la mujer, la protección de la naturaleza y la importancia de la UNUMA; a nivel de proyecto productivo comunitario es de vital importancia generar mayor acompañamiento técnico y capacitaciones constantes en temas ambientales, agropecuarios y administrativos, con el apoyo interdisciplinario de las entidades privadas y públicas que tienen presencia en el departamento.

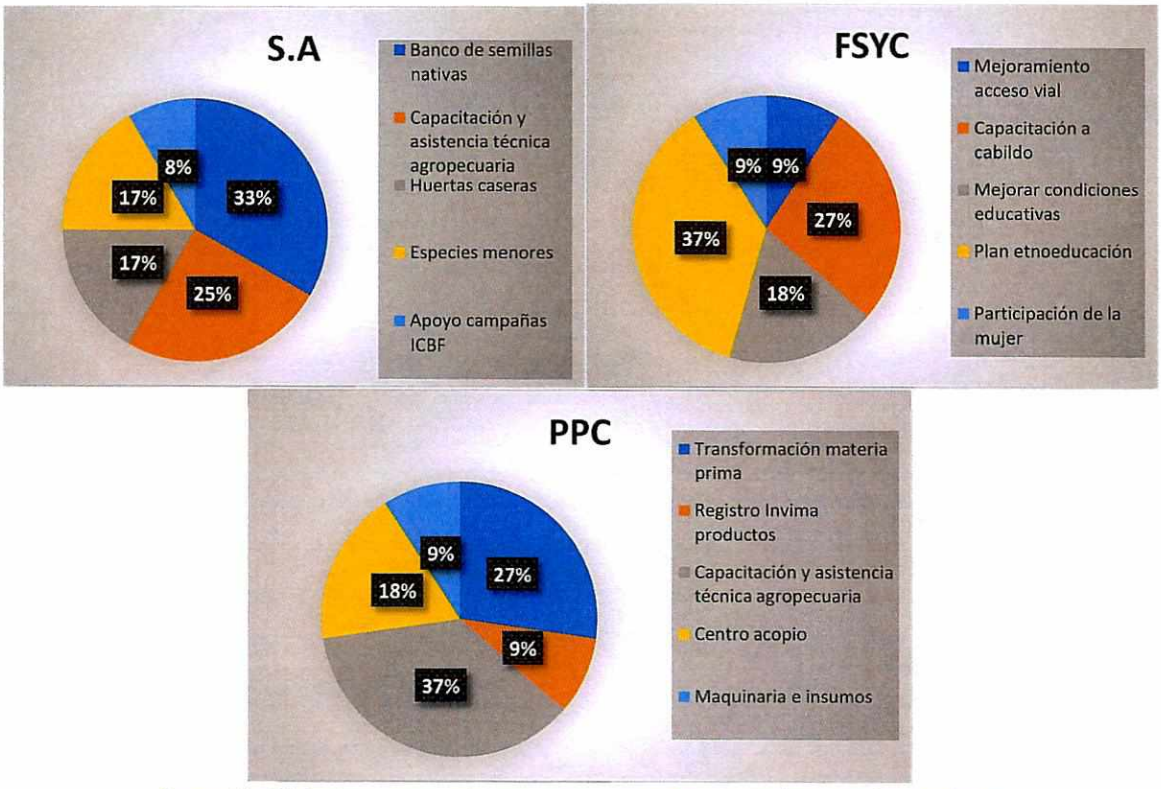


Ilustración 55 Acciones necesarias por componente, Municipio de Cumaribo – Vichada

En el departamento de Nariño, se alcanzó una meta de 5 diagnósticos realizados en el municipio de El Charco, correspondiente al Consejo Porvenir y Tumaco, en los Resguardos La Brava, Indá Sabaleta, Peña Alegría y Pulgande. En los municipios de Ricaurte y Barbacoas se proyecta la realización de los diagnósticos comunitarios para el mes de junio.

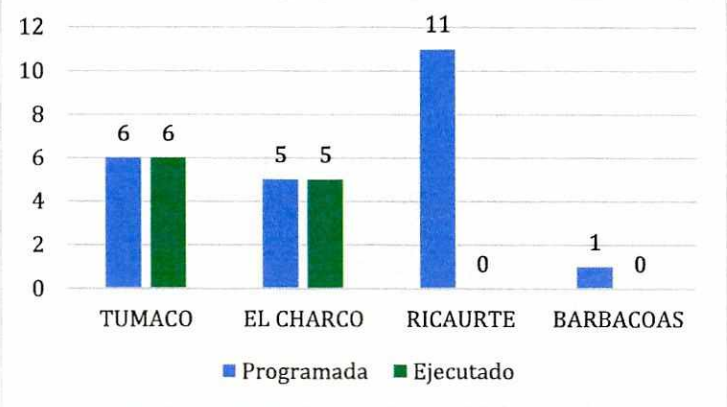


Ilustración 56 Diagnósticos Comunitarios - Nariño

En la siguiente tabla se presentan los territorios colectivos, en los cuales se desarrolló el diagnóstico comunitario y ya se cuenta con la revisión de calidad.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO COMUNITARIO	FECHA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C Menor Prominga Tapajeña	30/04/2020
		C.C Menor Socio Tapaje	30/04/2020
		C.C Menor Tribuna del Pueblo	04/05/2020
		C.C Menor Unión Taijeña	29/04/2020
	TUMACO	C.C Bajo Mira y Frontera	28/04/2020
		Resguardo Indígena Indá Sabaleta	30/04/2020

Tabla 8 Diagnósticos comunitarios realizados en Nariño

En el Resguardo Indígena Inda Guacaray, encontramos en el componente de Seguridad Alimentaria: (- Pérdida de hábitos alimenticios tradicionales, No hay interés por cultivar las semillas nativas y es insuficiente la que hay, Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, Se cultiva lo siguiente: chiro, plátano, yuca, ají, borojo, tomate, pepino, sandia, zapallo, chilma, caña, manzano, naranja, maíz, chillangua, chillaran varqueño, limón y cacao, Cría de: aves gallina, pato, cerdo y Recolección y venta de huevos de gallinas ponedoras.

Proyectos Productivos:(Jóvenes trabajando en cultivos de coca, Productos son vendidos a bajo precio (yuca), Difícil comercialización, No se cuenta con un centro de acopio, No hay tecnificación al momento de sembrar y cosecha de los productos y Estanques piscícolas en mal estado.

Fortalecimiento Social: (Territorio propio, Presencia de grupos armados y de cultivos de uso ilícito, Fumigación aérea con glifosato, Presencia de tuberías de hidrocarburos. Actores ilegales hacen extracción ilegal de petróleo, contaminando las fuentes de agua, Se carece de servicios públicos, La comunidad escolar debe hacer su bachillerato en el corregimiento de Llorente, Pérdida de saberes y valores ancestrales (incluyendo la lengua Awapit) y se han adoptado costumbres de los colonos. Además, la Institución educativa en mal estado, además requiere dotación. Deserción escolar, El puesto de salud carece de dotación de primero auxilios y herramientas médicas, inadecuado manejo de los recursos naturales y contaminación y el porcentaje general del ICOE fue del 66%, resultado que también se obtuvo en todos sus subíndices.

En el Resguardo Indígena La Brava encontramos en el componente de Seguridad Alimentaria: (Escasez de semillas, Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, Falta de asistencia técnica en los cultivos y Desnutrición y malnutrición. En el componente de Proyectos Productivos: (Economía de subsistencia (caza, pesca, recolección, agricultura a baja escala y actividades agropecuarias para autoconsumo), Jóvenes trabajando en cultivos de coca, Productos son vendidos a bajo precio y No hay mercados para vender los productos. En el componente de Fortalecimiento Social: (Territorio propio , Presencia de grupos armados y de cultivos de uso ilícito, Fumigación aérea con glifosato, Se carece de servicios públicos, Caminos y vías en mal estado, Institución educativa en mal estado, además requiere dotación, Desplazamiento y retorno a comunidades sin garantías de seguridad, Pérdida de

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

saberes y valores ancestrales (incluyendo la lengua Awapit) y se han adoptado costumbres de los colonos, Violencia a la mujer (intrafamiliar y por actores armados), El puesto de salud carece de dotación de primero auxilios y herramientas médicas, Inadecuado manejo de los recursos naturales y el ICOE total 58% (rango medio). Puntaje más bajo en el subíndice de percepción (36%).

Para el Resguardo Indígena Peña Alegría, tenemos que el territorio ancestral tiene una población aproximada de 250 habitantes, compuesta de 125 familias aproximadamente, organizadas en 2 comunidades de los cuales 33 son beneficiarios directos del programa IRACA Z1. El territorio está legalmente constituido mediante el Acuerdo 212 del 9 de julio de 2010. Las condiciones desfavorables del entorno obligaron a los nativos a desarrollar actividades económicas de subsistencia como la agricultura principalmente en el trabajo por jornales, como una actividad de sobrevivencia, ya que no cuentan con las tierras suficientes para cultivar, la piscicultura y cría de animales domésticos, así mismo, la caza de animales de monte como la tatabra, el armadillo, el venado, entre otros y esto se realiza por tradición.

El territorio no cuenta con agua potable y las fuentes están lejanas al territorio, entones ellos, usan agua lluvia y cabe la posibilidad, de contaminación, igualmente, tampoco cuentan con acueducto; se tienen sistemas artesanales construidos con mangueras y tanques, así se abastecen de agua. Esta comunidad tiene un gran deseo de cultivar en sus huertas comunitarias Tomate, cebolla, pepino, y cilantro, esto con el fin de poder tener acceso rápido a estos productos, ya que, según sus creencias, los productos traídos de afuera, le hacen daño a su salud, y la mejor opción es ellos mismo cultivarlos.

En el Resguardo Indígena de Pulgande, tenemos que de acuerdo a la RESOLUCIÓN 039 31/05/1999 por medio de la cual se confiere carácter legal de resguardo indígena, en favor de la comunidad Awa de Pulgande Campo Alegre, a un globo de terreno baldío, localizado en jurisdicción del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. El resguardo Pulgande Campoalegre tiene 390 habitantes conformada por 112 familias de los cuales 66 son beneficiarios directos del programa IRACA Z1. Para el pueblo Awá Kuaiker el territorio es un espacio de vida que permite mantener el equilibrio con los espíritus y la naturaleza, que cuenta con lugares diferenciados para trabajar, cultivar, pescar, vivir y recrear el pensamiento. Las actividades agrícolas que se desarrollan en el territorio la gran mayoría son de pan coger y entre esos cultivos se encuentran el chiro, yuca, plátano, papakun, papachilma, limón, guayaba, naranja, lulo como cultivos más importantes. También se pueden encontrar algunas plantas medicinales como menta, limoncillo entre otras. Dentro de las actividades pecuarias se encuentran la cría de gallina y pesca artesanal con fines de autoconsumo, no se realiza explotación forestal ni de fauna y flora silvestre. Los suelos son de baja fertilidad, ácidos, poco contenido de calcio, magnesio, potasio, fosforo y nitrógeno. Con respecto a la lengua nativa que es el awapit no todos los miembros de la comunidad la practican por lo tanto esta identidad cultural se ha ido perdiendo.

La pérdida de la lengua en gran parte se debe a los sistemas escolares de la región han sido poco sensibles a sus necesidades culturales y lingüísticas y no cuentan con el recurso humano para practicar esta lengua. Las vías de acceso al resguardo son ineficientes, no cuentan con puentes para cruzar las pequeñas quebradas que pasan por el territorio, que cuando hay creciente de los ríos, los habitantes no pueden cruzar. Si se presenta un caso de emergencia

las personas deben esperar a que las aguas bajen para poder cruzar. Sólo hay acceso por vía terrestre en un camino que dura aproximadamente dos horas a pie el cual se encuentra en mal estado debido a que transitan animales de trabajo como caballos y que se ve muy afectado cuando hay lluvias porque el suelo se vuelve muy lodoso.

El territorio es amenazado por la presencia de grupos ilegales al margen de la ley, afectando el bienestar de las comunidades que habitan el territorio. Debido a estos aspectos negativos mencionados todo el territorio se encuentra en constante amenaza y condición de vulnerabilidad. Esta zona del municipio de Tumaco por lo general es lluviosa, esto quiere decir que llueve la mayor parte del tiempo, puesto que se encuentra a las cercanías del piedemonte costero que es una de las zonas más lluviosas del departamento, por ende, la comunidad está expuesta a inundaciones y desbordamiento de los ríos que la rodean constantemente por la lluvia permanente.

Como resultado general se puede concluir que en la mayoría de territorios analizados se presentan problemas de desnutrición infantil, falta de agua potable, también la falta de transporte, la escasez de vías y las pocas vías que hay en los territorios se encuentran en mal estado, así mismo, el conflicto armado causado por grupos al margen de la ley aquejan actualmente al departamento y a nivel interno desafortunadamente el poco interés de los jóvenes por los saberes ancestrales y el servicio de salud precario complican la situación de ésta población.

En la siguiente gráfica, se describen las líneas o enfoques que se pudieron observar en el desarrollo del diagnóstico, en el municipio de El Charco.

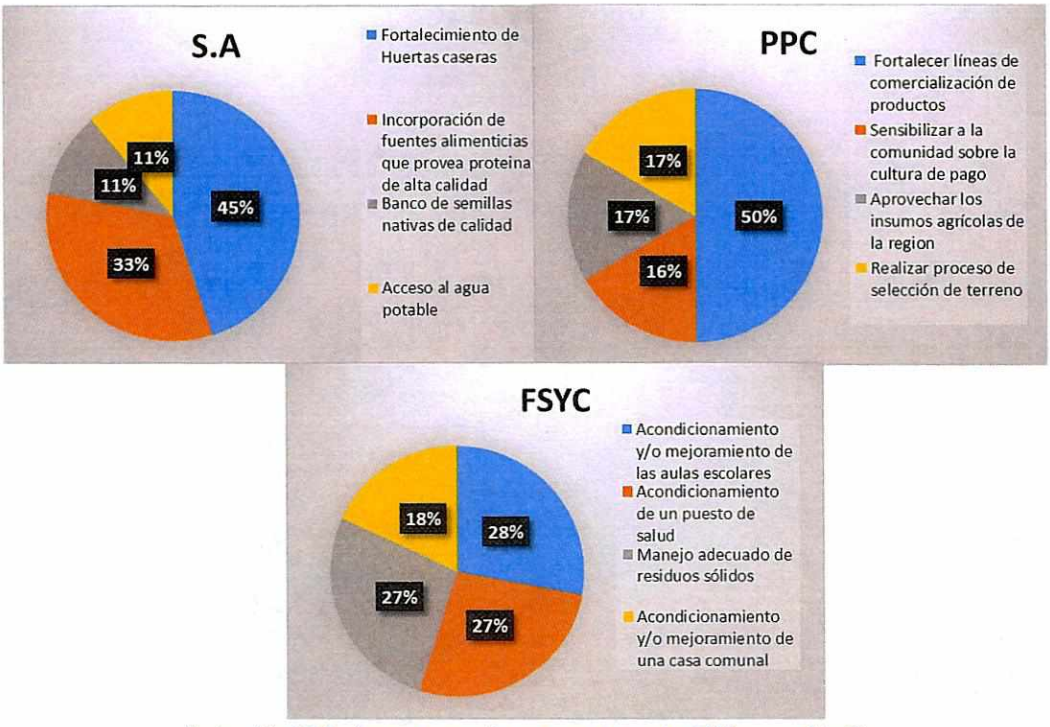


Ilustración 57 Acciones necesarias por componente, El Charco – Nariño

A nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que el enfoque de los Consejos Comunitarios del municipio del Charco es la necesidad del fortalecimiento de huertas caseras para proveer alimentos a la comunidad a través de cultivos de pan coger tales como el plátano hartón, el maíz chococito, las hortalizas como el pepino cohombro, el tomate chonto, el cebollín, el cimarrón y la albahaca.

A nivel de proyecto productivo comunitario se necesita fortalecer las líneas de comercialización de productos mediante el establecimiento de los canales de distribución (mercado mayorista, minorista, por internet, medios de comunicación, entre otros) y así mismo, fortalecer las líneas agrícolas y pecuarias de la región, brindar capacitaciones y acompañamiento en temas de promoción de los productos y realizar alianzas comerciales y/o productivas, también la implementación, producción y certificación del sello verde (productos orgánicos).

En el componente de fortalecimiento social y comunitario el acondicionamiento y mejoramiento de aulas a través de la construcción de baños, el mejoramiento de aulas y la adecuación de los escenarios lúdico-deportivos facilitará el acceso a la educación en los jóvenes de la comunidad, evitando el analfabetismo en los miembros de las comunidades.

En la siguiente ilustración, se describen las líneas o enfoques que se pudieron observar en el desarrollo del diagnóstico, en el municipio de Tumaco.

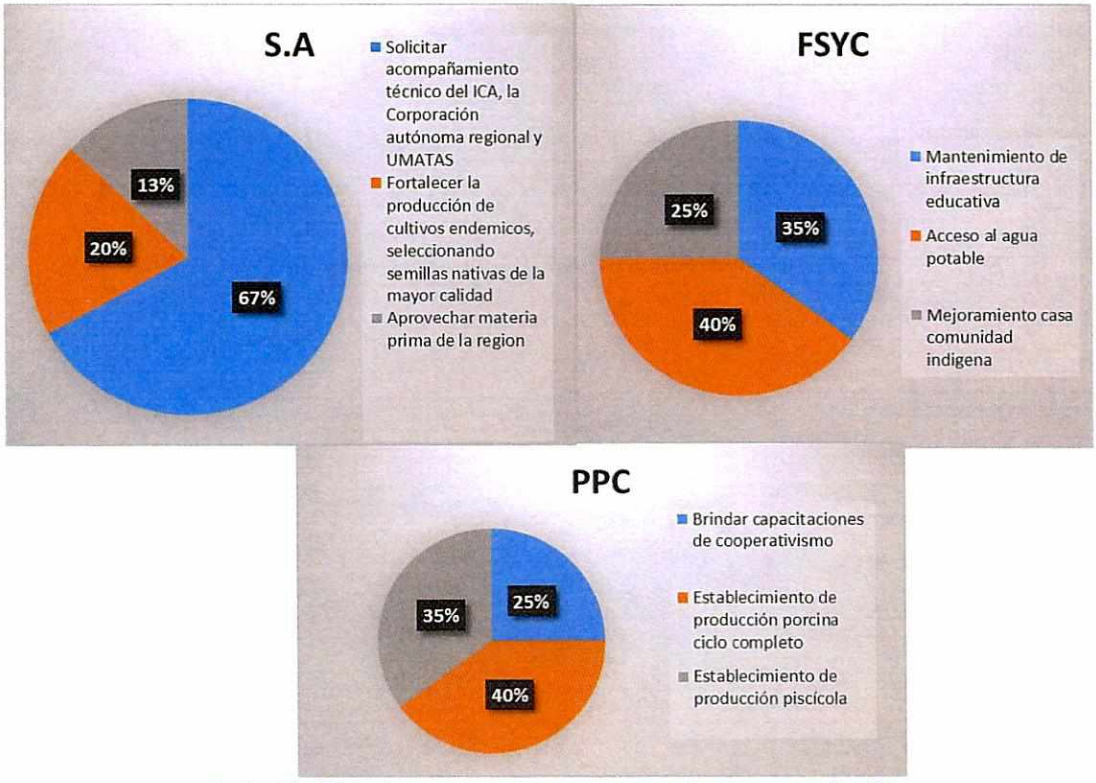


Ilustración 58 Acciones necesarias por componentes, Tumaco – Nariño



A nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que el enfoque de los Resguardos del municipio de Tumaco se requiere solicitar acompañamiento técnico y apoyo en insumos a entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario, Corporación autónoma regional y UMATAS.

En el componente de fortalecimiento social y comunitario es necesario planificar estrategias que permitan solucionar el problema de la falta de agua potable para la comunidad, mejorando la capacidad de almacenamiento del acueducto, reemplazar insumos obsoletos, aportar materiales para ampliar la cobertura y otros procedimientos que contribuyan a mitigar este problema.

En el componente productivo es necesario fortalecer la producción pecuaria, específicamente cerdos y peces, además crear conciencia en las comunidades sobre las bondades de la asociatividad y el cooperativismo en una comunidad.

Evidencia que soporta el proceso:

- Acta de Reunión
- Listado de Asistencia
- Informe de Diagnóstico
- Matriz de Actores
- Matriz de priorización de proyectos
- Evidencias de Diagnóstico comunitario anexas al presente informe: https://drive.google.com/drive/folders/1hYJySzG_--eVeMao3iWF5XN1210dc6J6?usp=sharing (Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización)

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO: *Formulación de Proyectos*
INDICADOR: *Número de Hogares Vinculados a proyectos formulados por componente*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Fichas de Proyectos*
META PROGRAMADA: *21.120*
META EJECUTADA: *640*
META EN PROCESO: *20.480*

En el mes de mayo se ha adelantado la construcción de fichas de proyecto, de Seguridad Alimentaria y Fortalecimiento Social del Resguardo de Atabapo y la Ficha de Fortalecimiento Social del Consejo Comunitario Renacer Negro, ya cuentan con los diferentes filtros de revisión, por tanto, se hace la entrega a Prosperidad Social con los respectivos medios de verificación.

140

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

En el momento, existen fichas en construcción, fichas en revisión por parte de los profesionales locales y los especialistas. En la tabla 10, se presentan las fechas proyectadas de entrega a Prosperidad Social.

MUNICIPIO	TERRITORIO COLECTIVO	FECHA REALIZACION	ESCENARIO	% ENTREGA A JUNIO 15	% ENTREGA AJUNIO 30
Barbacoas	RI Hojal la Turbia	22/06/2020	AI	50%	50%
Ricaurte	R.I. Vegas	22/06/2020	AI	50%	50%
	R.I. Ramos Mongón	22/06/2020	AI	50%	50%
	R.I. Alto Cartagena	22/06/2020	AI	50%	50%
	R.I. Edén Cartagena	22/06/2020	AI	50%	50%
	R.I. La Milagrosa	22/06/2020	AI	50%	50%
	R.I. Magui	22/06/2020	AI	50%	50%
	R. I. Palmar	22/06/2020	AI	50%	50%
	R. I. Pialapi	22/06/2020	AO	50%	50%
	R. I. Gualcalá	22/06/2020	AO	50%	50%
	R. I. Telembí	22/06/2020	AO	50%	50%
	R. I. Nulpe Medio	22/06/2020	AO	50%	50%
Tumaco	CC Bajo Mira y Frontera	15/05/2020	AO	50%	50%
	RI La Brava	26/05/2020		25%	75%
	RI Indá Guacaray	26/05/2020		50%	50%
	RI Indá Sabaleta	15/05/2020		25%	75%
	RI Peña Alegría	26/05/2020		25%	75%
	RI Pulgande	26/05/2020		25%	75%
El Charco	CC Porvenir	24/05/2020		25%	75%
	CC Socio Tapaje	15/05/2020		50%	50%
	CC Unión Taijeña	15/05/2020		50%	50%
	CC Tribuna del pueblo	22/05/2020		25%	75%
	CC Prominga Tapajeña	15/05/2020		50%	50%
Puerto Inírida	RI Atabapo	01/06/2020	AO	100%	0%
	RI Paujil			100%	0%
Puerto Carreño	RI Caño Guaripa	01/06/2020 a 12/06/2020	AI	25%	75%
	RI Caño Mesetas Dagua			25%	75%

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

La Primavera	RI El Trompillo			25%	75%
	RI Campoalegre y Ripialito			25%	75%
	RI Yajotja			0%	50%
Cumaribo	RI Chololobo			25%	75%
	RI Rio Tomo Beweri			25%	75%
	RI Aiwa Kuna Tsetajibo			25%	75%
	RI Santa Teresita del Tuparro	15 junio		25%	75%
Timbiquí	C. C. Renacer Negro	15/05/2020 a 15/06/2020	AO	50%	50%
Guapi	C. C. Guapi Abajo			50%	50%
	C. C Alto Guapi			50%	50%
	C. C. Rio Guajuí			50%	50%
	C. C. Río San Francisco			50%	50%
	C. C. Rio Napi			50%	50%

Tabla 10. Proyección de entrega de Ficha de Proyectos, Iraca z1

Por otra parte, y debido a la situación actual que atraviesa el País a causa del COVID-19, y a la medida de aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, el Socio Implementador remitió a Prosperidad Social propuesta de ejecución de actividades para este proceso, en el que involucra un componente tecnológico fuerte, guiado y acompañado por el equipo de gestores contratados, profesionales y coordinadores de los niveles locales y nacionales que permitan avanzar en la ejecución de las actividades, para el caso específico de formulación de proyectos, la Unión Temporal contrató con recursos propios la construcción de un aplicativo que permite recolectar y analizar información, como a su vez, evidenciar a través de una metodología guiada la identificación de los proyectos, fichas de los mismos y sus respectivos planes de inversión, hasta el punto que le permite al gestor descargar los formatos establecidos para este proceso ya diligenciados desde el aplicativo, a fin de ser impresos, socializados con los beneficiarios y realizar la recolección de firmas una vez levantada la medida de aislamiento obligatorio.

Para lo anterior nos permitimos anexar pantallazos del aplicativo ya mencionado.





COMITES TÉCNICOS REGIONALES

Se han desarrollado los siguientes Comités Técnicos Regionales dentro del convenio 213 de 2019.

GUAINIA

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 09/12/2019
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 18/02/2020
El 3er Comité Técnico se desarrolló el 22/04/2020

CAUCA

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 18/12/2019
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 17/01/2020
El 3er Comité Técnico se desarrolló el 06/04/2020

VICHADA

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 03/02/2020
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 20/04/2020

NARIÑO

El 1er Comité Técnico se desarrolló el
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 24/01/2020
El 3er Comité Técnico se desarrolló el 06/04/2020

En el siguiente enlace se relacionan las actas de los comités regionales
https://drive.google.com/open?id=1_eqI8h4hqQ5lZxOOLB4vIzDS1mbJjdGN

Se programaron comités regionales de la siguiente manera:

CAUCA martes 23 de junio
NARIÑO miércoles 24 de junio
GUANIA jueves 25 de junio
VICHADA viernes 26 de junio

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA:

El día Martes 21 de Abril Se desarrolló el Séptimo (7) Comité técnico nacional, en el que se detalló el avance técnico, administrativo y financiero del Convenio 213 durante el mes de Marzo, estableciéndose frente a ello diferentes compromisos, dentro de los cuales se anotó;

"Realizar una transferencia metodológica en el entorno de la formulación de proyectos y la socialización del anexo técnico frente al COVID 19".

De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo la transferencia metodológica a los equipos regionales, con la siguiente agenda, la cual fue concertada con la dirección regional del PS:

Lunes 04 de mayo de 2020		
Lugar: VIRTUAL		
TEMA	**TIEMPO**	**RESPONSABLE**
PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES	8:00 a.m. – 8:10 a.m.	**JAMES ARIAS**
APERTURA- RAZONES DE LA REUNIÓN	8:10 a.m.– 8:20 a.m.	**JAMES ARIAS**
AVANCE ACTUAL DE CADA ETAPA DEL PROGRAMA	8:20 a.m. – 8:40 a.m.	**EQUIPO UNIÓN TEMPORAL**
ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICOS FINALIZADOS A LA FECHA	8:40 a.m. – 9:20 a.m.	**EQUIPO UNIÓN TEMPORAL**
REFUERZO METODOLOGÍA ETAPA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS		
SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL MARCO DEL COVID-19 –ANEXO ENVIADO POR PS	9:20 a.m. – 9:40 a.m.	**EQUIPO PROSPERIDAD SOCIAL**
RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES	9:40 a.m. – 10:00 a.m.	**ASISTENTES**
CIERRE DE LA JORNADA		

- Regional Guania: lunes 4 de mayo 8:00am -10:30am
- Regional Cauca: martes 5 de Mayo 10:00am -12:30am
- Regional Nariño: Miércoles 6 de Abril de 8:00am – 3:00pm
- Regional vichada: jueves 7 de mayo de 2020 de 8:30am- 10am

El día viernes 22 de Mayo Se desarrolló el Séptimo (8) Comité técnico nacional, en el que se detalló el avance técnico, administrativo y financiero del Convenio 213 durante el mes de abril, estableciéndose frente a ello diferentes compromisos, dentro de los cuales se anotó;

"Realizar reuniones semanales de seguimiento y control de las actividades para que tanto el operador como PS se tuviera el control del día a día del proyecto

De acuerdo a lo anterior, se estableció un tablero de control para que el operador y prosperidad social tengan semana a semana la contabilidad de las actividades asi:

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

	Cantidad	% REZAGO A 30-ABR-2020	% REZAGO ACTUAL	Avance a la fecha	REZAGO A 30-ABR-2020	REZAGO A LA FECHA	META A PROGRAMAR A 31-JUL-2020	Avance semanal	jun-20 SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
Prog.	5.280	35%	27%	100%	35%	27%	1.861	100%	300	300	400	500
Ejec.	3.419			65%				22%	415			
Prog.	5.280			100%	35%	27%	1.861	100%	300	300	400	500
Ejec.	3.419			65%				22%	415			

SOCIALIZACIÓN A AUTORIDADES EN EL MARCO DEL COVID-19

Recibido el borrador del anexo técnico, la UT en su propósito de dar a conocer de manera formal el mismo, creo y remitió la carta adjunta en el drive a las 40 autoridades de los resguardos y comunidades, en la cual se socializan las dos formas de manejo del programa en el marco del COVID-19 y las estrategias de bioseguridad derivadas de este (Resumidas en AISLAMIENTO OBLIGATORIO E INTELIGENTE), pasando para ello por cada una de las etapas del desarrollo del programa. De los cuales ya tenemos 10 autoridades con remisión de la carta autorizando al operador a seguir desarrollando el programa en su territorio.

CONTRA- PARTIDA APORTADA POR LA UNIÓN TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA

Se realizo mesa de trabajo donde el socio implementador presento el avance en la construcción de actividades de la contrapartida, se recibió retroalimentación por parte del equipo de supervisión, se realizarán mesas de trabajo posterior para poder ir avanzando en su implementación.

La relación de actividades con sus respectiva descripción y fecha estimada de entrega de las evidencias, las cuales se relacionan a continuación:

Componente: SEGURIDAD ALIMENTARIA	
Actividad: Inversión hogares	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020
Descripción de la actividad a ejecutar: Se realizará un análisis de las fichas de proyecto formuladas por las comunidades, y se procederá a la concertación de los insumos de contra-partida (600 hogares adicionales) propuestos por el socio implementador en la etapa precontractual.	
Actividad: Realización de mercados campesinos para comercialización de productos de los hogares participantes	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de septiembre de 2020
Descripción de la actividad a ejecutar: **A raíz de la situación que atraviesa hoy en día la humanidad a causa de la pandemia COVID-19, el socio implementador para el desarrollo de la presente actividad propone:**	

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Departamentos de Intervención:

- Nariño
- Cauca
- Vichada
- Guainía

Cantidad de hogares a beneficiar:

- 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

Generar alianzas comerciales de encadenamientos productivos que le permitan a los hogares atendidos acceder a mercados locales para comercializar sus productos y con esto fortalecer las economías propias.

Plan de acción:

A través de la generación de alianzas comerciales con plazas de mercado, macro y micro-mercados, y pequeñas y medianas empresas locales, el socio implementador busca garantizar que las comunidades atendidas en el programa IRACA accedan a un canal de comercialización permanente, que le permita en el tiempo fortalecer sus economías propias e incorporarse a mundo globalizado de comercio.

El socio implementador realizara las siguientes acciones:

- Identificación de líneas agrícolas, pecuarias y de comercio implementada por los beneficiarios del programa IRACA en la zona 1, a fin de promover canales de comercialización.
- Diseño de protocolos logísticos de distribución, empaque y rotulado de los bienes e insumos producidos por las comunidades a fin de ser comercializados.
- Acuerdo comercial de compra – venta, entre beneficiarios del programa y organizaciones de comercio local (Plazas de mercado, macro y micro-mercados).

Actividad: Formación en asociación eficiente de cultivos - aprovechamiento de recursos naturales disponibles	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

PRACTICAS AGRICOLAS - NATURALES SOSTENIBLES Y EFICIENTES

Departamentos de Intervención:

- Nariño
- Cauca
- Vichada
- Guainía

Cantidad de hogares a beneficiar:

- 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Promover en las comunidades beneficiadas por el programa IRACA en la zona 1 el aprovechamiento de los recursos naturales y la generación de alternativas eficientes y sostenibles de asociación de cultivos.

Logros esperados:

- Mayor producción y de mejor calidad en los proyectos agrícolas implementados por los beneficiarios.
- Mayor aprovechamiento de los recursos naturales, tales como agua, suelos, nutrientes, luz y energía.
- Mayor resistencia a las plagas y enfermedades de los cultivos iniciados.
- Protección de los suelos frente a la erosión facilitando la infiltración del agua.
- Diversificación de cultivos, permitiéndole a las comunidades la obtención de mayores ingresos.
- Comunidades con conocimientos en prácticas eficientes de aprovechamiento de los recursos naturales y asociación eficiente de cultivos

Plan de acción:

A través de la contratación de una empresa especializada en temas relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales, y en la implementación de cultivos eficientes, el socio implementador busca garantizar que las comunidades fortalezcan sus conocimiento y capacidades en la asociación eficiente de cultivos y aprovechamiento de recursos naturales disponibles, a fin de ser implementados en sus prácticas agrícolas diarias.

Actividad: Escuela Mi Huerta - Mi Casa	**Fecha Estimada de entrega:** 15 de julio de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

UN LABORATORIO ABIERTO PARA EL APRENDIZAJE

Departamentos de Intervención:

- Nariño
- Cauca
- Vichada
- Guainía

Cantidad de hogares a beneficiar:

- 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

Fortalecer los conocimientos y capacidades de las comunidades beneficiadas por el programa IRACA en la zona 1, en temas relacionados con la siembra e implementación de huertas caseras que permitan a las comunidades acceder a alimentos durante todas las etapas del año y con contribuir a la seguridad alimentaria.

Logros esperados:



- Proporcionar alimentos variados para las familias durante todo el año o varios meses.
- Mejorar los ingresos con los productos de la huerta en el largo plazo.
- Mejorar o mantener el estado nutricional de la familia.
- Fortalecer la integración familiar.
- Promover una producción sana y segura de los alimentos.
- Fomentar la diversidad de cultivos de hortalizas, leguminosas, cría de aves y especies menores.

Plan de acción:

A través de la implementación de esta estrategia el socio implementador suministrara a las comunidades material impreso y elementos de trabajo, que permitan realizar las actividades propuestas así contribuir a la seguridad alimentaria, lo que hemos denominado "De la huerta a mi mesa"

Nota: De acuerdo a la reunión de alcance de revisión de los productos de contra-partida, el socio implementador se encuentra en la reestructuración de la presente actividad a fin de ser socializada a Prosperidad Social.

Ver anexo.

Actividad: Encuentros de cocina tradicional (Cartilla fogones ancestrales)	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de agosto de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

Departamentos de Intervención:

- Nariño
- Cauca
- Vichada
- Guainía

Cantidad de hogares a beneficiar: 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

Visualizar la gastronomía más exquisita de las comunidades beneficiadas por el programa IRACA en la zona 1, a través de la producción de material audio visual y divulgación en redes sociales y en especial en canal de YouTube – "La cocina de Iraca".

Plan de acción:

Contratar una empresa de diseño gráfico y producción audio visual que recolecte en campo videos e historias gastronómicas de las comunidades beneficiadas por el programa IRACA en la zona 1, a fin de ser editados, cargados y publicados en diferentes redes sociales, y en especial en el canal de YouTube – "La cocina de Iraca", creado por el socio implementador, para lo cual se dispondrá de personajes afros e indígenas como presentadores y por video se realizara bajo la modalidad de invitados los beneficiarios del programa iraca, a fin de mostrar su producción gastronómica.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Componente: FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	
Actividad: Inversión hogares	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

Se realizará un análisis de las fichas de proyecto formuladas por las comunidades, y se procederá a la concertación de los insumos de contra-partida (600 hogares adicionales) propuestos por el socio implementador en la etapa precontractual.

Actividad: Talleres para el Fortalecimiento de habilidades sociales para las comunidades	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

Departamentos de Intervención:

- Nariño
- Cauca
- Vichada
- Guainía

Cantidad de hogares a beneficiar: 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

Fortalecer habilidades sociales básicas de los beneficiarios del programa IRACA en la zona 1, a través de talleres teorico-practicos que permitan una mayor apropiación de los temas impartidos.

Plan de acción:

Contratar una empresa que disponga de personal especializados en temas relacionados con el fortalecimiento de habilidades sociales, a fin de producir material pedagógico didáctico, audio visual, que a su vez imparta en campo talleres, encuentros y actividades que permitan el fortalecimiento de habilidades sociales en las comunidades beneficiadas.

Ver anexo.

Actividad: Fortalecimiento a los territorios, teniendo en cuenta los resultados de ICOE	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

Departamentos de Intervención:

- Nariño
- Cauca
- Vichada
- Guainía

Cantidad de hogares a beneficiar:

- 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Brindar apoyo y asesoría permanente a los 40 territorios colectivos beneficiados por el programa IRACA asignados a la zona 1, compuesta por los departamentos de Nariño, Cauca, Vichada y Guainía, a fin de fortalecer los territorios y las comunidades de acuerdo a los resultados obtenidos en las fichas ICOE.

Plan de acción:

A través de la implementación de una estrategia de acompañamiento, asesoría y seguimiento permanente, tomando como referencia los resultados del ICOE, el socio implementador mediante la contratación de una empresa especialista en la formulación de proyectos e implementación de los mismos, busca fortalecer las competencias de las comunidades y los beneficiarios a fin de formular proyectos que perduren en el tiempo.

Para lo cual la empresa especialista realizara los siguientes procesos:

- Contratar el personal requerido para la implementación de las actividades contratadas.
- Realizar un estudio de las zonas beneficiadas por el programa IRACA en la zona 1, como de su condición medio-ambiental, social, política y geográfica.
- Realizar un análisis de los instrumentos ICOE recolectados por la Unión Temporal a través de su equipo en cada uno de los territorios.
- Brindar apoyo y asesoría permanente a los territorios colectivos y a las comunidades en la construcción de las fichas de proyectos de acuerdo a los resultados obtenidos en las fichas ICOE
- Brindar apoyo y asesoría permanente a los territorios colectivos y a las comunidades en la implementación de sus proyectos y en las practicas que permitan su sostenibilidad en el tiempo.

Ver anexo.

Componente: COMPONENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS	
Actividad: Inversión hogares	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020
Descripción de la actividad a ejecutar: Se realizará un análisis de las fichas de proyecto formuladas por las comunidades, y se procederá a la concertación de los insumos de contra-partida (600 hogares adicionales) propuestos por el socio implementador en la etapa precontractual.	
Actividad: Realización de ruedas de negocios	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de septiembre de 2020
Descripción de la actividad a ejecutar: **Departamentos de Intervención:** - Nariño - Cauca - Vichada - Guainía	

150

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Cantidad de hogares a beneficiar: 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos Beneficiados.

Objetivos:

Realizar una rueda de negocios por cada uno de los departamentos beneficiados apoyados en herramientas digitales "on-line" que permita la integración de potenciales proveedores (Beneficiarios) y potenciales compradores.

Plan de acción:

Organizar por cada uno de los departamentos beneficiados una rueda de negocios "ON-LINE", que permita la integración de los beneficiarios del programa IRACA, las autoridades étnicas, y los potenciales compradores y demás invitados, a fin de estructurar alianzas comerciales a nivel departamental y/o nacional.

- El socio implementador organizara la logística necesaria para garantizar el transporte, alimentación y hospedaje de beneficiarios y autoridades invitadas a puntos que permitan conectividad a internet.
- Promoción, divulgación e invitación de potenciales compradores, y demás invitados.
- Adquisición de un canal on-line que permita la realización del evento.
- Disponer de un moderador y presentador del evento.
- La demás logística necesaria.

Actividad:	
- Fortalecimiento a través del E-commerce de los proyectos productivos - Formulación y avance en estrategias de comercialización de productos de los hogares atendidos. - Formulación e implementación de estrategias para la creación o fortalecimiento de encadenamientos productivos de productos de los hogares atendidos.	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de agosto de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO CON IDENTIDAD – ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN

Introducción

El programa IRACA contempla una serie de acciones efectivas para la prevención y atención al desplazamiento de las comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas en el territorio Nacional, a su vez busca contribuir al empoderamiento y desarrollo propio de las comunidades étnicas a través de una intervención integral con enfoque diferencial étnico que incluye el contribuir al desarrollo del capital humano y social, de la seguridad alimentaria y la generación de ingresos o fortalecimiento productivo comunitario.

IRACA® implementa un modelo de acompañamiento que incorpora elementos de Seguridad Alimentaria, Proyectos Productivos y Fortalecimiento social y Comunitario, incentivando proyectos sobre la base de los saberes locales y regionales, así como promoviendo la incorporación de buenas prácticas productivas y comerciales que fortalezcan las economías propias, en el marco

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

de los derechos fundamentales a la Autonomía y Gobierno Propio, Identidad Cultural y del Territorio, de las comunidades étnicas.

Componente de seguridad alimentaria: Abordada por el programa en torno a los ejes de acceso y consumo, en articulación con los sistemas tradicionales de producción, así como con las prácticas culturales, alimenticias y de selección para la producción de alimentos para autoconsumo.

Componente de Proyectos Productivos Comunitarios: Este componente impulsa el desarrollo de actividades generadoras de ingresos con las cuales se pretende mejorar las condiciones socio económicas, responder a problemáticas o potencializar oportunidades a un determinado grupo de personas organizado para tal fin. De manera complementaria se contempla el financiamiento de proyectos productivos comunitarios consolidados que presenten resultados tempranos, constituyan una oportunidad de fortalecimiento y potencialice los resultados de la intervención del programa, es importante tener en cuenta que dada la característica del incentivo de financiamiento complementario, este no se entregará a la totalidad de hogares participantes del programa, el programa realizará una identificación y priorización de los proyectos que cumplan con los criterios para recibir el financiamiento.

Componente de Fortalecimiento Social y Comunitario: Es concebido como un proceso de mediano y largo plazo, por medio del cual se fortalece a las comunidades participantes y sus organizaciones, coadyuvando al afianzamiento de la confianza, del accionar conjunto, de la visión de lo colectivo y del capital social, como aporte a la integridad étnica, cultural y social, así como a las visiones de desarrollo propio de las comunidades étnicas.

Por lo anterior, el socio implementador Unión Temporal Prosperidad Iraca, en el proceso contractual propuso una serie de actividades y estrategias que a su vez buscan contribuir por las metas trazadas por dicho programas, en las que entre otras se encuentran: Fortalecimiento a través del E-commerce de los proyectos productivos, Formulación y avance en estrategias de comercialización de productos de los hogares atendidos, Formulación e implementación de estrategias para la creación o fortalecimiento de encadenamientos productivos de productos de los hogares atendidos, por lo cual, se procedió a la articulación de estas actividades y con esto crear la estrategia "DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO CON IDENTIDAD – ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN".

Programa: IRACA® - Zona 1

Departamentos de Intervención

- Nariño
- Cauca
- Vichada
- Guainía

Objetivos

Contribuir al empoderamiento y desarrollo propio de las comunidades étnicas a través de la implementación de acciones que permitan la comercialización y generación de ingresos apoyados en el comercio electrónico, encadenamientos productivos y asociativo, de los proyectos adelantados en el componente Proyectos Productivos Comunitarios del Programa IRACA®.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO CON IDENTIDAD – ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN

A través de procesos e iniciativas de desarrollo con identidad, esta estrategia busca apoyar la comercialización, productividad y asociatividad de los proyectos productivos adelantado por las comunidades étnicas beneficiadas en el programa IRACA en la zona 1, conformada por los departamentos de Nariño, Cauca, Vichada y Guainía, el cual pretende mejorar las condiciones socio económicas, responder a problemáticas y potencializar oportunidades en las familias focalizadas.

Con la articulación de un conjunto de actividades y acciones se busca implementar procesos de comercialización innovadores y eficientes, pero que guarden consistencia con los sistemas ancestrales de las comunidades beneficiadas, como a su vez, se reconstruya la identidad de las familias que hacer parte de esta. Por lo anterior la Unión Temporal asoció las actividades descritas a continuación, las cuales fueron ofertadas en calidad de contrapartida en el proceso contractual del Programa IRACA.

- Fortalecimiento a través del E-commerce de los proyectos productivos.
- Formulación y avance en estrategias de comercialización de productos de los hogares atendidos.
- Formulación e implementación de estrategias para la creación o fortalecimiento de encadenamientos productivos de productos de los hogares atendidos.

Con la articulación de estas actividades se obtendrán los siguientes insumos:

- **Aplicación Móvil (APP):** Programa diseñado para ser ejecutado en teléfonos, tabletas, y otros dispositivos móviles que permiten al usuario acceder de forma fácil y en el momento deseado.

  A través de diferentes módulos establecidos, le permitirá a los usuarios:

  - **Bienes y Servicios Ofrecidos:** Este módulo les permitirá a las comunidades étnicas poner a disposición de todos los Colombianos y el mundo los productos bienes y/o servicios que ofrecen en sus comunidades, y dar a conocer los proyectos productivos emprendidos con los incentivos entregados por el Programa IRACA, el cual de forma fácil permite adquirir en calidad de compra dichos productos o servicios a través de la aplicación móvil – APP.
  - **Módulo de Historia**: Buscar recrear los orígenes de nuestras comunidades, su historia, ubicación, cantidad de comunidades, y la importancia de su rol en la sociedad.
  - **Costumbres y Tradiciones:** Busca a través de la identificación de las comunidades conocer su lengua, religión, vestimenta, tipo de vivienda, gastronomía, prácticas culturales y de subsistencia, entre otros.
  - **Medicina Ancestral:** Con autorización de las autoridades étnicas busca dar a conocer la forma tradicional que durante años han utilizado para atender las diferentes enfermedades presentadas en sus comunidades.
  - **Cocina Ancestral:** Con autorización de las autoridades étnicas busca dar a conocer al país su gastronomía más exquisita, en el que se detalle nombre del plato o receta, insumos para su preparación, y método de preparación.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

- **Donaciones:** Este módulo le permitirá a las personas naturales y jurídicas realizar donaciones en dinero y/o en especie a las diferentes comunidades vinculadas a la plataforma, esto a través de sus autoridades.
- **Galería Fotográfica:** Este módulo les permitirá a las comunidades de forma permanente cargar fotografías en el que se dé a conocer su vivencia diaria, sistemas de producción, y vivienda, para lo cual se dispondrá de un personal para realizar control del contenido cargado.

Lo anterior, en busca de generar fuentes de ingresos a las diferentes comunidades, sin dejar a un lado su identidad y su modo de vida.

- **Recolección de información en los territorios:** El socio implementador contratará una firma especializada en la recolección de información en campo y aplicación de instrumentos de encuesta cualitativa y cuantitativa, que permitan obtener información de primera mano y acorde a la realidad de cada territorio, información que estará dispuesta en un sitio web para su consulta.

- **Promoción y divulgación:** Con la información recolectada en los diferentes territorios, el socio implementador iniciara una campaña publicitaria apoyado en cuñas radiales, redes sociales, perifoneo y elaboración de un folleto físico y digital por municipio en el que se evidencien los proyectos emprendidos por cada uno de los territorios colectivos atendidos por el programa IRACA.

- **Tratamiento de datos y derechos de autor:** El socio implementador adelantara un protocolo de tratamiento de datos y cesión de derechos de autor que garanticen la publicación de la información recolectada y la divulgación de la misma.

Se busca con la actual estrategia crear redes de comercialización de productos que permitan a las comunidades atendidas la generación de ingresos continuos y la incorporación a una vida productiva global.

Actividad:	
- Participación de los hogares en vitrinas comerciales. - Producción de materiales de marketing de las organizaciones productivas. Difusión de estos materiales a través de medios comunicación masivos	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

Departamentos de Intervención:

- Nariño
- Cauca
- Vichada
- Guainía

Cantidad de hogares a beneficiar: 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Generar estrategias de visualización masivas que permitan a los hogares participantes estar en escenarios de impacto nacional y/o internacional a fin de promover su identidad cultural y su economía local.

Plan de acción:

A través de la contratación un canal de televisión regional y/o nacional, adquirir un espacio para la producción de un programa enfocado a la visualización del diario vivir de las comunidades étnicas, en el cual se permitirá dar a conocer los bienes y/o servicios que ofrecen, sus costumbres, tradiciones y vivencias, a su vez, con esto se busca el fortalecimiento de las organizaciones a las que pertenecen dichas comunidades.

Actividad: Participación de hogares en giras (intercambio de experiencias, seminarios, congresos entre otros)	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

Departamentos de Intervención:

- Nariño
- Cauca
- Vichada
- Guainía

Cantidad de hogares a beneficiar: 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

Realizar un foro pedagógico – comercial, con invitados de organizaciones de alto impacto nacional e internacional en cada uno de los departamentos beneficiados por el programa IRACA en la zona 1, que permita integra beneficiarios, representantes de comunidades, y demás invitados.

Actividad: Entrega de activos productivos a los hogares participantes	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

Se realizará un análisis de las fichas de proyecto formuladas por las comunidades, y se procederá con las comunidades a la concertación de los insumos adicionales que serán entregados por el socio implementador en calidad de Contra-Partida.

Actividad: Acompañamiento especializado en el componente de PPC	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020

Descripción de la actividad a ejecutar:

Departamentos de Intervención:

- Nariño

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

- Cauca
- Vichada
- Guainía

Cantidad de hogares a beneficiar:

- 5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

Brindar apoyo y asesoría permanente a los 40 territorios colectivos beneficiados por el programa IRACA asignados a la zona 1, compuesta por los departamentos de Nariño, Cauca, Vichada y Guainía, a fin de fortalecer las competencias y capacidades de los beneficiarios en temas relacionados a sus proyectos implementados.

Plan de acción:

A causa de la diversidad de proyectos que surgen de la implementación de las actividades del programa IRACA, se hace necesario la contratación de una empresa especializada en temas relacionados a la formulación de proyectos e implementación de los mismos, la cual debe disponer de diversos profesionales especializados en cada una de las áreas que puedan surgir en los proyectos formulados por los beneficiarios.

Componente: FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	
Actividad: Inversión hogares	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020
Descripción de la actividad a ejecutar: Se realizará un análisis de las fichas de proyecto formuladas por las comunidades, y se procederá a la concertación de los insumos de contra-partida (600 hogares adicionales) propuestos por el socio implementador en la etapa precontractual.	
Actividad: Financiación de actividades complementarias a los proyectos productivos desarrollados por las comunidades	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020
Descripción de la actividad a ejecutar: Se realizará un análisis de las fichas de proyecto formuladas por las comunidades, y se procederá con las comunidades a la concertación de los insumos adicionales que serán entregados por el socio implementador en calidad de Contra-Partida.	
Actividad: Financiamiento de actividades complementarias a los proyectos de seguridad alimentaria desarrollados por las comunidades	**Fecha Estimada de entrega:** 30 de octubre de 2020
Descripción de la actividad a ejecutar: Se realizará un análisis de las fichas de proyecto formuladas por las comunidades, y se procederá con las comunidades a la concertación de los insumos adicionales que serán entregados por el socio implementador en calidad de Contra-Partida.	

SITUACIÓN HUMANITARIA Y DE ORDEN PÚBLICO

A continuación presentamos varias noticias reportadas por prensa escrita de diferentes medios de comunicación, tanto a nivel nacional como local, en la zona donde la UT tiene accionar en las comunidades



EL TIEMPO

SUSCRIBIRME

COLOMBIA | BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BOYACÁ LLANO MÁS CIUDADES

El Cauca está en alerta por el paro armado del Eln

Reportan varias situaciones, entre ellas quema de carro. Investigan muerte de un hombre en El Tambo.

El Tambo, uno de los municipios más afectados por la estructura guerrillera, en el Departamento del Cauca.
Foto: Archivo / EL TIEMPO

Ilustración 59 Situación de conflicto armado en el cauca



Semana

TENDENCIAS

CAUCA

ELN habría secuestrado a cuatro personas en Guapi, Cauca

Dos de los plagiados son empleados de la compañía Energizando S.A.S, que adelantaban labores de campo en una área rural de este municipio costero.

Ilustración 60 Situación de conflicto en Guapi - Cauca



Ilustración 61 Secuestro de contratistas en el Cauca



Ilustración 62 Situación de conflicto armado en el Cauca



Ilustración 63 Situación de conflicto armado en Nariño y Cauca



Ilustración 64 Municipios sin energía eléctrica

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

W RADIO La W Programas Ciudades Pico W Denuncie Personajes

Más de 340 personas desplazadas en Guapi, Cauca

La Unidad para las Víctimas evalúa la situación de cerca de 58 familias que salieron desplazadas por la presencia de grupos armados en la vereda Santa Ana.



Ilustración 65 Personas desplazadas en Guapi - Cauca



Ilustración 66 Desplazamiento forzado en Guapi Cauca

166



Semana

Ministra Alicia Arango dice que "los asesinos salen en cuarentena sin permiso"

La ministra del Interior reconoció que durante la época del confinamiento han aumentado los homicidios en el departamento del Cauca y anunció que se harán mayores esfuerzos para parar los asesinatos.

En el departamento del Cauca los asesinatos no paran y lo más grave es que en medio de la cuarentena la cifra de homicidios ha ido en aumento. Por ejemplo, este sábado una niña de nueve meses y su padre fueron atacados a tiros en zona rural de Suárez (Cauca) mientras se movilizaban en una motocicleta.

Una de las hipótesis que se maneja en este caso es que los grupos armados ilegales que operan en esta zona atacaron a esta familia por, supuestamente, estar violando la cuarentena ya que, además de las disposiciones del Gobierno, estos grupos al margen de la ley pusieron sus propias reglas en ese territorio.

NOTICIAS RELACIONADAS

Polémica por concejal que agredió a correazos a un joven en Santander

Ilustración 69 Situación de orden público y COVID-19 en Cauca

MATRIZ DE RIESGO ACTUALIZADO

En el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1pIfpjSKd1Hqibk2AH32FwcMxjY4grG0n?usp=sharing se cargó archivo Excel que contiene la matriz de riesgos actualizados.

Es importante tener en cuenta que la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, ha estado siempre atenta y presta al cumplimiento de las metas y de las obligaciones contractuales derivadas del convenio No. 213 de 2019, para ello se estarán realizando planes estratégicos, que nos permitan avanzar de una manera sustancial en la ejecución de las actividades.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Cordialmente,

PAOLA ANDREA PINZON AGUDELO
Representante Legal Unión Temporal
U.T. Prosperidad Iraca Zona 1

JAMES ARIAS GOMEZ
Coordinador Zonal
U.T. Prosperidad Iraca Zona 1
