INFORME TÉCNICO No. 023

Programa IRACA



Fecha de Corte del Informe: 30/07/2021

5.280

HOGARES

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ***15***

ETAPA DE ALISTAMIENTO: ***17***

PROCESO: Selección y contratación del Equipo Zonal y Local **17**

PROCESO: Contratación de Oficinas y Espacios **21**

ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN: ***26***

PROCESO: Socialización y Concertación con Autoridades **26**

PROCESO: Socialización a Comunidades **36**

ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACIÓN: ***24***

PROCESO: Vinculación de hogares **24**

PROCESO: Caracterización de Entrada **29**

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS: ***34***

PROCESO: ICOE de entrada **34**

PROCESO: Visión de Desarrollo **49**

PROCESO: Diagnóstico Comunitario **59**

PROCESO: Formulación de Proyectos **74**

ETAPA: VALIDACION Y ASIGNACION DE RECURSOS *¡Error! Marcador no definido.*

PROCESO: Asignación de Recursos **79**

PROCESO: Socialización de Proyectos **85**

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ***89***

PROCESO: Entregas **93**

COMITES TÉCNICOS REGIONALES ***104***

COMITES TECNICOS NACIONALES ***105***

COMITES DE CONTROL SOCIAL ***106***

OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA: *¡Error! Marcador no definido.*

¡Error! Marcador no definido.

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Meta programada – meta alcanzada del Equipo Zonal Iraca z1 contratado 17
Ilustración 2Meta programada – meta alcanzada del Equipo Local Iraca z1 contratado.....18
Ilustración 3 Evidencias fotográficas 2da jornada de transferencia.....20
Ilustración 4 Evidencias fotográficas Oficina Zonal- Bucaramanga 23
Ilustración 5 Evidencias fotográficas Oficina Local Guainía 24
Ilustración 6 Evidencias fotográficas Oficina Local Cauca 24
Ilustración 7 Evidencias fotográficas Oficina Local Nariño.....25
Ilustración 8 Evidencias fotográficas Oficina Local Vichada.....26
Ilustración 9 Socialización y Concertación a Autoridades - Guainía.....27
Ilustración 10 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades - Guainía27
Ilustración 11 Socialización y Concertación a Autoridades – Cauca.....28
Ilustración 12 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades - Cauca..28
Ilustración 13 Socialización y Concertación a Autoridades – Cumaribo, Vichada 29
Ilustración 14 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Cumaribo, Vichada.....29
Ilustración 15 Socialización y Concertación a Autoridades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada.....30
Ilustración 16 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada 30
Ilustración 17 Socialización y Concertación a Autoridades – Ricaurte, Nariño.....31
Ilustración 18 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Ricaurte, Nariño.....31
Ilustración 19 Socialización y Concertación a Autoridades – Tumaco, Nariño 32
Ilustración 20 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Tumaco, Nariño.....33
Ilustración 21 Socialización y Concertación a Autoridades – El Charco, Nariño 33
Ilustración 22 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – El Charco, Nariño 34
Ilustración 23 Socialización y Concertación a Autoridades – Barbacoas, Nariño.....34
Ilustración 24 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Barbacoas, Nariño 35
Ilustración 25 Socialización a Comunidades - Guainía 36
Ilustración 26 Socialización a Comunidades - Cauca 20
Ilustración 27 Socialización a Comunidades Municipio de Cumaribo - Vichada 20
Ilustración 28 Socialización a comunidades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada.....21
Ilustración 29 Socialización a Comunidades – Tumaco, Nariño 21
Ilustración 30 (Socialización a Comunidades – El Charco, y Barbacoas- Nariño).....22
Ilustración 31 (Socialización a Comunidades – Ricaurte) 22

Ilustración 32 Socialización A Comunidades por Departamentos 23
Ilustración 33 Meta programada – meta alcanzada Socialización a Comunidades 23
Ilustración 34 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento del Cauca 25
Ilustración 35 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento de Nariño 25
Ilustración 36 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamentos de Vichada y Guainía 26
Ilustración 37 Vinculados Inscritos en KOKAN, IRACA Zona 1 26
Ilustración 38 Ejercicio de Vinculación de Hogares (Consejo Comunitario Tribuna del Pueblo – El Charco – Departamento de Nariño) 27
Ilustración 39 Jefe de Hogar por Genero 27
Ilustración 40 Media de edad por Genero miembros de Hogar 28
Ilustración 41 Nivel de Escolaridad Población beneficiaria programa IRACA 28
Ilustración 42 Total hogares caracterizados y validados en Kokan 30
Ilustración 43 Déficit en disponibilidad de alimento Departamento del Cauca 30
Ilustración 44 Déficit en disponibilidad de alimento Departamento de Nariño 31
Ilustración 45 Déficit en disponibilidad de alimento Departamento de Vichada y Guainía 31
Ilustración 46 Fuentes de obtención de alimentos Departamento de Cauca 32
Ilustración 47 Fuentes de obtención de alimentos Departamento de Nariño 32
Ilustración 48 Fuentes de obtención de alimentos Departamento de Vichada y Guainía 33
Ilustración 49 Promedio de gastos en los territorios Departamento de Cauca 33
Ilustración 50 Promedio de gastos en los territorios Departamento de Nariño 34
Ilustración 51 Promedio de gastos en los territorios Departamento de Guainía y Vichada 34
Ilustración 52 ICOEs – Nariño 35
Ilustración 53 Resultados ICOEs – Nariño 36
Ilustración 54 Actividad de ICOE (Consejo Comunitario Bajo Mira y frontera – Tumaco-Departamento de Nariño) 38
Ilustración 55 Descripción de indicadores ICOE, resguardos de Ricaurte 39
Ilustración 56 Descripción de Promedios General de Icoes, resguardos de Ricaurte 43
Ilustración 57 Descripción de Promedios General de Icoes, resguardo de Barbacoas 43
Ilustración 58 ICOEs Municipio Puerto Inírida - Guainía 44
Ilustración 59 Resultado ICOE Puerto Inírida - Guainía 45
Ilustración 60 ICOEs – Cauca 45
Ilustración 61 Resultados ICOEs – Cauca 46
Ilustración 62 ICOEs – Vichada 47
Ilustración 63 Resultados de ICOE - Vichada 47
Ilustración 64 Visión de Desarrollo – Nariño 51
Ilustración 65 Resultados Visión de Desarrollo – Nariño 51
Ilustración 66 Descripción de visiones de la comunidad, resguardos de Ricaurte y Barbacoas 53
Ilustración 67 Visión de Desarrollo Municipio Puerto Inírida - Guainía 54
Ilustración 68 Resultados Visión de Desarrollo - Guainía 55
Ilustración 69 Visiones de Desarrollo – Cauca 55
Ilustración 70 Resultados Visión de Desarrollo - Cauca 56

Ilustración 71 Desarrollo de la Actividad de Visión de Desarrollo (Consejo Comunitario Renacer Negro – Timbiquí- Departamento del Cauca) 57
Ilustración 72 Visión de Desarrollo – Vichada 57
Ilustración 73 Resultados Visión de Desarrollo - Vichada 58
Ilustración 74 Diagnósticos Comunitarios - Nariño 60
Ilustración 75 Acciones necesarias por componentes, Tumaco – Nariño 63
Ilustración 76 Acciones necesarias por componente, El Charco – Nariño 64
Ilustración 77 Diagnósticos Comunitarios realizados – Guainía 69
Ilustración 78 Acciones necesarias por componente – Guainía 70
Ilustración 79 Diagnósticos comunitarios realizados – Cauca 71
Ilustración 80 Acciones necesarias por componente - Cauca 72
Ilustración 81 Diagnósticos Comunitarios - Vichada 74
Ilustración 82 Acciones necesarias por componente, Municipio de Puerto Carreño, Vichada 76
Ilustración 83 Acciones necesarias por componente, Municipio La Primavera – Vichada 77
Ilustración 84 Acciones necesarias por componente, Municipio de Cumaribo – Vichada 73
Ilustración 85 Asesinato de líderes en el cauca ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 86 Situación de conflicto armado en el cauca ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 87Situación de conflicto en Guapi – Cauca ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 88 Secuestro de contratistas en el Cauca ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 89 confinamiento en Nariño ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 90 Secuestro y muerte en Nariño ..... **¡Error! Marcador no definido.**

LISTA DE TABLAS

Tabla 1Primera Transferencia metodológica al Equipo Local 19
Tabla 2 Segunda Transferencia metodológica al Equipo Local 20
Tabla 3 Elementos de dotación y suministro de oficina zonal 23
Tabla 4 Elementos de dotación y suministro de oficina local Guainía 23
Tabla 5 Elementos de dotación y suministro de oficina local Cauca 24
Tabla 6 Elementos de dotación y suministro de oficina local Nariño 25
Tabla 7 Elementos de dotación y suministro de oficina local Vichada 25
Tabla 8 Resumen del Estado de las Vinculaciones de Hogares Zona 1 24
Tabla 9 Territorios Colectivos con ICOE de entrada desarrollado 39
Tabla 10 Visión de desarrollo realizados en los 4 Departamentos 50
Tabla 11 Diagnósticos comunitarios realizados en Nariño 65
Tabla 12 Diagnósticos comunitarios por territorio colectivo – Cauca 72
Tabla 13 Diagnósticos Comunitarios por Territorio Colectivo – Vichada 75
Tabla 14 Fichas de Proyectos Iraca z1 entregadas acumuladas a septiembre 2020 a Prosperidad Social 78

CARPETAS DRIVE

- Transferencia Metodológica
- Socialización y Concertación con Autoridades Étnicas
- Socialización y Concertación con comunidades
- Vinculaciones y Caracterizaciones
- ICOES de Entrada
- Visión de Desarrollo
- Diagnostico Comunitario
- Formulación de Fichas de Proyectos
- Asignación de Recursos
- Socialización de Proyectos
- Acompañamiento
- Entregas
- Cierres de Proyectos
- Cierre del Programa

INFORME TÉCNICO No. 023
Programa Iraca Intervención No 4
Fecha de Corte del Informe: 31/07/2021

Convenio No.	**213 de 2019**
Suscrito entre:	Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1
Fecha inicio de Convenio:	17/09/2019
Fecha fin de Convenio:	30/07/2021
Valor total de Convenio:	$ 46.281.342.831
Valor total Recursos PS Desembolsados	$ 43.064.836.081
Zona:	1 (Uno)
No. Total, de Hogares a Atender:	5.280
No. de Informe:	023

INTRODUCCIÓN

El convenio de asociación 213 del 17 de septiembre de 2019, firmado entre el Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, tiene por objeto*: "Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL—y el ASOCIADO, dirigidos a la implementación del Programa IRACA en aras de disminuir las afectaciones de acceso a alimentos, debilitamiento comunitario y generación de ingresos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas producidas por el conflicto armado focalizados por PROSPERIDAD SOCIAL ".* Estos beneficiarios se focalizaron para la zona 1 en los Departamentos y municipios:

- Nariño: El Charco, Barbacoas, San Andrés de Tumaco, y Ricaurte
- Cauca: Guapi y Timbiquí
- Vichada: Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo
- Guainía: Puerto Inírida.

Para el cumplimiento del presente objeto, el programa se desarrolla en etapas, procesos, indicadores y metas que se encuentran vinculadas y aprobadas en el Plan Operativo Anual (POA), enmarcándose en la cronología del programa o línea de tiempo y el presupuesto dado para el mismo, el cual permite su ejecución.

Aprobado el POA, se convalidan las diferentes etapas, procesos, indicadores y metas que corresponden a las gestiones desarrolladas en el mes de Noviembre de 2020 y que convergen dentro de la estructura del mismo para el logro de los objetivos trazados del programa, este permite realizar el respectivo seguimiento cronológico de cada una de sus actividades, sin dejar atrás la situación de cuarentena presentada durante los últimos días desde el mes de Marzo a Agosto, las cuales a causa de la pandemia COVID-19 afectó a la humanidad, al punto que el Gobierno Colombiano declaró el estado emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, y, en virtud de la misma, adoptó serias medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, y mitigar sus efectos. A su vez el Decreto 457 de 2020, "Por

el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", ordenó en su artículo primero el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a su vez, mediante Circular Externa 0018 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se emitieron una serie de instrucciones relativas a las "acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias", ordenó "Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias personas para evitar el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y COVID-19", por otra parte la Resolución No. 00639 del 30 de marzo de 2020, emitida por Prosperidad Social, se expresa: "Los contratistas, operadores y Asociados de Prosperidad Social, no podrán suspender o terminar anticipadamente, contratos laborales, contratos de prestación de servicios personales y profesionales, y de apoyo a la gestión celebrados para la ejecución de los programas y proyectos contratados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, hasta que la emergencia sanitaria sea superada, salvo que la suspensión y terminación anticipada sea solicitada por el contratista o se presente alguna de las causales de terminación anticipada"

Lo anterior conllevo a que el Socio Implementador Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, en el periodo de mayo 2020, obtuviera la firma del otro si y el ajuste del anexo técnico. Este continúo construyendo la metodología pertinente junto a Prosperidad Social, además de adoptar las alternativas que le permitirán dar cumplimiento a lo ordenado por el Gobierno Nacional y Prosperidad Social, a su vez que le permitió adelantar actividades administrativas, técnicas y financieras de los equipos en casa, que siguieron revisando la calidad de los medios de verificación de las actividades hechas antes del 20 de marzo.

Por otra parte, el socio implementador Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, para la ejecución de las actividades del programa continuo adoptando el modelo gerencial KAIZEN – MEJORAMIENTO CONTINUO –, el cual a través de los procesos denominados P. H. R. A. (Planear, Hacer, Revisar y Actuar), y basados en la exigencia para mantener altos estándares de gestión, aprovechamiento del tiempo y aumento en la producción de cada funcionario, nos permitirá avanzar en la correcta realización de las actividades del programa con la pandemia actual que afecta a la humanidad, y con esto dar cumplimiento a las metas establecidas.

A continuación, se evidencia el estado de ejecución de las actividades en campo a corte 30 de Julio de 2021:

ETAPA DE ALISTAMIENTO:

ETAPA: ALISTAMIENTO
PROCESO: Selección y contratación del Equipo Zonal y Local
INDICADOR: *Número de personas contratadas*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Matriz de Excel con la relación del personal contratado, hojas de vida y copia escaneada de los contratos suscritos.*
META PROGRAMADA: *177 personas*
META EJECUTADA: *177 personas*

De acuerdo a lo contractualmente establecido, y a lo definido en la matriz POA, para el presente proceso se contempló la contratación de 17 personas a fin de conformar el equipo zonal y 160 personas a fin de conformar el equipo local del programa, para lo cual el socio implementador para el actual periodo logró el cumplimiento de la meta establecida en un 100%, tal como se grafica a continuación:

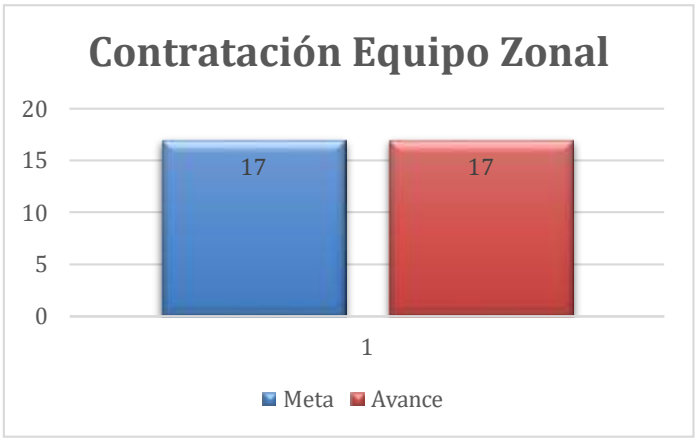


Ilustración 1 Meta programada – meta alcanzada del Equipo Zonal Iraca z1 contratado

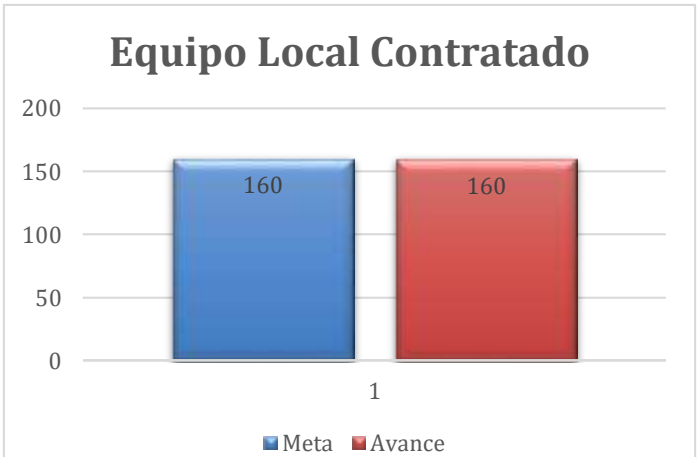


Ilustración 2 Meta programada – meta alcanzada del Equipo Local Iraca z1 contratado

Las anteriores graficas ilustran meta establecida versus el avance logrado en la ejecución del proceso de contratación del equipo zonal y local, a su vez, el detalle se encuentra soportado en los diferentes informes financieros remitidos a Prosperidad Social y las diferentes bases de contratación remitida

Evidencia que soporta el proceso:

- Informes técnicos mensuales
- Base de datos de profesionales contratados remitidas en los informes financieros
- Informes financieros que dan muestra del personal contratado.

ETAPA: ALISTAMIENTO
PROCESO: *Transferencia al equipo Local*
INDICADOR: *Número de talleres*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Documento metodológico, Programación Informe de la actividad, registro fotográfico, y listados de asistencia.*
META PROGRAMADA: 5
META EJECUTADA: 5

Se realizaron 5 jornadas de transferencia metodológica en dos diferentes momentos. Inicialmente se alcanzó el 100% de la transferencia a los 4 equipos locales (Cauca, Nariño, Vichada y Guainía), en el mes de noviembre de 2019, como se resume a continuación:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA TRANSFERENCIA	LUGAR DEL EVENTO	No. PARTICIPANTES
CAUCA	GUAPI	15 y 16 de noviembre	Instituto de Investigación Ambiental del Pacifico Calle 4 No.	17

		2019	1-19	
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	17 y 18 de noviembre 2019	Hotel Sultana Calle 14 No.9B-112	27
GUAINIA Y VICHADA	VILLAVICENCIO –META	25 y 26 de noviembre 2019	Hotel El Caimito, Carrera 35 No. 26ª-16	18

Tabla 1 Primera Transferencia metodológica al Equipo Local

Esta Transferencia Metodológica a los equipos locales, iniciaron el día 15 de noviembre en el municipio de Guapi Cauca y terminaron el 26 de noviembre en el municipio de Villavicencio Meta en jornadas de dos días, con el equipo local de Guainía y Vichada, tal como lo muestra la tabla anterior, cumpliendo con lo establecido en el Plan Operativo Anual.

Las jornadas contaron con la participación activa de los Gestores Sociales, Gestores Productivos, Profesionales Sociales y Profesionales Productivos, y coordinadores locales de cada uno de cada una de las regiones a intervenir. Cada actividad estructuro una agenda de trabajo, documento metodológico y obtuvo listados de asistencia.

El equipo zonal y de la Unión Temporal del programa Iraca Z1, fueron los encargados de transmitir la información del programa a los asistentes, realizando la presentación del programa con todos sus componentes en la fase pre y operativa, entregando físicamente los formatos que deben ser utilizados en campo y la explicación del diligenciamiento de cada uno de ellos, realizando durante la jornada talleres prácticos que facilitarían en desarrollo de las actividades en campo, igualmente fue creado el correo electrónico IRACAZ12019N@GMAIL.COM, suministrando la clave para que desde allí pudieran obtener todas las memorias de la transferencia y los formatos a utilizar en las actividades propias de cada uno de los componentes.

Adicionalmente fue realizada una Transferencia Metodológica virtual a los Coordinadores Locales de los Departamentos de Cauca, Guainía, Nariño y Vichada, junto con el Especialista Pecuario entrante, el día 7 de noviembre de 2019 a partir de las 9:00 A.M. en las instalaciones del Hotel Golden Tag, ubicado en la Carrera 40 No.25-05 de la ciudad de Bogotá, donde contamos con el apoyo de prosperidad social, en cabeza de la supervisora del programa Mauren Mendivelso y el apoyo de la parte técnica del funcionario Edwin Gutiérrez.

En una segunda Jornada de transferencia del componente metodológico con énfasis para la Etapa de Formulación de Proyectos, se desarrolló esta actividad con cada uno de los 4 equipos locales, alcanzando un 100% de la meta programada en el mes de marzo de 2020, como se resume a continuación:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO DE REALIZACIÓN	FECHA TRANSFERENCIA	LUGAR DEL EVENTO	No. PARTICIPANTES
NARIÑO	EL CHARCO	14 – 15 de marzo 2020	Casa de Gobierno Consejo Comunitario Mayor Prodefensa– Rio Tapaje	12
	SAN ANDRES DE TUMACO	18– 19 de marzo 2020	Oficina de la UT PROSPERIDAD IRACA	25
GUAINIA	PUERTO INIRIDA	22-23 de marzo 2020	Oficina de la UT PROSPERIDAD Modo virtual	12
VICHADA	LA PRIMAVERA	17– 19 de marzo 2020	Oficina de la UT PROSPERIDAD IRACA	12
CAUCA	GUAPI	15 de abril 2020	Virtual	22
	TIMBIQUI	21 de abril 2020	Virtual	15

Tabla 2 Segunda Transferencia metodológica al Equipo Local

La segunda Transferencia Metodológica al equipo local se realizó en los municipios de El Charco y Tumaco del departamento de Nariño y La Primavera del Departamento de Vichada de modo presencial en las oficinas del socio implementador UT prosperidad IRACA Z1, y de modo virtual la transferencia al equipo local del Departamento de Guainía y Cauca, tal como lo muestra la tabla anterior, dando así, cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Anual, donde se contó con la participación activa de los Gestores Sociales, Gestores Productivos, Profesionales Sociales y Profesionales Productivos, y coordinadores locales de las regiones focalizadas en la zona 1.

El equipo zonal de la Unión Temporal del programa Iraca Z1, fue el encargado de transmitir la información del programa a los asistentes, realizando la presentación del programa con todos sus componentes con énfasis en la Formulación de Proyectos, haciéndoles entrega física de los formatos que deben ser utilizados en campo y la explicación del diligenciamiento de cada uno de ellos, realizando durante la jornada talleres teórico-prácticos que facilitarían en desarrollo de las actividades en campo.





Ilustración 3 Evidencias fotográficas 2da jornada de transferencia

Evidencia que soporta el proceso:

- Documento Metodológico
- Listado de Asistencia
- Agenda
- Presentación - Videos
    - Primera Parte: https://youtu.be/vUUlFQwefAw
    - Segunda Parte: https://youtu.be/zwq-i7c4NU4
    - Tercera Parte: https://youtu.be/0SUEjZ0iKak
    - Cuarta Parte: https://youtu.be/7nGX13B2Umw
    - Quinta Parte: https://youtu.be/A2LqNRq-678
    - Sexta Parte: https://youtu.be/wZPhaFotXqw
    - Séptima Parte: https://youtu.be/E934YsSb6gI
    - Octava Parte: https://youtu.be/fKeletNFWNg
    - Novena Parte: https://youtu.be/0z_owFj9kMM
    - Décima Parte: https://youtu.be/BiboKk3MBPo
    - Onceava Parte: https://youtu.be/V6VreaF6sHY
    - Doceava Parte: https://youtu.be/wMKv-kt1YwU
    - Treceava Parte: https://youtu.be/tI6CQOj7TqM
    - Catorceava Parte: https://youtu.be/38hfgwXHdko

- Evidencias del proceso de realización: https://drive.google.com/drive/folders/1uflNL1eGSO3EmcErb7vqrvhqRXGZU2wn?usp=sharing

ETAPA: ALISTAMIENTO
PROCESO: *Contratación de Oficinas y Espacios*
INDICADOR: *Número de Oficinas contratadas*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Contratos de Arrendamiento.*
META PROGRAMADA: 5
META EJECUTADA: 5

Para el presente periodo de corte, se alcanzó la meta del 100% al tener el contrato de arrendamiento de las oficinas locales ubicadas en los municipios de Tumaco, Puerto Inírida, Guapi y La Primavera, además de la oficina zonal ubicada en la ciudad de Bucaramanga.

En concordancia con lo establecido en el POA y en las obligaciones del Convenio, la contratación de oficinas y espacios abarca aspectos relacionados con la disponibilidad de oficinas o espacios para los puestos de trabajo, dotación de papelería, apoyo logístico y demás. Para llevar a cabo estas actividades se realizó la celebración de contrato de Outsourcing No. 0031 con la empresa Fast Work Colombia S.A.S. para el alquiler de bienes muebles e inmuebles para el

funcionamiento de oficinas bajo la modalidad de arrendamiento, es así que desde el mes de noviembre de 2019 se cuenta con los espacios locativos con las condiciones expuestas, los cuales se encuentran ubicados en Municipio la Primavera- Vichada (Cra 7 Calle 6 Barrio Bello Horizonte), Municipio Puerto Inírida - Guainía (Cra 6 # 6-17 Barrio Berlín), Municipio de Guapi – Cauca (Barrio El Pueblito) y Municipio de Tumaco – Nariño (Calle nueva creación), espacios designado para el Equipo Local del Programa Iraca. En cuanto a la oficina zonal, desde el mes de noviembre de 2019 hasta el mes de marzo de 2020, funciono en la Cra 28c N° 84-20 de la ciudad de Bogotá, y desde el mes de abril de 2020 hasta la fecha ha venido funcionando en la Cra 34 N° 52-60 de la ciudad de Bucaramanga.

Oficina Equipo Zonal

La oficina del equipo zonal se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga, entro en operación en el mes de abril de 2020, pero desde el mes de noviembre de 2019 hasta el mes de marzo de 2020, estuvo funcionando en la ciudad de Bogotá. Esta contiene los siguientes bienes muebles a su disposición:

IMPLEMENTOS	CANTIDAD
Equipos de cómputo Asus Core i5	16 un.
Equipos de cómputo Asus Core i7	11 un.
Pantalla Asus ccaoo45271191	1 un.
Pantalla Samsung ls22f350fhlxzl	1 un.
Pantalla Samsung s2273507hl	1 un.
Computador de mesa 912ntle81864	2 un.
Internet router	4 un.
Impresora Samsung M2070	2 un.
Impresora e-STUDIO 5560C Toshiba	1 un.
Teclados para computador	3 un.
Tóner	7 un.
Televisor Samsung (sala de juntas)	1 un.
Ventiladores	29 un.
Sillas ergonómicas tipo oficina	30 un.
Gabinete F50	27 un.
Escritorios James S1	28 un.
Escritorios tipo oficina en madera	6 un.
Sillas para oficina	5 un.
Sillas plásticas Rimax	10 un.
Mesas Rimax	4 un.
Sillas de espera	1 de tres puestos
Sillas de juntas	20 un.
mesa de juntas en madera	1 un.
Papelera en acero inoxidable	32 un.
Aires acondicionados	4 un.

Escalera portátil en acero	1 un.
Archivadores A-Z tamaño carta papier	40 un.
Archivadores A-Z tamaño oficio papier	30 un.

Tabla 3 Elementos de dotación y suministro de oficina zonal

También cuenta con los elementos generales de funcionamiento y de dotación (tintas, lapiceros, papel, tóner, demás elementos de papelería y de aseo, y bienes de consumo los cuales son suministrados cada mes los artículos consumibles y los elementos deteriorados son repuestos cada dos o tres meses por la empresa Fast Work.





Ilustración 4 Evidencias fotográficas Oficina Zonal- Bucaramanga

Oficina Equipo Local Guainía

La oficina del equipo local se encuentra ubicada en la ciudad de Puerto Inírida, funciona desde el mes de noviembre de 2019, y contiene los siguientes bienes muebles a su disposición:

IMPLEMENTOS	CANTIDAD
Equipos de cómputo Asus Core i5	2 un.
Escritorio de madera	2 un.
Sillas ergonómicas tipo oficina	2 un.
Sillas Rimax	15 un.
Mesa de caribe	3 un.
Ventiladores	2 un.
Impresora Samsung M2070	1 un.

Tabla 4 Elementos de dotación y suministro de oficina local Guainía

La oficina local de Guainía cuenta con los elementos generales de funcionamiento y de dotación (tintas, lapiceros, papel, tóner, demás elementos de papelería y de aseo, y bienes de consumo), los cuales son suministrados cada mes los artículos consumibles y los elementos deteriorados son repuestos cada dos o tres meses por la empresa Fast Work.



Ilustración 5 Evidencias fotográficas Oficina Local Guainía

Oficina Equipo Local Cauca

La oficina del equipo local se encuentra ubicada en la ciudad de Guapi, funciona desde el mes de noviembre de 2019 y contiene los siguientes bienes muebles a su disposición:

IMPLEMENTOS	CANTIDAD
Equipos de cómputo Asus Core i5	2 un.
Mesa de escritorio	2 un.
Sillas ergonómicas tipo oficina	2 un.
Ventiladores	4 un.
Impresora M2070	1 un.
Mesas Rimax	3 un.
Sillas Rimax	9 un.

Tabla 5 Elementos de dotación y suministro de oficina local Cauca

La oficina local de Cauca cuenta con los elementos generales de funcionamiento y de dotación (tintas, lapiceros, papel, cintas, perforadoras, tóner, demás elementos de papelería y de aseo, y bienes de consumo), los cuales son suministrados cada mes los artículos consumibles y los elementos deteriorados son repuestos cada dos o tres meses por la empresa Fast Work.



Ilustración 6 Evidencias fotográficas Oficina Local Cauca

Oficina Equipo Local Nariño

La oficina del equipo local se encuentra ubicada en la ciudad de Tumaco, funciona desde el mes

de noviembre de 2019 y contiene los siguientes bienes muebles a su disposición:

IMPLEMENTOS	CANTIDAD
Equipos de cómputo Asus Core i5	4 un.
Impresora M2070	2 un.
Sillas Rimax	30 un.
Mesas Rimax	6 un.
Escritorio de madera	2 un.
Ventiladores	5 un.
Sillas ergonómicas tipo oficina	3 un.

Tabla 6 Elementos de dotación y suministro de oficina local Nariño

El Equipo Local de San Andrés de Tumaco, cuenta con los elementos generales de funcionamiento y de dotación (tintas, lapiceros, papel, cintas, perforadoras, tóner, huelleros, tablas de apoyo, demás elementos de papelería y de aseo, y bienes de consumo), los cuales son suministrados cada mes los artículos consumibles y los elementos deteriorados son repuestos cada dos o tres meses por la empresa Fast Work.





Ilustración 7 Evidencias fotográficas Oficina Local Nariño

Oficina Equipo Local Vichada

La oficina del equipo local se encuentra ubicada en la ciudad de La Primavera, funciona desde el mes de noviembre de 2019 y contiene los siguientes bienes muebles a su disposición:

IMPLEMENTOS	CANTIDAD
Equipos de cómputo Asus Core i5	3 un.
Impresora M2070	2 un.
Sillas Rimax	30 un.
Mesas Rimax	6 un.
Escritorio de madera	1 un.
Ventiladores	2 un.
Sillas ergonómicas tipo oficina	1 un.

Tabla 7 Elementos de dotación y suministro de oficina local Vichada

Para el funcionamiento del Equipo Local de Vichada, se estableció la oficina en la, ciudad de la Primavera, la cual cuenta con los elementos generales de funcionamiento y de dotación (tintas, lapiceros, papel, cintas, perforadoras, tóner, huelleros, tablas de apoyo, demás elementos de papelería y de aseo, y bienes de consumo), los cuales son suministrados cada mes los artículos consumibles y los elementos deteriorados son repuestos cada dos o tres meses por la empresa Fast Work.



Ilustración 8 Evidencias fotográficas Oficina Local Vichada

ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN:

ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN
PROCESO: *Socialización y Concertación con Autoridades*
INDICADOR: Número de encuentros de socialización del programa IRACA y concertación de entrada al territorio con las autoridades
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de socialización y concertación IRACA, Registro Fotográfico y Listados de asistencia
META PROGRAMADA: 40 Territorios colectivos
META EJECUTADA: 40 Territorios colectivos

El presente proceso se encuentra en un 100% de cumplimiento de la meta establecida, el cual a su vez fue remitido a Prosperidad Social para su revisión y se encuentra con un estado actual de "Aprobado", con un total de 40 territorios colectivos socializados y concertados con Autoridades étnicas para los Resguardos indígenas y Consejos Comunitarios de los Departamentos de Cauca, Nariño, Vichada y Guainía.

A continuación, se presentan los territorios colectivos por municipio, donde se realizó la socialización y concertación a autoridades.

En la siguiente ilustración se observa los dos territorios colectivos socializados y concertados con las autoridades en el municipio de Puerto Inírida, Departamento de Guainía. En el Resguardo Indígena Paujil se contó con la presencia del gobernador y los capitanes de las comunidades microfocalizadas (Cucurital, Platanillal y Cimarrón). En el Resguardo Atabapo, se socializó y concertó con el Capitán y líderes de la comunidad Concordia. Esta comunidad presenta una particularidad: inicialmente solicitó ser admitida por el Resguardo Almidón y

no fue aceptada; Posteriormente, se realizó la misma solicitud al Resguardo Atabapo y en octubre de 2019, se contaba con la aceptación por parte del cabildo, sin embargo, el proceso no estaba 100% legalizado.

Puerto Inírida:

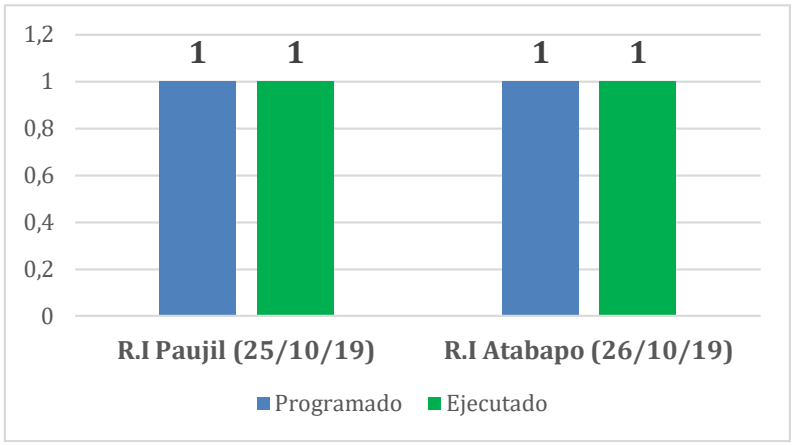


Ilustración 9 Socialización y Concertación a Autoridades - Guainía





Ilustración 10 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades - Guainía

En el departamento de Cauca, se realizó la socialización y concertación a autoridades en 5 Consejos Comunitarios del municipio de Guapi y uno en el municipio de Timbiquí, tal como se muestra a continuación:

Guapi – Timbiquí:

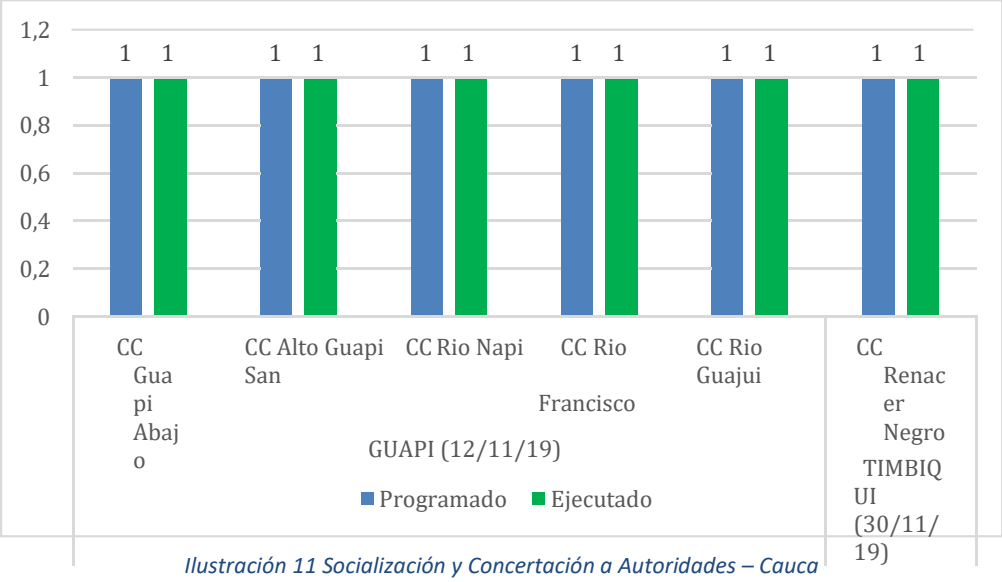


Ilustración 11 Socialización y Concertación a Autoridades – Cauca



Ilustración 12 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades - Cauca

En el departamento de Vichada, esta actividad se llevó a cabo en los nueve (9) resguardos indígenas distribuidos en los municipios de Cumaribo, Puerto Carreño y La Primavera.

En la siguiente ilustración, se presentan los Resguardos Indígenas del municipio de Cumaribo, donde se desarrolló la socialización y concertación con autoridades y líderes comunitarios.

Cumaribo:

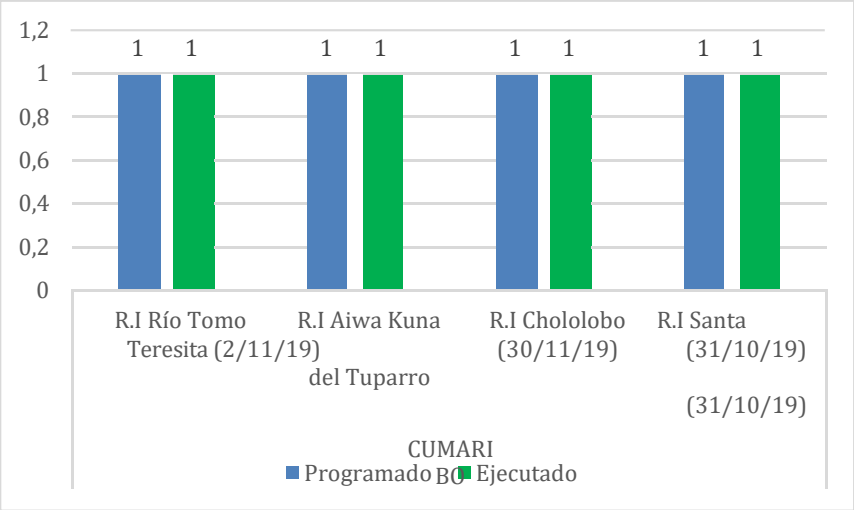


Ilustración 13 Socialización y Concertación a Autoridades – Cumaribo, Vichada





Ilustración 14 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Cumaribo, Vichada

En el municipio de Puerto Carreño, se socializó y concertó con las autoridades y líderes comunitarios de los Resguardos Indígenas de Caño Guaripa y Caño Mesetas Dagua. De igual manera, en los resguardos El Trompillo, Campoalegre y Riapialito y Yajota del municipio de La Primavera.

Puerto Carreño – La Primavera:

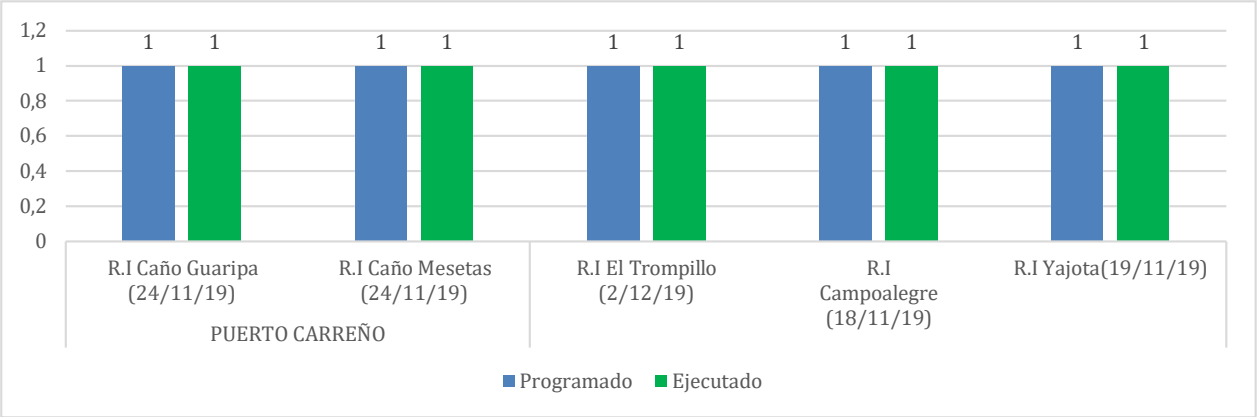


Ilustración 15 Socialización y Concertación a Autoridades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada



Ilustración 16 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada

En el departamento de Nariño, esta actividad se llevó a cabo en veintitrés (23) territorios colectivos pertenecientes a los municipios de Ricaurte, Tumaco, El Charco y Barbacoas.

En el municipio de Ricaurte, en el mes de noviembre de 2019 se realizó la socialización y concertación con los Gobernadores Mayores y menores de los once (11) resguardos, en la casa comunitaria de la Asociación CAMAWARI, de la cual todos hacen parte, donde manifestaron que las decisiones en torno al Programa IRACA, serán tomadas en conjunto.

Ricaurte:

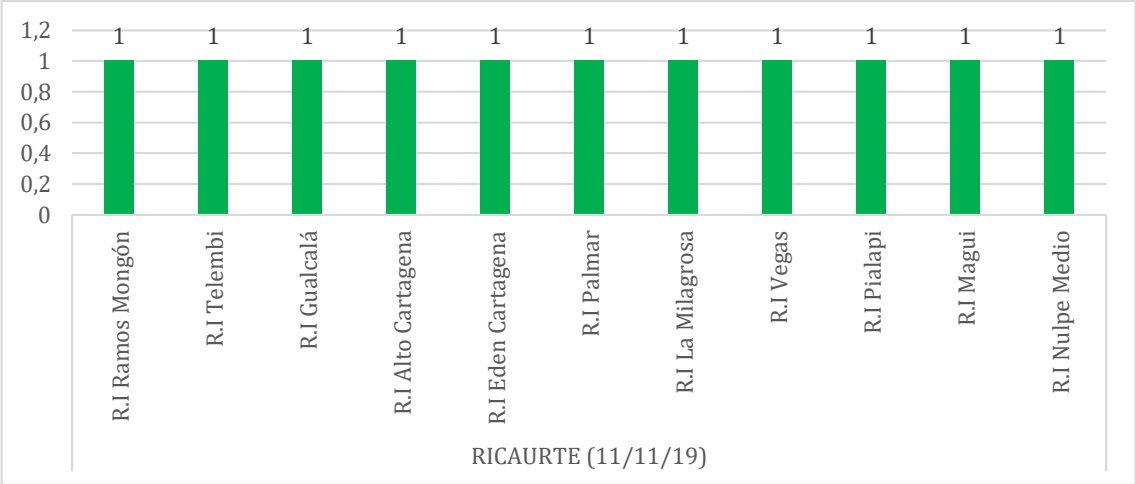


Ilustración 17 Socialización y Concertación a Autoridades – Ricaurte, Nariño





Ilustración 18 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Ricaurte, Nariño

A pesar que, la socialización y concertación fue exitosa, en los meses de diciembre 2019 y enero 2020, hubo cambio de Gobernadores y los actuales solicitaron aclaración de dudas, solicitud de un coordinador para Ricaurte y que para la selección del equipo de gestores deben ser tenidos en cuenta los técnicos y profesionales de los resguardos. Para ello, se llevó a cabo una reunión el día 23 de enero de 2020, dirigida por la coordinadora local, en la que también solicitaban 2 enlaces más.

Posteriormente, se convocó a una nueva reunión el 29 de febrero del presente año, donde se aclararon las dudas y se acordó que el personal para ejercer el cargo de Gestor, sería de los resguardos o en su defecto del municipio de Ricaurte, contando con el aval de los gobernadores, y cumpliendo con el perfil exigido en el anexo técnico del programa. Para ello, se tiene en cuenta el decreto 1083 de 2015 de Convalidación de Títulos y el decreto 2365 de 2019, que reglamenta la contratación de jóvenes profesionales sin experiencia laboral. Además, solicitaron 2 enlaces adicionales: uno para el resguardo Palmar y otro para el resguardo Pialapí, argumentando la distancia entre comunidades y dispersión de hogares.

En el municipio de Tumaco, se realizó en el mes de noviembre de 2019 la socialización y concertación a autoridades en el Consejo Comunitario Bajo Mira y los cinco (5) Resguardos Indígenas: Inda Sabaleta, Inda Guacaray, La Brava – El cedro, Peña Alegría y Pulgande Campoalegre, ver ilustración.

San Andrés de Tumaco:

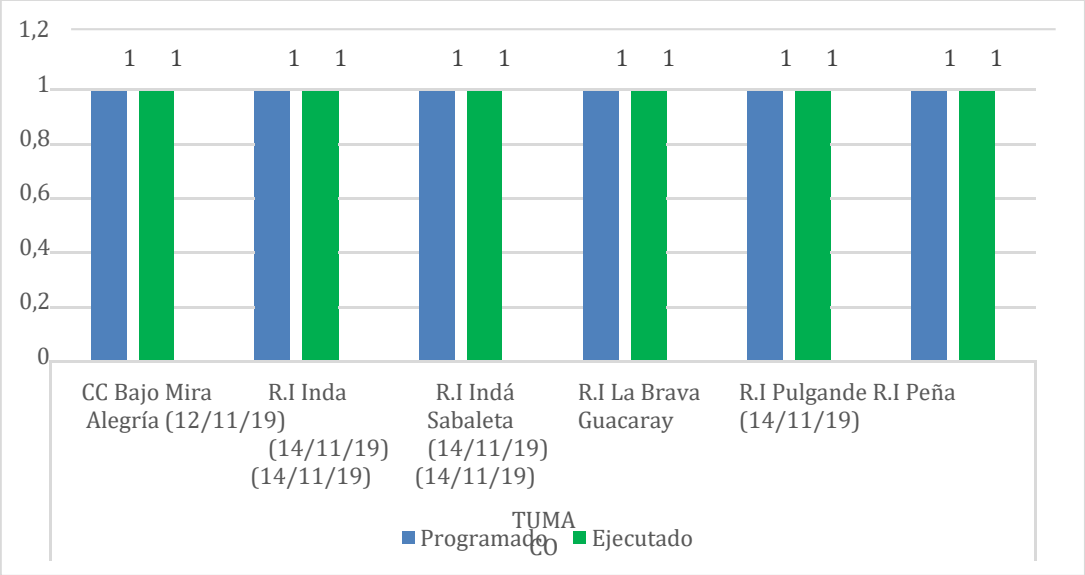


Ilustración 19 Socialización y Concertación a Autoridades – Tumaco, Nariño



Ilustración 20 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Tumaco, Nariño

A pesar que la socialización y concertación a los gobernadores de los resguardos de Tumaco fue un éxito, los gobernadores enviaron la distribución de los 600 cupos de (contrapartida) el día 29 de enero de 2020, de forma diferente a la propuesta por Prosperidad Social, situación que atraso la intervención de estos territorios colectivos hasta tanto no se aclaró con cuantos cupos quedaban asignados en cada Resguardo Indígena. De modo que para el mes de febrero de 2020 se iniciaron las actividades pertinentes de la etapa de Alistamiento expuestas en la ruta operativa del programa.

Para el mismo mes de noviembre - 2019, se realizó la socialización y concertación a los cinco consejos comunitarios, pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor Prodefensa del Río Tapaje del Municipio de El Charco. Ver ilustración

El Charco:

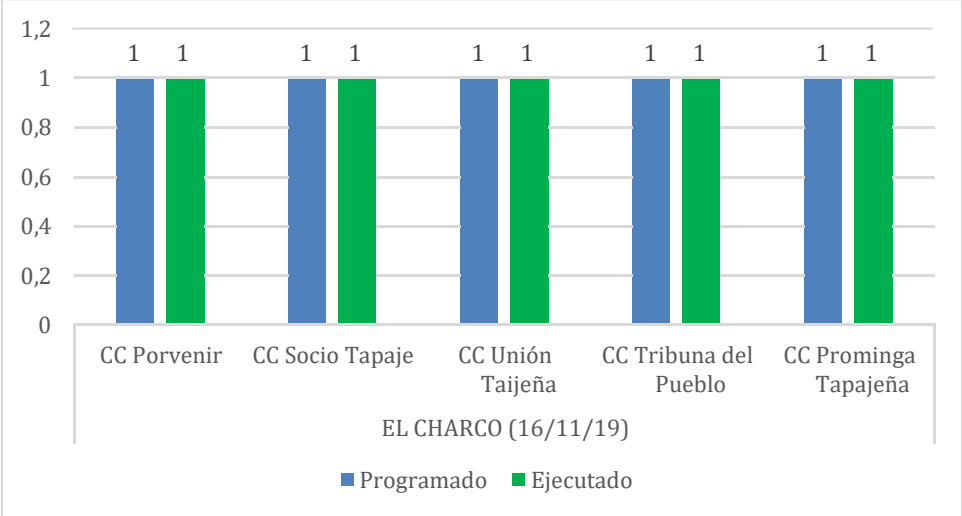


Ilustración 21 Socialización y Concertación a Autoridades – El Charco, Nariño





Ilustración 22 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – El Charco, Nariño

En el municipio de Barbacoas, se realizó la socialización y concertación con el Gobernador y líderes comunitarios del Resguardo Indígena El Hojal – La Turbia en el mes de diciembre de 2019, dejando claro que estaban de acuerdo con las actividades del programa, sin embargo, estaban insatisfechos por la contratación del socio operador, manifestando su interés en operar el programa en su territorio. Esta situación atraso la intervención del territorio para iniciar con la etapa de Alistamiento del Programa. En los meses de enero y febrero de 2020, se mantuvieron contactos con las autoridades del Hojal La Turbia, buscando clarificar las condiciones propias y lineamientos del programa IRACA, a los nuevos integrantes del Cabildo. De modo que el socio implementador UT Prosperidad Iraca Z1 logro luego de varios acercamientos, concertar una nueva reunión el día 06 de marzo de 2020, en la cual se acordó que el equipo de gestores productivos y sociales deben tener el aval del gobernador y solicitaron 2 nuevos enlaces étnicos, argumentando la distancia que existe entre las comunidades y la dispersión de los hogares, Ver Ilustración

Barbacoas:

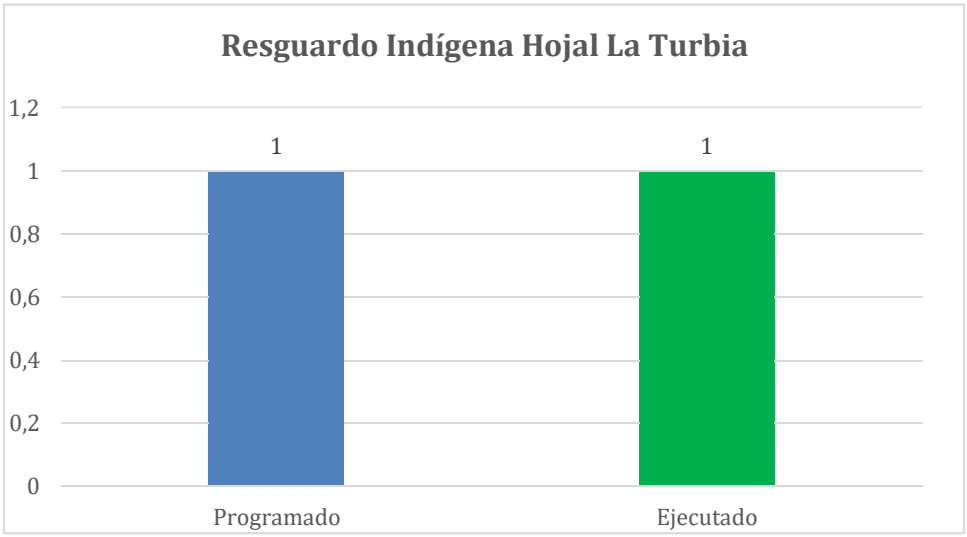


Ilustración 23 Socialización y Concertación a Autoridades – Barbacoas, Nariño





Ilustración 24 Evidencias fotográficas de Socialización y Concertación a Autoridades – Barbacoas, Nariño

Evidencia que soporta el proceso:

- Actas de Socialización y Concertación con Autoridades realizadas en campo
- Actas y evidencias de los procesos realizados para aprobación:
- https://drive.google.com/drive/folders/1JHNUe4XgPsDVc6WgdJhYM8Th_AkIO1_5?usp=sharing

  (Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización).

ETAPA: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN
PROCESO: *Socialización a Comunidades*
INDICADOR: Número de encuentros de socialización del programa IRACA con las comunidades.
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de socialización y vinculación comunitaria, Registro Fotográfico y Listados de asistencia
META PROGRAMADA: 100% comunidades socializadas (301)
META EJECUTADA: 100 % comunidades socializadas (301)

Para el desarrollo de este proceso, se evidencia el avance del 100 %.

En el departamento de Guainía, se socializaron las comunidades de Cucurital, Cimarrón y Platanillal del Resguardo Paujil. En el Resguardo Atabapo, se realizó la socialización a la comunidad de Concordia.

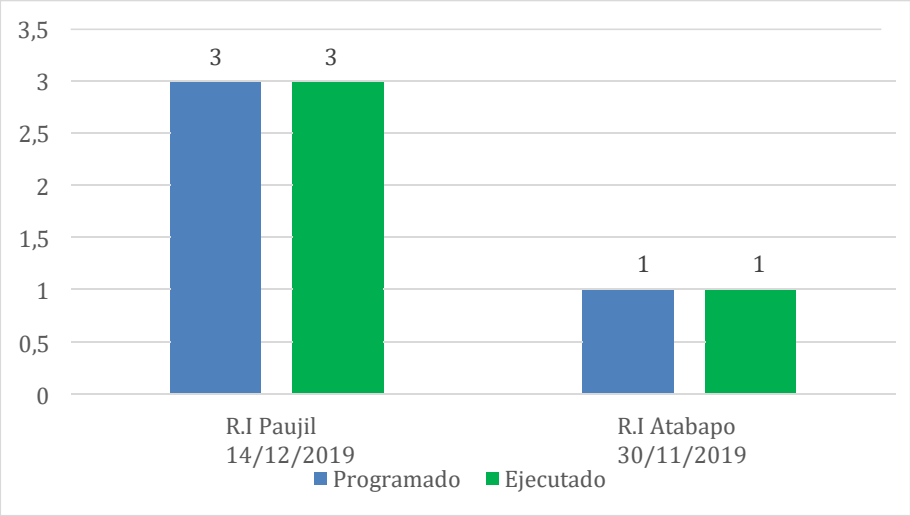


Ilustración 25 Socialización a Comunidades - Guainía

Para el Departamento de Cauca, tenemos en total socializados todas las comunidades de los consejos Comunitarios de Guapi Abajo, Alto Guapi, Rio Napi, Rio San Francisco y Rio Guajuí en el municipio de Guapi y el Consejo Comunitario de Renacer Negro en el Municipio de Timbiquí, ver ilustración.

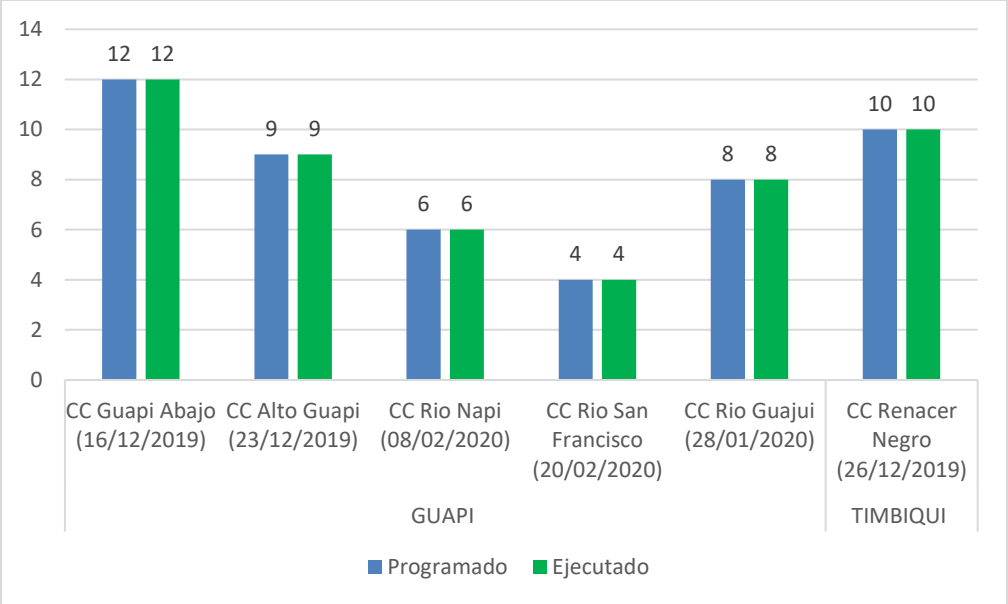


Ilustración 26 Socialización a Comunidades - Cauca

En el Municipio de Cumaribo del departamento del Vichada, se socializaron las comunidades de los Resguardos Indígenas de Rio Tomo, Aiwa Kuna, Chololobo y Santa Teresita del Tuparro.

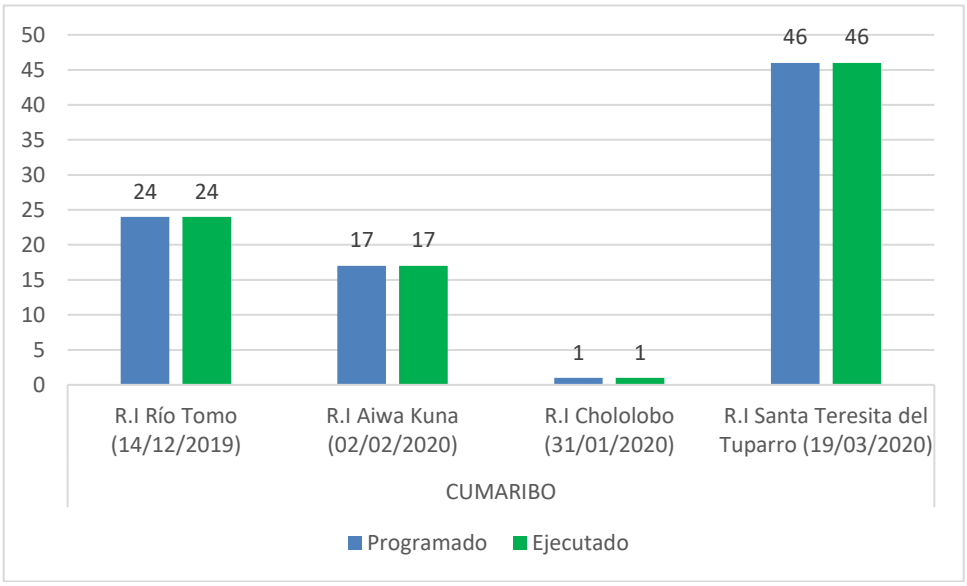


Ilustración 27 Socialización a Comunidades Municipio de Cumaribo - Vichada

Carrea 34 No. 52 - 60, Bucaramanga. coordinadorzonal@iracaz1.com - representantelegal@iracaz1.com
Tel. (037) 6950202 - 3208260219

También, en el departamento del Vichada, se socializaron las comunidades de los Resguardos Indígenas de Caño Guaripa y Caño Mesetas del Municipio de Puerto Carreño y los Resguardos Indígenas de Trompillo, Campoalegre y Yajota del municipio de La Primavera.

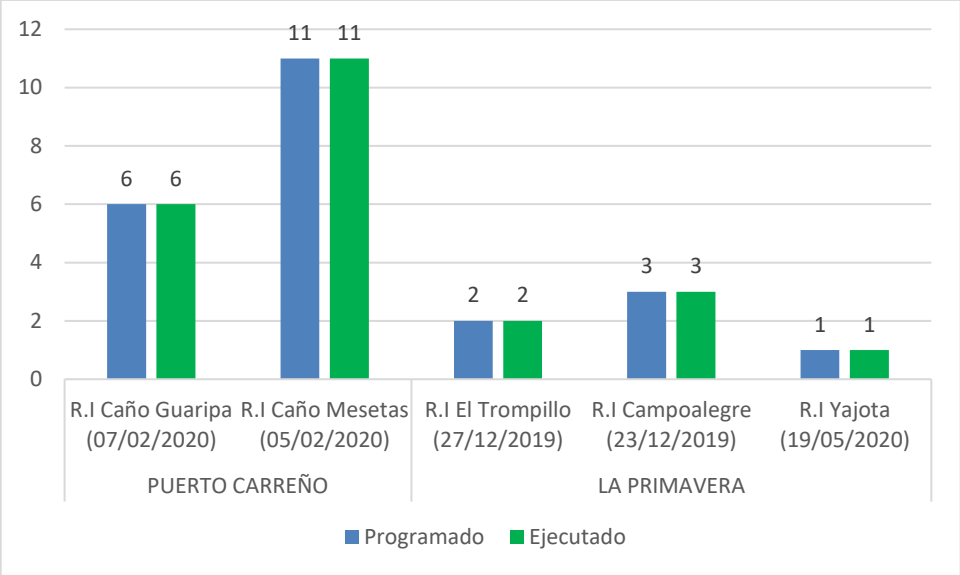


Ilustración 28 Socialización a comunidades – Puerto Carreño – La Primavera, Vichada

En el Municipio de Tumaco del departamento de Nariño, se socializaron las comunidades de los Resguardos Indígenas de Indá Zabaleta, Indá Guacaray, La Brava, Pulgande y Peña Alegría y las comunidades del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera. Ver Ilustración.

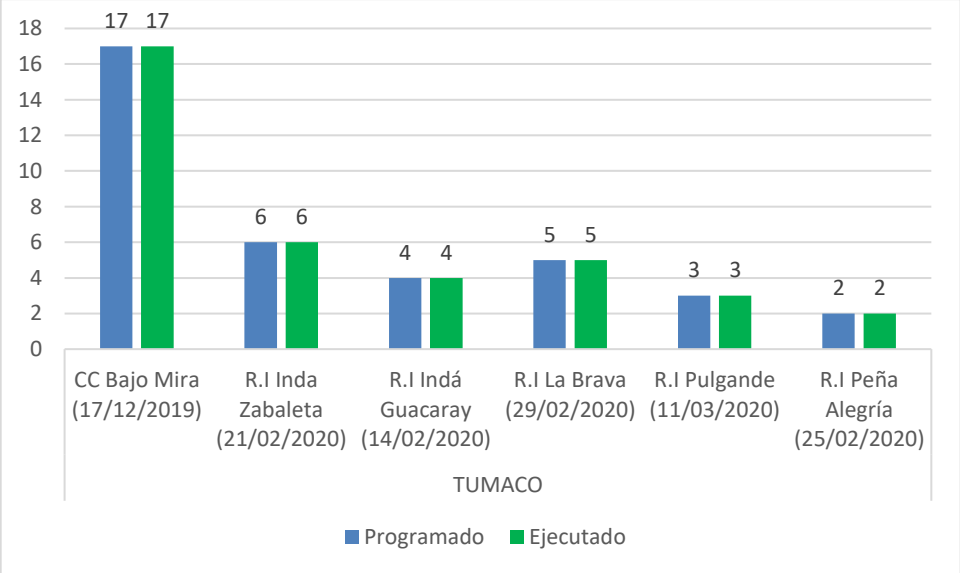


Ilustración 29 Socialización a Comunidades – Tumaco, Nariño

Carrea 34 No. 52 - 60, Bucaramanga. coordinadorzonal@iracaz1.com - representantelegal@iracaz1.com
Tel. (037) 6950202 - 3208260219

En el Municipio de El Charco departamento de Nariño, se socializaron las comunidades de los Consejos Comunitarios de El Porvenir, Socio Tapaje, Unión Taijeña, Tribuna del Pueblo y Prominga Tapajeña. Además, en el municipio de Barbacoas se socializaron las 14 comunidades del Resguardo Indígena Hojal La Turbia y en el municipio de Ricaurte se socializaron las comunidades de los 11 resguardos, Resguardo Indígena Nulpe Medio-Alto Río San Juan-Pueblo AWA, Resguardo Indígena Pialapí-Pueblo Viejo-San Miguel Yaré, Resguardo Alto Cartagena, Resguardo Indígena Edén Cartagena, Resguardo Indígena Ramos Mongón, Resguardo Indígena Palmar, Resguardo Indígena Libertad Telembí, Resguardo Indígena Magüi, Resguardo Indígena Integrado La Milagrosa, Resguardo Indígena Gualcalá, Resguardo Indígena Chaquí-Chimbuza-Vegas-San Antonio

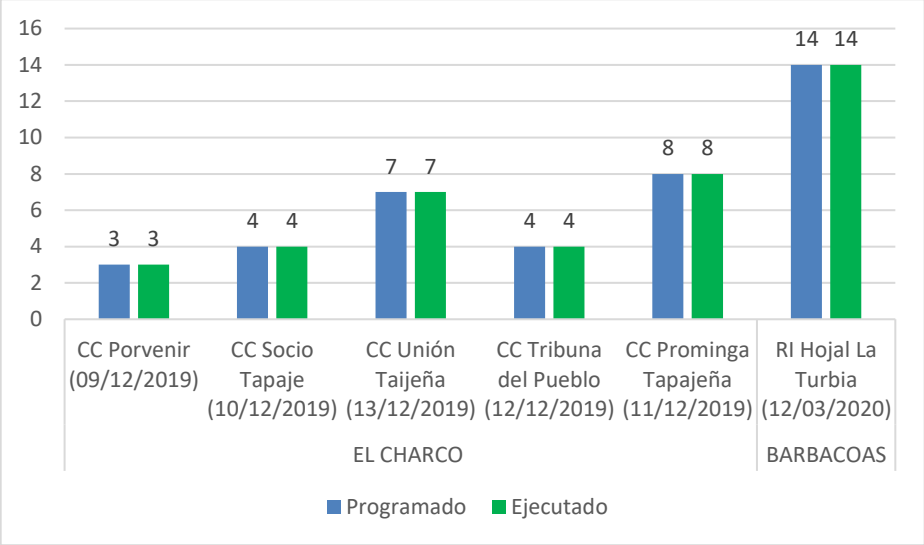


Ilustración 30 (Socialización a Comunidades – El Charco, y Barbacoas- Nariño)

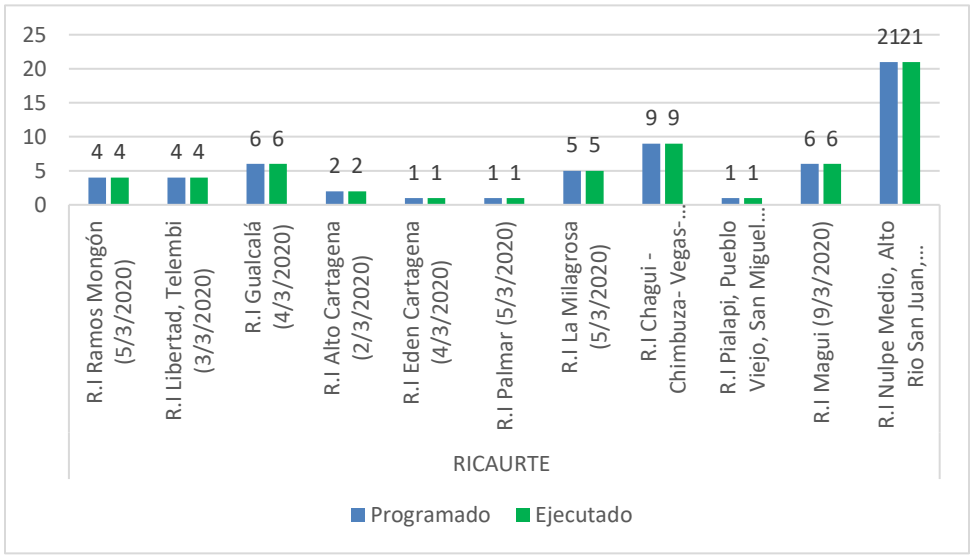


Ilustración 31 (Socialización a Comunidades – Ricaurte)

Carrea 34 No. 52 - 60, Bucaramanga. coordinadorzonal@iracaz1.com - representantelegal@iracaz1.com
Tel. (037) 6950202 - 3208260219

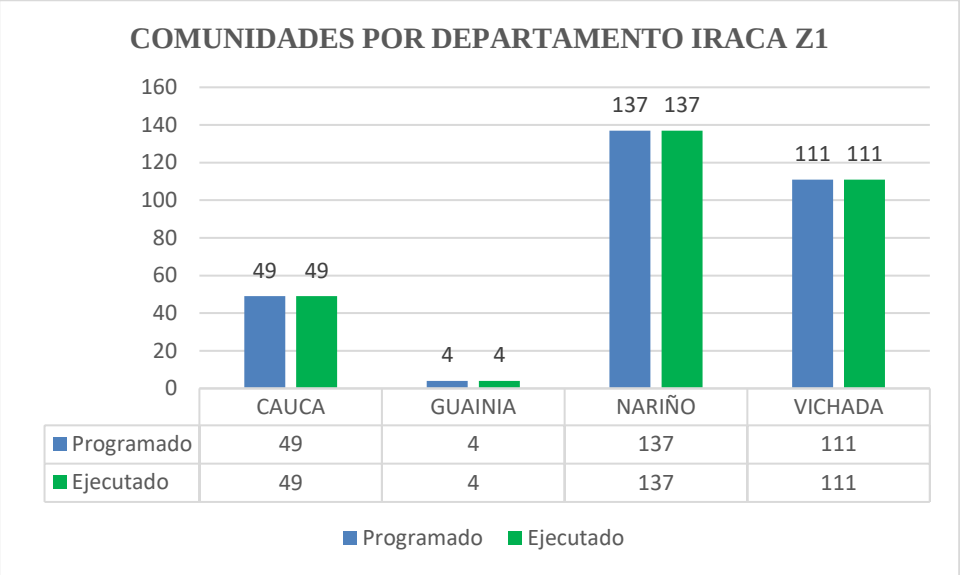


Ilustración 32 Socialización A Comunidades por Departamentos



Ilustración 33 Meta programada – meta alcanzada Socialización a Comunidades

De acuerdo a lo anterior, nos permitimos relacionar a continuación el estado de las evidencias que soportan la realización del actual proceso:

Estado del proceso	Cantidad
Meta asignada	301
Enviadas anteriormente a Prosperidad Social	301

Evidencia que soporta el proceso:

- Socialización a Comunidades realizadas en campo.
- Actas y evidencias de los procesos realizados para aprobación: https://drive.google.com/drive/folders/1LuKhosegt6B24Stb5Jxijqq19D3uMaoU?usp=sharing

ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACIÓN:


ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACIÓN
PROCESO: *Vinculación de hogares*
INDICADOR: Número de hogares vinculados y cargados en el aplicativo KOKAN
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta de vinculación del hogar y reporte de cargue en el KOKAN.
META PROGRAMADA: 5280 hogares
META EVIDENCIADA: 5280 hogares (100%)
META EN PROCESO: 0 hogares (0 %) Novedades Territoriales

Para el presente proceso el Socio Implementador ha logrado registrar en Kokan la realización de 5280 vinculaciones de hogares (100%)

ESTADO	CANTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Validadas por Prosperidad Social	5280	- Actas remitidas y validadas por Prosperidad Social en informes anteriores
En solicitud de retiro por control de calidad	32	- Carta de las autoridades
Pendientes para cierre	0	-Actas pendientes de remitir


Tabla 8 Resumen del Estado de las Vinculaciones de Hogares Zona 1

A fin de medir el porcentaje de actas de vinculación remitidas a Prosperidad Social con los hogares validados en KOKAN a fecha de corte 30 de Noviembre de 2020, se tiene:

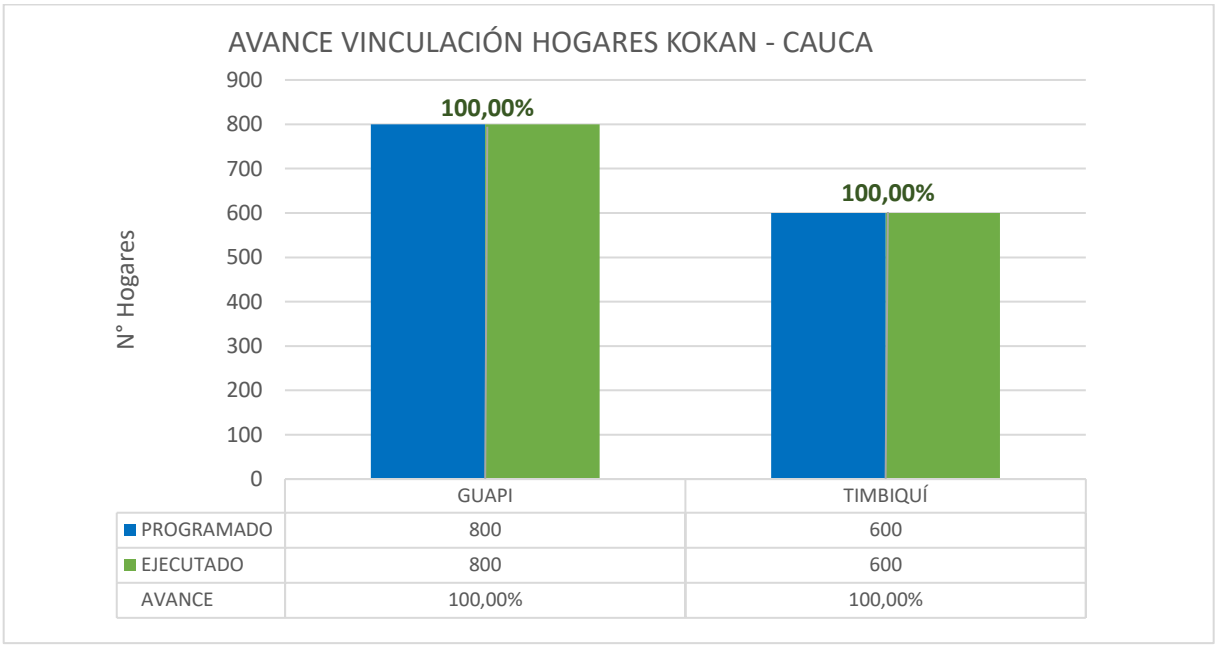

	GUAPI	TIMBIQUÍ
PROGRAMADO	800	600
EJECUTADO	800	600
AVANCE	100,00%	100,00%


Ilustración 34 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento del Cauca

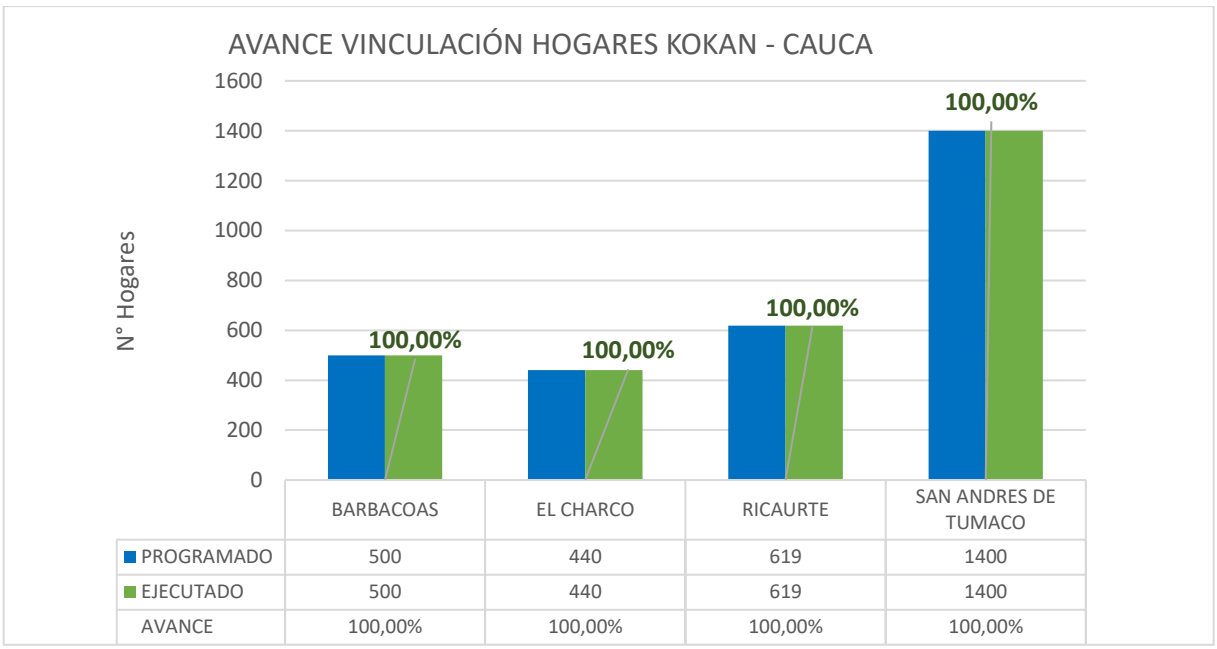

	BARBACOAS	EL CHARCO	RICAURTE	SAN ANDRES DE TUMACO
PROGRAMADO	500	440	619	1400
EJECUTADO	500	440	619	1400
AVANCE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ilustración 35 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento de Nariño

Para los municipios del Departamento de Guainía y Vichada la meta de vinculación se ha completado, pero se requiere la desvinculación de 27 hogares que después de un control de calidad se encontró que estos hogares son ya beneficiarios de otra edición del programa IRACA o ya no se encuentran en el resguardo o no terminaron de adjuntar la documentación requerida.

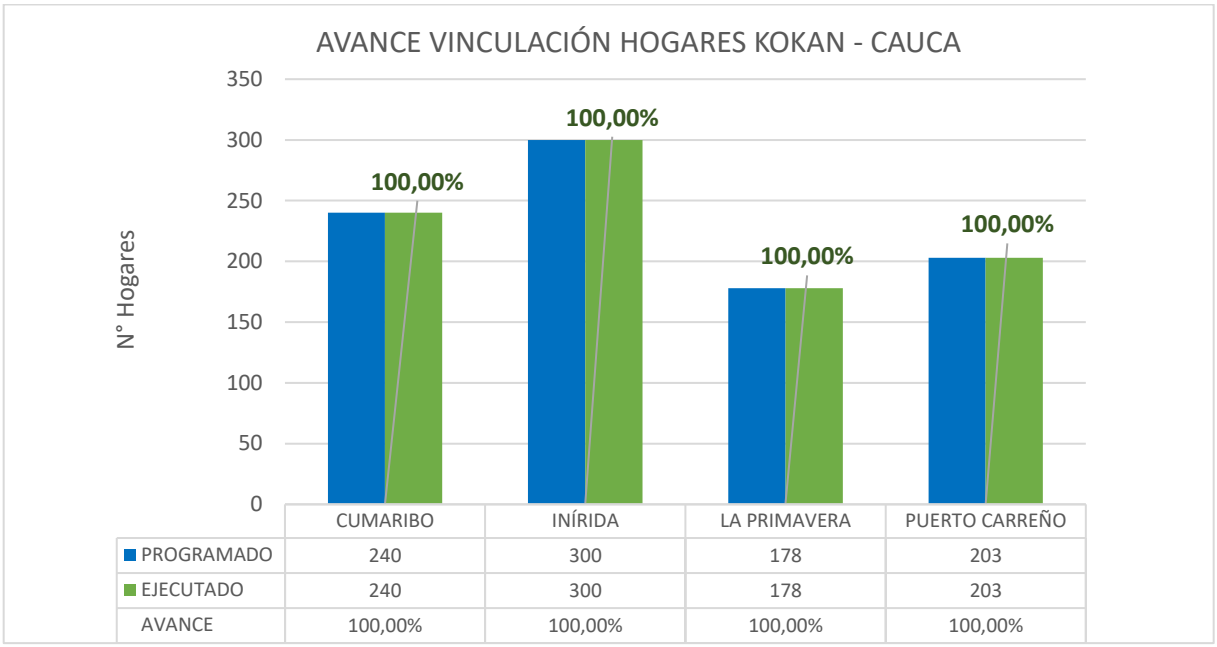

	CUMARIBO	INÍRIDA	LA PRIMAVERA	PUERTO CARREÑO
PROGRAMADO	240	300	178	203
EJECUTADO	240	300	178	203
AVANCE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ilustración 36 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamentos de Vichada y Guainía

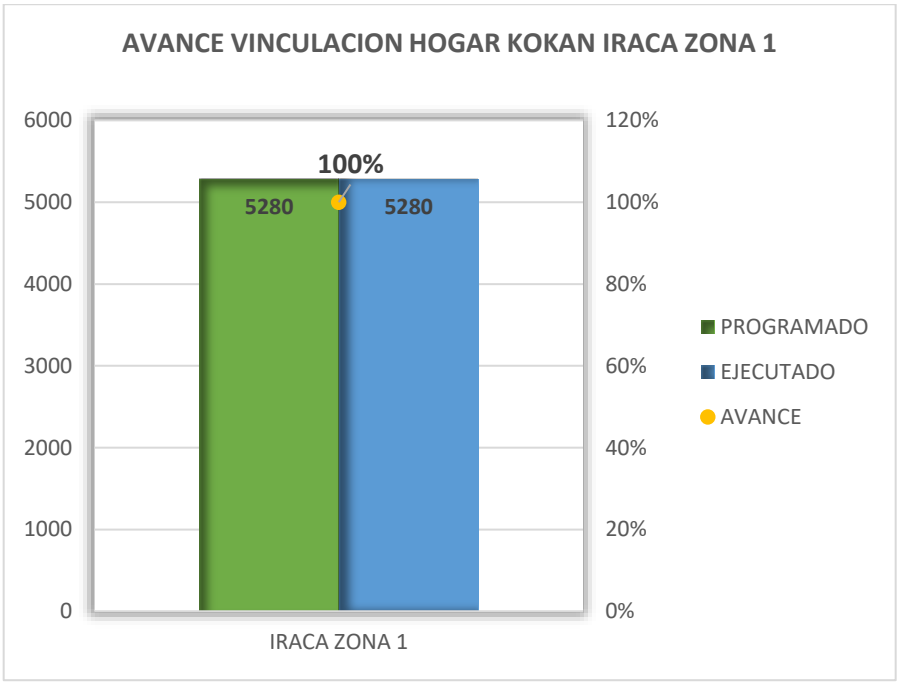


Ilustración 37 Vinculados Inscritos en KOKAN, IRACA Zona 1



Ilustración 38 Ejercicio de Vinculación de Hogares
(Consejo Comunitario Tribuna del Pueblo – El Charco – Departamento de Nariño)

De acuerdo a las vinculaciones de hogar inscritas en KOKAN por el Socio Implementador a Prosperidad Social, se tiene que, de los 5280 hogares, fueron designados como jefe de hogar a 2524 hombres, equivalentes al 48% y 2756 mujeres, equivalente al 52%, tal como lo muestra la siguiente gráfica:

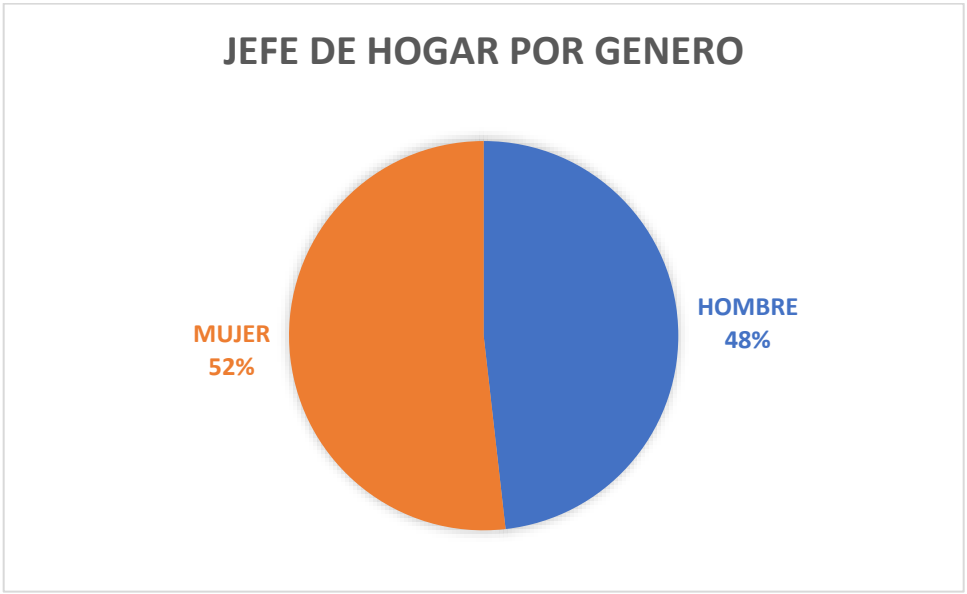


Ilustración 39 Jefe de Hogar por Genero

La media de edad de los miembros del hogar incluyendo al titular del hogar, se encuentran en rango entre 20 y 40 años.

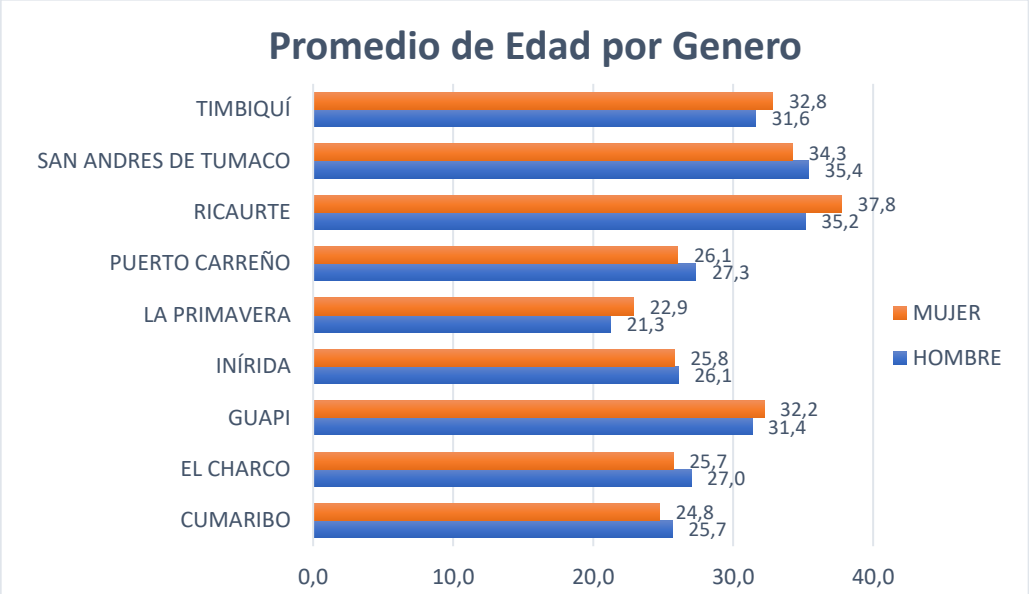


Ilustración 40 Media de edad por Genero miembros de Hogar

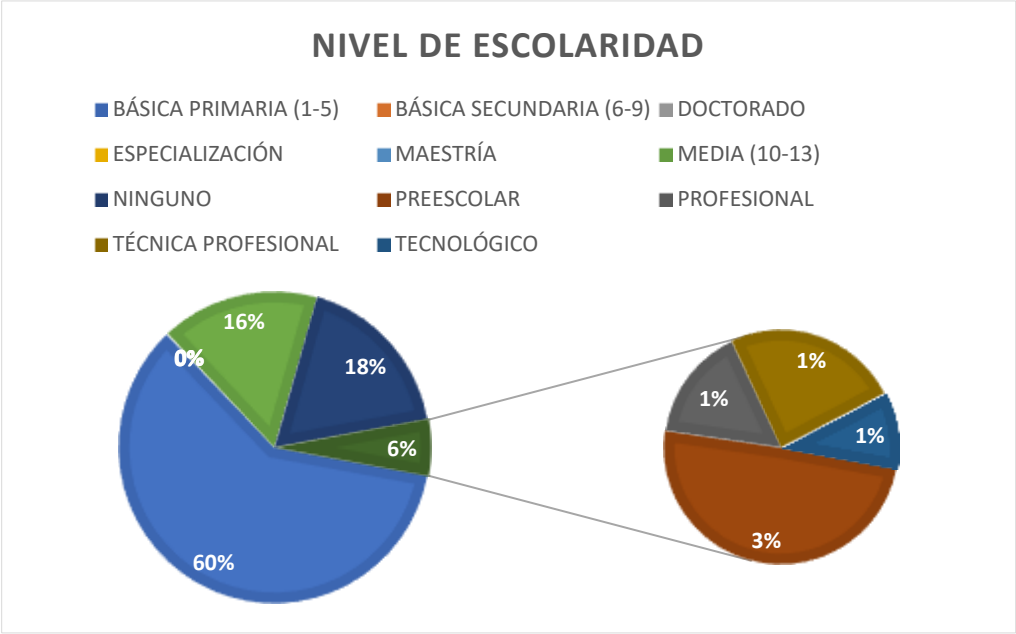


Ilustración 41 Nivel de Escolaridad Población beneficiaria programa IRACA

Para lo anterior, se adjunta en la carpeta "Vinculación de Hogar", documento Excel "que contiene la relación de cedulas de los beneficiarios remitidos para aprobación, el cual contiene pestaña CTRL que permite realizar la retroalimentación por parte de Prosperidad Social.

Evidencia que soporta el proceso:

Actas de vinculación de hogar remitidas para la validación de registros preinscritos en KOKAN, alojadas en los siguientes links:

Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1yoOVugKC6P65AAR3uXdZRnBPAYA9NUk9?usp=sharing

(Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización)

ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACIÓN
PROCESO: *Caracterización de Entrada*
INDICADOR: Número de hogares caracterizados y cargados en el aplicativo KOKAN
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Reporte generado por KOKAN.
META PROGRAMADA: 5280 hogares
META EVIDENCIADA: 5280 hogares (100%)
META EN PROCESO: 0 hogares (0 %) Novedades Territoriales

Para el proceso de caracterización de entrada el Socio Implementador ha realizado el proceso de depuración dejando como resultado las 5280 catalogadas como “Completa” por dicha plataforma y migradas a KOKAN. A continuación, se describe las cantidades de caracterizaciones de acuerdo al estado en que se encuentra:

Ítem	Cantidad
Meta	5280
Cargado en Buch On	-
Cargado en KOKAN	5280
En intercambio en KOKAN	0
Por transferir y cargar	0

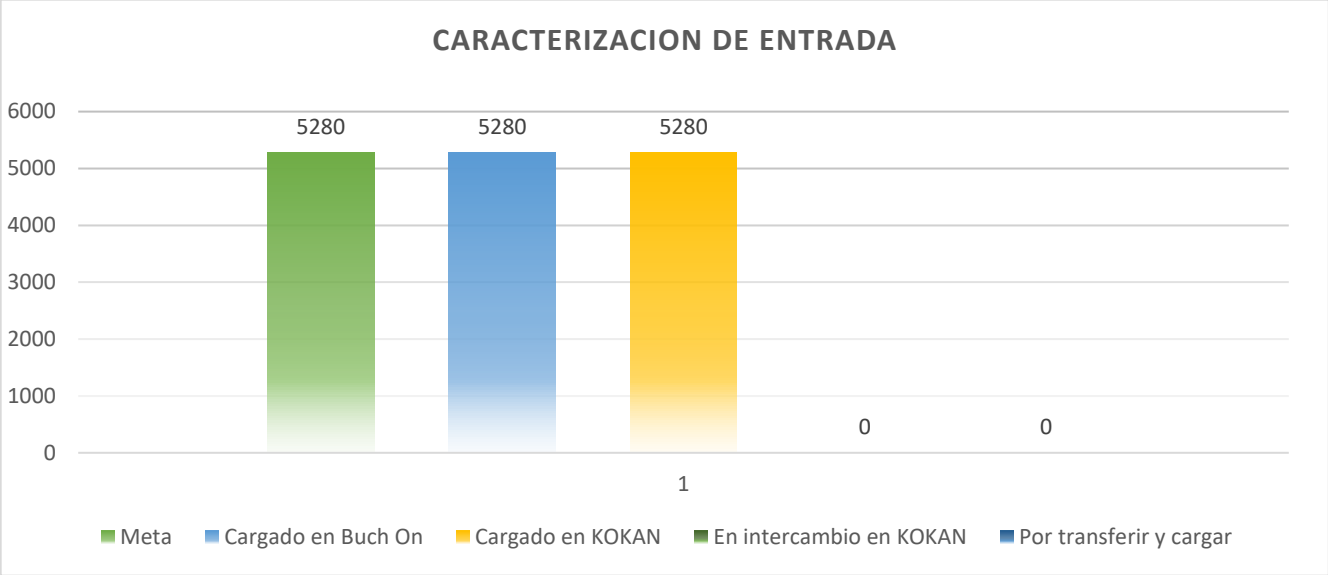


Ilustración 42 Total hogares caracterizados y validados en Kokan

Evidencia que soporta el proceso:

- Número de hogares caracterizados y cargados en el aplicativo KOKAN: http://kokan.prosperidadsocial.gov.co/Kokan/Kokan

Evaluando la caracterización del componente en seguridad alimentaria, se tiene en las siguientes ilustraciones que para todos los Departamentos los Territorios un 50% de la población ha presentado que en la menos algún día han tenido déficit en la disponibilidad de alimentos de su dieta.

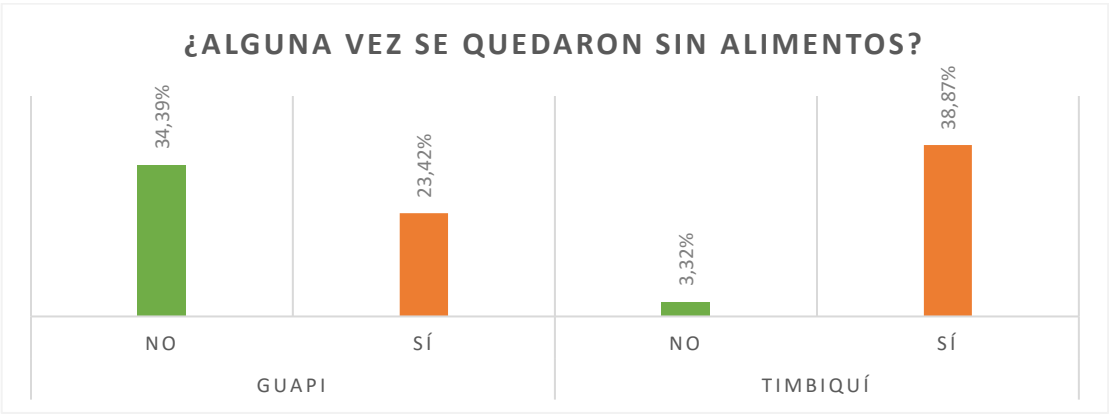


Ilustración 43 Déficit en disponibilidad de alimento Departamento del Cauca

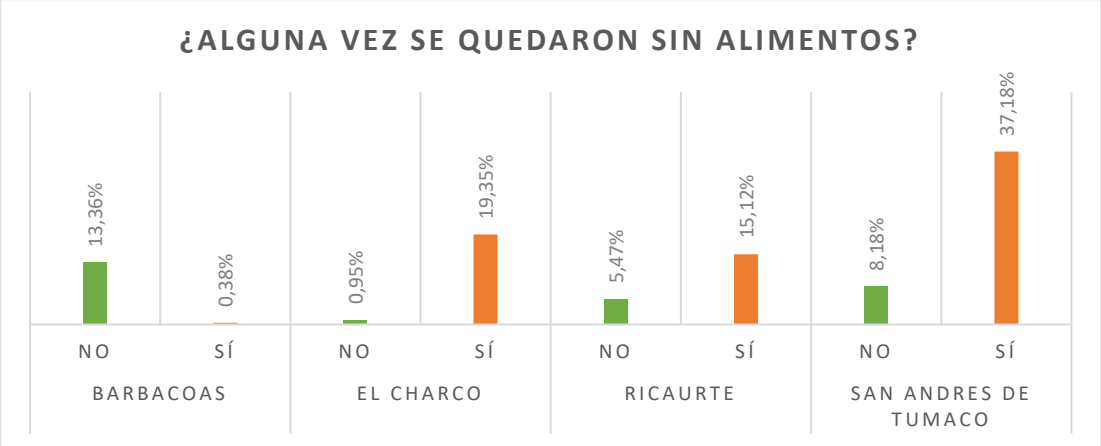


Ilustración 44 Déficit en disponibilidad de alimento Departamento de Nariño

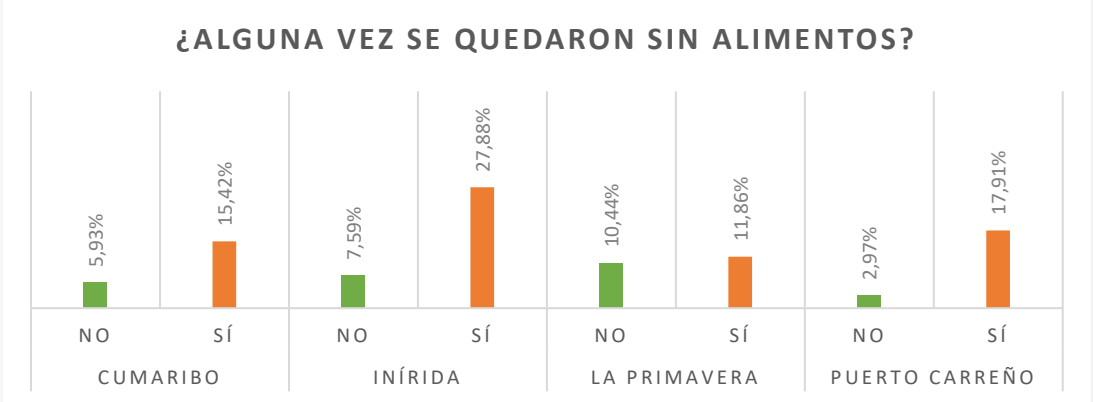


Ilustración 45 Déficit en disponibilidad de alimento Departamento de Vichada y Guainía

Una de las causales a este déficit de la disponibilidad puede ser que los medios o fuentes de obtención de alimentos (ilustraciones siguientes) dependen de las condiciones de la tierra y del clima lo que hace la necesidad de la población de establecer sus cultivos en lugares alejados de sus viviendas aumentando costos propios de producción.

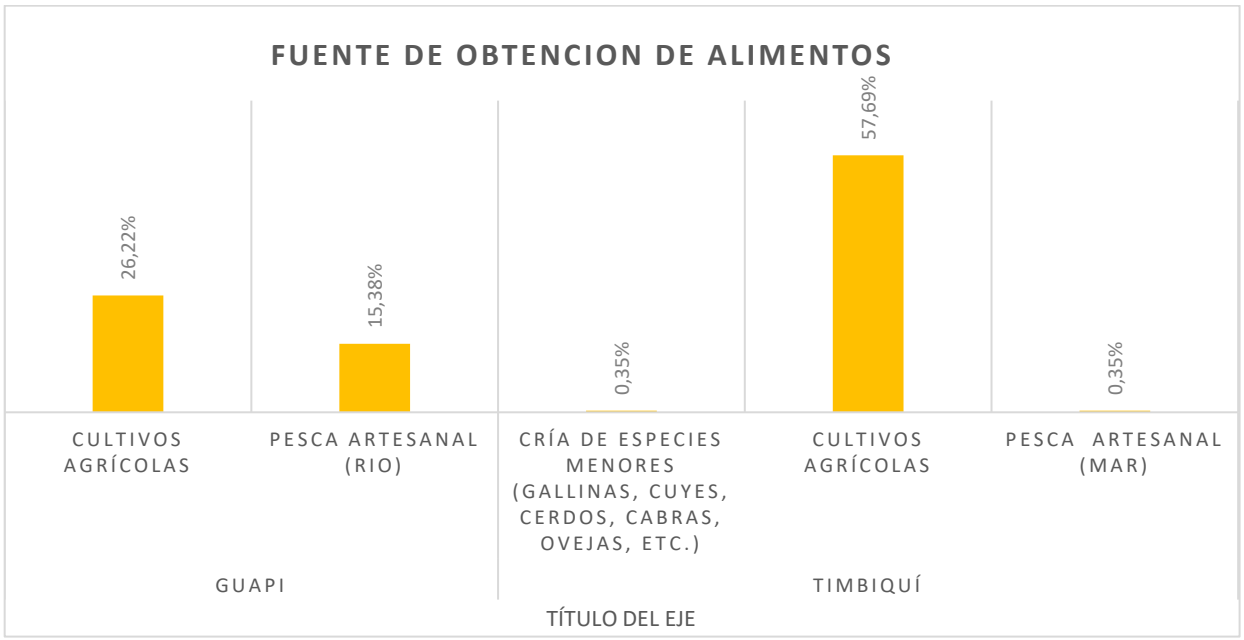


Ilustración 46 Fuentes de obtención de alimentos Departamento de Cauca

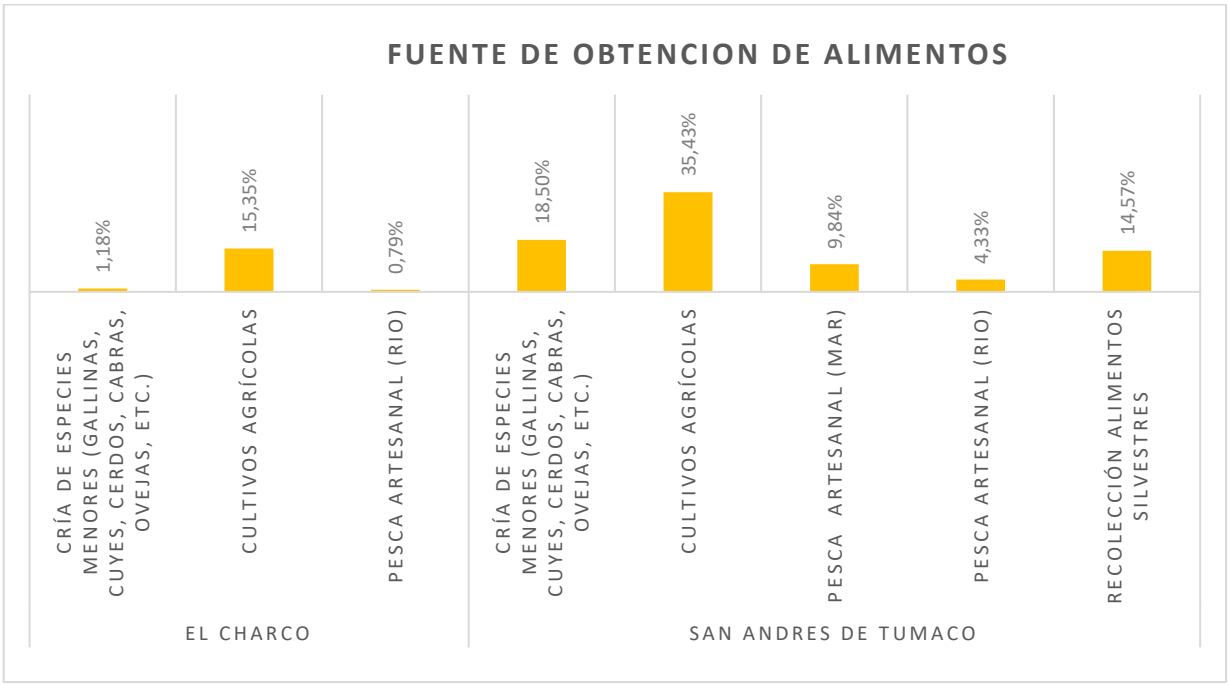


Ilustración 47 Fuentes de obtención de alimentos Departamento de Nariño

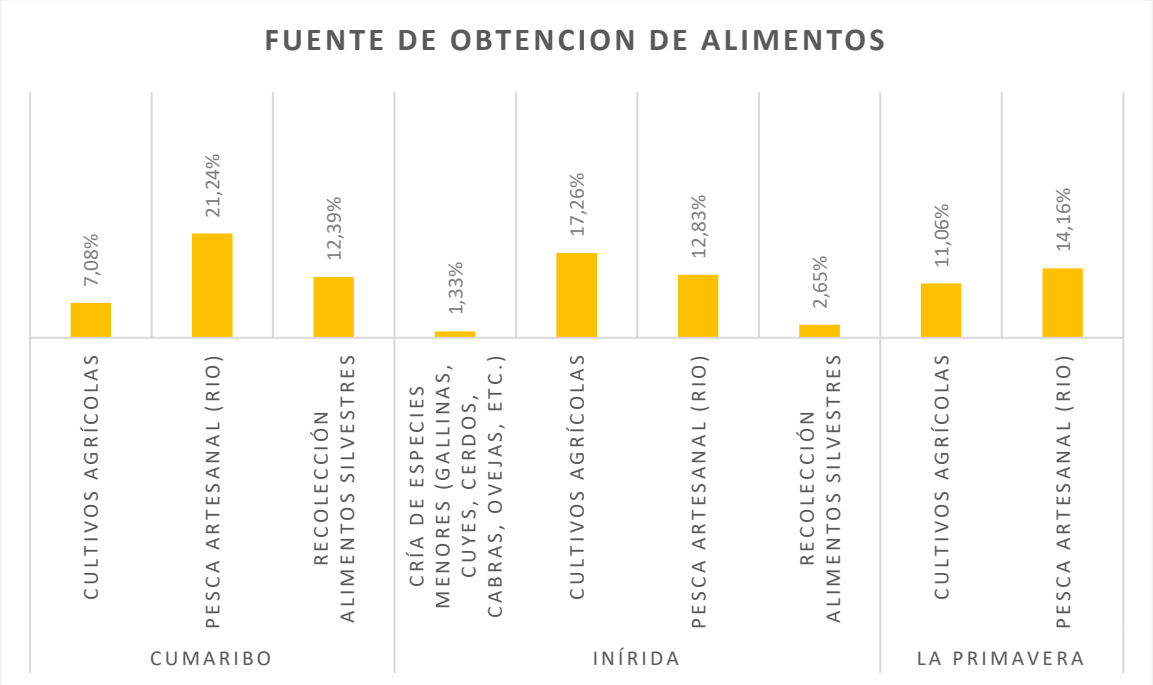


Ilustración 48 Fuentes de obtención de alimentos Departamento de Vichada y Guainía

En el componente productivo, se aprecia en las gráficas siguientes que en promedio las familias reciben ingresos por debajo de un salario mínimo mensual legal vigente y los mayores gastos se dan por la alimentación seguido de las deudas a acreedores.

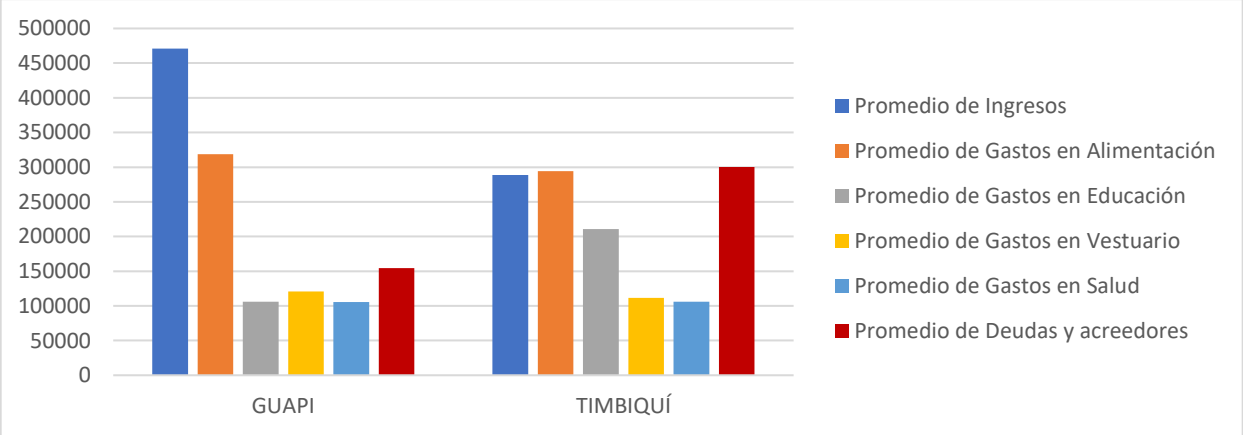


Ilustración 49 Promedio de gastos en los territorios Departamento de Cauca

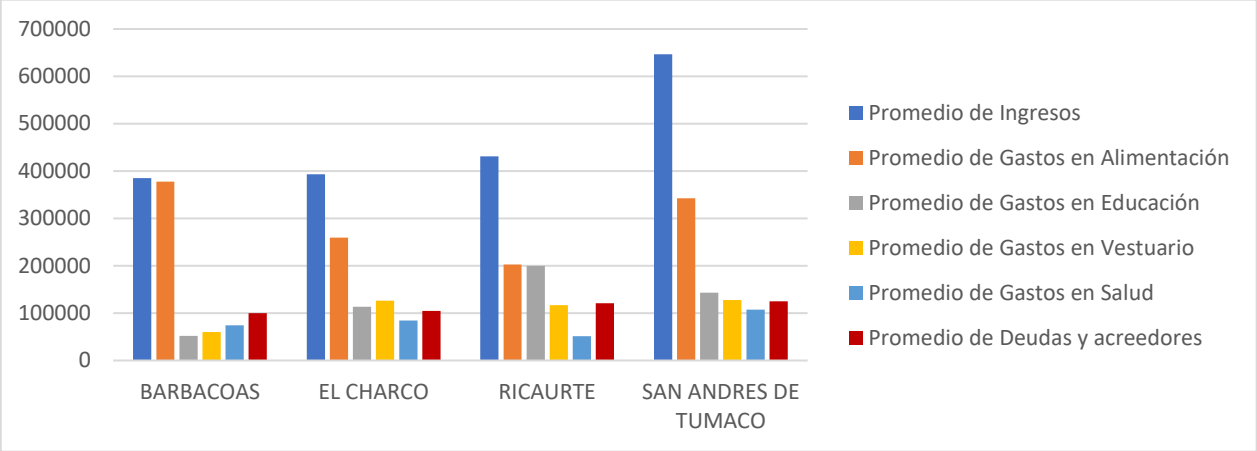


Ilustración 50 Promedio de gastos en los territorios Departamento de Nariño

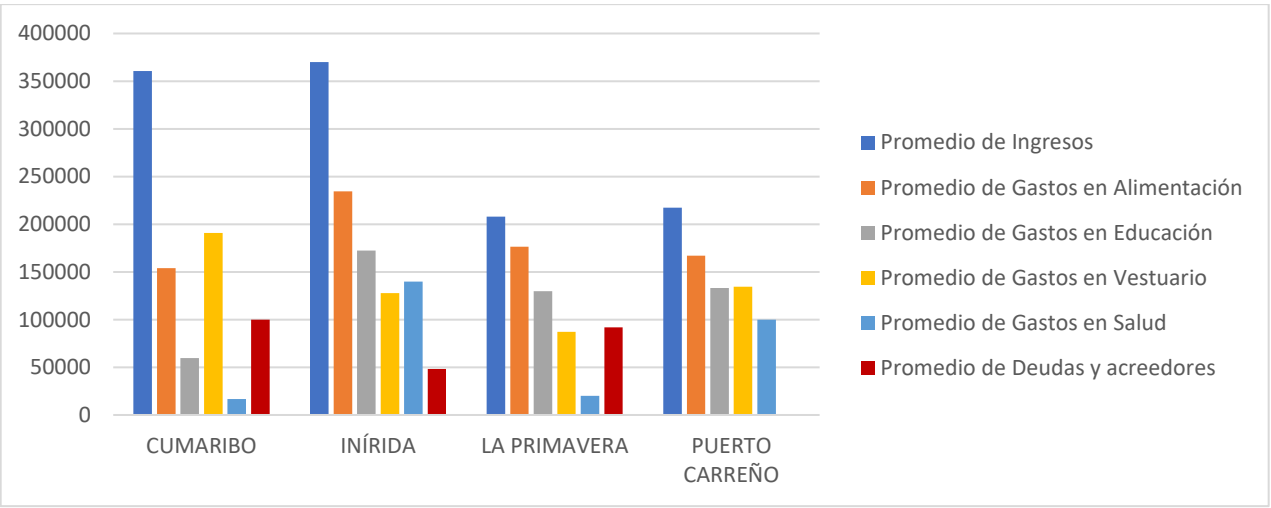


Ilustración 51 Promedio de gastos en los territorios Departamento de Guainía y Vichada

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS:

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO: *ICOE de entrada*
INDICADOR: *Territorios colectivos con ICOE de entrada*
MEDIO DE VERIFICACIÓN*: Ficha de ICOE de entrada diligenciada por territorio colectivo.*
META PROGRAMADA*: 40 (100%)*
META EJECUTADA: *40 (100%)*

En los 40 territorios colectivos que opera la UT Prosperidad Iraca z1, se llegó a la meta del 100%.

El Índice de Capacidades Organizativas Étnicas (ICOE) es un instrumento que mide la capacidad administrativa y de gestión de los cabildos y juntas directivas de los consejos comunitarios. Esta herramienta toma en cuenta 3 subíndices que son el de percepción, el de

condiciones y atributos y el de oportunidades de contexto. Es necesario resaltar que los subíndices de percepción y el de condiciones y atributos evalúan los mismos componentes (que son estructura de la organización sociopolítica, gobernabilidad interna, identidad y cohesión comunitaria y desarrollo comunitario y medios de vida), sólo que el primero se refiere a cómo las comunidades hacen una lectura de la gestión que llevan a cabo las autoridades étnicas (mide la confianza), mientras que el segundo indica de manera "tangible" o documental cuáles son los requisitos con los que cuentan las organizaciones étnicas para su buen funcionamiento (por ejemplo, el contar con la resolución que reconoce el territorio como resguardo o consejo comunitario, la existencia de planes de etnodesarollo o de vida, el registro documental de las reuniones que tienen, entre otros). En cuanto a las oportunidades de contexto, este subíndice evalúa cuál es la incidencia que tienen los territorios en los planes de gobierno municipales y el cómo son vistas estas poblaciones étnicas desde actores externos (tanto legales como ilegales).

Para la interpretación de este índice, de acuerdo al instructivo de ICOE, las organizaciones étnicas se clasifican según sus capacidades en los siguientes rangos:

0 al 25% Bajo y 26% al 45% Medio-Bajo

46% al 60% Medio

61% al 71% Medio Alto

72% al 100% Alto

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

En el departamento de Nariño se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y El Charco.

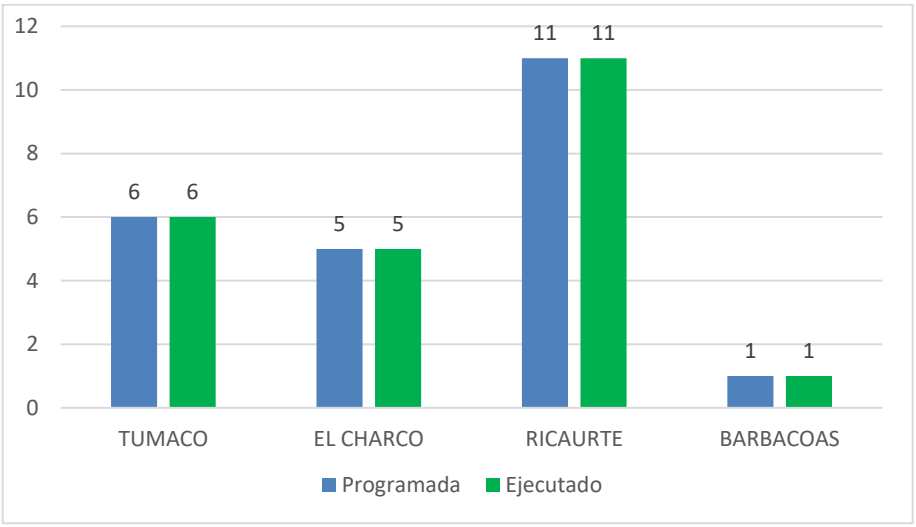


Ilustración 52 ICOEs – Nariño

En la ilustración 53, se presentan los resultados totales obtenidos del ICOE, en cada uno de los territorios colectivos del departamento de Nariño por municipio.

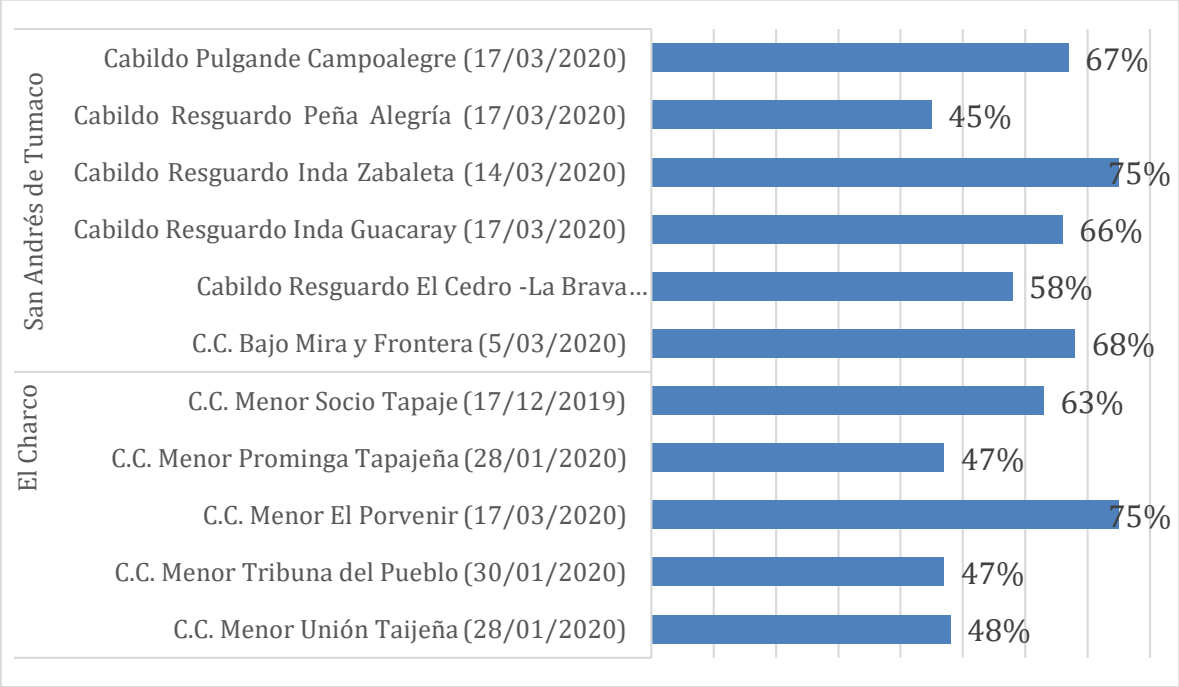


Ilustración 53 Resultados ICOEs – Nariño

De acuerdo con la gráfica anterior, la organización étnica que obtuvo un puntaje medio-bajo en su ICOE es el Cabildo del resguardo Peña Alegría y de los subíndices, el que mayor refuerzo requiere es el de condiciones y atributos (35%) porque las autoridades indígenas no llevan actividades de gestión ante entidades públicas o privadas.

Municipio El Charco

Los porcentajes de ICOE de las juntas directivas de los Consejos Comunitarios Menores de Unión Taijeña (48%), Prominga Tapajeña (47%) y Tribuna del Pueblo (47%) y del cabildo del resguardo El Cedro-La Brava (58%) se posicionaron en un rango medio de capacidades organizativas. En los territorios de Unión Taijeña y Tribuna del Pueblo su principal debilidad la manifestó el subíndice de percepción (46% y 42%), lo que indica que hay que mejorar los mecanismos que permiten la construcción de confianza entre las autoridades étnicas y sus comunidades, mientras que en Prominga Tapajeña los subíndices con los menores puntajes fueron el de condiciones y atributos (43%) y el de oportunidades de contexto (47%).

Cabe anotar que los consejos comunitarios menores de El Charco cuyas comunidades atiende IRACA, centralizan sus acciones a través del Consejo Comunitario Pro-defensa del río Tapaje, lo que posiblemente tenga incidencia en cómo las comunidades perciben a sus autoridades étnicas y así mismo, esto puede tener incidencia en los beneficios que reciben directamente del Estado.

Los consejos comunitarios menor de Socio Tapaje y el de Bajo Mira y Frontera, junto con los cabildos de los resguardos Inda Guacaray y Pulgande-Campoalegre obtuvieron porcentajes que los posicionaron en sus capacidades organizativas étnicas en un rango medio-alto. Las autoridades de Socio Tapaje obtuvieron puntaje bajo en el subíndice de condiciones y atributos (59%), lo que está relacionado con que se trata de una parte de un consejo comunitario mayor, que es el que cuenta con la documentación requerida para funcionar como organización étnica.

Municipio de San Andrés de Tumaco

La principal debilidad del cabildo de El Cedro-La Brava lo presenta el subíndice de percepción (36%), lo que indica que en esta organización hay que reforzar su presencia ante la comunidad, mejorar el modo en que coordina la participación de sus habitantes y mejorar su capacidad de gestión, así mismo cabe anotar que en este caso el programa IRACA tiene incidencia únicamente sobre una parte del resguardo.

Por otro lado, Bajo Mira tuvo el porcentaje más bajo en el subíndice de oportunidades de contexto (60%), un territorio cuyo difícil acceso a sus diferentes comunidades evidencia en parte la ausencia del Estado. El territorio de Inda Guacaray obtuvo los menores puntajes en los subíndices de percepción y en el de condiciones y atributos (juntos del 66%) y en ambos, sus debilidades se manifestaron ligeramente en desarrollo comunitario y medios de vida (formulación y gestión de proyectos) y en la gobernabilidad interna (implementación de planes). Finalmente, en el resguardo Pulgande-Campoalegre el puntaje que presenta un ligero porcentaje menor que el de su ICOE general es el subíndice de Condiciones y Atributos (63%), dado que requiere reforzar las actividades que promuevan la cohesión comunitaria en los últimos años y realizar algunas acciones que redunden en el desarrollo comunitario (por ejemplo, en participación en convocatorias que les financien proyectos).

Finalmente, con rangos altos de capacidades organizativas étnicas se encuentran los territorios del Consejo Comunitario El Porvenir y el resguardo de Inda Zabaleta, ambos con un porcentaje del 75%. El Consejo Comunitario Menor de El Porvenir, hace parte de la junta directiva del Consejo Comunitario Pro-defensa del Río Tapaje, cuya mayor debilidad la tiene en el subíndice de oportunidades de contexto (44%), lo que significa que hay que mejorar su impacto sobre los actores externos públicos y privados. En cuanto al cabildo de Inda Zabaleta el subíndice con el más bajo porcentaje fue el de oportunidades de contexto (70%), es decir, aquel que se relaciona con los beneficios que ofrecen las entidades públicas a los territorios étnicos.



Ilustración 54 Actividad de ICOE (Consejo Comunitario Bajo Mira y frontera – Tumaco- Departamento de Nariño)

Municipio de Ricaurte

Se construyeron 11 ICOES en el municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño correspondientes a los resguardos Chagui Chimbuza Vegas, Alto Cartagena, Integrado La Milagrosa, Telembi, Edén Cartagena, Gualcala, Magui Guadal, Nulpe Medio, Palmar, Pueblo Viejo Pialapi, y Ramos Mongon. De igual manera se construyó un (1) ICOE correspondiente al Resguardo Indígena Hojal La Turbia ubicado en el municipio de Barbacoas, Nariño.

A continuación, se presenta el análisis de los territorios correspondientes a los dos Municipios:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO COLECTIVO	ICOE de Entrada Realizados
Nariño	Ricaurte (11 R. I.)	R.I: La Milagrosa, Vegas, Palmar, Edén Cartagena, Alto Cartagena, Telembí, Gualcalá, Ramos Mongón, Pialapí, Magui, Nulpe Medio	Icoes desarrollados en los 11 territorios de los resguardos Indígenas de Ricaurte.
Nariño	Barbacoas (1	Resguardo	Icoe desarrollado con el Resguardo Hojal La Turbia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO COLECTIVO	ICOE de Entrada Realizados
	R.I)	Indígena Hojal La Turbia	

Tabla 9 Territorios Colectivos con ICOE de entrada desarrollado

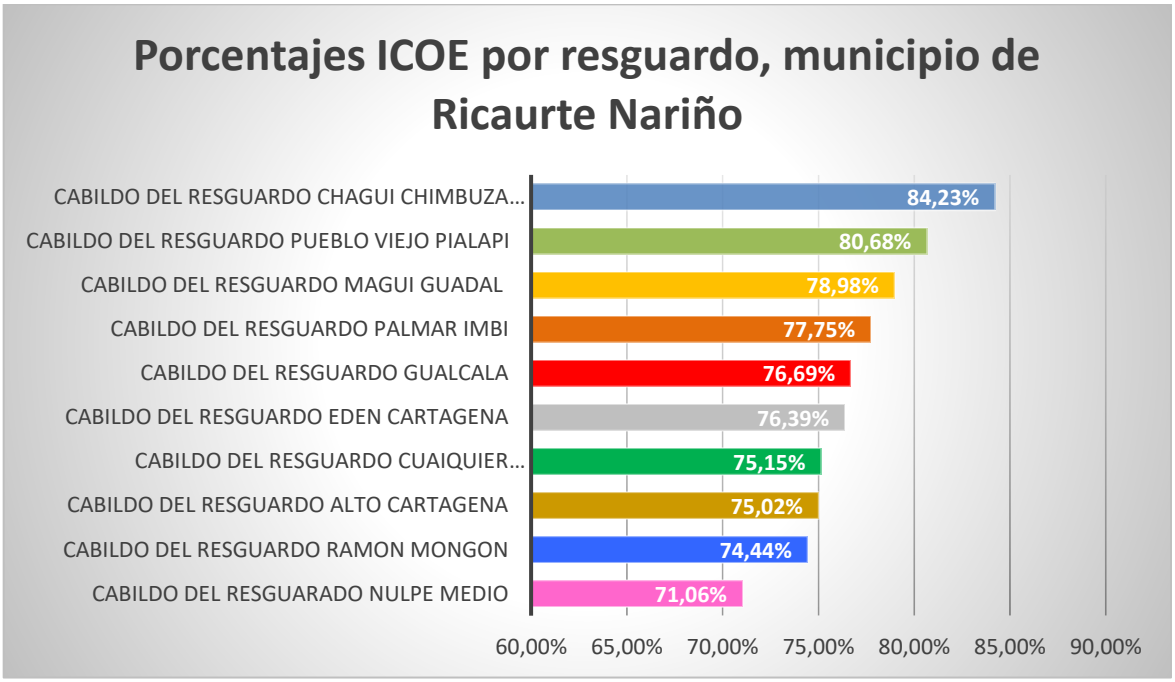


Ilustración 55 Descripción de indicadores ICOE, resguardos de Ricaurte

De acuerdo a la ilustración anterior se observa que 9 de los resguardos analizados obtuvieron ICOEs de rango alto, y uno (1) en el rango medio alto; identificándose de manera descendente el Cabildo del Resguardo Chagui Chimbuza Vegas con el 84,23% (el cual obtuvo el máximo puntaje), evidenciándose debilidades en el subíndice de Oportunidades del contexto el cual se encuentra en una rango medio con una ponderación del 50,00%, siendo el porcentaje de menor valor en comparación con los Subíndices de Percepción y Confianza, y el de Condiciones y atributos. Lo anterior se debe a la dificultad de los líderes del resguardo para identificar la afectación sobre estas oportunidades de contexto para emprender acciones que contribuyan al afianzamiento de acciones o valores para incrementar posibilidades de desarrollo comunitario con los recursos existentes en el territorio a pesar de las expresiones de vulnerabilidad presentes.

El segundo puntaje de mayor ponderación lo obtuvo el Cabildo del Resguardo Pialapi Pueblo Viejo San Miguel Yaré con el 80,68%, siendo el subíndice de condiciones y atributos guardo, el de mayor ponderación con el 93,72% dentro del cual los componentes estructura de la gobernabilidad interna con el 100%, e identidad y cohesión comunitarias con el 100%,

obtuvieron un rango alto; evidenciando como oportunidad de mejora lo relacionado con el desarrollo comunitario y los medios de vida el cual obtuvo un rango alto con una ponderación del 80% dado que no hay normas sobre el manejo sostenible ambiental en torno a prácticas productivas y cuidado de sitios sagrados.

El subíndice más bajo de este resguardo corresponde a Oportunidades del contexto el cual se encuentra en un rango medio con una ponderación del 49,78%, en la medida en que es necesario identificar acciones que contribuyan al afianzamiento de acciones o valores que favorezcan el desarrollo comunitario con los recursos existentes en el territorio a pesar de las expresiones de vulnerabilidad presentes.

El Cabildo del Resguardo Magui Guadal obtuvo una ponderación del 78,98%, seguido del Cabildo del Resguardo Palmar Imbi con el 77,75%.

En relación al primero, los resultados del ICOE, mostraron un rango alto en el subíndice de Condiciones y Atributos, con una puntuación de 87,72%, siendo los componentes de mayor ponderación la estructura de la organización socio-política con el 93% (27,72), gobernabilidad interna con el 100% (30), e identidad y cohesión comunitarias con el 100% (20), obtuvieron un rango alto.

El subíndice con porcentaje de menor valor corresponde a Oportunidades del contexto el cual se encuentra en un rango medio con una ponderación del 49,69%, aspecto que demanda atención en lo relacionado con la posible participación que los habitantes el resguardo puedan tener en los programas y planes del municipio, el departamento e incluso con la nación o con organismos internacionales, al percepción de la comunidad frente a los altos índices de victimización, grado de pertenencia de los territorios con PDET, subíndice alto de pobreza, entre otros factores.

En cuanto al Cabildo del Resguardo Palmar Imbi, su porcentaje en cuanto a capacidades organizativas indica un rango alto frente a la capacidad de gestión comunitaria y territorial para optimizar los recursos y oportunidades presentes en sus territorios en función del bienestar familiar y colectivo, siendo el subíndice de Condiciones y atributos el de mayor ponderación (93,02%), en comparación a los demás.

Nuevamente se destaca el subíndice de Oportunidades del contexto como el de menor porcentaje (48,50%), mostrando las dificultades en términos de participación que los habitantes el resguardo puedan tener en los programas y planes del municipio, el departamento e incluso con la nación o con organismos internacionales, y la generación de mayores esfuerzos para atender a la población vulnerable dentro de la cual se encuentra la del resguardo, por las condiciones del territorio.

Los cabildos de los resguardos Gualcala y Eden Cartagena obtuvieron el 76,69% y el 76,39%

respectivamente, lo que demuestra un rango alto en sus capacidades étnicas detalladas de la siguiente manera:

El cabildo del resguardo Gualcala muestra un avance importante en la capacidad de gestión comunitaria y territorial para optimizar los recursos y oportunidades presentes en sus territorios en función del bienestar familiar y colectivo, especialmente en la estructura de la organización socio-política, gobernabilidad interna, e identidad y cohesión comunitarias componentes que obtuvieron el 100%, del subíndice de Condiciones y atributos cuyo rango alto obtuvo un porcentaje del 92,03%, siendo este el de mayor ponderación dentro de las capacidades étnicas del resguardo.

Encontrándose también aspectos por mejorar atenientes a la consolidación de cooperativas, asociaciones o comités de trabajo conjunto con la organización indígena, la inclusión de personas en condición de discapacidad, la consolidación de activos productivos en funcionamiento, y el establecimiento de normas sobre manejo de un ambiente sostenible en torno a prácticas productivas y cuidado de sitios sagrados.

Por otra parte, se destaca en el subíndice de Percepción y confianza (64,58%), la necesidad de mejorar procesos de confianza de los lideres participantes frente a su desempeño, y cómo los demás líderes que no hacen parte del Cabildo, los perciben en su manera de cumplir las funciones.

El subíndice con menor puntuación corresponde para este resguardo es el de Oportunidades del contexto (48,40%), en el cual se identifica como posibilidad de mejora temas relacionados con la participación que los habitantes el resguardo puedan tener en los programas y planes del municipio, el departamento e incluso con la nación o con organismos internacionales, la percepción de seguridad y la inclusión de la población en políticas y programas de desarrollo; así como la gobernanza para dar lineamientos más claros hacia los actores externos, de manera que éstos comprendan y acepten sus propios términos y ritmos de desarrollo.

El cabildo del resguardo Edén Cartagena, presentó entre sus capacidades a mejorar las concernientes a Oportunidades del contexto, subíndice que reportó el puntaje de menor valor con un 50,74%, ubicándose en un rango medio de sus capacidades organizativas tendientes a los componentes de complejidad del contexto con un porcentaje del 70% (participación en las oportunidades que brinda el municipio para el desarrollo del territorio y cómo ven la seguridad y la inclusión de la población en políticas y programas de desarrollo), de atributos verificables del contexto con una ponderación del 44% y factores externos del contexto con un 80%

De igual manera es necesario fortalecer en el subíndice de Percepción o confianza cuyo porcentaje fue del 73,64%, el componente de Desarrollo Comunitario y Medios de Vida,

cuyo máximo puntaje fue del 70% (13,60), respecto a la capacidad de formular y gestionar proyectos, la promoción de procesos asociativos; el conocimiento sobre leyes nacionales e internacionales sobre la niñez, las mujeres, las personas LGBTI y la incidencia directa que tienen las autoridades étnicas participando por ejemplo en el Concejo Municipal, Comité interamericano de Derechos Humanos, Comités de Justicia Transicional, entre otros espacios de participación.

Siguiendo el orden descendente, los cabildos de los Resguardos Cualquier Integrado La Milagrosa con el 75,15%, Alto Cartagena con un 75,02%, y Ramos Mongon que reportó un 74,44%, se situaron en un rango alto, presentándose en los tres, oportunidades de mejora especialmente en el subíndice de Oportunidades del contexto en el cual se reportaron los porcentajes del 50,53%, 50,58%, 50,54%, respectivamente.

En este subíndice se denota la baja participación que los habitantes del resguardo tienen en los programas y planes del municipio, el departamento e incluso con la nación o con organismos internacionales; cualidades determinadas por la percepción de la comunidad ente a los índices de vic timización, pertenencia a territorios con PDET, índices de pobreza presentes, participación en las oportunidades que brinda el municipio para el desarrollo del territorio, percepción de la seguridad, inclusión de la población en políticas y programas de desarrollo; así como los esfuerzos para atender a la población vulnerable dentro de la cual se encuentra la del resguardo.

En último lugar se encuentra con respecto al Cabildo del Resguardo Nulpe Medio, este obtuvo un ICOE de rango medio alto con una ponderación equivalente al 71,06% en sus capacidades organizativas, presentando debilidades en el subíndice de Oportunidades del contexto el cual obtuvo una ponderación del 51,22%, siendo el único Resguardo cuyo ICOE reportó un rango medio.

En este sentido, el componente que obtuvo el menor puntaje de todos es el de Atributos verificables del contexto (44%), seguido de Actores y factores externos y Complejidad de contexto que alcanzaron el 80%.

A manera de conclusión es necesario acotar que el subíndice de Oportunidades del contexto y su posición más baja dentro de las capacidades organizativas étnicas, es una constante presente en todos los resguardos analizados en el presente informe, cuyo promedio porcentual en relación a los 11 ICOES analizados, fue del 50%, con un rango medio.

En esta lógica, el subíndice mejor afianzado entre los 11 resguardos, hace referencia al subíndice de Condiciones y atributos (87,21%), seguido del subíndice de Percepción o confianza (71,08%), situados en los rangos alto y medio alto respectivamente. Tal como se muestra en la siguiente ilustración.

El promedio general de las capacidades organizativas presentes en los resguardos estudiados, presenta una ponderación del 77,04%, valor que indica un rango alto en relación a la capacidad de gestión comunitaria y territorial para optimizar los recursos y oportunidades presentes en sus territorios en función del bienestar familiar y colectivo.

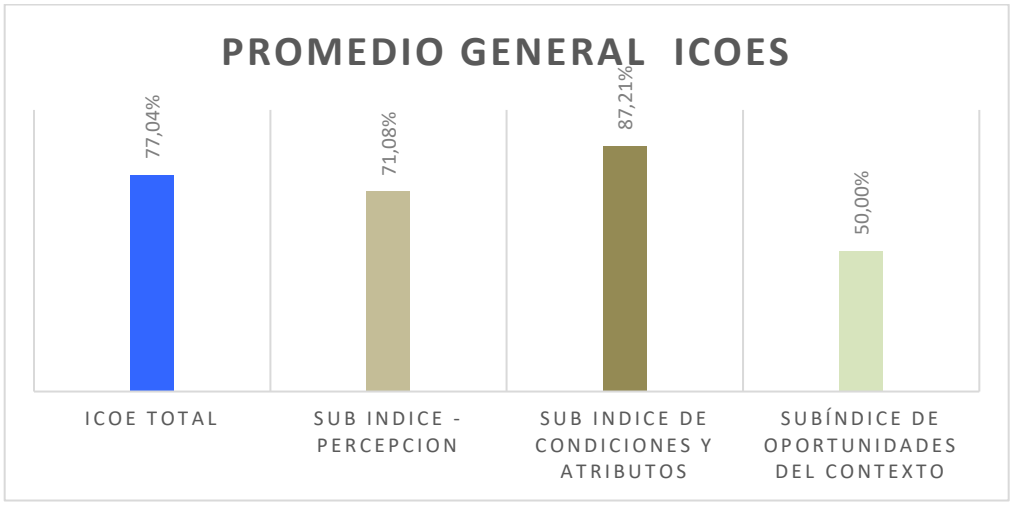


Ilustración 56 Descripción de Promedios General de Icoes, resguardos de Ricaurte

Municipio de Barbacoas

En el municipio de Barbacoas se estableció contacto con el resguardo indígena Hojal de la Turbia, en el cual el ICOE arrojo los datos presentados en la siguiente ilustración.

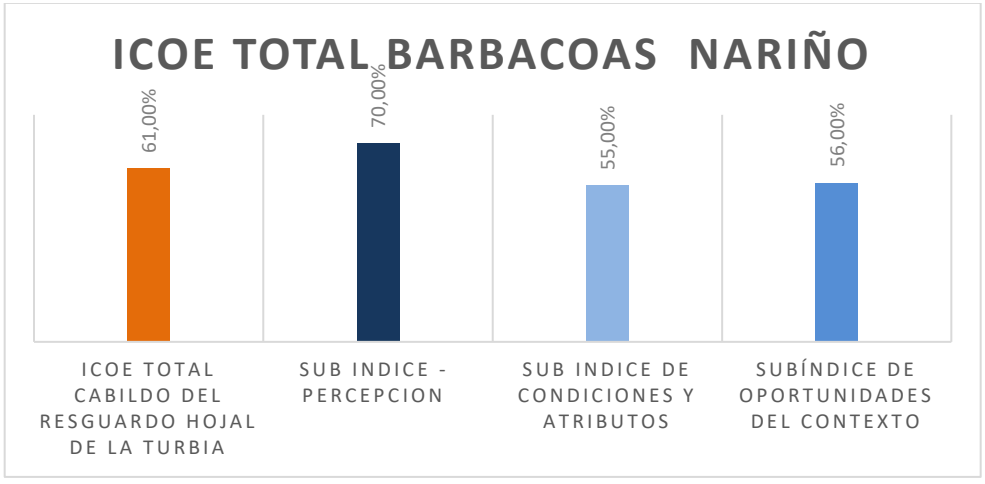


Ilustración 57 Descripción de Promedios General de Icoes, resguardo de Barbacoas

De acuerdo a la ilustración anterior los resultados del ICOE, el resguardo se encuentra en un

rango medio alto, con una ponderación del 61%, evidenciándose que el subíndice que presenta mejores avances en términos de sus capacidades organizativas corresponde al de Percepción y confianza con el 70% (rango medio alto).

Por otra parte, el subíndice que arrojo el menor valor corresponde a Condiciones y Atributos, con una puntuación de 55% (medio), por tanto, se requiere trabajar en la estructura de la organización socio-política, gobernabilidad interna, e identidad y cohesión comunitarias.

Otro de subíndice susceptible de mejora corresponde a Oportunidades del contexto el cual también se encuentra en un rango medio con una ponderación del 56%, y que requiere la atención para mejorar la participación que los habitantes del resguardo puedan tener en los programas y planes del municipio, el departamento e incluso con la nación o con organismos internacionales, al percepción de la comunidad frente a los altos índices de victimización, grado de pertenencia de los territorios con PDET, subíndice alto de pobreza, entre otros factores.

DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

Municipio de Puerto Inírida

En el departamento de Guainía, se realizaron los ICOEs en el Resguardo Indígena Paujil y en la Comunidad Concordia del Resguardo Atabapo, para un cumplimiento del 100% de la meta programa para Guainía.

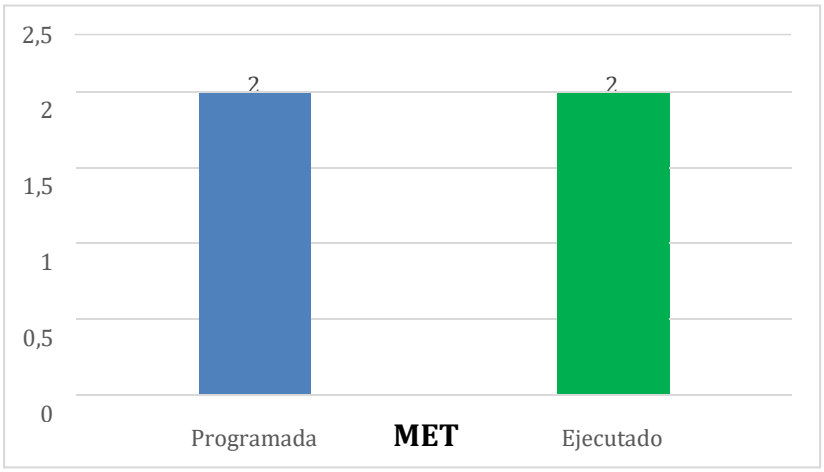


Ilustración 58 ICOEs Municipio Puerto Inírida - Guainía

Se analizaron los dos ICOEs del departamento de Guainía y que hacen parte del departamento de Puerto Inírida. Cabe anotar que el programa IRACA en el resguardo Atabapo, sólo hace presencia en la comunidad de Concordia, la cual es nueva y cuyos integrantes son desplazados de otras zonas.

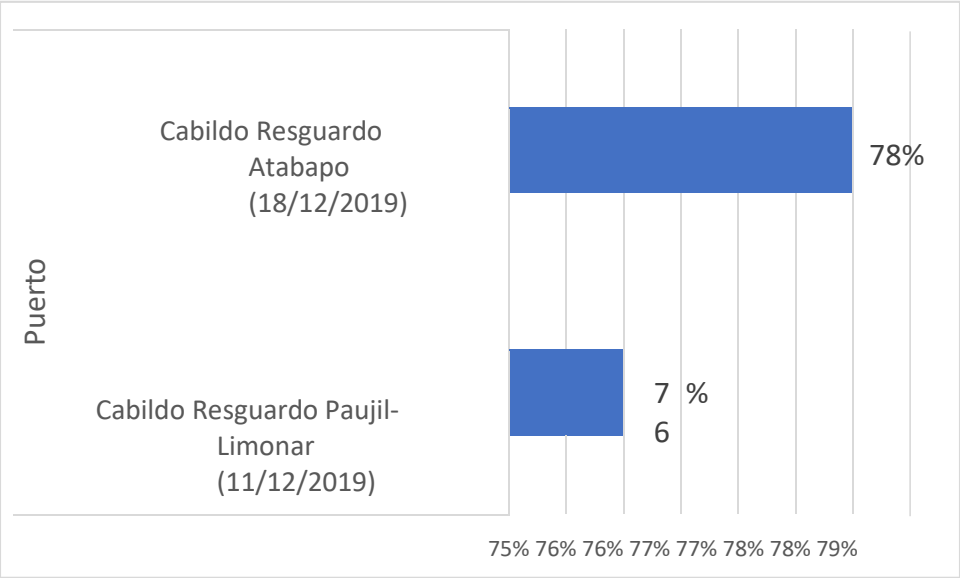


Ilustración 59 Resultado ICOE Puerto Inírida - Guainía

En la Ilustración 59 se observa que, tanto el cabildo del resguardo Paujil como el de Atabapo obtuvieron ICOEs de rango alto. En el caso de Paujil, la organización étnica mostró su mayor fortaleza en el subíndice de condiciones y atributos (100%), mientras que sus más fuertes debilidades las obtuvo en el subíndice de percepción (53%) y en el de complejidades del contexto (51%).

DEPARTAMENTO DE CAUCA

En el departamento de Cauca se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en los municipios de Guapi y Timbiquí.

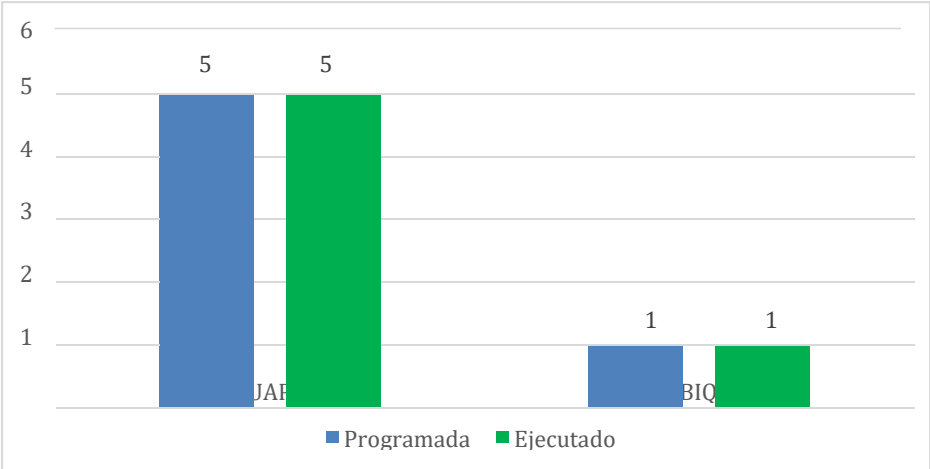


Ilustración 60 ICOEs – Cauca

En la ilustración 60, se muestran los resultados totales obtenidos del ICOE, en cada uno de los consejos comunitarios del departamento de Cauca.

Municipio de Guapi y Timbiqui

Según la ilustración, las juntas directivas de los consejos comunitarios de Alto Guapi (66%), Río Guajuí (69%) y Renacer Negro (71%) tienen su ICOE general en un rango medio-alto. De Alto Guapi, su subíndice de condiciones y atributos es el que obtuvo el puntaje más bajo (61%) lo que indica que hay que fortalecer el desarrollo comunitario y medios de vida y la identidad y cohesión comunitarias. El subíndice de percepción tanto de Río Guajuí como el de Renacer Negro fue el que obtuvo el menor puntaje (67% y 59% respectivamente), en el primero se requiere reforzar la estructura de la organización socio-política y la gobernabilidad interna, mientras que en el segundo se precisa mejorar un poco el desarrollo comunitario y medios de vida, la gobernabilidad interna y la estructura de la organización socio-política.

Las juntas directivas de los Consejos Comunitarios de Río Napi (80%), de Río San Francisco (75%) y de Guapi Abajo (74%) obtuvieron ICOEs que los posicionan en un rango alto (80%, 75% y 74% respectivamente). Todas estas organizaciones étnicas mostraron debilidad en el subíndice de percepción. De Río Napi, en dicho subíndice hay que reforzar un poco el desarrollo comunitario y medios de vida, mientras que en Río San Francisco se debe mejorar la gobernabilidad interna y el desarrollo comunitario y medios de vida y finalmente en Guapi Abajo hay que reforzar los componentes de gobernabilidad interna y de estructura de la organización sociopolítica.

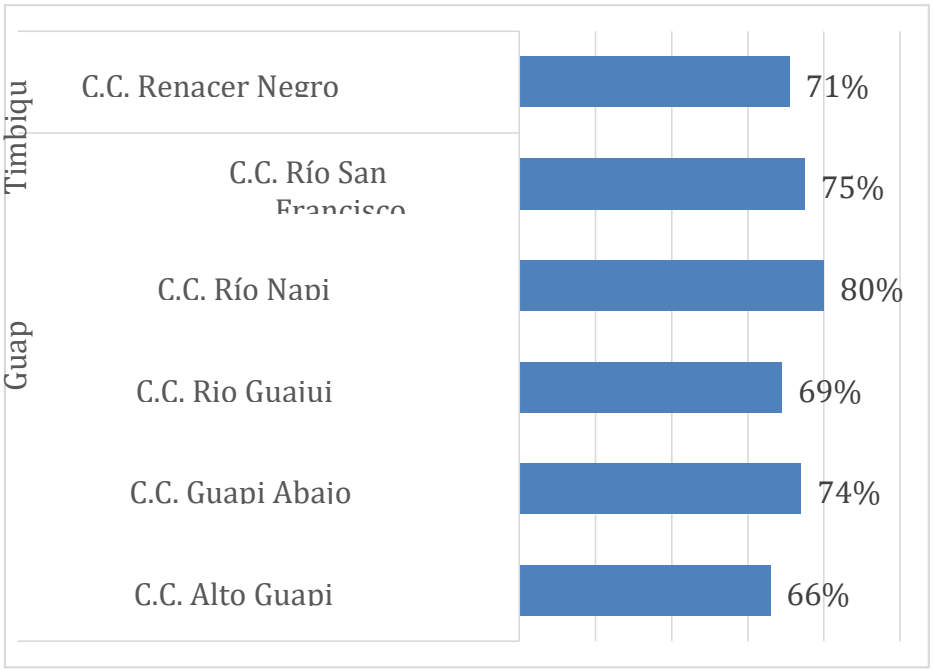


Ilustración 61 Resultados ICOEs – Cauca

DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Municipios de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo

En el departamento del Vichada se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo,

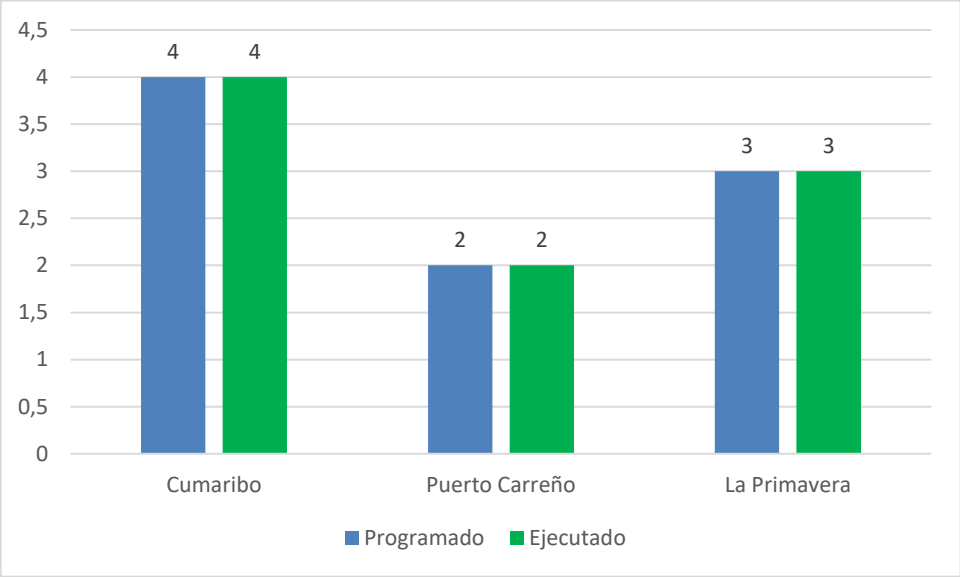


Ilustración 62 ICOEs – Vichada

En la ilustración 53 se muestran los resultados totales obtenidos del ICOE, en cada uno de los resguardos del departamento.

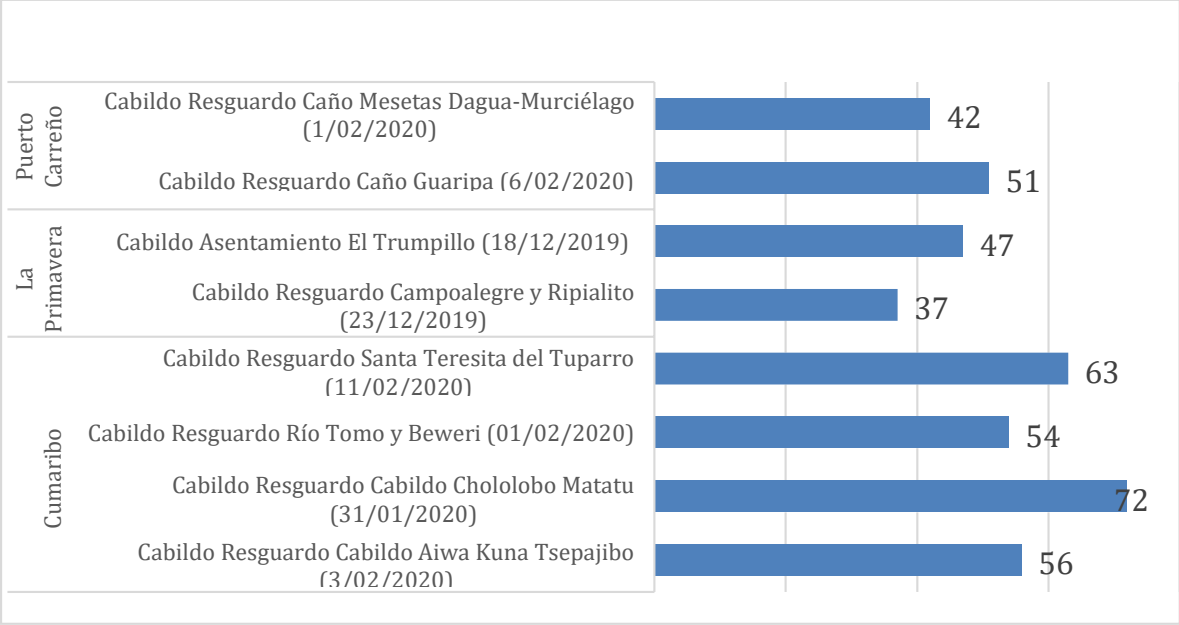


Ilustración 63 Resultados de ICOE - Vichada

Los cabildos cuyas capacidades organizativas obtuvieron un rango medio-bajo fueron los de los resguardos de Campoalegre y Ripialito (37%) y Caño Mesetas Dagua (42%). Parte del peso de este resultado en Campoalegre se debe a los subíndices de condiciones y atributos (23%) y de oportunidades de contexto (40%). En cuanto al primer subíndice, este territorio requiere ser reforzado en la estructura de la organización política, la gobernabilidad interna, la cohesión comunitaria y el desarrollo comunitario y medios de vida. Con respecto al segundo subíndice, la capacidad organizativa del municipio afecta la participación de las autoridades indígenas para posicionar las necesidades que viven en su territorio. Por otro lado, en el territorio de Caño Mesetas, su mayor debilidad se encuentra en el subíndice de condiciones y atributos (35%) ya que no cuentan con varios documentos de la organización o registro de las actividades que llevan a cabo internamente.

Los cabildos de los resguardos Aiwa Kuna Tsepajibo (56%), Caño Guaripa (51%), Río Tomo y Beweri (54%) y el del asentamiento El Trumpillo (47%) obtuvieron una clasificación de rango medio en sus capacidades étnicas. La organización étnica del resguardo Aiwa Kuna presenta debilidades en los subíndices de oportunidades de contexto (44%) y en el de condiciones y atributos (48%). En el primer caso, las autoridades indígenas carecen de impacto para mostrar la visibilidad de sus territorios en entidades territoriales como el municipio o departamento; en el segundo caso, la debilidad se manifiesta en la falta de algunos documentos que le permiten ordenar su territorio (gobernabilidad interna) y en el funcionamiento a media marcha de sus capacidades de cohesión comunitaria y en el desarrollo comunitario y medios de vida.

Los cabildos de Caño Guaripa y Río Tomo tienen en común que el subíndice de oportunidades de contexto es el que tiene los puntajes más bajos (46% y 36% respectivamente) lo que indica su debilidad para incidir sobre las instituciones públicas y privadas que operan en sus municipios y sobre otro tipo de actores (como por ejemplo los ilegales o los colonos) para posicionarse como autoridades étnicas.

En cuanto al cabildo del asentamiento indígena de El Trumpillo los puntajes del subíndice de condiciones y atributos y el de oportunidades de contexto requieren ser reforzados, principalmente porque este territorio aún no se formaliza para ser como resguardo, lo que le resta capacidad para acceder a algunos beneficios del Estado y así mismo, porque el municipio de La Primavera no ofrece suficientes oportunidades para la participación de las comunidades indígenas.

El cabildo del resguardo de Santa Teresita del Tuparro (63%) se encuentra clasificado como una organización de rango medio-alto. La mayor debilidad organizativa de este cabildo la tiene en el subíndice de oportunidades de contexto (43%), debido a que sus necesidades no se ven reflejadas en los planes de gobierno del municipio o no tienen mucho impacto en las entidades públicas o privadas que se encuentran en la región.

El territorio de Yajota a la fecha no está constituido como resguardo, lo cual tiene incidencia en los resultados que reporta la herramienta ICOE. En términos generales el cabildo se encuentra en un rango medio bajo (42%) y de sus subíndices el de mejor resultado es el de percepción (rango medio-alto), seguido de las oportunidades de contexto (rango medio) y

finalmente, el de menor puntaje es el de condiciones y atributos (rango bajo). Éste último subíndice refleja que la organización étnica carece de la documentación que le facilitaría su gestión para administrar el territorio.

Evidencia que soporta el proceso:

- Acta ICOE
- Listado de Asistencia
- Documento Excel - ICOE
- ICOE remitidos anexos al presente informe para revisión:
- https://drive.google.com/drive/folders/1G2g5F4QImBAQPKMBXCorJo-vhXQmwJjg?usp=sharing

  (Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización)

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO: *Visión de Desarrollo*
INDICADOR: *Territorios colectivos con Visión de Desarrollo*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Registro fotográfico, listados de asistencia y Visión de Desarrollo.*
META PROGRAMADA: *40 (100%)*
META EJECUTADA*: 40 (100%)*

En los 40 territorios colectivos que opera la UT Prosperidad Iraca z1, se llegó a la meta del 100%. En la siguiente tabla, se observan los territorios colectivos donde se realizó la visión de desarrollo.

DPTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO	FECHA VISION DE DESARROLLO
NARIÑO	EL CHARCO	CC Unión Taijeña	27/01/2020
		CC Prominga Tapajeña	27/01/2020
		CC Tribuna del Pueblo	29/01/2020
		CC Socio Tapaje	29/01/2020
		CC Porvenir	17/03/2020
	SAN ANDRES DE TUMACO	RI Inda – Guacaray	17/03/2020
		RI Inda – Zabaleta	14/03/2020
		RI Peña Alegría	17/03/2020
		CC Bajo Mira y Frontera	5/03/2020
		RI La Brava	5/03/2020
		RI Pulgande Campoalegre	17/03/2020

DPTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO	FECHA VISION DE DESARROLLO
NARIÑO	RICAURTE	RI Nulpe Medio-Alto Río San Juan-Pueblo AWA	2/06/2020
		RI Pialapí-Pueblo Viejo-San Miguel Yaré	18/06/2020
		Resguardo Alto Cartagena	7/06/2020
		RI Eden Cartagena	12/06/2020
		RI Ramos Mongón	19/06/2020
		RI Palmar	14/06/2020
		RI Libertad Telembí	20/06/2020
		RI Magüi	3/06/2020
		RI Integrado La Milagrosa	1/06/2020
		RI Gualcalá	6/06/2020
		RI Chaquí-Chimbuza-Vegas-San Antonio	19/06/2020
	BARBACOAS	RI Hojal La Turbia	13/06/2020
CAUCA	GUAPI	CC Guapi abajo	5/02/2020
		CC Alto Guapi	20/03/2020
		CC Rio San Francisco	15/03/2020
		CC Rio Guajui	22/02/2020
		CC Rio Napi	28/02/2020
	TIMBIQUI	CC Renacer Negro	16/03/2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	RI Caño Guaripa – murciélago	6/02/2020
		RI Caño Mesetas – Dagua	2/02/2020
		RI Campoalegre y Ripialito	8/02/2020
		RI El Trumpillo	20/02/2020
	LA PRIMAVERA	RI Yajota	19/05/2020
		RI Aiwa Kuna	3/02/2020
		RI Chololobo Matatu	30/01/2020
		RI Río Tomo Beweri	1/02/2020
	CUMARIBO	RI Santa Teresita del Tuparro	20/02/2020
		RI Atabapo	18/12/2019
GUAINIA	PUERTO INIRIDA	RI Paujil	19/12/2019

Tabla 10 Visión de desarrollo realizados en los 4 Departamentos

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

En el departamento de Nariño se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en los municipios de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas y El Charco. Ver ilustración 64.

Las visiones de desarrollo de estos territorios se proyectaron entre el 2023 y 2030. A continuación, la ilustración 65 se muestra la clasificación de temas y el número de territorios que lo reportaron.

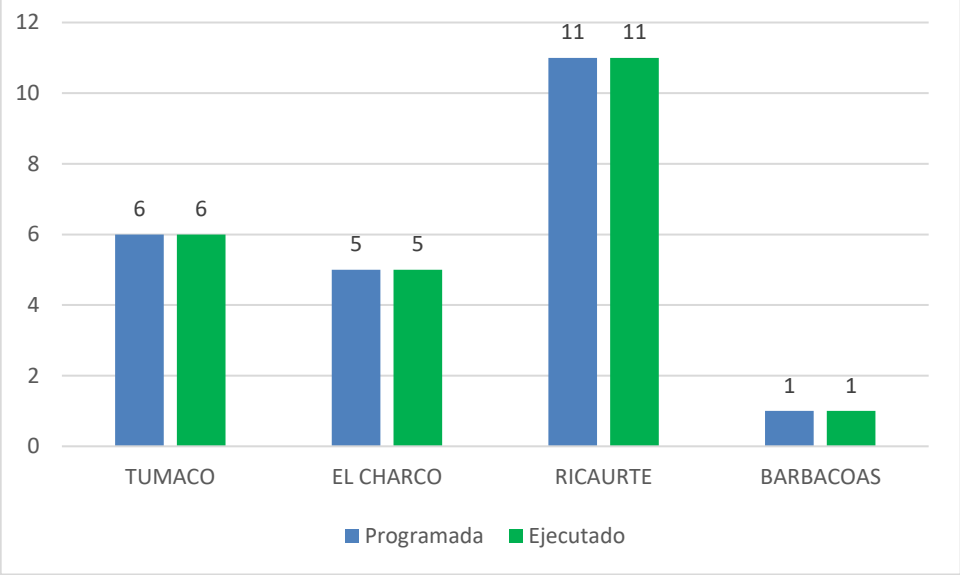


Ilustración 64 Visión de Desarrollo – Nariño

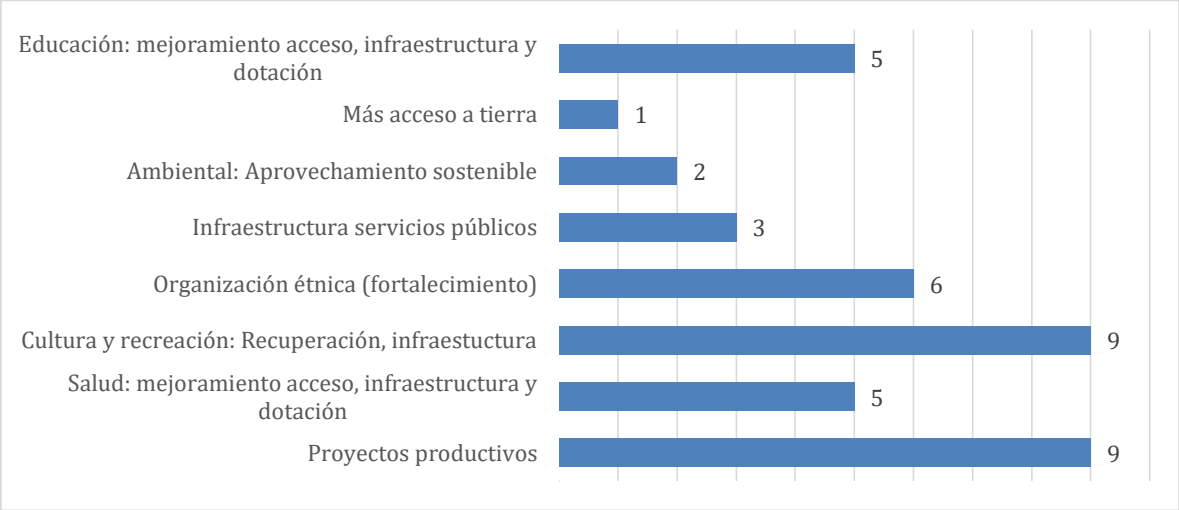


Ilustración 65 Resultados Visión de Desarrollo – Nariño

Municipios de El Charco y San Andrés de Tumaco

Los temas más recurrentes fueron los de proyectos productivos (9) y lo relacionado con cultura y recreación (9). El primer tema fue mencionado en los consejos comunitarios menores del municipio de El Charco (excepto en el territorio de Prominga Tapajeña), el Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera y en los resguardos de El Cedro-La Brava, Peña Alegría y Pulgande Campoalegre. Del consejo comunitario menor de Unión Taijeña, el tema productivo especifica productos como el plátano, la yuca y la papa china; se incluyeron los centros de acopio en los territorios de Socio Tapaje, Bajo Mira y Frontera y Unión Taijeña; y se mencionó únicamente en el fortalecimiento de la asociatividad en el resguardo Pulgande Campoalegre y en Socio Tapaje.

En cuanto al tema cultural, éste se enfocó en el rescate de tradiciones y saberes ancestrales y fue reportado en los consejos comunitarios de Unión Taijeña, Prominga Tapajeña, Socio Tapaje y Bajo Mira y Frontera y en los resguardos de El Cedro-La Brava, Inda Guacaray e Inda Zabaleta, cabe mencionar que sólo Pulgande Campoalegre y Peña Alegría incluyeron el tema de una infraestructura para la recreación. Adicionalmente se proyectó que en el rescate cultural se incluya infraestructura social como casas de cultura en los territorios de Unión Taijeña, Prominga Tapajeña y Socio Tapaje.

El fortalecimiento de las organizaciones étnicas se describió en los territorios de Unión Taijeña, Tribuna del Pueblo, Prominga Tapajeña, Bajo Mira y Frontera, Inda Guacaray e Inda Sabaleta.

Los temas educación y salud se mencionaron en estos 5 territorios: Consejos Comunitarios de Tribuna del Pueblo, Prominga Tapajeña y Socio Tapaje (éste último especificó un Centro de Desarrollo Infantil - CDI) y los resguardos de Peña Alegría y Pulgande.

Las visiones de desarrollo que incluyeron los servicios públicos se reportaron en los territorios de El Charco de Tribuna del Pueblo, Prominga Tapajeña y Socio Tapaje. Los servicios reportados fueron agua, energía, alcantarillado y comunicaciones.

El manejo sostenible de los recursos naturales se mencionó en Socio Tapaje e Inda Sabaleta. Finalmente, el acceso a la tierra se reportó únicamente en el resguardo Peña Alegría el cual carece de espacio para cultivar.

Municipios de Ricaurte y Barbacoas

Se analizaron para estos 2 Municipios 12 Visiones de Desarrollo, Ricaurte (11) y Barbacoas (1). En este sentido se revisaron 11 visiones de desarrollo de los territorios étnicos localizados en Ricaurte, de los cabildos del resguardo de Alto Cartagena, Edén Cartagena, Magüí, Ramos Mongon, Vegas Chagüi, Palmar Imbí, Nulpe Medio, Telembi, Integrado La Milagrosa Cualquier Viejo, Gualcala, Pialapi Pueblo Nuevo Viejo San Juan. Y un (1) Territorio étnico localizado en Barbacoas correspondiente al resguardo indígena Hojal de turbia. De este

ejercicio se encontró que las comunidades beneficiarias del programa IRACA de dichos resguardos, proyectaron sus visiones al año 2028.

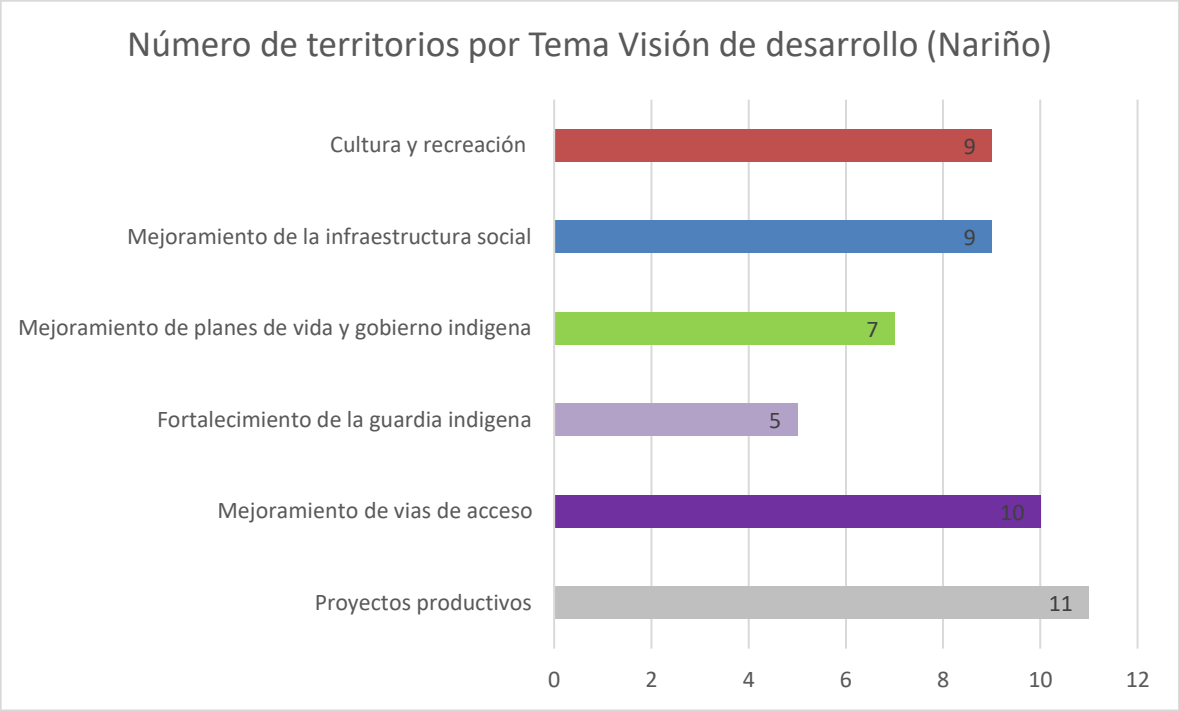


Ilustración 66 Descripción de visiones de la comunidad, resguardos de Ricaurte y Barbacoas

De acuerdo a la gráfica anterior, las 11 comunidades quieren centrar sus intereses en la implementación de proyectos productivos para contribuir a su seguridad alimentaria y sostenibilidad económica los cuales incluyen instalación de infraestructura para la cría de especies menores, piscicultura, porcicultura, ganadería, comercialización de huevos de gallina; ecoturismo (propuesto por los resguardos de Alto Cartagena y Eden Cartagena); la implementación y mantenimiento de Huertas caseras (Alto Cartagena, Magui) y la siembra de limón – aguacate – mandarina arazá (Alto Cartagena).

A excepción de Magüi, los 10 resguardos restantes proyectaron sus esfuerzos en la visión de desarrollo a 2028 frente al mejoramiento de vías de acceso caminos de paso y caminos ancestrales, aspecto que según la comunidad favorece el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias a partir de la tenencia de vías de acceso adecuadas para el transporte de sus productos y el relacionamiento comunitario.

En cuanto al fortalecimiento de la guardia indígena 5 de los resguardos correspondientes a Alto Cartagena, Magui, Vegas Chagüi, Pialapi Pueblo Nuevo Viejo San Juan y Palmar Imbi), encuentran en este tema una oportunidad para consolidarse como comunidad a 2028.

El mejoramiento de la infraestructura social fue reportado por 9 resguardos (a excepción de Alto Cartagena y ramos Mongón), que reconocen en la adecuación y mejoramiento de las condiciones de espacios como la casa cabildo trapiche comunitario, fortalecimiento de la tienda comunitaria, la posibilidad de fortalecimiento del tejido social de las comunidades y

la conservación de las costumbres culturales.

En lo respectivo al mejoramiento de los planes de vida y gobernabilidad indígena los resguardos de Edén Cartagena, Ramos Mongon, Vegas Chagüi, Palmar Imbí, Nulpe Medio, Pialapi Pueblo Nuevo Viejo San Juan y Hojal de turbia, consideran que esta visión de desarrollo ayudará a afianzar los principios de autonomía territorial, la actualización del reglamento interno.

Otro tema de interés está relacionado con la cultura y la recreación, a partir del establecimiento y mejora de espacios recreacionales para la realización de actividades lúdicas y deportivas. Los resguardos que no proyectaron acciones en su visión frente a este tema fueron Alto Cartagena y Vegas Chagüi.

De acuerdo a los demás resguardos (Edén Cartagena, Magüí, Ramos Mongon, Palmar Imbí, Nulpe Medio, Integrado La Milagrosa Cualquier Viejo, Gualcala, Pialapi Pueblo Nuevo Viejo San Juan, y Hojal de turbia), esta visión a 2028 promoverá el establecimiento de entornos protectores importantes para el desarrollo económico de sus habitantes, el aprovechamiento del tiempo libre especialmente de la población infantil del resguardo.

DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

Municipio de Puerto Inírida

Del departamento de Guainía los datos de *Visión de Desarrollo* son del 100% de los territorios, que son los provenientes de los resguardos de Atabapo (comunidad Concordia) y de Paujil (comunidades de Cucurital, Platanillal y Cimarrón).

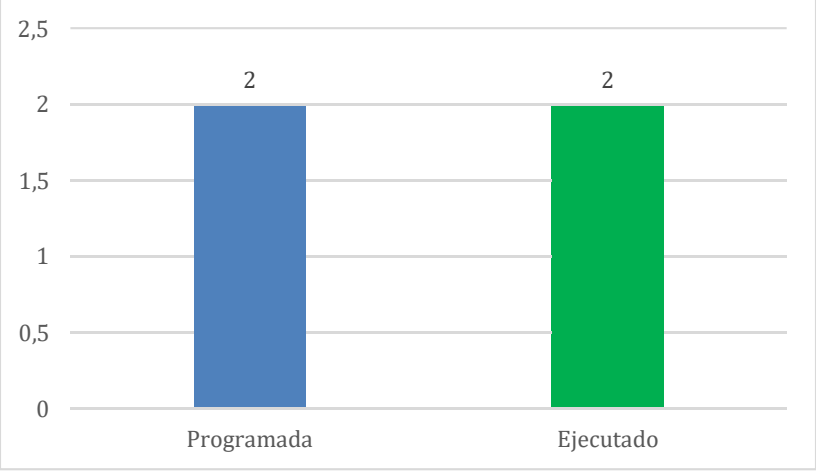


Ilustración 67 Visión de Desarrollo Municipio Puerto Inírida - Guainía

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes plasmados por las comunidades en cada una de las visiones proyectadas a 2025.

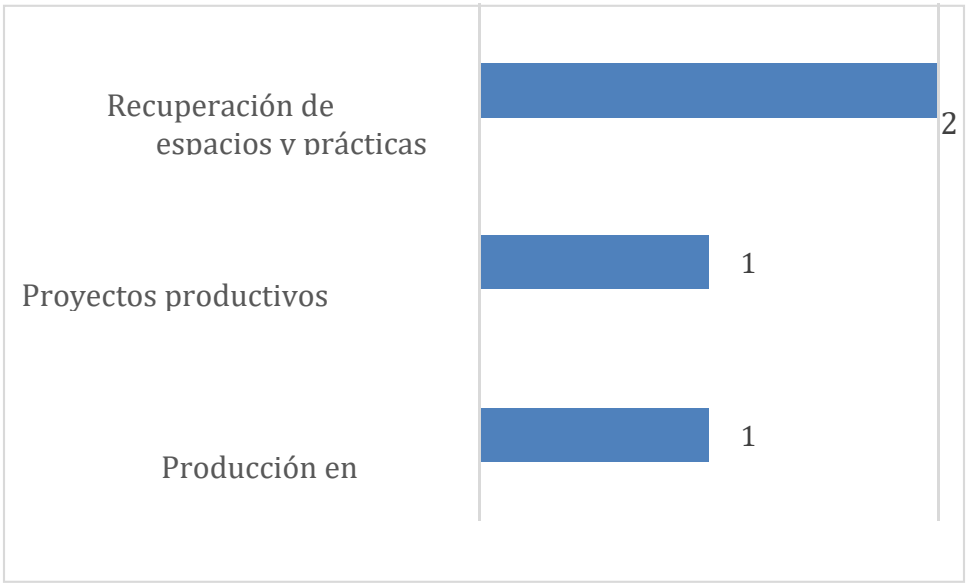


Ilustración 68 Resultados Visión de Desarrollo - Guainía

Según la ilustración anterior, los intereses futuros de estas comunidades quieren centrar sus acciones en: la producción de conucos o huertas indígenas (resguardo Atabapo), las cuales hacen parte la seguridad alimentaria; la generación de proyectos productivos sostenibles (resguardo Paujil) y la recuperación de espacios y prácticas culturales (ambos resguardos), dado que en esta región hay una gran preocupación por la paulatina pérdida de lenguas nativas (como son el cubeo, puinave, curripaco, entre otras) y de costumbres.

DEPARTAMENTO DE CAUCA

Municipios de Guapi y Timbiquí

En el departamento de Cauca, se llegó al 100% de la meta programada de Visión de Desarrollo en los municipios de Guapi y Timbiquí. Ver ilustración 69.

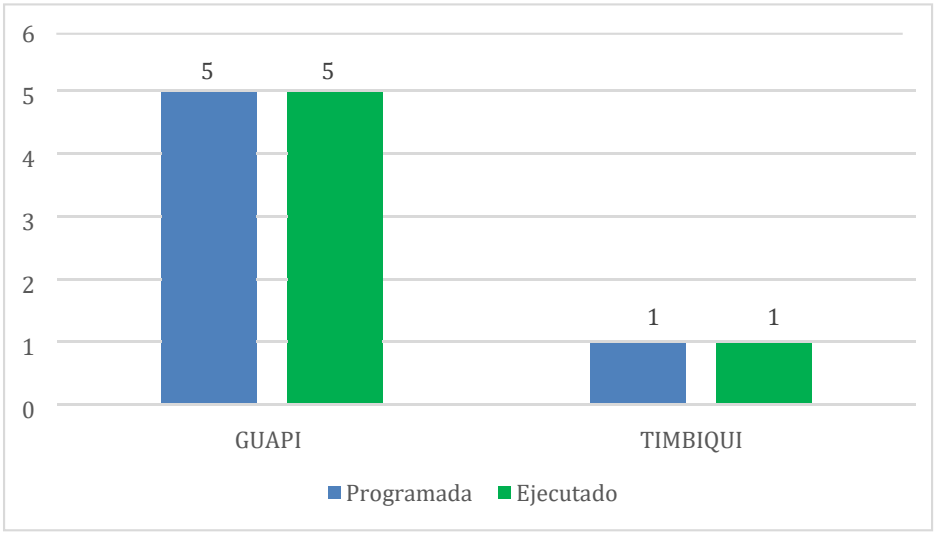


Ilustración 69 Visiones de Desarrollo – Cauca

En la ilustración 70, se presentan los aspectos más relevantes que los consejos comunitarios plasmaron en su visión de desarrollo a 2025.

Se evidencia que los temas de salud, educación y proyectos productivos se reportaron en los Consejos Comunitarios de Guapi Abajo, Alto Guapi, Río San Francisco y Renacer Negro

La cultura y la recreación, el fortalecimiento de la organización étnica y la paz se mencionaron en 2 territorios, siempre presente entre ellos Alto Guapi. En el primer tema, además fue reportado Guapi Abajo; en el segundo Río Napi y en el tercero, Río San Francisco.

El mejoramiento de las viviendas y el acceso a servicios públicos (energía), sólo fue reportado en el Consejo Comunitario del Río San Francisco y Renacer negro, así mismo el tratamiento de aguas residuales.

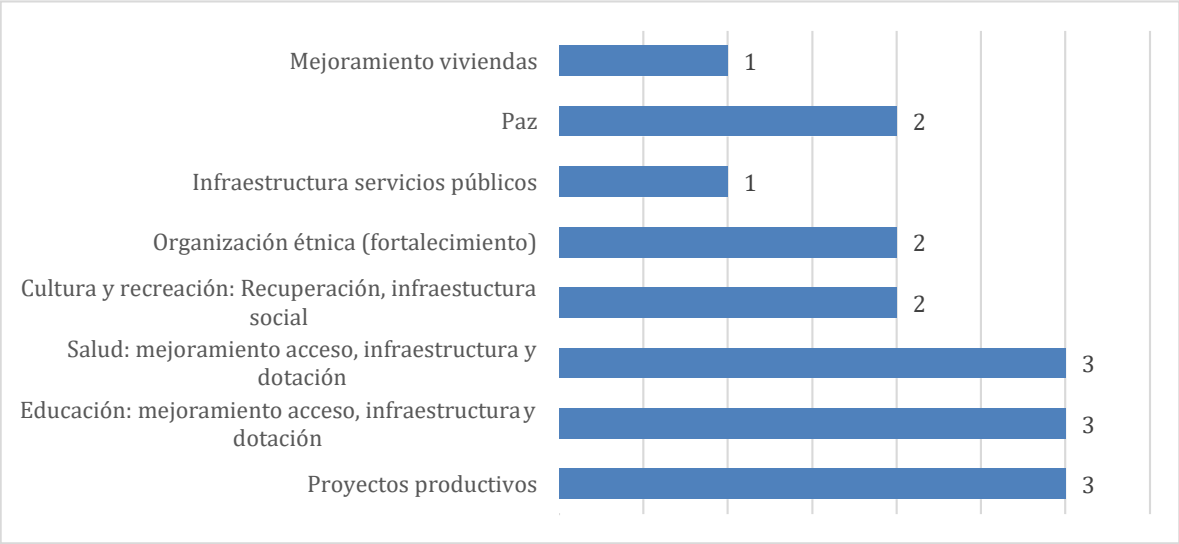


Ilustración 70 Resultados Visión de Desarrollo - Cauca

En el Consejo Comunitario Renacer Negro proyectan una educación técnica dentro del territorio, una infraestructura para la transformación de productos agropecuarios y empresas con capacidad de empleo y de producción de bienes y servicios.



Ilustración 71 Desarrollo de la Actividad de Visión de Desarrollo (Consejo Comunitario Renacer Negro – Timbiquí-Departamento del Cauca)

DEPARTAMENTO DE VICHADA

Municipios de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo

En el departamento de Vichada se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada. Ver ilustración 72.

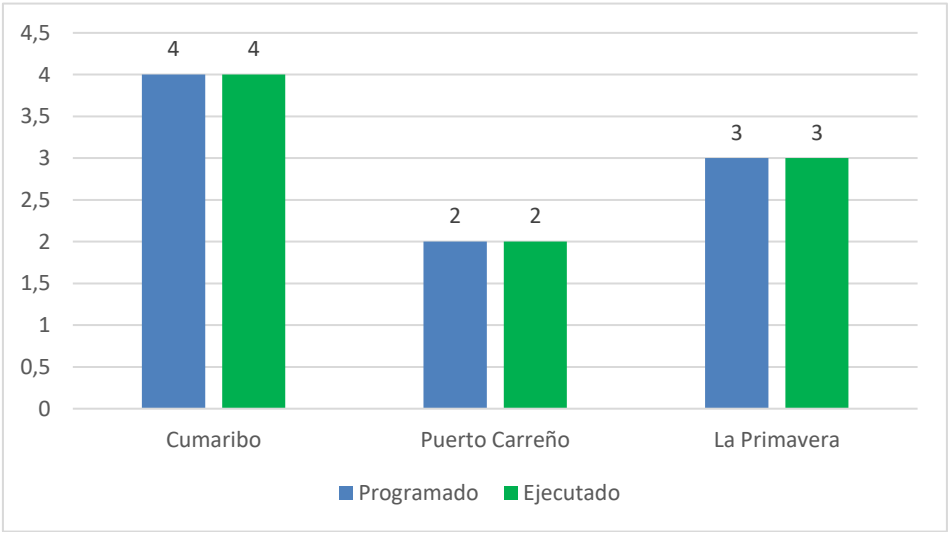


Ilustración 72 Visión de Desarrollo – Vichada

En la siguiente ilustración se presentan los aspectos más relevantes de las visiones de desarrollo de los 9 resguardos indígenas, las cuales fueron proyectadas entre 2024 y 2028.

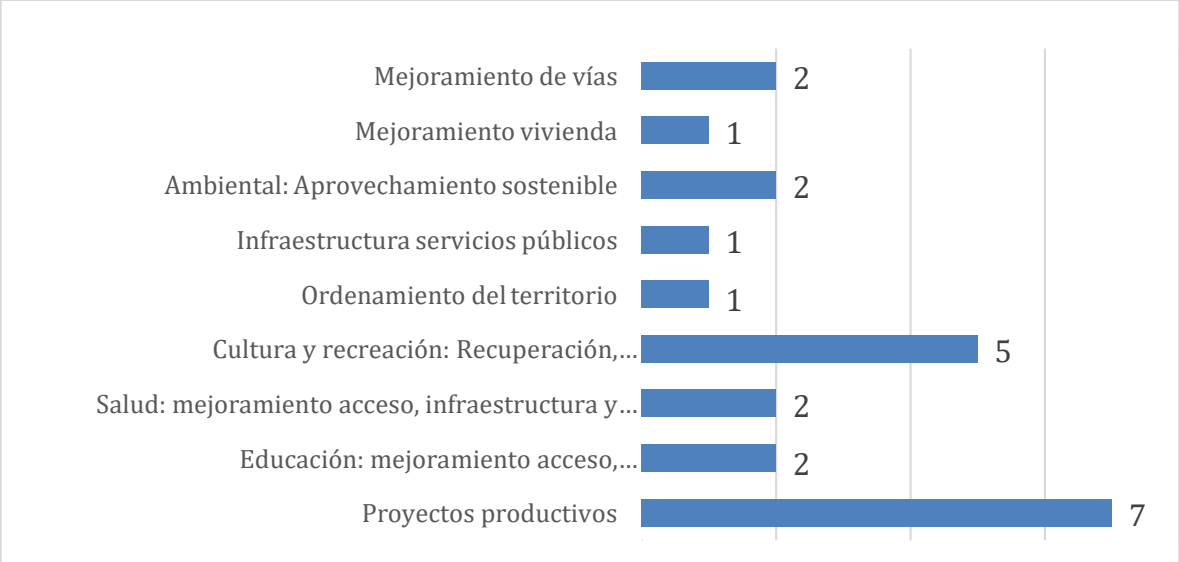


Ilustración 73 Resultados Visión de Desarrollo - Vichada

Los proyectos productivos fueron mencionados en todos los territorios de este departamento, excepto en el asentamiento indígena de El Trumpillo, el cual queda ubicado prácticamente en la cabecera municipal de La Primavera. La producción y comercialización de productos específicos dentro de la visión de desarrollo se detallaron en los resguardos de Campoalegre y Ripialito (producción de yuca, cacao, caña y ganadería), Chololobo Matatu (ají) y Santa Teresita del Tuparro (yuca amarga). Cabe mencionar que en los resguardos de Cumaribo (excepto en Aiwa Kuna Tsepajibo), se resalta la importancia de que sus territorios al llegar al año proyectado cuenten con asociaciones productivas fortalecidas.

El segundo tema más común es el relacionado con la cultura y recreación, el cual se presentó en 5 territorios, todos ellos pertenecientes a la etnia *sikuani* (asentamiento El Trumpillo y los resguardos de Caño Mesetas Dagua, Chololobo Matatu, Río Tomo Beweri y Santa Teresita del Tuparro), porque hace referencia a espacios de interacción social (incluyendo infraestructura) y de encuentro colectivo. Dentro de los temas culturales se encuentra el trabajo en *unuma*, que es una forma de trabajo colectivo que destaca la reciprocidad y el ofrecimiento de comida y bebida a quienes participan en esta actividad. Así mismo, se busca el fortalecimiento de la cultura, atendiendo a la ley de origen sikuani.

Los temas de salud y educación fueron un tema de interés para los resguardos de Caño Mesetas y Aiwa Kuna Tsepajibo. En ellos se incluye la cobertura, dotación e incluso el mejoramiento o adquisición de un lugar dentro de sus territorios donde se puedan atender las enfermedades.

El tema ambiental fue resaltado en los resguardos de Chololobo Matatu y de Río Tomo Beweri, indicando que el respeto a “la madre tierra” y vivir en “paz y armonía” con la naturaleza son fundamentales para la reproducción cultural sikuani.

El mejoramiento de vías fue reportado en los resguardos de Campoalegre y Ripialito y de Aiwa Kuna Tsepajibo. Cabe anotar que la mayoría de los territorios indígenas de Vichada carecen de vías de acceso o las que tienen se encuentran en mal estado.

El mejoramiento de vivienda e infraestructura agua se mencionó sólo en el resguardo de Campoalegre y Ripialito, y el tema de fortalecimiento de la organización étnica (resguardo organizado a nivel regional) sólo se nombró en el resguardo de Caño Guaripa.

Evidencia que soporta el proceso:

- Acta de Reunión
- Listado de Asistencia
- Cartografía Social a futuro
- Visión de Desarrollo
- Evidencias de visión de Desarrollo anexas al presente informe:
  https://drive.google.com/drive/folders/1qAIBrr0CRDgSLiQS_9M7rpyF-j-L1epB?usp=sharing
  (Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización).

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO: *Diagnóstico Comunitario*
INDICADOR: *Territorios colectivos participantes en el proceso de Diagnóstico Comunitario, el cual debe incluir los hogares vinculados al programa.*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Informe de diagnóstico comunitario, listados de asistencia y registro fotográfico.*
META PROGRAMADA: *40 (100%)*
META EJECUTADA: *40 (100%)*

En los 40 territorios colectivos que opera la UT Prosperidad Iraca z1, se llegó a la meta del 100% de la meta programada.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

En el departamento de Nariño, se alcanzó una meta de 23 diagnósticos realizados, en el municipio de Ricaurte para los (11) resguardos indígenas y uno (1) para el Resguardo de Hojal La Turbia Barbacoas, cinco (5) para El Charco y seis (6) Tumaco.

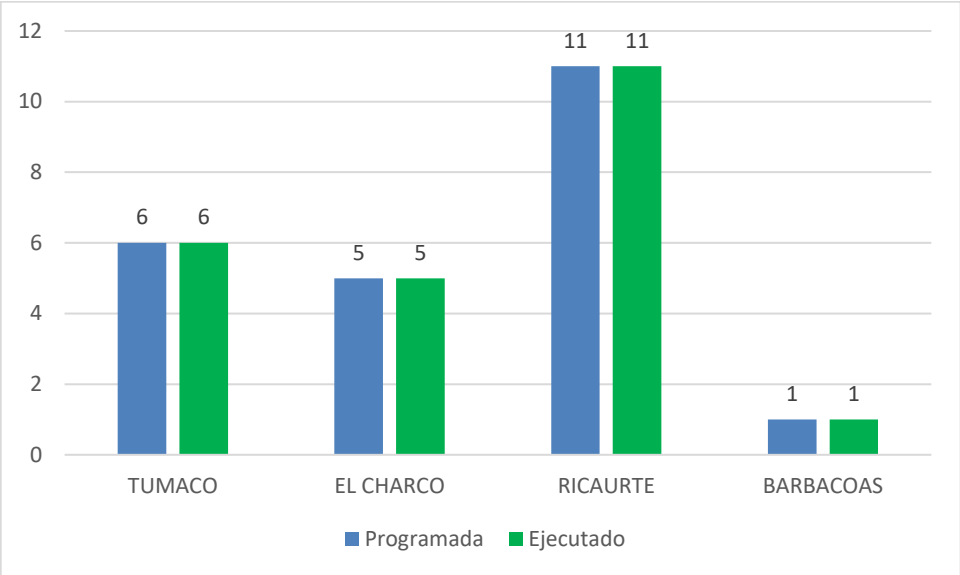


Ilustración 74 Diagnósticos Comunitarios - Nariño

Municipio de Tumaco

En el Resguardo Indígena Inda Guacaray, encontramos en el componente de Seguridad Alimentaria: (- Pérdida de hábitos alimenticios tradicionales, No hay interés por cultivar las semillas nativas y es insuficiente la que hay, Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, Se cultiva lo siguiente: chiro, plátano, yuca, ají, borojo, tomate, pepino, sandia, zapallo, chilma, caña, manzano, naranja, maíz, chillangua, chillaran varqueño, limón y cacao, Cría de: aves gallina, pato, cerdo y Recolección y venta de huevos de gallinas ponedoras. Proyectos Productivos:(Jóvenes trabajando en cultivos de coca, Productos son vendidos a bajo precio (yuca), Difícil comercialización, No se cuenta con un centro de acopio, No hay tecnificación al momento de sembrar y cosecha de los productos y Estanques piscícolas en mal estado.

Fortalecimiento Social: (Territorio propio, Presencia de grupos armados y de cultivos de uso ilícito, Fumigación aérea con glifosato, Presencia de tuberías de hidrocarburos. Actores ilegales hacen extracción ilegal de petróleo, contaminando las fuentes de agua, Se carece de servicios públicos, La comunidad escolar debe hacer su bachillerato en el corregimiento de Llorente, Pérdida de saberes y valores ancestrales (incluyendo la lengua Awapit) y se han adoptado costumbres de los colonos. Además, la Institución educativa en mal estado, además requiere dotación. Deserción escolar, El puesto de salud carece de dotación de primero auxilios y herramientas médicas, inadecuado manejo de los recursos naturales y contaminación y el porcentaje general del ICOE fue del 66%, resultado que también se obtuvo en todos sus subíndices.

En el Resguardo Indígena La Brava encontramos en el componente de Seguridad Alimentaria: (Escasez de semillas, Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, Falta

de asistencia técnica en los cultivos y Desnutrición y malnutrición. En el componente de Proyectos Productivos: (Economía de subsistencia (caza, pesca, recolección, agricultura a baja escala y actividades agropecuarias para autoconsumo), Jóvenes trabajando en cultivos de coca, Productos son vendidos a bajo precio y No hay mercados para vender los productos. En el componente de Fortalecimiento Social: (Territorio propio , Presencia de grupos armados y de cultivos de uso ilícito, Fumigación aérea con glifosato, Se carece de servicios públicos, Caminos y vías en mal estado, Institución educativa en mal estado, además requiere dotación, Desplazamiento y retorno a comunidades sin garantías de seguridad, Pérdida de saberes y valores ancestrales (incluyendo la lengua Awapit) y se han adoptado costumbres de los colonos, Violencia a la mujer (intrafamiliar y por actores armados), El puesto de salud carece de dotación de primero auxilios y herramientas médicas, Inadecuado manejo de los recursos naturales y el ICOE total 58% (rango medio). Puntaje más bajo en el subíndice de percepción (36%).

Para el Resguardo Indígena Peña Alegría, tenemos que el territorio ancestral tiene una población aproximada de 250 habitantes, compuesta de 125 familias aproximadamente, organizadas en 2 comunidades de los cuales 66 son beneficiarios directos del programa IRACA Z1. El territorio está legalmente constituido mediante el Acuerdo 212 del 9 de julio de 2010. Las condiciones desfavorables del entorno obligaron a los nativos a desarrollar actividades económicas de subsistencia como la agricultura principalmente en el trabajo por jornales, como una actividad de sobrevivencia, ya que no cuentan con las tierras suficientes para cultivar, la piscicultura y cría de animales domésticos, así mismo, la caza de animales de monte como la tatabra, el armadillo, el venado, entre otros y esto se realiza por tradición. El territorio no cuenta con agua potable y las fuentes están lejanas al territorio, por tanto ellos, usan agua lluvia y cabe la posibilidad, de contaminación, tampoco cuentan con acueducto; aunque disponen de sistemas artesanales construidos con mangueras y tanques, así se abastecen de agua. Esta comunidad tiene un gran deseo de cultivar en sus huertas comunitarias Tomate, cebolla, pepino, y cilantro, esto con el fin de poder tener acceso rápido a estos productos, ya que, según sus creencias, los productos traídos de afuera, le hacen daño a su salud, y la mejor opción es ellos mismo cultivarlos.

En el Resguardo Indígena de Pulgande, tenemos que de acuerdo a la RESOLUCIÓN 039 31/05/1999 por medio de la cual se confiere carácter legal de resguardo indígena, en favor de la comunidad Awa de Pulgande Campo Alegre, a un globo de terreno baldío, localizado en jurisdicción del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. El resguardo Pulgande Campoalegre tiene 390 habitantes conformada por 112 familias de los cuales 66 son beneficiarios directos del programa IRACA Z1. Para el pueblo Awá Kuaiker el territorio es un espacio de vida que permite mantener el equilibrio con los espíritus y la naturaleza, que cuenta con lugares diferenciados para trabajar, cultivar, pescar, vivir y recrear el pensamiento. Las actividades agrícolas que se desarrollan en el territorio la gran mayoría son de pan coger y entre esos cultivos se encuentran el chiro, yuca, plátano, papakun, papachilma, limón, guayaba, naranja, lulo como cultivos más importantes. También se pueden encontrar algunas plantas medicinales como menta, limoncillo entre otras. Dentro de las actividades pecuarias se encuentran la cría de gallina y pesca artesanal con fines de autoconsumo, no se

realiza explotación forestal ni de fauna y flora silvestre. Los suelos son de baja fertilidad, ácidos, poco contenido de calcio, magnesio, potasio, fosforo y nitrógeno. Con respecto a la lengua nativa que es el awapit no todos los miembros de la comunidad la practican por lo tanto esta identidad cultural se ha ido perdiendo.

La pérdida de la lengua en gran parte se debe a los sistemas escolares de la región, que han sido poco sensibles a sus necesidades culturales y lingüísticas y no cuentan con el recurso humano para practicar esta lengua. Las vías de acceso al resguardo son ineficientes, no cuentan con puentes para cruzar las pequeñas quebradas que pasan por el territorio, que cuando hay creciente de los ríos, los habitantes no pueden cruzar. Si se presenta un caso de emergencia las personas deben esperar a que las aguas bajen para poder cruzar. Sólo hay acceso por vía terrestre en un camino que dura aproximadamente dos horas a pie el cual se encuentra en mal estado debido a que transitan animales de trabajo como caballos y que se ve muy afectado cuando hay lluvias porque el suelo se vuelve muy lodoso.

El territorio es amenazado por la presencia de grupos ilegales al margen de la ley, afectando el bienestar de las comunidades que habitan el territorio. Debido a estos aspectos negativos mencionados todo el territorio se encuentra en constante amenaza y condición de vulnerabilidad. Esta zona del municipio de Tumaco por lo general es lluviosa, esto quiere decir que llueve la mayor parte del tiempo, puesto que se encuentra a las cercanías del piedemonte costero que es una de las zonas más lluviosas del departamento, por ende, la comunidad está expuesta a inundaciones y desbordamiento de los ríos que la rodean constantemente por la lluvia permanente.

Como resultado general se puede concluir que en la mayoría de territorios analizados se presentan problemas de desnutrición infantil, falta de agua potable, también la falta de transporte, la escasez de vías y las pocas vías que hay en los territorios se encuentran en mal estado, así mismo, el conflicto armado causado por grupos al margen de la ley aquejan actualmente al departamento y a nivel interno desafortunadamente el poco interés de los jóvenes por los saberes ancestrales y el servicio de salud precario complican la situación de ésta población.

En la siguiente ilustración, se describen las líneas o enfoques que se pudieron observar en el desarrollo del diagnóstico, en el municipio de Tumaco.

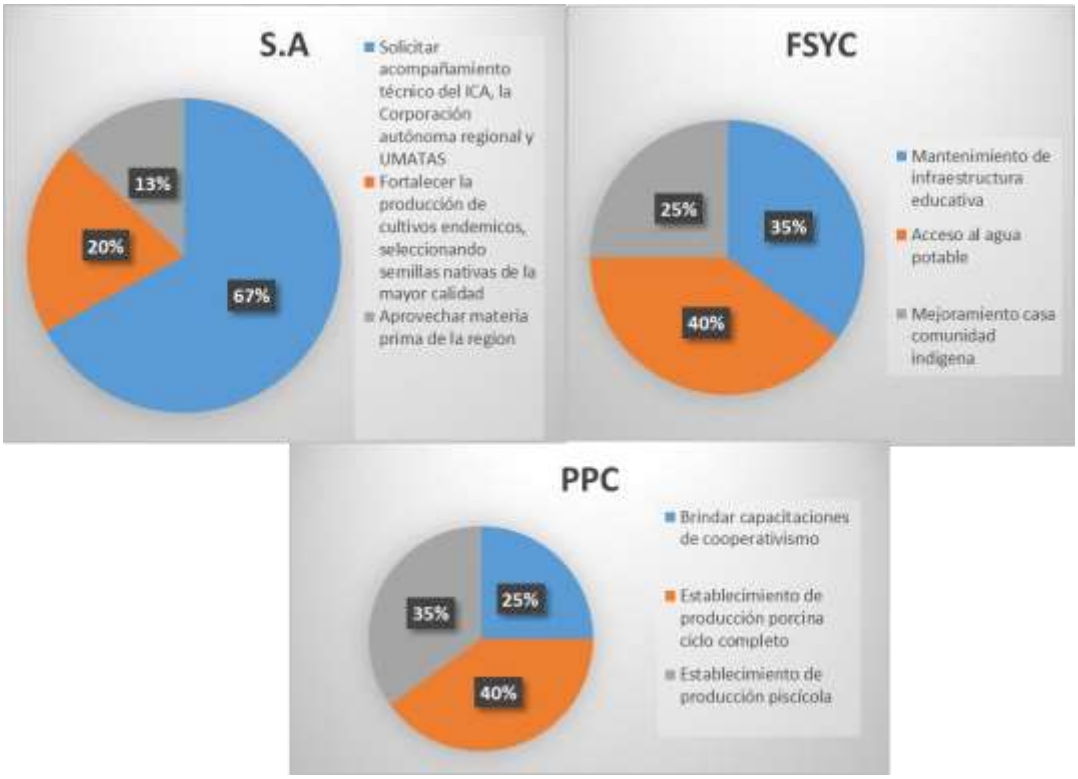


Ilustración 75 Acciones necesarias por componentes, Tumaco – Nariño

A nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que el enfoque de los Resguardos del municipio de Tumaco se requiere solicitar acompañamiento técnico y apoyo en insumos a entidadescomo el Instituto Colombiano Agropecuario, Corporación autónoma regional y UMATAS.

En el componente de fortalecimiento social y comunitario es necesario planificar estrategias que permitan solucionar el problema de la falta de agua potable para la comunidad, mejorando la capacidad de almacenamiento del acueducto, reemplazar insumos obsoletos, aportar materiales para ampliar la cobertura y otros procedimientos que contribuyan a mitigar este problema.

En el componente productivo es necesario fortalecer la producción pecuaria, específicamente cerdos y peces, además crear conciencia en las comunidades sobre las bondades de la asociatividad y el cooperativismo en una comunidad.

Municipio de El Charco

En la siguiente ilustración, se describen las líneas o enfoques que se pudieron observar en el desarrollo del diagnóstico, en el municipio de El Charco.

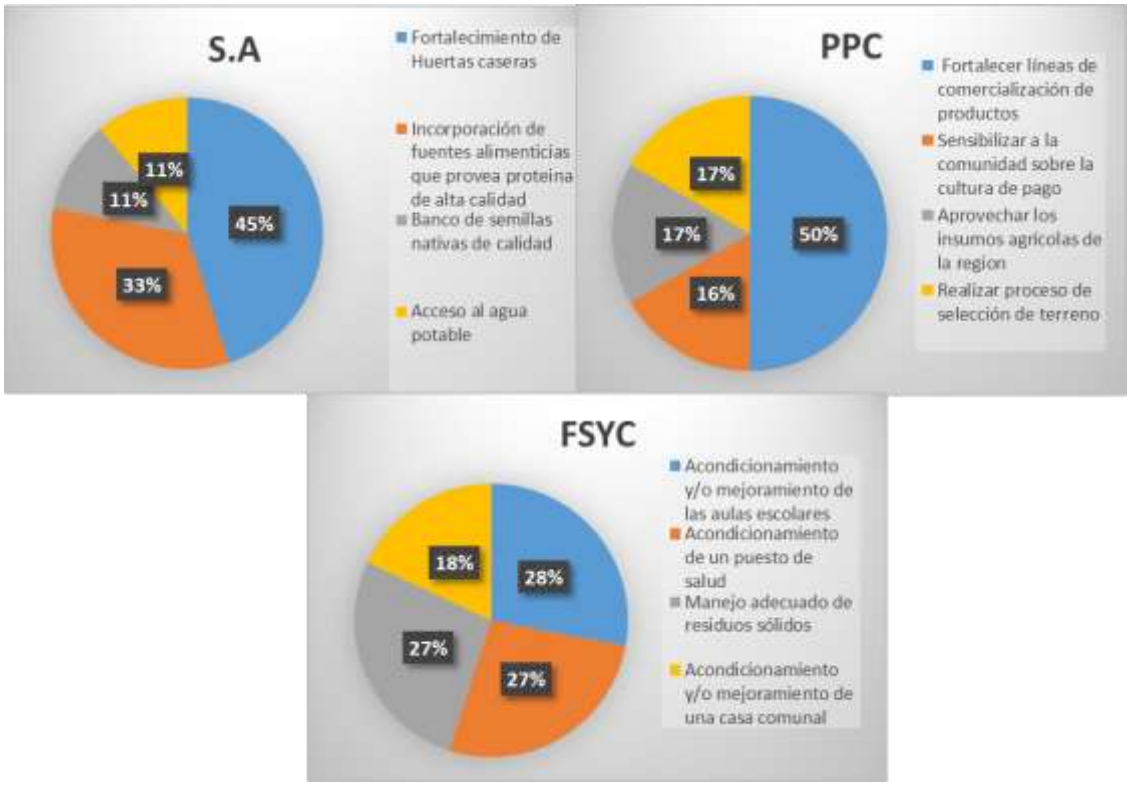


Ilustración 76 Acciones necesarias por componente, El Charco – Nariño

A nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que el enfoque de los Consejos Comunitarios del municipio de el Charco es la necesidad del fortalecimiento de huertas caseras para proveer alimentos a la comunidad a través de cultivos de pan coger tales como el plátano hartón, el maíz chococito, las hortalizas como el pepino cohombro, el tomate chonto, el cebollín, el cimarrón y la albahaca.

A nivel de proyecto productivo comunitario se necesita fortalecer las líneas de comercialización de productos mediante el establecimiento de los canales de distribución (mercado mayorista, minorista, por internet, medios de comunicación, entre otros) y así mismo, fortalecer las líneas agrícolas y pecuarias de la región, brindar capacitaciones y acompañamiento en temas de promoción de los productos y realizar alianzas comerciales y/o productivas, también la implementación, producción y certificación del sello verde (productos orgánicos).

En el componente de fortalecimiento social y comunitario el acondicionamiento y mejoramiento de aulas a través de la construcción de baños, el mejoramiento de aulas y la adecuación de los escenarios lúdico-deportivos facilitará el acceso a la educación en los

jóvenes de la comunidad, evitando el analfabetismo en los miembros de las comunidades.

Municipio de Ricaurte

En la siguiente tabla se presentan los territorios colectivos, en los cuales se desarrolló el diagnóstico comunitario en los municipios de Ricaurte y Barbacoas.

DPTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO COMUNITARIO	FECHA DIAGNOSTICO COMUNITARIO
NARIÑO	RICAURTE	Resguardo Indígena Nulpe Medio-Alto Río San Juan-Pueblo AWA	7/6/2020
		Resguardo Indígena Pialapí-Pueblo Viejo-San Miguel Yaré	24/6/2020
		Resguardo Alto Cartagena	12/6/2020
		Resguardo Indígena Eden Cartagena	18/6/2020
		Resguardo Indígena Ramos Mongón	24/6/2020
		Resguardo Indígena Palmar	20/6/2020
		Resuargo Indígena Libertad Telembí	26/6/2020
		Resguardo Indígena Magüi	9/6/2020
		Resguardo Indígena Integrado La Milagrosa	5/6/2020
		Resguardo Indigena Gualcalá	11/6/2020
		Resguardo Indígena Chaquí-Chimbuza-Vegas-San Antonio	22/6/2020
	BARBACOAS	Resguardo Indigena Hojal La Turbia	19/6/2020

Tabla 11 Diagnósticos comunitarios realizados en Nariño

Se construyeron, revisaron y analizaron once (11) Diagnósticos Comunitarios correspondientes a los Resguardos Alto Cartagena, Edén Cartagena, Magüí, Ramos Mongon, Vegas Chagüi, Palmar Imbí, Nulpe Medio, Telembi, Integrado La Milagrosa Cualquier Viejo, Gualcala, Pialapi Pueblo Nuevo Viejo San Juan, ubicados en el Municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, que corresponden al 100% de la meta programada.

Como resultados del Diagnóstico comunitario se pudo evidenciar que los hogares identificaron a nivel de seguridad alimentaria infertilidad del suelo a causa de factores como el cambio climático o no apto para cultivos específicos, falta de herramientas e insumos para cultivo y las labores pecuarias, manejo deficiente de actividades de ganadería, falta de alianzas comerciales para el intercambio económico ; condiciones ambientales y presencias ambientales que dificultan la comercialización de los productos afectando la sostenibilidad económica y seguridad alimentaria.

Se denota una necesidad de implementar alternativas de horticultura urbana o casera para dar respuesta a la demanda de las familias desde la producción de cultivos de pan coger.

En el aspecto social se logró identificar la afectación al sentido de pertenencia y afectación cultural, dificultad para gestionar proyectos, vías en mal estado, falta de acceso a agua potable, alcantarillado y electricidad situación que contribuye al desmejoramiento de la calidad de vida de las familias.

Otras problemáticas encontradas responden a la existencia de infraestructura social en mal estado como parques y Casas Cabildo, así como condiciones económicas precarias, y el deterioro de la salud a causa del flujo vehicular y condiciones ambientales.

La pérdida de la identidad cultural y de parcial de las prácticas y saberes ancestrales, especialmente en población joven es una situación que reconocieron los territorios, como aspectos merecedores de especial atención.

A nivel de proyecto productivo comunitario se encontraron debilidades en las estrategias implementadas para la comercialización de productos mediante el establecimiento de los canales de distribución (mercado mayorista, minorista, por internet, medios de comunicación, entre otros) respondiendo a las demandas del mercado y a la oferta comunitaria en torno a la producción agrícola y pecuaria

En este sentido también se denota la ausencia de procesos de formación y asistencia técnica que contribuyan al mejoramiento de los proyectos productivos, evidenciándose la desarticulación con entidades y organizaciones públicas o privadas presentes en el territorio que puedan apoyar las iniciativas propuestas por las familias, que también incluyen mejoramientos y dotación de espacios de encuentro colectivo, para la comercialización de productos (Tiendas comunitarias, Trapiches) y desarrollo de otros proyectos de tipo artesanal.

Dentro de las actividades propuestas desde el componente de Fortalecimiento Social Comunitario para atender las problemáticas evidenciadas en la etapa diagnostica se encuentra:

Gestionar ante autoridades locales el arreglo y/ o mejoramiento de las vías de acceso a los resguardos, la implementación y funcionamiento de electrificación de las comunidades, el mejoramiento del servicio de salud (infraestructura, dotación, disposición de personal idóneo); el mejoramiento o construcción de viviendas de las familias, la construcción del acueducto veredal y alcantarillado en el que se incluya el funcionamiento y mantenimiento el mismo, la construcción y adecuación espacios dedicados al esparcimiento y el encuentro social.

Gestionar con entidades de salud presentes en el territorio o el municipio programas de prevención de enfermedades respiratorias y cuidados al adulto mayor; monitoreo, atención y

prevención de la pandemia COVID-19;

Fortalecimiento de los sistemas de intercambio económico y las capacidades administrativas y de gestión de recursos con fines productivos, que contribuyan al mejoramiento de ingresos económicos y seguridad alimentaria.

La promoción de la Etnoeducación como instrumento de fortalecimiento cultural, a través de la Secretaría de Educación como alternativa de conservar costumbres propias de los territorios.

Formación a comunidades académicas del territorio e implementación de huertas verticales urbanas en los hogares, para contribuir a la seguridad alimentaria de las familias y al aprovechamiento de residuos sólidos

Crear campañas de concientización sobre la vocación del suelo y su uso legal con fines de producción agrícola y sostenibilidad económica de las familias

Promover con instituciones públicas y privadas que se encuentren en el territorio y también en el municipio para el desarrollo de actividades deportivas y culturales que permitan el acercamiento de las comunidades y el fortalecimiento del tejido social.

Generación de mecanismos de identificación de zonas de riesgo y planeación de mecanismos de alertas tempranas para dar una respuesta en caso de eventualidades.

Creación o fortalecimiento de asociaciones de mujeres, productores agropecuarios o grupo productivo existentes, con plan semilla que les permita iniciar proyectos o impulsar los que están desarrollando, mejorando las condiciones de trabajo, maximizando los tiempos y la calidad con la adquisición de equipos y herramientas necesarias,

Fortalecimiento de los nexos comerciales en las cadenas productivas y aprovechando espacios culturales, religiosos y festivos para la promoción de todos sus productos.

Implementar estrategias que permitan el paso o transporte de los productos generados en la región como poleas, puentes aéreos o agro cables, que permitan evitar el riesgo de daño o perdida por las crecientes de las fuentes hídricas, siempre teniendo en cuenta mantener la calidad y la inocuidad de estos.

Gestión para la adquisición de maquinaria, insumos y herramientas para la comunidad, buscando fortalecer y tecnificar los eslabones desde la elaboración, hasta la transformación y conservación de los bienes generados por ellos.

Gestión con entidades estatales desde las autoridades y líderes de los resguardos para la recepción de más recursos, insumos y acompañamiento.

Buscar alternativas para la transformación y conservación de productos generados en la comunidad que sean perecederos, especialmente buscando mitigar la problemática de la falta de energía eléctrica constante;

Municipio de Barbacoas

En el resguardo indígena Hojal La Turbia, de acuerdo al diagnóstico realizado se reconoce en el componente de seguridad alimentaria, falencias en el desarrollo de actividades agropecuarias, dado por la falta de tecnificación en temas de agricultura y desarrollo de ganadería o cría y levante de especies menores. Y se percibe entre las familias la falta de alternativas de sostenibilidad económica que garantice dar respuesta a sus necesidades básicas y seguridad alimentaria

Así mismo la falta de agua potable se convierte en un factor de riesgo para las familias en términos de salud.

Frente al componente social comunitario se distingue también una disminución del sentido de pertenencia por causa de las pocas oportunidades de desarrollo económico en la zona, lo que obliga especialmente a la población joven a buscar otras formas de ingreso, haciendo que se desplacen a centros poblados.

La ausencia de proyectos y las debilidades en términos de capacidad de gestión a nivel interno también ubica al resguardo en una situación de vulnerabilidad importante por cuanto no acceden a la red de recursos comunitarios existentes en el territorio para la atención a sus demandas. Situación que se agudiza con la presencia de grupos al margen de la ley en el territorio

Por otra parte, no se reconocen espacios destinados al encuentro colectivo que fomente la conservación de sus costumbres culturales, no cuentan con sistemas de electrificación acueducto y alcantarillado, y se evidencian dificultades para el acceso a servicios de salud.

Frente al componente productivo se observan dificultades para la proyección e identificación de oportunidades en el territorio potenciales para la generación de proyectos. Lo anterior articulado al mal estado de las vías de acceso al territorio, dificulta la comercialización de productos e intercambio económico.

En razón a lo anterior se proponen acciones para intervenir las problemáticas anteriormente relacionadas a partir del acompañamiento técnico agropecuario para mejorar la producción

agropecuaria en el territorio; tecnificar y fortalecer los sistemas productivos existentes.

Desde el componente social es importante fortalecer las capacidades organizativas del resguardo a fin de contribuir al empoderamiento de sus líderes para la gestión de servicios, públicos (electricidad y acueducto principalmente), y el establecimiento de espacios comunitarios para el encuentro colectivo y el fortalecimiento del tejido social.

Por otra parte, es necesario articular con autoridades locales y otras instituciones del estado o el sector privado, esfuerzos para el mejoramiento de las vías de acceso al resguardo en procura de facilitar el intercambio económico, la comercialización de los productos y el relacionamiento social.

DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

Municipio de Puerto Inírida

De acuerdo con los diagnósticos realizados hasta fecha, se observa que en el departamento de Guainía se cumplió con el 100% de la meta programada. Ver ilustración 77.

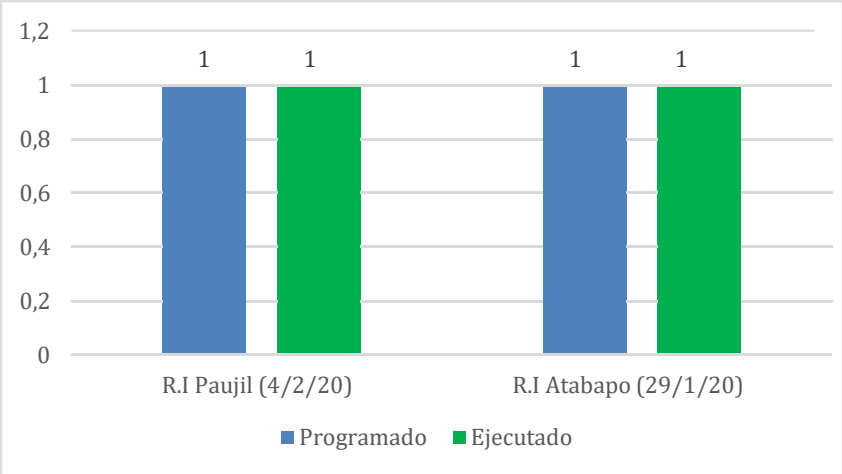


Ilustración 77 Diagnósticos Comunitarios realizados – Guainía

Como resultado del Diagnóstico comunitario se pudo evidenciar que los hogares identificaron las siguientes debilidades en sus territorios: suelos con baja fertilidad, falta de acompañamiento técnico, disminución de recursos naturales y afectaciones por el cambio climático, falta de herramientas e insumos para cultivo, falta de herramientas para pesca artesanal, pérdida de las artes en la pesca artesanal, pérdida de semillas nativas: Yuca brava, piña, ají, tupiro (lulo silvestre), especialmente en la comunidad de Concordia, Yuca brava, yuca dulce, plátano, ají, maíz, mapuey, ñame en el resguardo Paujil.

En el aspecto social se logró identificar: afectación al sentido de pertenencia y afectación cultural, dificultad para gestionar proyectos, débil articulación interinstitucional y de redes

de apoyo, vías en mal estado, falta de acceso a agua potable, existen fallas en la aplicabilidad del reglamento interno, incremento del consumo de sustancias psicoactivas entre la población joven, conexiones sanitarias irregulares que llegan a las fuentes de agua que se utilizan en el territorio y disposición final de residuos sólidos a campo abierto.

A continuación, se describen las acciones más relevantes que las comunidades desean trabajar en cada uno de los componentes: Seguridad alimentaria, proyectos productivos y fortalecimiento social y comunitario para el departamento de Guainía.

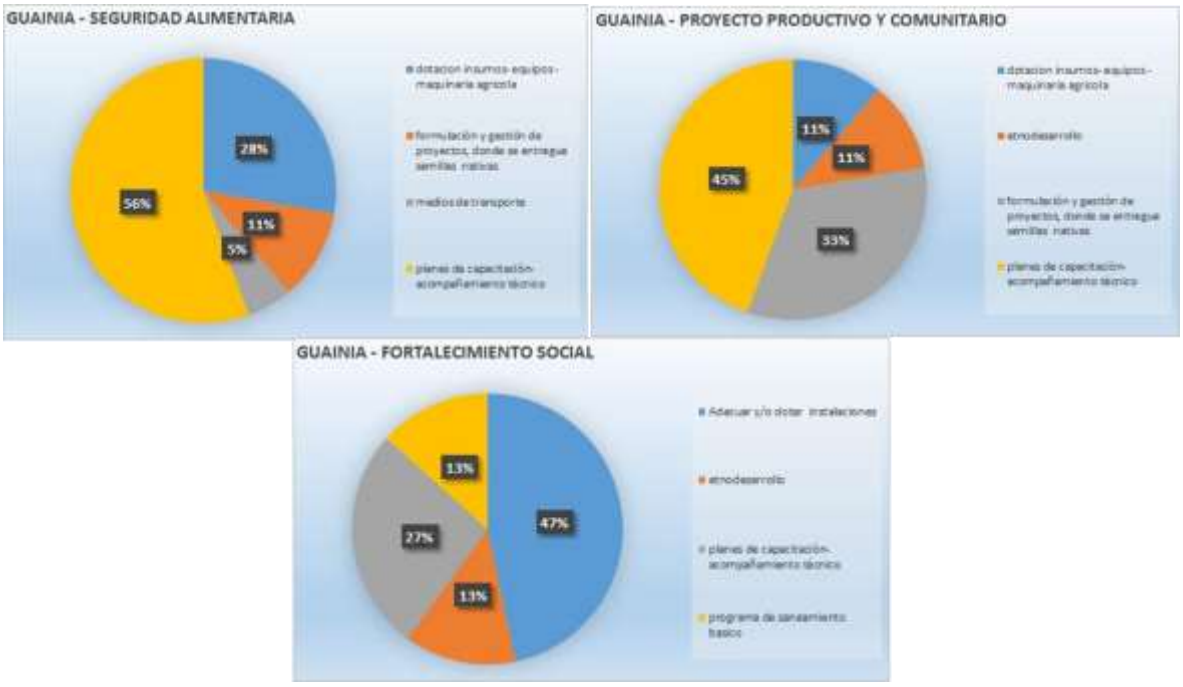


Ilustración 78 Acciones necesarias por componente – Guainía

En el componente Seguridad Alimentaria se logró evidenciar que la mayor necesidad se presenta en la implementación y desarrollo de planes de capacitación y acompañamiento técnico en temas como pesca, cultivos ancestrales, agropecuario, recursos naturales, seguido de la dotación de insumos y herramienta y maquinaria agrícola.

Para el componente de proyectos productivos, se evidencia que la mayor necesidad está representada en el desarrollo de Planes de capacitación y acompañamiento técnico en proyectos como "Modistería, corte y confección, elaboración de productos orgánicos, temas de liderazgo y estrategias de educación e información, seguido por temas de formulación y gestión de proyectos, y de la implementación de prácticas y alternativas de propagación de especies nativas vegetales de pancoger en los espacios tradicionales o conucos, acompañado de planes de prevención y mitigación a los efectos del cambio climático.

En fortalecimiento social y comunitario se pudo evidenciar que la mayor necesidad presentada en esta comunidad, tiene que ver con la adecuación, dotación y mejoramiento de instalaciones, con un 47%, específicamente para el espacio cultural (maloka), espacio para la venta y exhibición y comercialización de artesanías, y la adecuación de pozos acuíferos.

DEPARTAMENTO DE CAUCA

Municipios de Guapi y Timbiquí

En el departamento de Cauca se realizó el diagnóstico en (6) consejos comunitarios, alcanzando el 100% de la meta en Cauca.

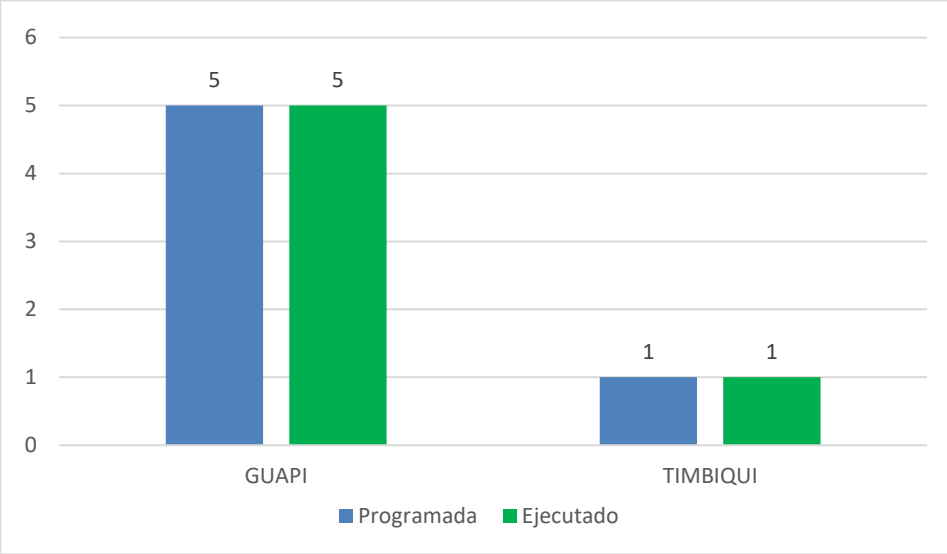


Ilustración 79 Diagnósticos comunitarios realizados – Cauca

En la ilustración 79, se presentan cada uno de los territorios en el Departamento de Cauca, donde se realizó el diagnóstico comunitario con su respectiva fecha.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO	FECHA
CAUCA	GUAPI	Consejo Comunitario Guapi Abajo	27/02/2020
		Consejo Comunitario Rio San Francisco	14/03/20
		Consejo Comunitario Rio Guajuí	03/03/2020
		Consejo Comunitario Rio Napi	21/03/2020
		Consejo Comunitario Alto Guapi	20/03/2020
	TIMBIQUI	Consejo Comunitario Renacer Negro	18/03/2020

Tabla 12 Diagnósticos comunitarios por territorio colectivo – Cauca

El Consejo Comunitario de Alto Guapi, que está constituido por 10 comunidades ubicadas en la parte alta y media de la cuenca del rio Guapi, dentro de él, se encuentran asentadas 1.171 familias de las cuales 564 de ellas están dentro del territorio y 607 se encuentran fuera del mismo anotando que la mayoría fueron desplazadas víctimas del conflicto armado. El consejo comunitario cuenta con una gran biodiversidad y riqueza natural, especialmente a nivel hídrico por sus ríos y bastas quebradas, donde en sus riveras desarrollan actividades agrícolas que están enmarcadas en los productos de pan coger; La única vía de acceso es a nivel fluvial, por lo tanto, la única forma de transporte está limitada a la utilización de embarcaciones como son el potrillo, la canoa con motor fuera de borda y en general se hace de manera personal, lo cual genera un alto costo del mismo ya que las comunidades no cuentan con líneas de transporte comercial.

Siguiendo este proceso, la comunidad decidió inclinarse en las líneas de proyecto, de la siguiente manera: En el proyecto de seguridad alimentaria ven la necesidad de fortalecer el sector agrícola con dotación en herramientas e insumos que les permita elaborar un banco de semillas con materia prima nativa; a nivel del del proyecto productivo comunitario dirigieron sus necesidades en adquirir herramientas, equipos y materiales que ayuden a realizar de una mejor manera, las actividades de siembra, cosecha, conservación y transformación de los productos generados por la comunidad; a nivel del componente social, requieren mejorar las instalaciones escolares, medicas e infraestructura de abastecimiento de agua potable.

En la ilustración 80, se describen las acciones más relevantes que las comunidades de los 6 Consejos Comunitarios desean trabajar en cada uno de los componentes: Seguridad alimentaria, proyectos productivos y fortalecimiento social y comunitario para el

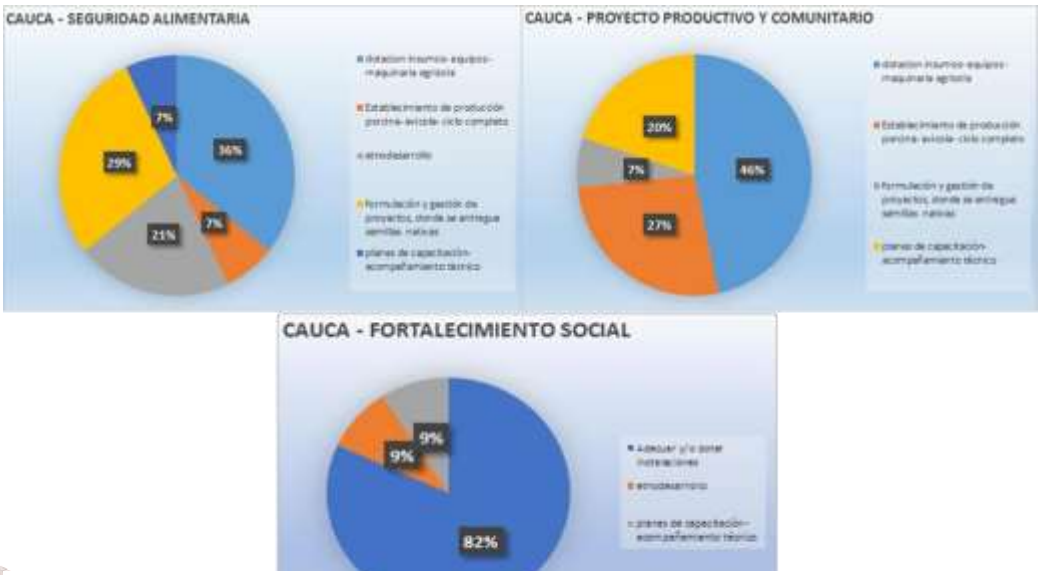


Ilustración 80 Acciones necesarias por componente - Cauca

departamento de Cauca.

El componente de seguridad alimentaria en general es débil por la falta de recursos, se evidencia desnutrición infantil, falta de asistencia técnica, falta de financiamiento para iniciativas productivas, puestos de salud abandonados y sin recursos económicos, se carece de instituciones educativas especializadas que le aporten a las necesidades de los territorios, presencia de grupos armados al margen de la ley, que trae como consecuencia el desplazamiento forzado, presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal, entre otros. Los territorios carecen de energía continua y acceso a agua potable. Además, manifiestan una pérdida parcial de las prácticas y saberes ancestrales. La mayor necesitad se presenta en temas de Formulación y Gestión de proyectos con un 36% seguido de dotación insumos, equipos y maquinaria agrícola.

En el componente productivo se evidencia que la mayor necesidad presentada en este componente consiste en Dotar insumos de equipos y maquinaria agrícola 46% seguido de planes de planes de capacitación y acompañamiento técnicos hasta el final del proyecto Social" están destinadas a realizar acciones de consistentes en adecuar y/o dotar instalaciones, (escuelas, centros de salud, canchas deportivas, casas comunitarias, malocas), mientras que el 9% están dedicadas a realizar planes de capacitación y acompañamiento técnico, y solo el 9% fue destinado a realizar actividades destinadas al Etnodesarrollo, entiéndase como la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, utilizando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica, y los recursos reales y potenciales de su cultura.

Además, se encontró que las principales acciones que presentó el Consejo Comunitario Renacer negro, en cuanto al componente "Fortalecimiento social" tienen que ver con la adecuación y/o dotación de instalaciones tales como la casa comunitaria y el restaurante escolar. Con relación al Componente Productivo y Seguridad alimentaria, los mayores porcentajes de acciones están encaminados al establecimiento de una granja ecológica fundamentando la integración de las familias con la rotación de semillas y recuperación de prácticas ancestrales, y la adquisición de maquinaria, equipos e insumos para la transformación de materia prima del territorio, como suplemento alimenticio en las explotaciones animales.

DEPARTAMENTO DE VICHADA

En el departamento de Vichada, se cumplió con el 100% de la meta programada en los municipios de Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño.

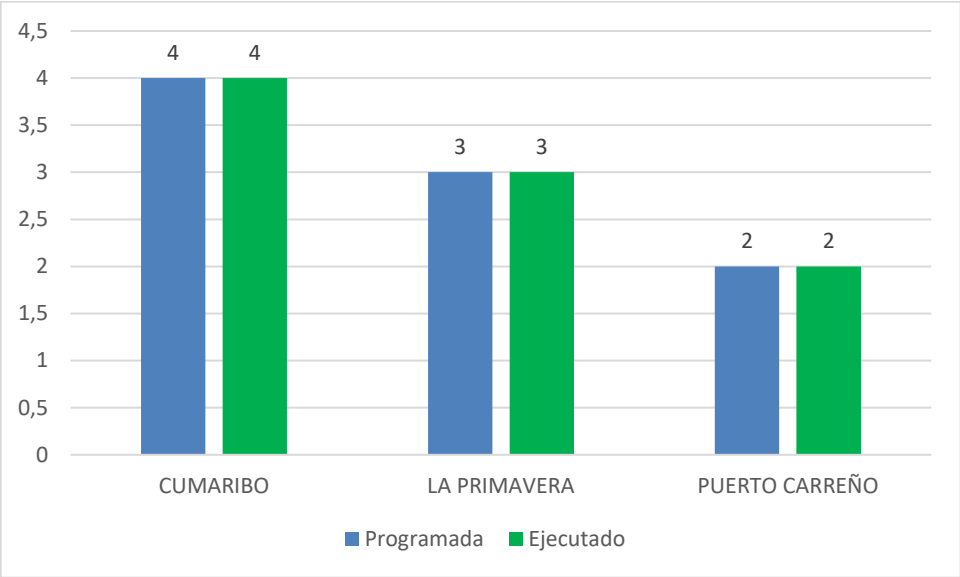


Ilustración 81 Diagnósticos Comunitarios - Vichada

La comunidad de los Yajota Waüpijiwi, tal vez por las circunstancias de desplazamiento forzado que han vivido, se caracterizan por ser muy apacibles y atentos; se encuentran asentadas en este lugar alrededor de 60 personas pertenecientes a algo más de 16 familias, esta comunidad es considerada seminómada y única en su tipo, cultura y dialecto. El principal problema que se identifica, es una especie de desarraigo al territorio, les ha sido muy difícil adoptar como propio el lugar donde habitan, sumado a esto, tienen la dificultad de estar sitiados en un espacio con muy poca extensión territorial, que no les permite desarrollar sus prácticas agrícolas y pecuarias; En la zona no hay mayor área de importancia ambiental como nacederos de agua o relictos boscosos, simplemente es un centro de sabana con pastura natural la mayoría. Esta comunidad trata de compensar la ausencia de recursos naturales en el territorio a través de trabajo en fincas aledañas en donde ganan a través de los jornales recursos para comprar elementos básicos como el jabón, azúcar, sal, entre otros.

Lo anteriormente descrito y sumado a otras necesidades hacen que esta comunidad se incline a nivel del proyecto de seguridad alimentaria en Implementar una parcela con varias especies agrícolas para proveer diversidad en la dieta alimentaria; en cuanto a el proyecto productivo comunitario requieren implementar infraestructura desmontable y funcional para empezar a producir bienes de calidad y establecer alianzas comerciales; para el proyecto social y comunitario ven la necesidad de dotar a la comunidad con medios de transporte como las bicicletas equipadas con parrillas para transportar incluso leña y materias primas.

En la tabla 13, se muestra los territorios colectivos de cada uno de los municipios, que ya cuentan con informe de diagnóstico.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO O CONSEJO	FECHA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	Resguardo Indígena Caño Guaripa – murciélago	02/02/2020
		Resguardo Indígena Caño Mesetas – Dagua	06/02/2020
	LA PRIMAVERA	Resguardo Indígena Campoalegre y Ripialito	08/02/2020
		Resguardo Indígena El Trompillo	20/02/2020
		Resguardo Indígena Yajota	20/05/2020
	CUMARIBO	Resguardo Indígena Aiwa Kuna	04/02/2020
		Resguardo Cholobolo Matatu	30/01/2020
		Resguardo Río Tomo y Beweri	02/02/2020
		Resguardo Santa Teresita del Tuparro	20/02/2020

Tabla 13 Diagnósticos Comunitarios por Territorio Colectivo – Vichada

De acuerdo con los resultados encontrados en esta etapa para el departamento de Vichada, se puede concluir que la gran mayoría de los resguardos indígenas están legalmente constituidos, a excepción del **Resguardo El Trompillo**, quien figura ante las entidades públicas como asentamiento indígena, es decir, el territorio no está constituido legalmente como resguardo indígena, por tanto, son excluidos de los beneficios que el estado brinda a este sector.

Por otra parte, se puede evidenciar que comparten amenazas muy similares, en cuanto a catástrofes naturales, marcados inconvenientes en épocas de verano e invierno, contaminación y perdida de recursos ambientales, especialmente deterioro de fuentes hídricas necesarias para el consumo humano y desarrollo de actividades agropecuarias, presencia activa de grupos al margen de la ley, problemática que genera desplazamientos a zonas urbanas y desarrollo de cultivos ilícitos que reemplazan las prácticas agrícolas tradicionales. Los integrantes de algunos de los resguardos lamentablemente no tienen el ánimo del trabajo grupal, se ven afectados con la falta de un buen servicio médico y una mala oferta educativa, se evidencia marcadamente el mal manejo que les dan a los desechos o residuos generales, procediendo a la contaminación del agua y la tierra, generando así ambientes idóneos para el desarrollo de reservorios de vectores portadores de enfermedades. En algunos casos se pudo observar comunidades que tienen conciencia en el manejo de los recursos de flora y

fauna, generando mutualismo, aunque en excepciones se ve exceso de tala indiscriminada, caza y pesca sin control, aprovechando insosteniblemente ese ecosistema biodiverso con el que cuentan en su mayoría.

Con el desarrollo de varias herramientas metodológicas utilizadas en esta fase, se pudo verificar el acompañamiento constante de algunas entidades públicas y privadas, con las que se pueden pactar alianzas para el cumplimiento de las metas en este programa, mitigando debilidades muy comunes como falta de asistencia técnica, poca capacitación a nivel social, técnico y ambiental, apoyo con insumos, herramientas y equipos para la transformación de la materia prima y productos generados en las comunidades, buscando darles valor agregado y crear canales de comercialización, fortaleciendo las capacidades sociales y culturales mediante el acompañamiento en capacitaciones y materiales.

A continuación, se describen las acciones más relevantes que las comunidades desean trabajar en cada uno de los componentes.

En el municipio de Puerto Carreño, a nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que la mayor necesidad de los resguardos es el acompañamiento técnico agropecuario para aumentar los indicadores productivos de lo generado en sus territorios; en el componente social se cuenta con una necesidad compartida que es la de energía permanente para su desarrollo colectivo y para tecnificar las producciones, transformado sus productos y generando valor agregado; a nivel de proyecto productivo comunitario se necesita fortalecer la cadena de comercialización, con la adquisición de centros de acopio donde se permita el almacenamiento, transformación y comercialización de los productos generados por la comunidad. Ver ilustración 82.

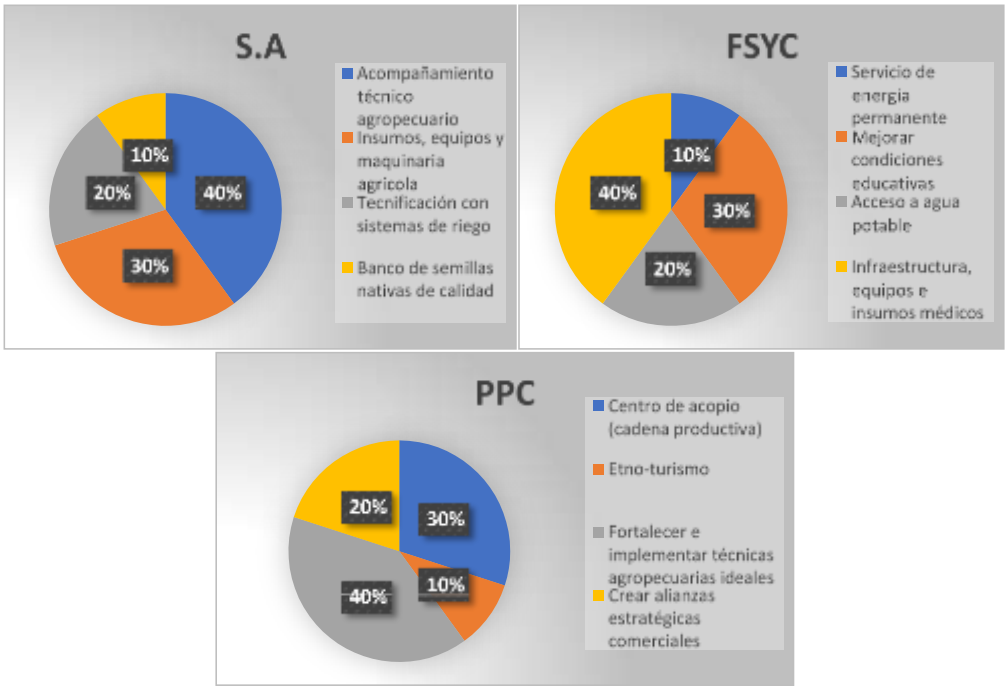


Ilustración 82 Acciones necesarias por componente, Municipio de Puerto Carreño, Vichada

Por otra parte en el municipio La Primavera, a nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que el enfoque de los resguardos es la necesidad de capacitación y acompañamiento técnico agropecuario para aumentar los indicadores productivos de lo que se genera en sus territorios; en el componente social es necesario el fortalecimiento del sistema educativo, con la construcción y reparación de infraestructura escolar, dotación de enseres-puestos sanitarios y la adecuación de espacios ludicopedagógicos que permitan generar armonía en las instituciones educativas; a nivel de proyecto productivo comunitario es necesario el aporte con insumos, materiales, herramientas, equipos e infraestructura que permitan darle un valor agregado a los productos mediante la transformación y conservación de estos..

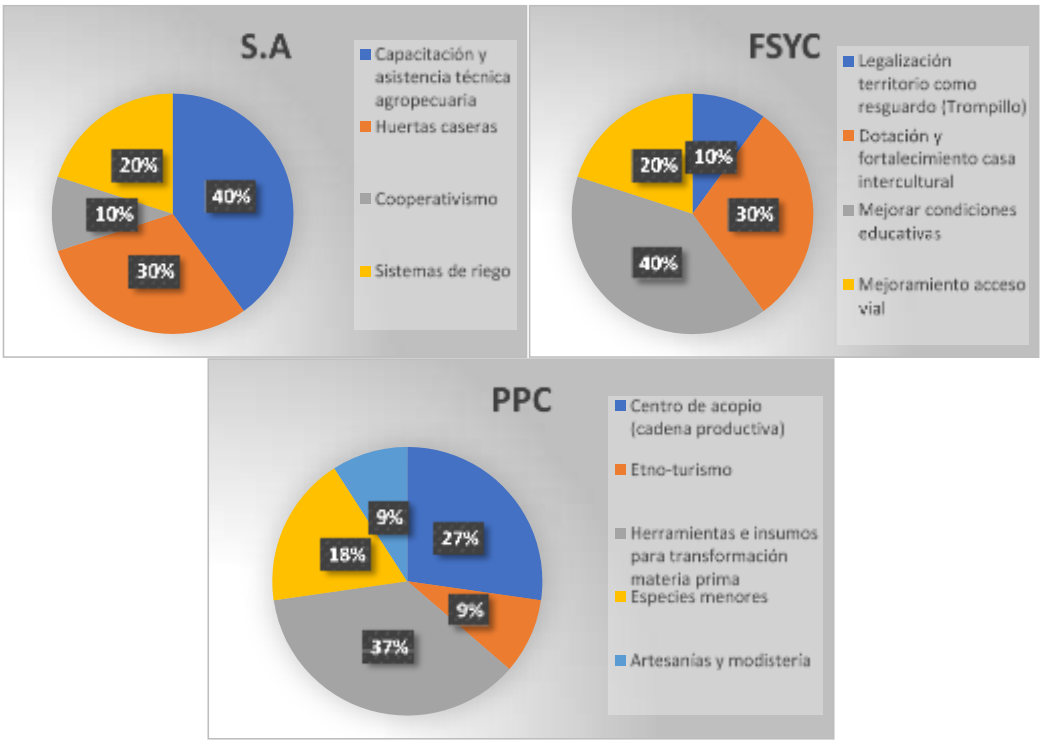


Ilustración 83 Acciones necesarias por componente, Municipio La Primavera – Vicha

En el municipio de Cumaribo, a nivel del componente de seguridad alimentaria en los resguardos del municipio de La Primavera, es necesaria la creación de un banco de semillas nativas, garantizando su calidad con la implementación de técnicas en su colecta, conservación, sanidad, brotación y demás necesidades, mediante el acompañamiento técnico profesional constante; en el componente social es necesario el fortalecimiento o la creación del plan etno educativo en el cual se articulen temáticas como la familia, el rol de la mujer, la protección de la naturaleza y la importancia de la UNUMA; a nivel de proyecto productivo comunitario es de vital importancia generar mayor acompañamiento técnico y capacitaciones constantes en temas ambientales, agropecuarios y administrativos, con el apoyo interdisciplinario de las entidades privadas y públicas que tienen presencia en el departamento.

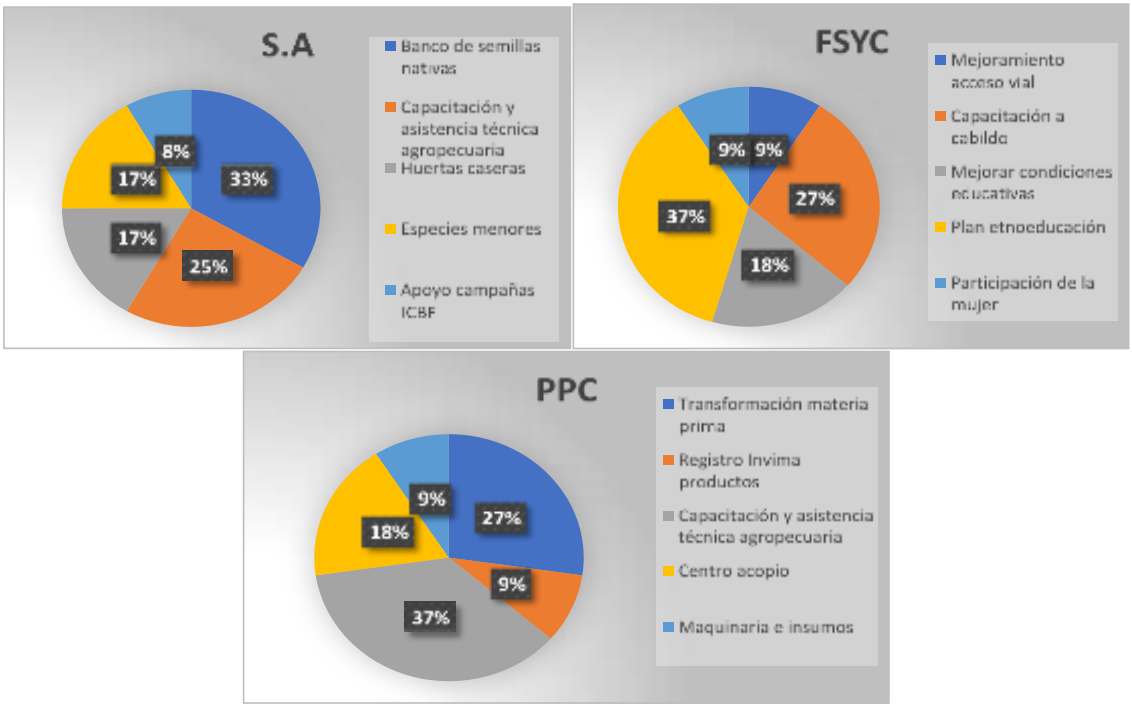


Ilustración 84 Acciones necesarias por componente, Municipio de Cumaribo – Vichada

Evidencia que soporta el proceso:

- Acta de Reunión
- Listado de Asistencia
- Informe de Diagnóstico
- Matriz de Actores
- Matriz de priorización de proyectos
- Evidencias de Diagnóstico comunitario anexas al presente informe:
- https://drive.google.com/drive/folders/1WKmdguichcEesj0N47shrIXdwKLDXD6k?usp=sharing

(Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización)

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO: *Formulación de Proyectos*
INDICADOR: *Número de Hogares Vinculados a proyectos formulados por componente*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Fichas de Proyectos*
META PROGRAMADA: *21.120*
META EJECUTADA: *21.120*
META EN PROCESO: *0*

La UT Prosperidad Iraca z1 llego al 100% de cumplimiento de esta meta. Se enviaron a Prosperidad Social todas las Fichas de proyectos formuladas con sus respectivos documentos soporte, como documentos de contrapartida de los resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios, anexos técnicos en los componentes de seguridad alimentaria, proyecto productivo comunitario y financiamiento complementario. En el caso de las fichas sociales que contemplan adecuaciones locativas, se adjuntaron Presupuesto de Obra, APU´s, Anexo técnico de Obra, diseños de áreas intervenidas, Programación de Obra, y en algunos casos Conceptos de Ingeniería estructural y diseños eléctricos. Los hogares beneficiados acumulados en el componente de Fortalecimiento Social (5280), en el componente de Seguridad Alimentaria (5280), en el componente de Proyecto Productivo (5280) y en Financiamiento complementario (5280).

Las fichas enviadas acumuladas hasta este mes de corte, se describen en las siguientes tablas:

Componente de Seguridad Alimentaria

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA

Tabla 14 Fichas de Proyectos SAN enviadas a DPS al 31 de marzo 2021

Proyecto Productivo

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO
CAUCA	TIMBIQUI	C.C. RENACER NEGRO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA

Tabla 15 Fichas de Proyectos PPC enviadas a DPS al 31 marzo 2021

Fortalecimiento Social

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA

Tabla 16 Fichas de Proyectos FSC enviadas a DPS al 31 de marzo 2021

Fortalecimiento Complementario

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA

Tabla 17 Fichas de Proyectos FC enviadas a DPS al 31 de marzo 2021

Evidencia que soporta el proceso:

- Correos electrónicos enviados a Prosperidad Social desde seguimiento@iracaz1.com & coordinadorcomponentes@iracaz1.com

ETAPA: VALIDACION Y ASIGNACION DE RECURSOS
PROCESO: *Asignación de Recursos*
INDICADOR: *Número de hogares vinculados a proyectos con asignación de recursos en el componente de FS&C, SA, PPC, F COMPL*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Acta Comité Asignación de Recursos*
META PROGRAMADA: *21.120*
META EJECUTADA: *21.120*
META EN PROCESO: *0*

La UT Prosperidad Iraca Z1 llego al 100% de cumplimiento de esta meta. El 11 de marzo de 2021 fue realizado el Comité de Asignación de Recursos No. 17, llegando a un total de diecisiete (17) comités, en los cuales se dio asignación de recursos a las fichas de proyectos de Seguridad Alimentaria (5280), Fortalecimiento Social (5280), Proyecto Productivo Comunitario (5280) y Fortalecimiento Complementario (5280), los cuales se describen en la siguiente tabla:

Seguridad Alimentaria

DEP.	MUNICIPIO	TIPO	NOMBRE	N° COMITE	FECHA COMITE
CAUCA	GUAPI	CC	GUAPI ABAJO	2	jueves, 30 de julio de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	ALTO GUAPI	1	jueves, 23 de julio de 2020

DEP.	MUNICIPIO	TIPO	NOMBRE	N° COMITE	FECHA COMITE
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO GUAJÚI	2	jueves, 30 de julio de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO NAPI	2	jueves, 30 de julio de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO SAN FRANCISCO	2	jueves, 30 de julio de 2020
CAUCA	TIMBIQUÍ	CC	RENACER NEGRO	2	jueves, 30 de julio de 2020
GUAINIA	INÍRIDA	RI	ATABAPO	1	jueves, 23 de julio de 2020
GUAINIA	INÍRIDA	RI	PAUJIL	2	jueves, 30 de julio de 2020
NARIÑO	BARBACOAS	RI	HOJAL LA TURBIA	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	MENOR EL PORVENIR	4	miércoles, 5 de agosto de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	PROMINGA TAPAJEÑA	2	jueves, 30 de julio de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	SOCIO TAPAJÉ	4	miércoles, 5 de agosto de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	TRIBUNA DEL PUEBLO	1	jueves, 23 de julio de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	UNIÓN TAIJEÑA	2	jueves, 30 de julio de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	ALTO CARTAGENA	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	EDEN CARTAGENA	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	GUALCALÁ	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	INTEGRADO LA MILAGROSA	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	LIBERTAD TELEMBÍ	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	MAGÜI	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	PALMAR	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	RAMOS MONGÓN	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	CC	BAJO MIRA Y FRONTERA	1	jueves, 23 de julio de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	INDÁ GUACARAY	1	jueves, 23 de julio de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	INDÁ ZABALETA	1	jueves, 23 de julio de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	LA BRAVA	1	jueves, 23 de julio de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	PEÑA ALEGRIA	1	jueves, 23 de julio de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	PULGANDE CAMPOALEGRE	1	jueves, 23 de julio de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	AIWA KUNA TSEPAJIBO	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	CHOLOLOBO MATATU	13	viernes, 27 de noviembre de 2020

DEP.	MUNICIPIO	TIPO	NOMBRE	N° COMITE	FECHA COMITE
VICHADA	CUMARIBO	RI	RIO TOMO	10	lunes, 26 de Octubre de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	SANTA TERESITA	10	lunes, 26 de Octubre de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	10	lunes, 26 de Octubre de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	EL TROMPILLO	3	lunes, 3 de agosto de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	YAJOTA WAIPIJIWI	2	jueves, 30 de julio de 2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	RI	CAÑO GUARIPA	10	lunes, 26 de Octubre de 2020
VICHADA	PUERTO CAREÑO	RI	CAÑO MESETAS DAGUA	13	viernes, 27 de noviembre de 2020

Tabla 18 Fichas de Proyectos SA con asignación de recursos al 31 de marzo 2021

Proyecto Productivo

DEP.	MUNICIPIO	TIPO	NOMBRE	COMITE	FECHA
CAUCA	GUAPI	CC	GUAPI ABAJO	9	viernes, 28 de agosto de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	ALTO GUAPI	10	lunes, 26 de octubre de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO GUAJÚI	9	viernes, 28 de agosto de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO NAPI	11	12 de noviembre de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO SAN FRANCISCO	10	lunes, 26 de octubre de 2020
GUAINIA	INÍRIDA	RI	ATABAPO	10	lunes, 26 de octubre de 2020
GUAINIA	INÍRIDA	RI	PAUJIL	8	martes, 18 de agosto de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	MENOR EL PORVENIR	9	viernes, 28 de agosto de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	PROMINGA TAPAJEÑA	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	SOCIO TAPAJÉ	5	miércoles, 12 de agosto de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	TRIBUNA DEL PUEBLO	15	lunes, 21 de diciembre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	UNIÓN TAIJEÑA	7	viernes, 14 de agosto de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	ALTO CARTAGENA	11	12 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	EDEN CARTAGENA	11	12 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	GUALCALÁ	11	12 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	INTEGRADO LA MILAGROSA	11	12 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	LIBERTAD TELEMBÍ	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	MAGÜI	11	12 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	PALMAR	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	RAMOS MONGÓN	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	CC	BAJO MIRA Y FRONTERA	5	miércoles, 12 de agosto de 2020

NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	INDÁ GUACARAY	4	miércoles, 5 de agosto de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	INDÁ ZABALETA	7	viernes, 14 de agosto de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	LA BRAVA	12	20 de noviembre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	PEÑA ALEGRIA	4	miércoles, 5 de agosto de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	PULGANDE CAMPOALEGRE	5	miércoles, 12 de agosto de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	AIWA KUNA TSEPAJIBO	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	CHOLOLOBO MATATU	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	RIO TOMO	8	martes, 18 de agosto de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	SANTA TERESITA	9	viernes, 28 de agosto de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	8	martes, 18 de agosto de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	EL TROMPILLO	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	YAJOTA WAIPIJIWI	5	miércoles, 12 de agosto de 2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	RI	CAÑO GUARIPA	9	viernes, 28 de agosto de 2020
VICHADA	PUERTO CAREÑO	RI	CAÑO MESETAS DAGUA	9	viernes, 28 de agosto de 2020
CAUCA	TIMBIQUÍ	CC	RENACER NEGRO	16	viernes, 19 de febrero de 2021
NARIÑO	BARBACOAS	RI	HOJAL LA TURBIA	16	viernes, 19 de febrero de 2021

Tabla 19 Fichas de Proyectos PPC con asignación de recursos al 31 de marzo 2021

Fortalecimiento Social

DEP.	MUNICIPIO	TIPO	NOMBRE	COMITE	FECHA
CAUCA	GUAPI	CC	ALTO GUAPI	6	jueves, 13 de agosto de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	GUAPI ABAJO	3	lunes, 3 de agosto de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO GUAJÚI	3	lunes, 3 de agosto de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO NAPI	10	lunes, 26 de octubre de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO SAN FRANCISCO	4	miércoles, 5 de agosto de 2020
GUAINIA	INÍRIDA	RI	ATABAPO	3	lunes, 3 de agosto de 2020
GUAINIA	INÍRIDA	RI	PAUJIL	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	MENOR EL PORVENIR	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	PROMINGA TAPAJEÑA	9	viernes, 28 de agosto de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	SOCIO TAPAJÉ	9	viernes, 28 de agosto de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	TRIBUNA DEL PUEBLO	5	miércoles, 12 de agosto de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	UNIÓN TAIJEÑA	6	jueves, 13 de agosto de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	ALTO CARTAGENA	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	EDEN CARTAGENA	11	12 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	GUALCALÁ	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	INTEGRADO LA MILAGROSA	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	LIBERTAD TELEMBÍ	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	MAGÜI	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	10	lunes, 26 de octubre de 2020

DEP.	MUNICIPIO	TIPO	NOMBRE	COMITE	FECHA
NARIÑO	RICAURTE	RI	PALMAR	11	jueves, 12 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	11	jueves, 12 de noviembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	RAMOS MONGÓN	11	jueves, 12 de noviembre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	CC	BAJO MIRA Y FRONTERA	9	viernes, 28 de agosto de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	INDÁ GUACARAY	9	viernes, 28 de agosto de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	INDÁ ZABALETA	9	viernes, 28 de agosto de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	LA BRAVA	9	viernes, 28 de agosto de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	PEÑA ALEGRIA	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	PULGANDE CAMPOALEGRE	9	viernes, 28 de agosto de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	AIWA KUNA TSEPAJIBO	7	viernes, 14 de agosto de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	CHOLOLOBO MATATU	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	RIO TOMO	6	jueves, 13 de agosto de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	SANTA TERESITA	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	9	viernes, 28 de agosto de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	EL TROMPILLO	11	12 de noviembre de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	YAJOTA WAIPIJIWI	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	RI	CAÑO GUARIPA	9	viernes, 28 de agosto de 2020
VICHADA	PUERTO CAREÑO	RI	CAÑO MESETAS DAGUA	9	viernes, 28 de agosto de 2020
CAUCA	TIMBIQUÍ	CC	RENACER NEGRO	17	jueves, 11 de marzo de 2021
NARIÑO	BARBACOAS	RI	HOJAL LA TURBIA	17	jueves, 11 de marzo de 2021

Tabla 20 Fichas de Proyectos FSC con asignación de recursos al 31 de marzo 2021

Financiamiento Complementario

DEP.	MUNICIPIO	TIPO	NOMBRE	COMITE	FECHA
CAUCA	GUAPI	CC	ALTO GUAPI	12	viernes, 20 de noviembre de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	GUAPI ABAJO	12	viernes, 20 de noviembre de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO NAPI	12	viernes, 20 de noviembre de 2020
CAUCA	GUAPI	CC	RÍO SAN FRANCISCO	10	lunes, 26 de octubre de 2020
CAUCA	TIMBIQUÍ	CC	RENACER NEGRO	11	jueves, 12 de noviembre de 2020
GUAINIA	INÍRIDA	RI	ATABAPO	10	lunes, 26 de octubre de 2020
GUAINIA	INÍRIDA	RI	PAUJIL	13	viernes, 27 de noviembre de 2020
NARIÑO	BARBACOAS	RI	HOJAL LA TURBIA	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	MENOR EL PORVENIR	15	lunes, 21 de diciembre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	PROMINGA TAPAJEÑA	15	lunes, 21 de diciembre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	SOCIO TAPAJÉ	15	lunes, 21 de diciembre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	TRIBUNA DEL PUEBLO	15	lunes, 21 de diciembre de 2020
NARIÑO	EL CHARCO	CC	UNIÓN TAIJEÑA	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	ALTO CARTAGENA	14	lunes, 7 de diciembre de 2020

DEP.	MUNICIPIO	TIPO	NOMBRE	COMITE	FECHA
NARIÑO	RICAURTE	RI	CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	EDEN CARTAGENA	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	GUALCALÁ	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	INTEGRADO LA MILAGROSA	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	LIBERTAD TELEMBÍ	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	MAGÜI	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	PALMAR	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	RICAURTE	RI	RAMOS MONGÓN	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	INDÁ GUACARAY	12	viernes, 20 de noviembre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	INDÁ ZABALETA	15	lunes, 21 de diciembre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	LA BRAVA	15	lunes, 21 de diciembre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	PEÑA ALEGRIA	11	jueves, 12 de noviembre de 2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	RI	PULGANDE CAMPOALEGRE	14	lunes, 7 de diciembre de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	AIWA KUNA TSEPAJIBO	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	CHOLOLOBO MATATU	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	RIO TOMO	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	CUMARIBO	RI	SANTA TERESITA	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	11	jueves, 12 de noviembre de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	EL TROMPILLO	12	viernes, 20 de noviembre de 2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	RI	YAJOTA WAIPIJIWI	10	lunes, 26 de octubre de 2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	RI	CAÑO GUARIPA	12	viernes, 20 de noviembre de 2020
VICHADA	PUERTO CAREÑO	RI	CAÑO MESETAS DAGUA	10	lunes, 26 de octubre de 2020
NARIÑO	BARBACOAS	RI	HOJAL LA TURBIA	16	viernes, 19 de febrero de 2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	CC	BAJO MIRA Y FRONTERA	16	viernes, 19 de febrero de 2021
CAUCA	GUAPI	CC	RIO GUAJUI	16	viernes, 19 de febrero de 2021

Tabla 21 Fichas de Proyectos FC con asignación de recursos al 31 de marzo 2021

ETAPA: VALIDACION Y ASIGNACION DE RECURSOS
PROCESO: *Socialización de Proyectos*
INDICADOR: *Número de hogares con proyectos socializados componente de FS&C, SA, PPC, F COMPL*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Actas de socialización, listado de asistencia y ficha de proyectos firmadas por las partes y recibidas a satisfacción por PS.*
META PROGRAMADA: *21.120*
META EJECUTADA: *21.120*
META EN PROCESO: *0*

A la fecha de corte de 30 de julio 2021 los hogares socializados acumulados en el componente de Seguridad Alimentaria (5280), Fortalecimiento Social (5280), Proyecto Productivo Comunitario (5280) y Fortalecimiento Complementario (5280), los cuales se describen en la siguiente tabla.

Seguridad Alimentaria

DEP.	MUNICIPIO	NOMBRE	FECHA SOCIALIZACION
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	27/07/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	1/08/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	1/08/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	3/08/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	3/08/2020
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	11/08/2020
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	28/07/2020
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	3/08/2020
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	30/01/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	6/08/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	1/08/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	6/08/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	1/08/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	17/09/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	26/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	30/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	22/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	18/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	26/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	30/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	27/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	17/12/2020

NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	17/12/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	31/07/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	4/08/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	11/09/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	31/07/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	29/07/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	7/08/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA	23/02/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO	24/02/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	20/09/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	23/09/2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	12/11/2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	6/08/2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	3/08/2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	2/12/2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	27/09/2020

Tabla 22 Socialización de Fichas de Proyectos SA al 30 de junio de 2021

Proyecto Productivo

DEP.	MUNICIPIO	NOMBRE	FECHA SOCIALIZACIÓN
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	1/09/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	30/10/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	31/08/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	17/11/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	23/11/2020
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	23/03/2021
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	30/10/2020
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	19/08/2020
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	8/02/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	26/08/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	30/10/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	23/08/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	28/08/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	9/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	30/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	18/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	26/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	30/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	27/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	17/12/2020

NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	26/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	22/12/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	28/08/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	7/08/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	3/12/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	15/12/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	21/11/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	8/09/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	30/10/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	24/09/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	20/09/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	23/09/2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	24/08/2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	30/10/2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	9/10/2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	28/09/2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	28/09/2020

Tabla 23 Socialización de Fichas de Proyectos PPC al 30 de junio de 2021

Fortalecimiento Social

DEP.	MUNICIPIO	NOMBRE	FECHA SOCIALIZACION
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	24/08/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	10/08/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	4/08/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	17/11/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	26/08/2020
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	14/04/2021
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	7/08/2020
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	30/10/2020
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	28/04/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	8/11/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	28/09/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	25/08/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	24/08/2020
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	17/09/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	4/11/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	25/11/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	25/11/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	4/11/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	4/11/2020

NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	4/11/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	23/11/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	25/11/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	25/11/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	16/10/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	28/09/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	3/12/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	26/10/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	12/12/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	6/10/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	25/09/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	30/10/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	20/09/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	30/10/2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	8/10/2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. TROMPILLO	5/02/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	13/11/2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	28/09/2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	27/09/2020

Tabla 24 Socialización de Fichas de Proyectos FSC al 30 de junio de 2021

Financiamiento Complementario

DEP.	MUNICIPIO	NOMBRE	FECHA SOCIALIZACIÓN
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	15/03/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	16/03/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	17/03/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	2/12/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	29/10/2020
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	23/03/2021
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	30/10/2020
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	9/12/2020
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	8/02/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	13/01/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	13/01/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	13/01/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	13/01/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	9/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	30/01/2021

DEP.	MUNICIPIO	NOMBRE	FECHA SOCIALIZACIÓN
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	18/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	26/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	30/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	27/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	17/12/2020
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	26/01/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	22/12/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	22/02/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	17/12/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	13/01/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	13/01/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	12/12/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	12/12/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	30/10/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	30/10/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	30/10/2020
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	30/10/2020
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	13/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	13/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	13/11/2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	2/12/2020
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	30/10/2020

Tabla 25 Socialización de Fichas de Proyectos FC al 30 de junio de 2021

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Porcentaje de avance general en la implementación de los proyectos de FS&C.*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Matriz de seguimiento de proyectos.*
META PROGRAMADA: *100%*
META EJECUTADA: *100%*
META EN PROCESO: 0%

Se realizaron en el mes de julio 2021, acompañamiento a las fichas de proyecto en el componente social y comunitario en la implementación de las mismas, llegando a una meta ejecutada del 100%.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Talleres para el Fortalecimiento de habilidades sociales para las comunidades*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Matriz de seguimiento de proyectos.*
META PROGRAMADA: $ *705.063.047*
META EJECUTADA: $ *705.063.047*
META EN PROCESO: $ *0*

La UT Prosperidad Iraca Z1 llegó al cumplimiento del 100% de esta meta. Evidenciamos la totalidad de ejecución de esta actividad, invirtiendo el total de $ 705.063.047 en los diferentes territorios beneficiarios del programa.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Fortalecimiento a los territorios, teniendo en cuenta los resultados de ICOE*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Ficha de Proyecto, Informe de la actividad, listados de asistencia y registro fotográfico.*
META PROGRAMADA: *100%*
META EJECUTADA: *100%*
META EN PROCESO: *0%*

La UT Prosperidad Iraca Z1 llegó al cumplimiento del 100% de esta meta. Evidenciamos la totalidad de ejecución de esta actividad del componente social, llegando a la meta del 100% de implementación.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Porcentaje de avance general en la implementación de los proyectos de S.A.*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Matriz de seguimiento de proyectos.*
META PROGRAMADA: *100%*
META EJECUTADA: 100%
META EN PROCESO: 0%

Se realizaron en el mes de julio 2021, acompañamiento a las fichas de proyecto en el componente de seguridad alimentaria en la implementación de las mismas, llegando a la meta de ejecución del 100%.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Porcentaje de avance general en la implementación de los proyectos de PPC.*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Matriz de seguimiento de proyectos.*
META PROGRAMADA: *100%*
META EJECUTADA: 100%
META EN PROCESO: 0%

Se realizaron en el mes de julio 2021, acompañamiento a las fichas de proyecto en el componente de proyecto productivo en la implementación de las mismas, llegando a la meta de ejecución del 100%.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Mercados campesinos para comercialización de productos de los hogares participantes (1 por municipio).*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Informe de la actividad, listados de asistencia y registro fotográfico.*
META PROGRAMADA: *10*
META EJECUTADA: 10
META EN PROCESO: *0*

La UT Prosperidad Iraca Z1 llegó al cumplimiento del 100% de esta meta. Se evidencia la realización completa de los mercados campesinos en los Municipios de Puerto Inírida, Cumaribo, Puerto Carreño, La Primavera, Guapi, Timbiquí, Tumaco, El Charco, Ricaurte y Barbacoas, actividades propias de comercialización de productos agropecuarios.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Calendario Lunar (una por territorio colectivo)*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Informe de la actividad, listados de asistencia y registro fotográfico.*
META PROGRAMADA: 100%
META EJECUTADA: *100%*
META EN PROCESO: *0%*

La UT Prosperidad Iraca Z1 llegó al cumplimiento del 100% de esta meta, de entrega de calendarios lunares por grupo étnico (afrodescendientes, indígenas). En los 40 territorios.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Formación en asociación eficiente de cultivos -aprovechamiento de recursos naturales disponibles. (una por territorio colectivo))*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Informe de la actividad, listados de asistencia y registro fotográfico.*
META PROGRAMADA: 4*0*
META EJECUTADA: 4*0*
META EN PROCESO: 0

La UT Prosperidad Iraca Z1 llegó al cumplimiento del 100% de esta meta, se evidencia la totalidad de ejecución de esta actividad del componente productivo con enfoque ambiental, llegando a la meta del 100% de implementación.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Número de eventos de intercambio (trueques) realizados. Componente SA*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Informe de la actividad, listados de asistencia y registro fotográfico.*
META PROGRAMADA: *10*
META EJECUTADA: *10*
META EN PROCESO: 0

En el actual corte de julio 2021, se realizaron el 100% de los eventos de intercambio.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Acompañamiento (Avance en la implementación)*
INDICADOR: *Porcentaje de avance general en la implementación de los proyectos de F.COMPL*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Matriz de seguimiento de proyectos.*
META PROGRAMADA: *100*
META EJECUTADA: 100*%*
META EN PROCESO: 0*%*

Se realizaron en el mes de julio 2021, acompañamiento a las fichas de proyecto en el componente de financiamiento complementario en la implementación de las mismas, llegando a la meta de ejecución del 100%.

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Entregas*
INDICADOR: *Recursos asociados a las entregas de los proyectos de FS&C, SA, PPC, F COMPL*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Actas de entrega.*
META PROGRAMADA: *21.120*
META EJECUTADA:*21.120*
META EN PROCESO: *0*

Hasta el mes de Julio 2021 se han realizado, entregas de elementos de dotación, suministro de las fichas de Proyectos en los componentes de Seguridad Alimentaria, Productivo Comunitario, Social Comunitario Y Financiamiento Complementario. El consolidado a la fecha de los hogares que recibieron las entregas en el componente de Seguridad Alimentaria (5280), Fortalecimiento Social (5280), Proyecto Productivo Comunitario (5280), Financiamiento Complementario (5280), que se describen en las siguientes tablas:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO	N HOGARES
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	160
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	160
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	260
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	160
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	60
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	600
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	20
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	280
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	500
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	100
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	100
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	17
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	90
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	14
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	15
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	140
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	37
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	70
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	142
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	35
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	39
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	20
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. BAJO MIRA Y FRONTERA	450
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	200
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	418

NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	92
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	17
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100

Tabla 26 Fechas de entregas de insumos SA al 30 de julio 2021

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO	N HOGARES
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	160
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	160
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	260
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	160
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	60
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	600
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	20
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	280
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	500
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	100
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	100
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	17
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	90
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	14
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	15
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	140
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	37
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	70
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	142
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	35
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	39
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	20
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. BAJO MIRA Y FRONTERA	450
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	200
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	418
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66

NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	92
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	17
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100

Tabla 27 Fechas de entregas de insumos PPC al 30 de julio 2021

DEP	MUNICIPIO	NOMBRE	N HOGARES
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	160
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	160
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	260
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	160
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	60
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	600
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	20
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	280
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	500
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	100
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	100
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	17
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	90
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	14
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	15
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	140
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	37
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	70
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	142
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	35
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	39
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	20
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. BAJO MIRA Y FRONTERA	450
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	200
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	418
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66

VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	92
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	17
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100

Tabla 28 Fechas de entregas de insumos FSC al al 30 de julio 2021

DEP	MUNICIPIO	NOMBRE	N HOGARES
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	160
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	160
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	160
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	260
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	60
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	600
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	20
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	280
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	500
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	80
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	100
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	100
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	17
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	90
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	14
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	15
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	140
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	37
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	70
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	142
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	35
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	39
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	20
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. BAJO MIRA Y FRONTERA	450
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	200
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	418
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	92
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16

VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	17
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100

Tabla 29 Fechas de entregas de insumos FC al 30 de julio 2021

A la fecha se adelanta el proceso de validación y consolidación de actas de entrega desde el territorio hacia el nivel zonal, las cuáles se cargarán en la plataforma KOKAN.

Evidencia que soporta el proceso:

- Ficha diligenciada con sus anexos

https://drive.google.com/drive/folders/1p33RlbsaQMToLgDwG80xkkNHQUCrHlkr?usp=sharing

- Carta de validación por la Autoridad Étnica
- Carta de autorización de la metodología trabajada
- Registro de los emails enviados a las Autoridades Étnicas
- Evidencias de Diagnóstico y Formulación comunitario anexas al presente informe:

https://drive.google.com/drive/folders/1sNfZX0TVNit_WY0wYIzM-JH7FfTgH4av?usp=sharing

- Evidencias a a la implementación de proyectos:

https://drive.google.com/drive/folders/1TSE_IVDgsWL8Zq5gom5lj-wPdwzqHiQs?usp=sharing

(Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos mientras carga la información, ya que por la cantidad y tamaño de los archivos toma un tiempo la sincronización)

ETAPA: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
PROCESO: *Cierre*
INDICADOR: *Proyectos cerrados componente de FS&C, SA, PPC, F COMPL*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Acta de cierre de proyectos.*
META PROGRAMADA: *100%*
META EJECUTADA:*100% FS&C, 100% SA, 100% PPC, 100% F COMPL*
META EN PROCESO: *0% FS&C, 0% SA, 0% PPC, 0% F COMPL*

Hasta el mes de Julio de 2021 se han realizado, los respectivos cierres de fichas de proyectos en los siguientes componentes:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. BAJO MIRA Y FRONTERA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE

VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA

Tabla 30 Cierre territorios SA al 30 de julio 2021

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. BAJO MIRA Y FRONTERA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU

VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA

Tabla 30 Cierre territorios PPC al 30 de julio 2021

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. BAJO MIRA Y FRONTERA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO

VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA

Tabla 30 Cierre territorios FSC al 30 de julio 2021

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. BAJO MIRA Y FRONTERA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO

VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA

Tabla 30 Cierre territorios FC al 31 de julio 2021

ETAPA: CIERRE
PROCESO: *ICOE DE SALIDA*
INDICADOR: *Realización del ICOE de salida formulado.*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *ICOE de salida por territorio colectivo entregado a la supervisión del convenio.*
META PROGRAMADA: *40*
META EJECUTADA:*40 (100%)*
META EN PROCESO: 0 *(0%)*

Para el presente periodo de corte, en este proceso se alcanzó una meta del 100%. En la siguiente tabla, se presentan los territorios en los cuales los ICOEs se encuentran validados.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERRITORIO
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN

NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. BAJO MIRA Y FRONTERA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA

Tabla 30 Relación de ICOEs realizados a corte de 30 de julio 2021

En el siguiente link se alojan las evidencias de la realización de los ICOE por cada uno de los territorios

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CTM6dSE88_VDsues873gpezCj0wbPVdv

ETAPA: CIERRE
PROCESO: *PLAN ESTRATEGICO DE GESTION COMUNITARIA-*
INDICADOR: *No. de municipios con planes de gestión comunitaria.*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Planes de Gestión Comunitaria entregados a la supervisión del convenio.*
META PROGRAMADA: *10*
META EJECUTADA:10 *(100%)*
META EN PROCESO: 0)

La UT Prosperidad Iraca Z1 llegó al cumplimiento del 100% de esta meta. se evidencia la totalidad de ejecución de esta actividad, llegando a la meta del 100% de implementación.

ETAPA: CIERRE
PROCESO: *EVALUACION PARTICIPATIVA*
INDICADOR: *Número de evaluaciones participativas de los resultados del programa.*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Evaluación participativa por territorio colectivo entregado a la supervisión del convenio.*
META PROGRAMADA: *10*
META EJECUTADA: *10 (100%)*
META EN PROCESO: *0*

La UT Prosperidad Iraca Z1 llegó al cumplimiento del 100% de esta meta, se evidencia la ejecución completa de esta actividad.

ETAPA: CIERRE
PROCESO: *ENCUESTAS DE SATISFACCION-*
INDICADOR: *Número de encuestas de satisfacción aplicadas y analizadas.*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Entrega de informe sobre el análisis de las encuestas a la supervisión del convenio.*
META PROGRAMADA: 8002
META EJECUTADA: 100%
META EN PROCESO: 0%

La UT Prosperidad Iraca Z1 llegó al cumplimiento del 100% de esta meta.

ETAPA: CIERRE
PROCESO: *CARACTERIZACION DE HOGARES DE SALIDA*
INDICADOR: *Caracterización de salida de los hogares en el aplicativo KOKAN*
MEDIO DE VERIFICACIÓN: *Reporte generado por KOKAN.*
META PROGRAMADA: 5280
META EJECUTADA: 100%
META EN PROCESO: 0%

La UT Prosperidad Iraca Z1 llegó al cumplimiento del 100% de esta meta.

COMITES TÉCNICOS REGIONALES

Se han desarrollaron los siguientes Comités Técnicos Regionales dentro del convenio 213 de 2019

GUAINIA

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 09/12/2019
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 18/02/2020
El 3er Comité Técnico se desarrolló el 22/04/2020
El 4to Comité Técnico se desarrolló el 25/06/2020
El 5to Comité Técnico se desarrolló el 20/08/2020
El 6to Comité Técnico se desarrolló el 26/10/2020
El 7to Comité Técnico se desarrolló el 16/12/2020
El 8vo Comité Técnico se desarrolló el 24/02/2021

CAUCA

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 18/12/2019
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 17/01/2020

El 3er Comité Técnico se desarrolló el 06/04/2020
El 4to Comité Técnico se desarrolló el 23/06/2020
El 5to Comité Técnico se desarrolló el 26/08/2020
El 6to Comité Técnico se desarrolló el 29/10/2020
El 7to Comité Técnico se desarrolló el 16/10/2020
El 8vo Comité Técnico se desarrolló el 23/02/2021

VICHADA

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 03/02/2020
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 20/04/2020
El 3er Comité Técnico se desarrolló el 26/06/2020
El 4to Comité Técnico se desarrolló el 25/08/2020
El 5to Comité Técnico se desarrolló el 19/10/2020
El 6to Comité Técnico se desarrolló el 17/10/2020
El 7to Comité Técnico se desarrolló el 16/10/2020
El 8vo Comité Técnico se desarrolló el 24/02/2021

NARIÑO

El 1er Comité Técnico se desarrolló el 24/01/2020
El 2do Comité Técnico se desarrolló el 06/04/2020
El 3to Comité Técnico se desarrolló el 24/06/2020
El 4to Comité Técnico se desarrolló el 24/08/2020
El 5to Comité Técnico se desarrolló el 03/11/2020
El 6to Comité Técnico se desarrolló el 11/10/2020
El 7to Comité Técnico se desarrolló el 16/10/2020
El 8vo Comité Técnico se desarrolló el 22/02/2021

En el siguiente enlace se relacionan las actas de los comités regionales

https://drive.google.com/open?id=1_eqI8h4hqQ5lZxOOLB4vIzDS1mbJjdGN

COMITES TECNICOS NACIONALES

A la fecha, se realizaron 19 comités técnicos nacionales donde se presentaron los avances y dificultades propios de la ejecución del programa y la implementación de los proyectos. Las fechas de realización se mencionan a continuación:

1 Comité Técnico Nacional celebrado en 01-10-2019
2 Comité Técnico Nacional celebrado en 15-10-2019
3 Comité Técnico Nacional celebrado en 12-11-2019
4 Comité Técnico Nacional celebrado en 17-01-2020
5 Comité Técnico Nacional celebrado en 12-02-2020

6 Comité Técnico Nacional celebrado en 20-03-2020
7 Comité Técnico Nacional celebrado en 20-04-2020
8 Comité Técnico Nacional celebrado en 22-05-2020
9 Comité Técnico Nacional celebrado en 24-06-2020
10 Comité Técnico Nacional celebrado en 13-07-2020
11 Comité Técnico Nacional celebrado en 31-08-2020
12 Comité Técnico Nacional celebrado en 24-09-2020
13 Comité Técnico Nacional celebrado en 30-10-2020
14 Comité Técnico Nacional celebrado en 18-11-2020
15 Comité Técnico Nacional celebrado en 7-12-2020
16 Comité Técnico Nacional celebrado en 19-01-2021
17 Comité Técnico Nacional celebrado en 16-02-2021
18 Comité Técnico Nacional celebrado en 25-03-2021
19 Comité Técnico Nacional celebrado en 16-04-2021
20 Comité Técnico Nacional celebrado en 19-05-2021
21 Comité Técnico Nacional celebrado en 18-06-2021
22 Comité Técnico Nacional celebrado en 23-07-2021

En el siguiente link se alojan las actas de los Comités Técnicos Nacionales:

https://drive.google.com/drive/folders/1IYm9gNWTlSl54WaNb7VVI9K0I9IvK5k_?usp=sharing

COMITES DE CONTROL SOCIAL

Se realizaron comités de control social locales para el seguimiento local a la transparencia de implementación del programa IRACA. En el siguiente link están asociados todas las actas de los comités de control social.

https://drive.google.com/drive/folders/1HZVJUY-BsNaR8Q8TNyoT1DBCSr8rLfgo?usp=sharing

SOCIALIZACIÓN A AUTORIDADES EN EL MARCO DEL COVID-19

Recibido el borrador del anexo técnico, la UT en su propósito de dar a conocer de manera formal el mismo, creo y remitió la carta adjunta en el drive a las 40 autoridades de los resguardos y comunidades, en la cual se socializan las dos formas de manejo del programa en el marco del COVID-19 y las estrategias de bioseguridad derivadas de este (Resumidas en AISLAMIENTO OBLIGATORIO E INTELIGENTE), pasando para ello por cada una de las etapas del desarrollo del programa.

SITUACIÓN HUMANITARIA Y DE ORDEN PÚBLICO

El operador y su equipo local se enfrentan a las múltiples dificultades y retos que le

imponen los grupos al margen de la ley para llegar a los territorios. Los departamentos de Cauca y Nariño han sido reiteradamente afectados por la presencia y el accionar de grupos armados, como disidencias de las FARC-EP, ELN, grupos de narcotraficantes como CAPARROS, CLAN DE LOS USUGA, LOS CONTADORES y CARTEL DE TIJUANA, entre otros.

Este panorama hace que tanto las actividades de campo como el desarrollo de la implementación de proyectos se vean afectadas, ya que, si estos grupos hacen un paro armado, no hay posibilidad de transporte fluvial, marítimo o por carreteras. Necesariamente la UT ha tenido que sortear dichas dificultades para seguir operando bajo estas circunstancias, lo que restringe el normal desarrollo de las mismas y el avance significativo reflejado en un instrumento tan frio como lo es el POA.

Ante el aislamiento de todas las poblaciones por el COVID-19, los grupos armados ilegales han aprovechado para expandir su territorio y ajusticiar a los líderes sociales que defienden su derecho constitucional al territorio. Esta situación se ha dilatado por más de cuatro (4) meses.

A continuación, presentamos varias noticias reportadas por prensa escrita de diferentes medios de comunicación, tanto a nivel nacional como local, en la zona donde la UT tiene accionar en las comunidades.


EL TIEMPO

COLOMBIA | BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA SANTANDER BOYACÁ LLANO MÁS CIUDADES

'Nariño está en una crisis social total': Gobernador Jhon Rojas

El mandatario clama por corredores humanitarios para que ingresen alimentos, medicamentos y oxígeno.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

infobae
COLOMBIA AMERICA MÉXICO ARGENTINA TENDENCIAS DEPORTES
Colombia Últimas Noticias Coronavirus Colombia ESPN Cultura Newsletters

COLOMBIA

Indígenas se toman vía que de Pasto conduce a Tumaco, en Nariño

Esta es la forma de la comunidad awá de rechazar la reforma tributaria y el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz.



En lo corrido del año se han presentado 24 homicidios de indígenas awá, el año pasado solo hubo ocho. (Foto Corporación Nuevo Arco Iris)

Los indígenas del sur de Colombia siguen firmes en sus acciones para apoyar el Paro Nacional que inició ayer, 28 de abril, y se ha extendido hasta hoy, 29 de abril. Esta tarde se reportó que la comunidad Awá bloqueó la vía que conduce de Pasto a Tumaco, en Nariño. Esta población está haciendo presencia específicamente en el tramo de carretera que está dentro de la jurisdicción de Ricaurte y en el sector El Diviso, adscrito al municipio de Barbacoas.

"Ayer se cumplió una asamblea de los pueblos indígenas y se determinó que se continuaría con el bloqueo en la vía. Seguimos en protesta y rechazamos la reforma tributaria y los incumplimientos de los acuerdos de paz", aseguró un líder Awá a RCN Radio.

La decisión de bloquear esta carretera en particular tiene que ver con que esta es la principal conexión terrestre que hay entre los municipios de Nariño. La vía conduce a Tumaco, que es un puerto muy importante del Pacífico que abastece a los diez municipios costeros de esta región del país. Además, por ese mismo camino los campesinos, pescadores y pequeños comerciantes sacan sus productos y los distribuyen.

La comunidad awá está asentada al suroccidente de Colombia, en los municipios de Cumbal, Santa Cruz de Guachavez, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Tumaco e Ipiales, en Nariño; y en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, La Dorada, Orito, Puerto Caicedo, Villa Garzón en el Putumayo.

En ambos departamentos se reportan constantemente problemas relacionados con la vulneración de los derechos humanos, pues ahí operan varios grupos al margen de la ley. Esta razón, principalmente, es la que motiva a los indígenas a unirse al Paro Nacional.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

Colombia INFORMA
AGENCIA DE COMUNICACIONES

DD.HH.

El Pacífico caucano exige diálogo con los actores al margen de la ley

Publicado por Editora General | Abr 27, 2021 | Conflicto y Paz, Destacadas | 0 |

27 abr. CI.- El jueves pasado culminó la caravana humanitaria de tres días por la costa del Pacífico del Departamento del Cauca, en el Suroeste de Colombia. Bajo el lema "Pacto por la Vida y la Paz. Respetar la Vida para construir la Paz", más de 200 personas de organizaciones nacionales e internacionales recorrieron las bocanas y ríos de los tres municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay. El objetivo de la caravana fue poner fin a la actual crisis humanitaria en la región del Pacífico, como consecuencia del conflicto armado. Las y los caravanistas hicieron un llamamiento a los actores armados al margen de la ley para que dialoguen con la sociedad civil.

Colombia Informa @Col_Informa · 21 abr. 2021

#DDHH | Caravana fluvial humanitaria por la vida y por la paz ha recorrido los territorios de López de Micay, Suárez, Zaragoza y Noanamita en el departamento del Cauca, visibilizando la crisis humanitaria que enfrenta el Pacífico colombiano



En septiembre del año pasado diferentes sectores de la sociedad civil, organizaciones étnico-territoriales, sociales, eclesiásticas, del sector académico, institucionalidad, organismos internacionales y otras expresiones del movimiento social de los cuatro departamentos de la costa pacífica colombiana impulsaron el Pacto por la Vida y la Paz. En este, denunciaron el recrudecimiento del conflicto social, político y armado; así como la agudización de la crisis humanitaria y el incumplimiento del Acuerdo de Paz a nivel nacional.

Ahora la Mesa Étnica Territorial de Paz -METP-, la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca -Cococauca- y el Vicariato Apostólico de Guapi se unieron para organizar la Caravana Humanitaria, con el fin de invitar a otros sectores de la sociedad a sumarse al pacto y apoyar la paz.

Orlando Pantoja, palenquero mayor de Cococauca constató que por primera vez se logra a llevar a cabo una caravana de este alcance en la región del Pacífico. "Queremos dejar claro que no vamos a entregar nuestro territorio ancestral a nadie. Somos un pueblo anfibio con una tradición milenaria que se mueve por las aguas, los ríos, los esteros. Nuestro mensaje es: vamos a permanecer en el territorio que nos dejaron nuestros ancestros", afirmó Pantoja.

@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1
@iracaz1

EL MORICHAL
EL PERIÓDICO DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA



Cumaribo Portada Vichada

Transportadores vichadenses se sumaron al Paro Nacional. Ya escasean alimentos en Cumaribo

7 mayo, 2021 Redacción ElMorichal 1 comentario Paro Nacional en Vichada, Transportadores Vichada

Los transportadores que viajan hacia el municipio de Cumaribo (Vichada) también se han sumado al Paro Nacional. Cerca de un 70% de los camioneros han cesado actividades y una gran mayoría se ha sumado activamente a los bloqueos que ese gremio realiza en las principales vías de acceso o salida a Villavicencio (Meta).

En conversación con EL MORICHAL, Luis Mosquera aseguró que hace 8 o 10 días los camioneros dejaron de viajar hacia el Vichada.

A parte del pedido de todos los transportadores del país que reclaman congelar los costos del combustible y los peajes, ellos tienen al menos tres solicitudes particulares frente a temas que los afecta directamente, y que repercuten finalmente en todos los habitantes de la región.





"Uno es intervenir la vía entre Puente Arimena (Meta) y El Viento (Vichada). Estamos exigiendo un mantenimiento vial", aseguró Mosquera. Los transportadores denuncian que el estado de la vía empeora cada día y la entrada de la temporada de las lluvias puede agudizar la situación. "El tramo más feo es de Los Mangos a El Viento, son unos 25 – 30 kilómetros y ahora mismo nos gastamos seis horas, cuando en condiciones normales uno se gasta 30 minutos".

Paro Nacional, en vivo: protestas, bloqueos y marchas el 17 de junio, en directo | Última hora

AS.COM
Actualizado a 18 de junio de 2021 a las 11:00 CDT

COMENTA



Paro Nacional: protestas, bloqueos y marchas el 17 de junio

Esta tarde se realizó una manifestación en inmediaciones al Portal de las Américas en Bogotá, para exigir la búsqueda de Duban barros, joven que lleva desaparecido mas de 10 días.

> **Colombia Informa**
> @Col_Informa
>
> #ParoNacional17J | Está tarde frente al Portal Resistencia en la ciudad de Bogotá, la @nydia_erika y la familia de Duban Barros siguen exigiendo a la Fiscalía y al Estado colombiano se inicie la búsqueda urgente del joven que lleva desparecido desde el 5 de junio.
>
> 
>
> 8:28 PM · Jun 17, 2021

Es importante tener en cuenta que pese a las adversidades presentadas en todos los 40 territorios que atendió la Unión Temporal Prosperidad Iraca Z1, siempre estuvo atenta, además de prestar el cumplimiento de las metas y de las obligaciones contractuales derivadas del convenio No. 213 de 2019. Para ello se realizaron planes estratégicos, que nos permitieron avanzar de una manera sustancial en la ejecución de las actividades convenidas.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA PINZON AGUDELO
Representante Legal Unión Temporal
U.T. Prosperidad Iraca Zona 1
