ACTA No. 18

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL ZONA I

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: BOGOTÁ D.C. – MODALIDAD VIRTUAL

FECHA: 25/03/2021 **HORA: 8**:00 AM A 9:00 AM

LUGAR: Modalidad Virtual

DEPENDENCIA A CARGO: Grupo interno de Trabajo - GIT Atención Integral con Enfoque Diferencial - AIED

OBJETIVO:

Realizar el 18° Comité Técnico Nacional del Convenio 213 de 2019, suscrito entre Prosperidad Social y Unión Temporal Prosperidad Iraca Zona 1, corte al 28 de febrero de 2021.

Participantes: este comité fue realizado bajo modalidad virtual usando la herramienta Teams. Los participantes se listan a continuación:

Equipo Nacional
Juan Manuel Erazo – Director de Inclusión Productiva
Walden Alberto Borja - Coordinador GIT- AIED – Supervisor Convenio 213/19
Jorge Ardila – Profesional Apoyo a la supervisión DIP
Omar Torrijos – Asesor Financiero del despacho de la DIP
Diana Chica – Apoyo financiero DIP
Susan Buitrago – Abogada de la Dirección

Equipo Unión Temporal
Oscar Rendón – Coordinador Área Financiera y Representante Legal UT IRACA Zona I (Delegado por la representante legal)
James Arias Gómez – Coordinador Zonal
Nelson Rincón – Coordinador de Seguimiento UT
Mónica Rangel – Coordinador de componentes
Alejandro Cárdenas – Asesor externo

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO Y COMPROMISOS:

1. Verificación quorum
2. Seguimiento Compromisos
3. Avance financiero, respuesta a las observaciones presentadas por la supervisión a los informes financieros de octubre y noviembre de 2020
4. Avance técnico y seguimiento del POA.
5. Varios
6. Compromisos

1. Verificación del Quórum y Seguimiento a compromisos

Durante la verificación del quorum se informó al Comité que se cumple de acuerdo con la lista de asistencia (ver lista).

Posteriormente se continuo con el proceso de revisión de compromisos por parte del coordinador zonal James Arias de la Unión Temporal (UT) donde se menciona en que porcentaje de cumplimiento de estos.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
1	Responder a las propuestas de tema de contrapartida y ajuste de rubro presupuestal	Equipo supervisión	21 de enero	18/01/2021 Y 01/02/2021
2	Enviar la matriz de los productos de contrapartida	UT	18 de enero	NO
3	Incluir la fecha de entrega en el reporte de la ficha de proyectos	UT	21 de enero	SI
4	Alistamiento y cierre del convenio	UT	21 de enero	Se reporta que la UT empezó a trabajar semanas atrás

2. Avance Financiero

Oscar Rendón coordinador financiero de la UT, presenta el componente financiero con corte a 28 de febrero de 2021.


APORTES DE RECURSOS:

Aporte Prosperidad Social	: $ 32.165.067.502,00
Adiciones	: $ 0,00
Aporte Total Prosperidad Social	**: $ 32.165.067.502,00**
Aporte Contrapartida UT	: $ 14.116.275.329,00
Valor Total del Convenio	**: $ 46.281.342.831,00**

Oscar Rendón informa que el convenio cuenta con aportes por parte de Prosperidad Social por valor de $32.165.067.502 y, por parte de contrapartida de $14.116.275.329.00, cómo se presenta en el cuadro anterior.

A la fecha se han recibido cuatro desembolsos por valor de $28.948.560.752 que equivalen a un 90% y está pendiente de recibir el 5° desembolso por valor de $3.216.506.750 equivalente al 10%. Cómo se presenta a continuación:

2. AVANCE FINANCIERO – DESEMBOLSOS

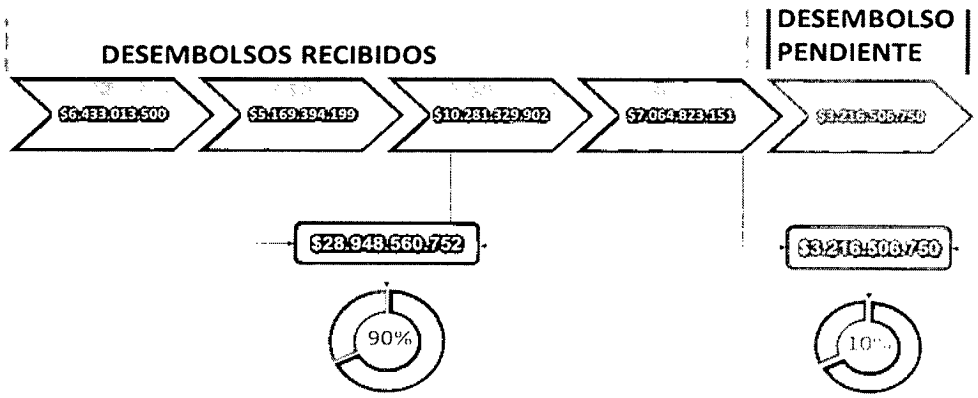

Respecto a los avances de los recursos técnicos Vs los avances financieros, para febrero se tenía un avance técnico de 74% y un avance financiero del 68.99%.

Legalización de recursos con corte 28 de febrero

Se expone por parte del coordinador financiero de la UT la ejecución de recursos con corte 28 de febrero, que está pendiente de envío en el siguiente cuadro:

RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL

Línea Presupuestal	Vr. Programado	Vr. Acumulado Legalizaciones Corte Noviembre 2020	Vr Presentado a legalizar Diciembre 2020	Vr a Presentar a legalizar enero 2021	Vr a Presentar a legalizar febrero 2021	Vr. Acumulado Presentado a Legalizar Corte febrero	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 9.296.500.000,00	$ 7.476.316.619,67	$ 577.859.999,33	$ 571.419.999,00	$ 426.559.999,00	$ 9.052.156.617,00	$ 244.343.383,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 5.041.916.873,00	$ 2.595.615.791,33	$ 335.100.000,00	$ 0,00	$ 521.950.000,00	$ 3.452.665.791,33	$ 1.589.251.081,67
3. INVERSIÓN	$ 15.989.600.000,00	$ 224.798.688,00	$ 5.532.058.747,91	$ 1.007.419.000,00	$ 2.278.433.275,97	$ 9.042.709.711,88	$ 6.946.890.288,12
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.794.320,00	$ 0,00	$ 56.794.320,00	$ 5.605.680,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.629,00	$ 392.160.932,00	$ 139.226.953,00	$ 0,00	$ 55.845.467,00	$ 587.233.352,00	$ 1.187.417.277,00
VALOR TOTAL	**$ 32.165.067.502,00**	**$ 10.688.892.031,00**	**$ 6.584.245.700,24**	**$ 1.635.633.319,00**	**$ 3.282.788.741,97**	**$ 22.191.559.792,21**	**$ 9.973.507.709,79**
Porcentaje de legalización Vs Total aportes DPS		**33,23%**	**20,47%**	**5,09%**	**10,21%**	**68,99%**	**31,01%**
Porcentaje de legalización Vs Desembolso DPS		**36,92%**	**22,74%**	**5,65%**	**11,34%**	**76,66%**	**34,45%**

que ya están contemplados los ajustes ya que por ejecutar en el mes de marzo en el rubro de talento humano se ejecutaron $244.000.000 para apropiar en el mes de marzo, en gastos operativos $1.589.000.000 e inversión $6.900.000.000 esos traslados estaban inmersos dos líneas presupuestales que son talento humano y gastos operativos para financiar la operación hasta abril.

Walden Borja pide que las presentaciones de los comités se envíen con suficiente tiempo para ser analizada, ya que para este caso la fecha de corte fue el 28 de febrero y la presentación el 25 de marzo lo cual indica que tuvieron mucho tiempo para preparar la presentación y la enviaron solo unas horas antes de empezar el Comité lo cual dificulta estudiar las cifras y preparar los comentarios para ser discutidos en el comité. El Supervisor expresa que esto es considerado una mala practica y pide que para el próximo comité esta situación no se vuelva a presentar.


Continua Óscar Rendón, mencionando que de los recursos de contrapartida se encuentran por enviar a PS a noviembre de 2020 $822.289.997.57, diciembre de 2020 $3.894.852.193,66, a enero de 2021 $1.777.176.135.00 y a febrero de 2021 $2.678.821.037,20 con esto se llega a un Acumulado Ejecutado con corte a febrero de 2021. de $9.173.139.363,43 correspondiente a un 64.98%

De la misma manera se expone el comportamiento del estado financiero del mes de enero donde se evidencia que se han ejecutado $19.238.388.875. Adicionalmente se tiene en trámite de legalización con corte a enero un 36.72%, para un total de $10.630.618.129 los cuales se pueden evidenciar en el siguiente cuadro:

RECURSOS CONTRAPARTIDA

Línea Presupuestal	Vr. Programado	Vr. Acumulado Legalizaciones Corte Noviembre 2020	Vr Presentado a legalizar Diciembre 2020	Vr a Presentar a legalizar enero 2021	Vr a Presentar a legalizar febrero 2021	Vr. Acumulado Presentado a Legalizar Corte febrero	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 751.680.000,00	$ 651.779.159,00	$ 51.520.000,00	$ 15.840.000,00	$ 31.680.000,00	$ 750.819.159,00	$ 860.841,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 776.466.677,05	$ 73.510.839,57	$ 37.883.262,26	$ 317.836.135,00	$ 0,00	$ 429.230.236,83	$ 347.236.440,22
3. INVERSIÓN	$ 12.588.128.652,00	$ 96.999.999,00	$ 3.805.448.931,40	$ 1.443.500.000,00	$ 2.647.141.037,20	$ 7.993.089.967,60	$ 4.595.038.684,41
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 14.116.275.329,05	$ 822.289.997,57	$ 3.894.852.193,66	$ 1.777.176.135,00	$ 2.678.821.037,20	$ 9.173.139.363,43	$ 4.943.135.965,63
Porcentaje de legalización Vs Aportes Unión temporal		**5,83%**	**27,59%**	**12,59%**	**18,98%**	**64,98%**	**35,02%**

Avance legalización recursos PS enero – febrero

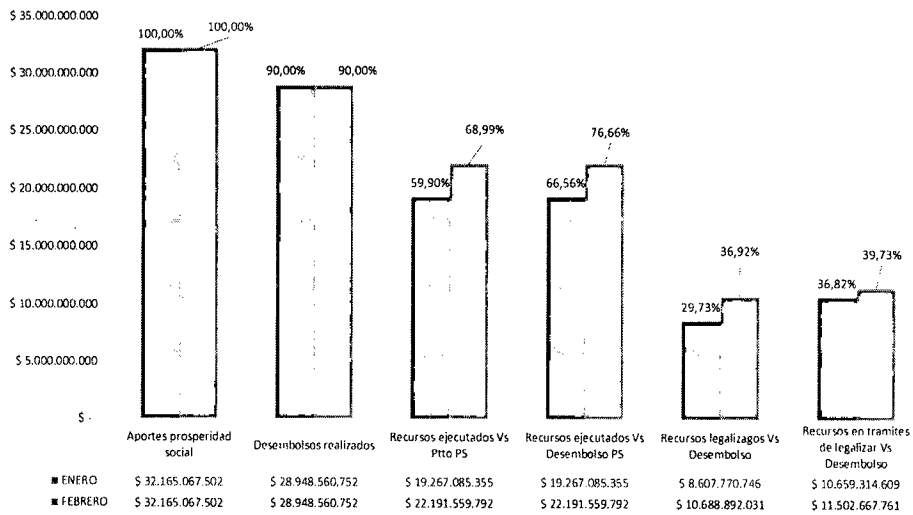

3.Avance Técnico

Respecto al avance técnico James Arias, coordinador zonal, informa que en la etapa de alistamiento hay 142 contratos para el equipo local con corte al 28 de febrero y en el equipo zonal, 17 contratos. La contratación de equipo sigue igual pues de la meta de 160 personas, hay 160 personas contratadas a la fecha. En cuanto a la rotación del equipo local en febrero no se hicieron rotaciones.

También informa que de acuerdo con los compromisos establecidos en el convenio 213, se realizaron actividades POA en los 40 territorios colectivos y en los cuatro departamentos, logrando así el cumplimiento de la meta en un 100%.

ACTIVIDAD POA	EJECUCION
•Contratación Equipo Local	100%
•Alistamiento - transferencia	100%
•Socialización y Concertación con Autoridades	100%
•Socialización y Concertación con Comunidades	100%
•Vinculación de Hogares	100%
•Caracterización de Entrada	100%
•ICOE de Entrada y Visión de Desarrollo	100%
•Diagnóstico Comunitario	100%
• Fichas de proyectos	
•Implementación de proyectos	

Respecto al proceso de formulación e implementación de fichas de proyecto se menciona por parte del coordinador Zonal que en el departamento del Cauca para el mes de febrero todas las fichas están en etapa de implementación y muchas de ellas han sido entregadas en su totalidad y se tienen algunos procesos pendientes con Rio Napi, Rio San Francisco y Renacer Negro para entregarles antes del 30 de abril los compromisos que se pactaron con estas comunidades

Para el Departamento de Guanía ya se encuentran todas las fichas asignadas y en implementación de proyectos, siendo el departamento más adelantado en el proceso de ejecución del programa. Esta semana se hicieron entregas allá en compañía de la dirección Regional. A continuación, se presenta un cuadro del estado actual de las entregas de insumos adelantadas:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	Nº HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	160	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	19/10/2020	IMPLEMENTACION	16/09/2020	IMPLEMENTACION	12/04/2020
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	160	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	16/09/2020	IMPLEMENTACION	15/04/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	260	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	19/10/2020	IMPLEMENTACION	11/09/2020	IMPLEMENTACION	16/04/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	160	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	20/04/2021 parcial	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	60	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	600	IMPLEMENTACION	24/09/2020	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	20	IMPLEMENTACION	24/10/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020	IMPLEMENTACION	24/02/2021	IMPLEMENTACION	24/11/2020
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	280	IMPLEMENTACION	27/10/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020

Para el departamento de Nariño, en el resguardo de Hojal La Turbia la ficha de PPC y FSC ya se le asignaron recursos y están en etapa de implementación; en el Charco esta semana se realizarán entregas en Socio Tapaje y Porvenir, los demás de este municipio quedan para el mes de abril. En Ricaurte la ficha del Nulpe ya fue entregada la ficha en la parte alta y en la parte media y se tienen programadas las entregas en abril para Edén Cartagena y Alto Cartagena. A continuación, se presenta un cuadro del estado actual de las entregas de insumos adelantadas:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	Nº HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
NARIÑO	BARBACOAS	R I. HOJAL LA TURBIA	500	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	ASIGNACION RECURSOS		IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	80	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	80	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	80	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	100	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	13/10/2020	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIEÑA	100	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R I. ALTO CARTAGENA	17	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUI-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	90	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R I. EDEN CARTAGENA	14	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R I. GUALCALÁ	15	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R I. INTEGRADO LA MILAGROSA	140	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R I. LIBERTAD TELEMBÍ	37	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R I. MAGUI	70	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R I. NULPE MEDIO - ALTO RIO SAN JUAN-PUEBLO AWA	142	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021
NARIÑO	RICAURTE	R I. PALMAR	35	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	39	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	RICAURTE	R I. RAMOS MONGÓN	20	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA

Walden Borja supervisor del convenio, recomienda que sean remitidas las actas de entregas de las fichas que ya aparecen como entregadas desde hace varios meses, ya que el proceso del último desembolso esta supeditado a la verificación de esos entregables y al cargue del sistema, y como esta información es tan numerosa, el proceso de revisión es un trabajo dispendioso y riguroso.

En cuanto a la información del departamento de Nariño, Walden Borja solicita que se informe con celeridad la fecha de entrega para que los equipos de Prosperidad Social puedan hacer el debido acompañamiento a las entregas.

Siguiendo con el tema de Nariño, el Coordinador Zonal informa que, en San Andrés de Tumaco, en Bajo Mira y Frontera están en proceso de entrega de materiales para los arreglos de la Casa de Gobierno y las fichas de PPC y FC están para entrega el mes de abril. Peña Alegría ya está cerrado y la Brava se va a hacer entrega los próximos días al igual que Pulgande.

Por último, para el departamento de Vichada en Cumaribo se han entregado la mayoría de las fichas y en Primavera lo más atrasado es el resguardo de Trompillo que se acaba de hacer una sociedad con el Batallón de Ingenieros para que colaboren con 6 efectivos para hacer rápidamente la construcción de la bodega. En Puerto Carreño también está apoyando el Batallón en Caño Mesetas Dagua en la entrega de las piaras; adicionalmente en la inauguración de estas entregas, se realizarán brigadas de salud y recreación para los niños de los resguardos mencionados. A continuación, se presenta un cuadro del estado actual de las entregas de insumos adelantadas:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	Nº HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	450	IMPLEMENTACION	09/04/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	28/04/2021	IMPLEMENTACION	PROCESO DE COMPRA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	200	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	418	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200	IMPLEMENTACION	18/03/2021	IMPLEMENTACION	18/03/2021	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	18/03/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66	IMPLEMENTACION	4/11/2020	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AWA KUNA TSEPAJIBO	92	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	23/01/2021	IMPLEMENTACION	12/12/2020	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	26/02/2021	IMPLEMENTACION	12/12/2020	IMPLEMENTACION	26/02/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	22/11/2020	IMPLEMENTACION	12/12/2020	IMPLEMENTACION	14/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48	IMPLEMENTACION	22/02/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113	IMPLEMENTACION	1/02/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021 parcial	IMPLEMENTACION	16/03/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPUMI	17	IMPLEMENTACION	20/10/2020	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021 parcial	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021 parcial	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA

El supervisor del convenio pide que aclare que cuales son los territorios cerrados y se envíen la totalidad de las evidencias. Mónica Rangel coordinadora de componentes informa que ya se tienen 10 territorios con proyectos cerrados. Walden reitera la solicitud que las fichas que aparecen entregadas en el 2020 se envíen de inmediato para poder hacer la revisión ya que son requisitos para el último desembolso.

Se presentan fotografías por parte del Coordinador Zonal de la capacitación y entrega de ficha en el Resguardo Indígena Atabapo, entrega de potrillos y ficha FC en el C.C Rio Guajui en Guapi, entrega de ficha PPC de Producción De Arroz en el C.C. Alto Guapi, fotos de entrega de la ficha de Inda Zabaleta y entrega de fichas FSC y FC del C.C. de Rio Tomo.

En general resumen de la matriz de seguimiento de componentes a corte de 28 de febrero esta de la siguiente manera:

Seguridad Alimentaria al 74.5%
Proyectos Productivos al 68.5%
Fortalecimiento Social y Comunitario al 78.6%
Financiamiento complementario al 59%

Adicionalmente se expuso la parrilla de contenidos de comunicaciones que se hace semanalmente y que se adelantó del mes de febrero en los territorios intervenidos. En el caso de los mercados campesinos se muestra la información de Guainía, Tumaco, Barbacoas

y Puerto Carreño. Adicionalmente se muestra información de las entregas regionales en Vichada, Nariño y en el Panorama Regional se muestran las situaciones de orden público en los territorios Rio Napi y Rio San Francisco y el Panorama Covid del mes de febrero.

Por último, la Unión Temporal presenta la necesidad de estudiar la necesidad de una prórroga del Convenio, modificando la cláusula Octava donde se señala que la ejecución del convenio será hasta el 30 de abril de 2021, ampliando su plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2021. En los próximos días se enviará la propuesta técnica y jurídica a Prosperidad Social para su revisión.

El Supervisor anota que en el tema de la prorroga sería necesario establecer las causas de fuerza mayor que generan el retraso de las actividades y establecer cuál es el impacto financiero de esto y aclarar de donde salen los recursos para una eventual prórroga. Adicionalmente solicita que antes de presentar la propuesta ante el comité, se analice con el equipo de supervisión del convenio la propuesta para que se lleve una posición clara por cada una de las dos partes ante el próximo comité y pide que el borrador de la solicitud se entregue máximo 6 de abril para poder solicitar a tiempo al ordenador del gasto la aprobación o no de esta solicitud.

4.Otros y Varios

El supervisor del convenio informa que en la visita que se hizo a Guapi se evidenció una buena imagen y alto grado de satisfacción por parte de la comunidad sobre Prosperidad Social y el Operador.

También informa que La contraloría General de la Republica ha seleccionado este convenio para desarrollar su función de auditoria y hay programadas unas visitas a campo por lo cual se solicita estar muy atentos a los requerimientos que hagan y solicita responder de manera formal y siempre informar las solicitudes para que PS pueda hacer el acompañamiento correspondiente.

Compromisos:

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Enviar la matriz de los productos de contrapartida	UT	29 de marzo
2	envio actas de entrega	UT	29 de marzo
3	envío informes financieros pendientes	UT	29 de marzo
4	Envío propuesta de prorroga	UT	6 de abril

OSCAR RENDÓN PADILLA
Representante legal UT IRACA Zona I Delegado)

WALDEN ALBERTO BORJA
Supervisor convenio 213 Zona I

JAMES ARIAS
Coordinador Zonal UT IRACA Zona I

JUAN MANUEL ERAZO
Director de Inclusión Productiva- DPS

Elaboró: Catalina Cuadros Apoyo a la supervisión.
Anexo: acto administrativo de delegación por parte de la representante legal y presentación del Comité Nacional.
