ACTA No. 22

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL IRACA ZONA I

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: BOGOTÁ D.C. – MODALIDAD VIRTUAL

FECHA: 23/07/2021 **HORA:** 8:00 a.m. A 10 a.m.

LUGAR: Modalidad Virtual

DEPENDENCIA A CARGO: Grupo interno de Trabajo - GIT Atención Integral con Enfoque Diferencial - AIED

OBJETIVO:

Realizar el 22° Comité Técnico Nacional del Convenio 213 de 2019, suscrito entre Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Zona 1, corte del 31 de junio de 2021.

Participantes: este comité fue realizado bajo modalidad virtual usando la herramienta Teams. Los participantes se listan a continuación:

Equipo Nacional
Omar Torrijos – Delegado de la Directora de Inclusión Productiva
Walden Alberto Borja - Coordinador GIT- AIED – Supervisor Convenio 213/19
Jorge Ardila – Apoyo a la supervisión DIP
Diana Chica – Apoyo financiero DIP
Catalina Cuadros - Apoyo a la supervisión DIP
Jesús Antonio García Micolta - Apoyo a la supervisión DIP

Equipo Unión Temporal
Paola Pinzón – Representante Legal
Oscar Rendón – Coordinador Área Financiera
James Arias Gómez – Coordinador Zonal
Nelson Rincón – Coordinador de Seguimiento UT
Alejandro Cárdenas – Asesor UT
Mónica Rangel – Coordinador de Componentes

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO Y COMPROMISOS:

1. Verificación quorum
2. Seguimiento Compromisos
3. Avance financiero
4. Avance técnico y seguimiento del POA.
5. Varios
6. Compromisos

1. Verificación del Quórum y Seguimiento a compromisos

WALDEN BORJA en calidad de Supervisor del Convenio 213 de 2019 procede a presidir la reunión del Comité Técnico Nacional No. 22 a la hora señalada, anunciando que la Doctora BRASILIA ROMERO SINISTERRA Directora de Inclusión Productiva delegó su participación en la reunión en la persona de OMAR TORRIJOS Asesor Financiero del despacho de la DIP para representarla en esta reunión. (Se anexa delegación)

Se dio inicio a la reunión previa verificación del quorum, poniendo en consideración de los participantes el siguiente orden del día:

- Verificación quorum
- Seguimiento Compromisos
- Avance financiero
- Avance técnico y seguimiento del POA.
- Varios
- Compromisos.

2. Seguimiento compromisos.

En el segundo punto del orden del día, tomo la palabra JAMES ARIAS GÓMEZ, Coordinador Zonal de la Unión Temporal (UT) para exponer los avances en la implementación de las obligaciones y actividades convenidas, conforme al cronograma prestablecido en el Convenio. En la siguiente diapositiva, proyectada en la presentación se relaciona los compromisos pendientes:

Diapositiva 1. Compromisos:

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	FECHA
1	Cronograma actas de entrega	UT	SI	21 de junio
2	Entrega de observaciones financieras	UT	SI	23 de junio
3	Realizar mesa de trabajo financiera	UT Y PS	SI	25 de junio
4	5 casos pendientes de definición de la titularidad en KOKAN	UT	SI	21 de mayo
5	Confirmar si la directora de la DIP va a participar en la entrega de Guapi para preparar su visita.	PS	SI	21 de junio
6	Enviar informe de visita de supervisión a Nariño por parte de Jorge Ardila	PS	SI	25 de junio
7	Requerimientos de prioritaria respuesta	UT	SI	21 de junio
8	Asegurar que todo el expediente del convenio este bien construido	UT	EN CONSTRUCCION	31 de junio

Como está señalado en la diapositiva, los compromisos se cumplieron, salvo dos novedades de titularidad de los beneficiarios no registradas en la base de datos de Kokan, según informó el Supervisor, la situación es atribuida errores del sistema. JAMES ARIAS destaca la referirse al punto

5º de los compromisos, la visita de la Directora de la DIP la Municipio de Guapi. En el punto octavo destacó que se trata de un compromiso de trato permanente.

3. Avance Financiero

En este punto del orden del día, toma la palabra OSCAR RENDÓN, coordinador financiero de la UT, quien presenta el componente financiero con corte a 30 de junio de 2021. En la siguiente diapositiva, recuerda el monto de los aportes convenidos por las partes que suscribieron el Convenio:

3.1. Aportes de recursos:


Aporte Prosperidad Social	: $ 32.165.067.502,00
Adiciones	: $ 0,00
Aporte Total Prosperidad Social	**: $** 32.165.067.502**,00**
Aporte Contrapartida UT	: $ 14.116.275.329,00
Valor Total del Convenio	**: $ 46.281.342.831,00**

En cuanto el avance financiero de los desembolsos informa que se han efectuado hasta el momento cuatro desembolsos por el valor de $28.948.560.752 equivalente al 90%. Afirma que está pendiente el 5° desembolso por valor de $3.216.506.750 equivalente al 10%.

3.2. Avance técnico vs avance financiero meses de abril-mayo-junio.

Respecto al cotejo del avance técnico de la ejecución vs los avances financieros, al corte del 30 de junio, OSCAR RENDÓN afirma que el avance técnico es del 93% mientras el avance en la ejecución financiera es del 90%. Es decir que, hay un superávit del 3% en avance técnico vs ejecución de recursos. Resalta que, el avance en lo que resta en ejecución depende que se haga efectivo el desembolso pendiente, para realizar el cierre y pago a proveedores conforme a la dispuesto en la ficha técnica. Lo anterior fue ilustrado en la diapositiva 2:

Diapositiva 2. Avance técnico vs avance financiero abril-mayo-junio.

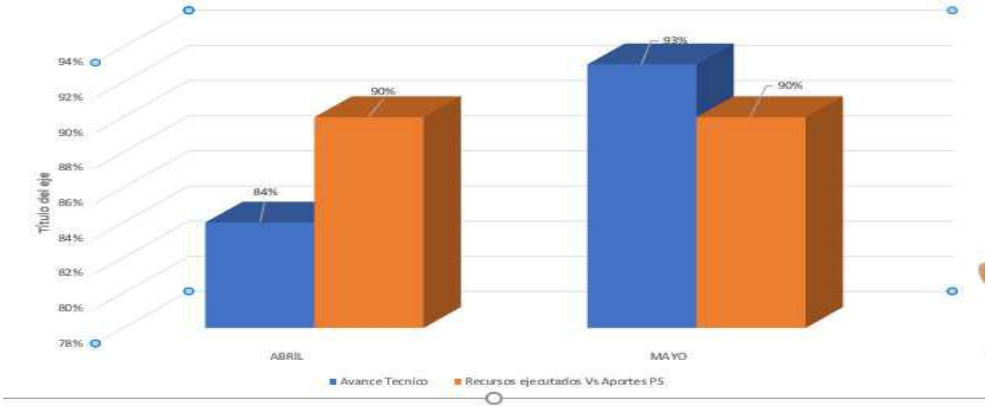

En cuanto a los avances de la ejecución de los recursos aportados por Prosperidad Social con corte al 30 de junio de 2021, en el cuadro de la Diapositiva 3, expone los avances correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2021.

Diapositiva 3. Avance técnico vs avance financiero.

RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL CORTE 30 JUNIO

Línea Presupuestal	Vr. Programado	Vr. Acumulado Legalizado Corte Marzo 2021	Vr Presentado a legalizar abril y en subsanacion 2021	Vr presentado a legalizar mayo 2021	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar	Vr en subsanacion y/o por presentar JUNIO 2021	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar	Saldo por ejecutar
1. TALENTO HUMANO	$ 9.482.702.047,46	$ 8.067.016.619,67	$ 1.375.553.332,00	$ 0,00	$ 9.442.569.951,67	$ 40.132.095,79	$ 9.482.702.047,46	$ 0,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 4.855.714.826,00	$ 3.215.994.866,33	$ 135.124.040,49	$ 8.763.000,00	$ 3.359.881.906,82	$ 1.495.832.919,18	$ 4.855.714.826,00	$ 0,00
3. INVERSIÓN	$ 15.989.600.000,00	$ 1.086.819.856,44	$ 441.244.834,00	$ 1.566.221.106,35	$ 3.094.285.796,79	$ 12.895.314.203,21	$ 15.989.600.000,00	$ 0,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 38.596.140,00	$ 5.604.420,00	$ 0,00	$ 44.200.560,00	$ 18.199.440,00	$ 62.400.000,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.629,00	$ 427.065.099,00	$ 5.500.000,00	$ 0,00	$ 432.565.099,00	$ 1.342.085.530,00	$ 1.774.650.629,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 32.165.067.502,46**	**$ 12.835.492.581,44**	**$ 1.963.026.626,49**	**$ 1.574.984.106,35**	**$ 16.373.503.314,28**	**$ 15.791.564.188,18**	**$ 32.165.067.502,46**	**$ 0,00**
Porcentaje de legalización Vs Total aportes DPS	$ 32.165.067.502,46	39,91%	6,10%	4,90%	50,90%	49,10%	100,00%	
Porcentaje de legalizacion Vs Desembolso DPS	$ 28.948.560.752,00	44,34%	6,78%	5,44%	56,56%	54,55%		

Con relación a la legalización de los avances del mes marzo señala están registrados en el cuadro de la diapositiva 3 sin novedad. En este sentido, la ejecución de este mes respeto a los aportes del DPS es del 39.91% y la ejecución respeto al desembolso es del 44.34%. El valor total de ejecución en este periodo es $ 12.835.492.581,44. En cuanto al mes de abril, señala que el día de ayer 22 de mayo, se había enviado la información respondiendo a las observaciones hechas de parte de la Supervisión del Convenio, acerca de los gastos de talento humano, operativos y de inversión. Destaca que la subsanación eran aspectos de forma, que con la información enviada el día anterior, las observaciones quedaban subsanadas.

En este orden, la legalización de ejecución financiera corresponde al contenido del cuadro de la referida diapositiva. Lo legalizado de los aportes correspondiente a este periodo, según el cuadro, es de 6,10% y lo legalizado de lo desembolsado es de $ 6,78%, para un total legalizado de $ 1.963.026.626,49. En cuanto al mes de mayo, manifiesta que la información para la legalización de ejecución de este mes se presentó el día de ayer 22 de julio. Afirma que con la legalización de la información se llegaría a una ejecución de $1.574.984.106,35, con un avance de los aportes estimado en el 4,90% y con relación al desembolso del 5,44%. Del grueso por legalizar en este periodo, lo que más falta, son los componentes de inversión y soporte organizacional. Consolidada esta información, según OSCAR RENDÓN se llegaría a un avance en ejecución de los aportes del 50,90% y 56,56% del desembolso. Advierte que, con este reporte de informe, se cierra financieramente el Convenio.

OSCAR RENDÓN, al ser interpelado por WALDEN, respeto de si en el anunciado informe de ayer estaba la información de los contratos solicitados anteriormente, afirma que sí. Resalta que hay una carpeta con los contratos del personal Zonal y Local. Lo anterior es ratificado por JORGE ARDILA, quien afirma que la información de los contratos era el mayor escollo y queda solo pendiente un aspecto de menor importancia por dilucidar. Al ser interrogado por WALDEN acerca de los meses a los cuales corresponde la entrega del informe de ayer, OSCAR señala que la entrega corresponde a los meses de abril y mayo. WALDEN de nuevo lo inquiere con relación a la fecha de entrega de la

información del mes de junio por parte de la Unión Temporal, a lo que responde OSCAR que el próximo viernes 30 de julio de 2021, presentará el informe con el mayor avance posible. Asegura que no es posible la entrega total, debido a que no se halla consolidada la información de las Actas de entrega la cuales, según lo acordado en una mesa de trabajo, por razones de eficiencia se convino integrar a los informes administrativos y financieros.

WALDEN recordó que, la entrega de los informes se debe hacer dentro de los primeros 7 días calendarios de cada mes y que el ultimo desembolso está condicionado a la entrega oportuna del informe. OSCAR se comprometió a entregar el mayor avance posible del informe del 30 de junio, el próximo viernes 30 de julio. Por petición de Jorge Ardila se acordó, celebrar una reunión la próxima semana presencial para la revisión física de las Actas de entrega y comprobantes de egresos, para garantizar la pronta y efectiva legalización de lo ejecutado. La fecha de reunión quedó definirse la próxima semana. En cuanto al informe de la contrapartida OSCAR manifiesta que se presentó el informe de la ejecución de mayo, quedando pendiente el mes de junio de 2021. Por otra parte, se comprometió a entregar la subsanación de los refrigerios correspondientes a las Actas de entrega el próximo 30 de julio, ante requerimiento de JORGE ARDILA.

4. Avance técnico y seguimiento del POA.

Prosiguiendo con el informe, en el punto de Avance técnico y seguimiento del POA, JAMES ARIAS manifiesta que en este periodo del informe, no se han presentado novedades en la contratación tanto zonal como local. En cuanto al aspecto de etapas superadas en meses anteriores, sostiene que, de acuerdo con el compromiso, se han cumplido en un 100% y en lo relacionado con la implementación de proyectos en un 98%. Lo anterior se observa en el cuadro de la diapositiva 4.

4.1. Avance técnico de la ruta opérativa

Diapositiva 4. Avance Técnico

Programado:	40	100%
Ejecutado:	40	

ACTIVIDAD POA	EJECUCION
CONTRATACION DE EQUIPO LOCAL	100%
ALISTAMIENTO-TRANSFERENCIA	100%
SOCIALIZACION CON AUTORIDADES	100%
SOCIALIZACION Y CONCERTACION CON COMUNIDADES	100%
VINCULACION DE HOGARES	100%
CARACTERIZACION DE ENTRADA	100%
ICOE DE ENTRADA	100%
VISION DE DESARROLLO	100%
DIAGNOSTICO COMUNITARIO	100%
FICHAS DE PROYECTO	100%
SOCIALIZACION DE FICHAS	100%
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	98%

Las evidencias de la presentes actividades ya fue validada por Prosperidad Social en un 100%



En cuanto a los avances correspondientes a los avances del proyecto, manifiesta que en donde mayor atraso se presenta es en los municipios de Guapi y Timbiquí en el departamento del Cauca. En este punto interviene ALEJANDRO CÀRDENAS Asesor de la UT, para informar que los motores fuera de borda comprados para la entrega de los insumos del proyecto eran marca Yamaha, salvo el del Consejo Comunitario de San Francisco (Guapi) que era marca Neptuno, porque en el momento no había la marca Yamaha en el mercado. Señaló que en principio los del Consejo Comunitario se negaron a recibirlo, pero que luego con la intervención de la doctora BRASILIA ellos habían aceptado recibirlo. Está pendiente la entrega material lo cual se espera realizar en el curso de los próximos días. Se informa que, el problema suscitado con la entrega de los insumos de seguridad alimentaria al Resguardo de Hojal-Turbia del Municipio de Barbacoa Nariño ya fue superado. Hubo acuerdo con los representantes de Resguardo para que ellos fueran los proveedores de los insumos. Se superó el sobreprecio que estaban cobrando por los productos, que superaban ostensiblemente los valores establecidos en la ficha técnica. Por otra parte, se informó acerca de las obras de reparación y conservación que se están realizando en la Casa de Gobierno del Resguardo, la cual se considera una obra prioritaria.

En el asunto del Resguardo de Prominga Tapajeña del Municipio del Charco, Nariño se asegura que la implementación se culminará antes del 30 del mes de julio, pues no ha habido mayores inconvenientes en la ejecución. En lo que corresponde al Municipio de Ricaurte, se informa que se están realizando las correspondientes entregas. Que la entrega del ganado se hizo con recibido satisfactorio, con la respectiva firma de las Actas de entrega. Se recuerda que la comunidad ha solicitado una sesión para el día 30 de julio de 2021. El Supervisor manifiesta que, por razones de salud, se ve precisado a solicitar el aplazamiento de la reunión para una fecha posterior, lo cual concertará con las autoridades territoriales. De parte de los representantes de la UT advierten de la necesidad de prever el auge del virus del Covid-19 entre las comunidades. Sugiere tomar medidas de prevención en aras de preservar la salud de todos.

En cuanto a las comunidades de San Andrés de Tumaco, cuyo territorio es considerado el más complejo, Bajo Mira y Frontera es lo más atrasado. Sin embargo, se tiene proyectado que al 30 de julio se culminará, conforme la proyección de actividades del operador. Se destaca las obras de arreglos locativos que se adelantan satisfactoriamente en la Casa de Gobierno situada en Tumaco, los cuales se espera entregar antes del 30 de julio del 2021. Referente a los Resguardos de Vichada, afirma que el mayor atraso es en el Trompillo-Primavera y Caño Meseta y Caño Guariga-Puerto Carreño. Aseguran que se dará cumplimiento antes del 30 de julio de 2021.

Diapositiva 5. Fichas del Proyecto.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	Nº HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREG
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	450	IMPLEMENTACION	19/05/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	19/05/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREG
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	200	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	418	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200	IMPLEMENTACION	18/03/2021	IMPLEMENTACION	18/03/2021	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	18/03/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66	IMPLEMENTACION	4/11/2020	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	20/04/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	92	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	23/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	08/12/2020	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	26/02/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	26/02/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	14/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113	IMPLEMENTACION	1/02/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	17	IMPLEMENTACION	20/10/2020	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	17/03/2021
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021	IMPLEMENTACION	30/10/2020	IMPLEMENTACION	11/05/2021


4.2. Avance de obra ejecutado mayo-junio 2021.

Respeto de las obras del Municipio del Charco, como se había dicho antes, es lo más atrasado con las obras de la Unión Taijeña. Se aseguró que la obra del Trapiche será entregada antes del 30 de julio de 2021 y la cubierta del Centro de salud en la primera semana de agosto del presente año. En lo concerniente a las obras de Hojal-Turbia y Bajo Mira del Municipio del Charco, se informa que todo está previsto para terminarlas antes del 30 de julio de 2021. En cuanto a las obras del Municipio de Puerto Carreño, Caño Mesetas y Caño Guaripa, se enuncia que serán terminadas al término de la presente semana. De igual manera, se anunció que las obras de los Municipios de Guapi y la Primavera serán terminadas antes del 30 de julio de 2021. Se exhibió fotos del avance de las obras de los Resguardos de Tribuna del Pueblo, Socio Tapaje, Caño Guaripa y la entrega de materiales al Resguardo La Brava y Pulgante. También se exhibió fotos relacionadas con la adecuación de la Casa de Gobierno de Bajo Mira.

4.3. Resumen de componentes.

A continuación, el Coordinador Zonal expone los avances por componentes:

Diapositiva 6. Resumen de componentes al corte del 30 de junio de 2021.

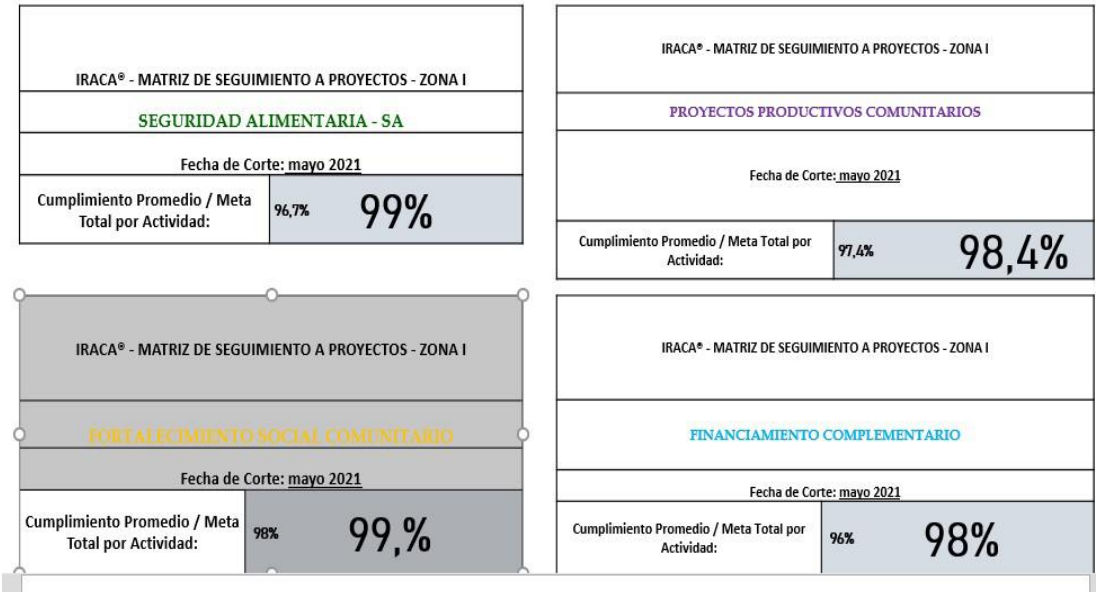

Se aclaró que, en el cuadro de la diapositiva hay un error en la fecha de corte, la cual no corresponde al mes de mayo, sino al mes de junio de 2021. En este punto no se hizo comentarios adicionales a lo contenido en la diapositiva.

4.4. Exhibición de fotos de entregas de insumos.

Se exhibió fotos de la entrega de insumos en visita a las comunidades del Consejo Comunitario de Guapí, entrega de complementarios al Consejo Comunitario de Guajui, Quiroga y Resguardo Ramos Mongón.

4.5. Información sobre el panorama regional.

Se presenta por parte de los representantes de la UT, un somero informe acerca de la situación de los territorios y comunidades, observada en la intervención en el proceso de implementación del programa IRACA a través de la ejecución del Convenio 213 de 2019:

- Asesinato de líderes sociales en el litoral pacífico y desplazamiento forzado de la población.
- Bloqueo de vías por parte de los transportadores en el Municipio El Morichal-Vichada por el pésimo estado de las vías de tránsito. Las vías son intransitables en periodo de invierno.
- Incautación de dos toneladas de marihuana en el Municipio La Primavera-Vichada.
- Limitación en la ejecución del plan de vacunación en la ruralidad de los territorios de Vichada intervenidos.

5. Proposiciones y varios.

En el punto de proposiciones y varios y varios JORGE ARDILA, señala que, revisadas las 750 Actas de entrega de seguridad alimentaria, el 90% de ellas presenta inconsistencias en el ítem de refrigerios y algunas en la titularidad del beneficiario quien firma el Acta de entrega.

Por otro lado, hizo alusión al correo enviado a la Representante Legal de la UT en que se le hizo saber de la inconformidad expresada por miembros del Consejo Comunitario de Timbiquí por la en la entrega de algunos insumos. Sobre el particular, intervino, el asesor de la UT ALEJANDRO CARDENAS, en representación de la UT, para explicar que la inconformidad surgió debido a que 600 bultos de concentrado para gallinas cuya entrega se había realizado se habían dañado. Enfatizo en el hecho que el concentrado se había dañado estando bajo la custodia del Consejo Comunitario. No obstante, la UT asumió el compromiso de reponer los bultos de concentrado, pero que, por razones de flujo de caja, tuvieron cierta demora en la entrega, por lo cual se presentó la tensión. Sin embargo, destacó que el problema fue superado y que en general, la relaciones con el Consejo Comunitario han sido muy buenas.

Otro aspecto sobre el cual JORGE ARDILA, de apoyo a la supervisión, insistió a la UT, es en la necesidad urgente de legalizar la parte técnica y financiera de los productos de la contrapartida del Convenio. Resalta la necesidad de programar una reunión para abordar el tema. Sostiene que, la entrega de información segmentada no es efectiva. WALDEN interviene luego, para insistir en el compromiso de la UT de entregar los soportes el 30 de julio de 2021 y subsanar dentro de ese mismo plazo, el asunto de los refrigerios, dada su relevancia para el cierre del proceso de implementación del Convenio.

Prosiguiendo la reunión en este punto, OMAR TORRIJOS tomó la palabra para exaltar la labor en la implementación del Convenio. Expresó su satisfacción por los logros, avances y nuevos aprendizajes observados en esta experiencia del Convenio 213 del 219. En nombre la Directora del DPS doctora SUSANA CORREA BORRERO y la Directora de la DIP doctora BRASILIA ROMERO SINISTERRA agradeció a la UT por los avances en el proceso de ejecución del citado Convenio, lo mismo que al GIT de Intervención Integral con Enfoque Diferencial. Del mismo modo, OMAR TORRIJOS mencionó la necesidad de dejar definida la fecha para los días 9, 10, y 11 de agosto de la reunión en la cual se revisará de forma presencial los soportes pendientes para la legalización del Convenio. A su vez, JAMES ARIAS, en calidad de Coordinador Zonal de la UT, manifestó su gratificación por los resultados de la intervención en los territorios y agradeció al equipo del DPSA por la oportunidad y el apoyo a la fecha.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Entrega de los insumos faltantes en las fichas de proyectos	UT	31 de julio
2	Entrega de los soportes pendientes para la legalización de los componentes administrativos, técnicos y financieros del mes de junio y julio.	UT	el 30 de julio de 2021.


3	Reunión los días 9, 10 y 11 de agosto de 2021 para revisar los ítems de los refrigerios en las actas de entrega, la firma de algunos titulares de los beneficiarios y los otros aspectos para el cierre, de manera presencial.	UT y Equipo de Supervisión	9,10,11 de agosto





PAOLA PINZON
Representante legal UT IRACA Zona I

WALDEN ALBERTO BORJA
Supervisor convenio 213 Zona I



OMAR TORRIJOS CADENA

Firmado digitalmente por OMAR TORRIJOS CADENA
Fecha: 2021.09.01 09:19:34 -05'00'

JAMES ARIAS
Coordinador Zonal UT IRACA Zona I

OMAR TORRIJOS
Delegado de la Directora de Inclusión Productiva

Elaboró: Jesús Antonio García – Apoyo a la supervisión.

Anexo: Correo de delegación de la Directora de Inclusión Productiva- DPS y presentación del Comité Nacional.

Giancarlo Paulina Geri

De: Walden Albert Borja Guerrero
Enviado el: viernes, 23 de julio de 2021 8:33 a. m.
Para: Paola Andrea Pinzón; coordinadorzonal
CC: Luis Enrique Alvarez Ruiz; Brasilia Romero Sinisterra; Omar Torrijos Cadena; Jorge Andres Ardila Melgarejo; Catalina Cuadros Vallejo; Diana Carolina Chica Lopez; Susan Milena Buitrago Mondragon
Asunto: Delegación participación Comité Técnico Nacional No. 22 Convenio 213/19 de la Dirección de Inclusión Productiva

Apreciados miembros del Comité Técnico Nacional Convenio 213 de 2019, Iraca zona 1. Buenos días

De manera atenta, se informa que la Doctora Brasilia Romero Sinisterra, Directora de Inclusión Productiva, delega su participación en el Comité Técnico Nacional del Convenio 213 de 2019, por ser realizado el día de hoy 23 de julio de 2021, en el Dr. Omar Torrijos Cadena, Asesor Financiero de la Dirección de Inclusión productiva, para que la represente en el desarrollo del orden del día en el marco de las funciones establecidas en la guía operativa del Programa IRACA.

Agradezco su atención y se solicita incluir este correo en el acta como soporte de la delegación.

Cordial saludo.

Walden Alberto Borja Guerrero
Coordinador
Dirección de Inclusión Productiva – GIT Atención Integral con Enfoque Diferencial
T. (0057 1) 5142060 Ext 8551
D. Carrera 7 #27-18 Piso 15. Edificio Itaú, Bogotá, Colombia
www.prosperidadsocial.gov.co



COMITÉ TÉCNICO NACIONAL

IRACA®

U.T Prosperidad Iraca Z1

Corte junio 30 de 2021

24-07-2021



ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quorum
2. Seguimiento Compromisos
3. Avance financiero.
4. Avance técnico y seguimiento del POA.
5. Varios
6. Compromisos

.



COMPROMISOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	FECHA
1	Cronograma actas de entrega	UT	SI	21 de junio
2	Entrega de observaciones financieras	UT	SI	23 de junio
3	Realizar mesa de trabajo financiera	UT Y PS	SI	25 de junio
4	5 casos pendientes de definición de la titularidad en KOKAN	UT	SI	21 de mayo
5	Confirmar si la directora de la DIP va a participar en la entrega de Guapi para preparar su visita.	PS	SI	21 de junio
6	Enviar informe de visita de supervisión a Nariño por parte de Jorge Ardila	PS	SI	25 de junio
7	Requerimientos de prioritaria respuesta	UT	SI	21 de junio
8	Asegurar que todo el expediente del convenio este bien construido	UT	EN CONSTRUCCION	31 de junio


2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

❑ APORTES DE RECURSOS


Aporte Prosperidad Social	: $	32.165.067.502,00
Adiciones	: $	0,00
Aporte Total Prosperidad Social	**: $**	**32.165.067.502,00**
Aporte Contrapartida UT	: $	14.116.275.329,00
Valor Total del Convenio	**: $**	**46.281.342.831,00**



2. AVANCE FINANCIERO – DESEMBOLSOS

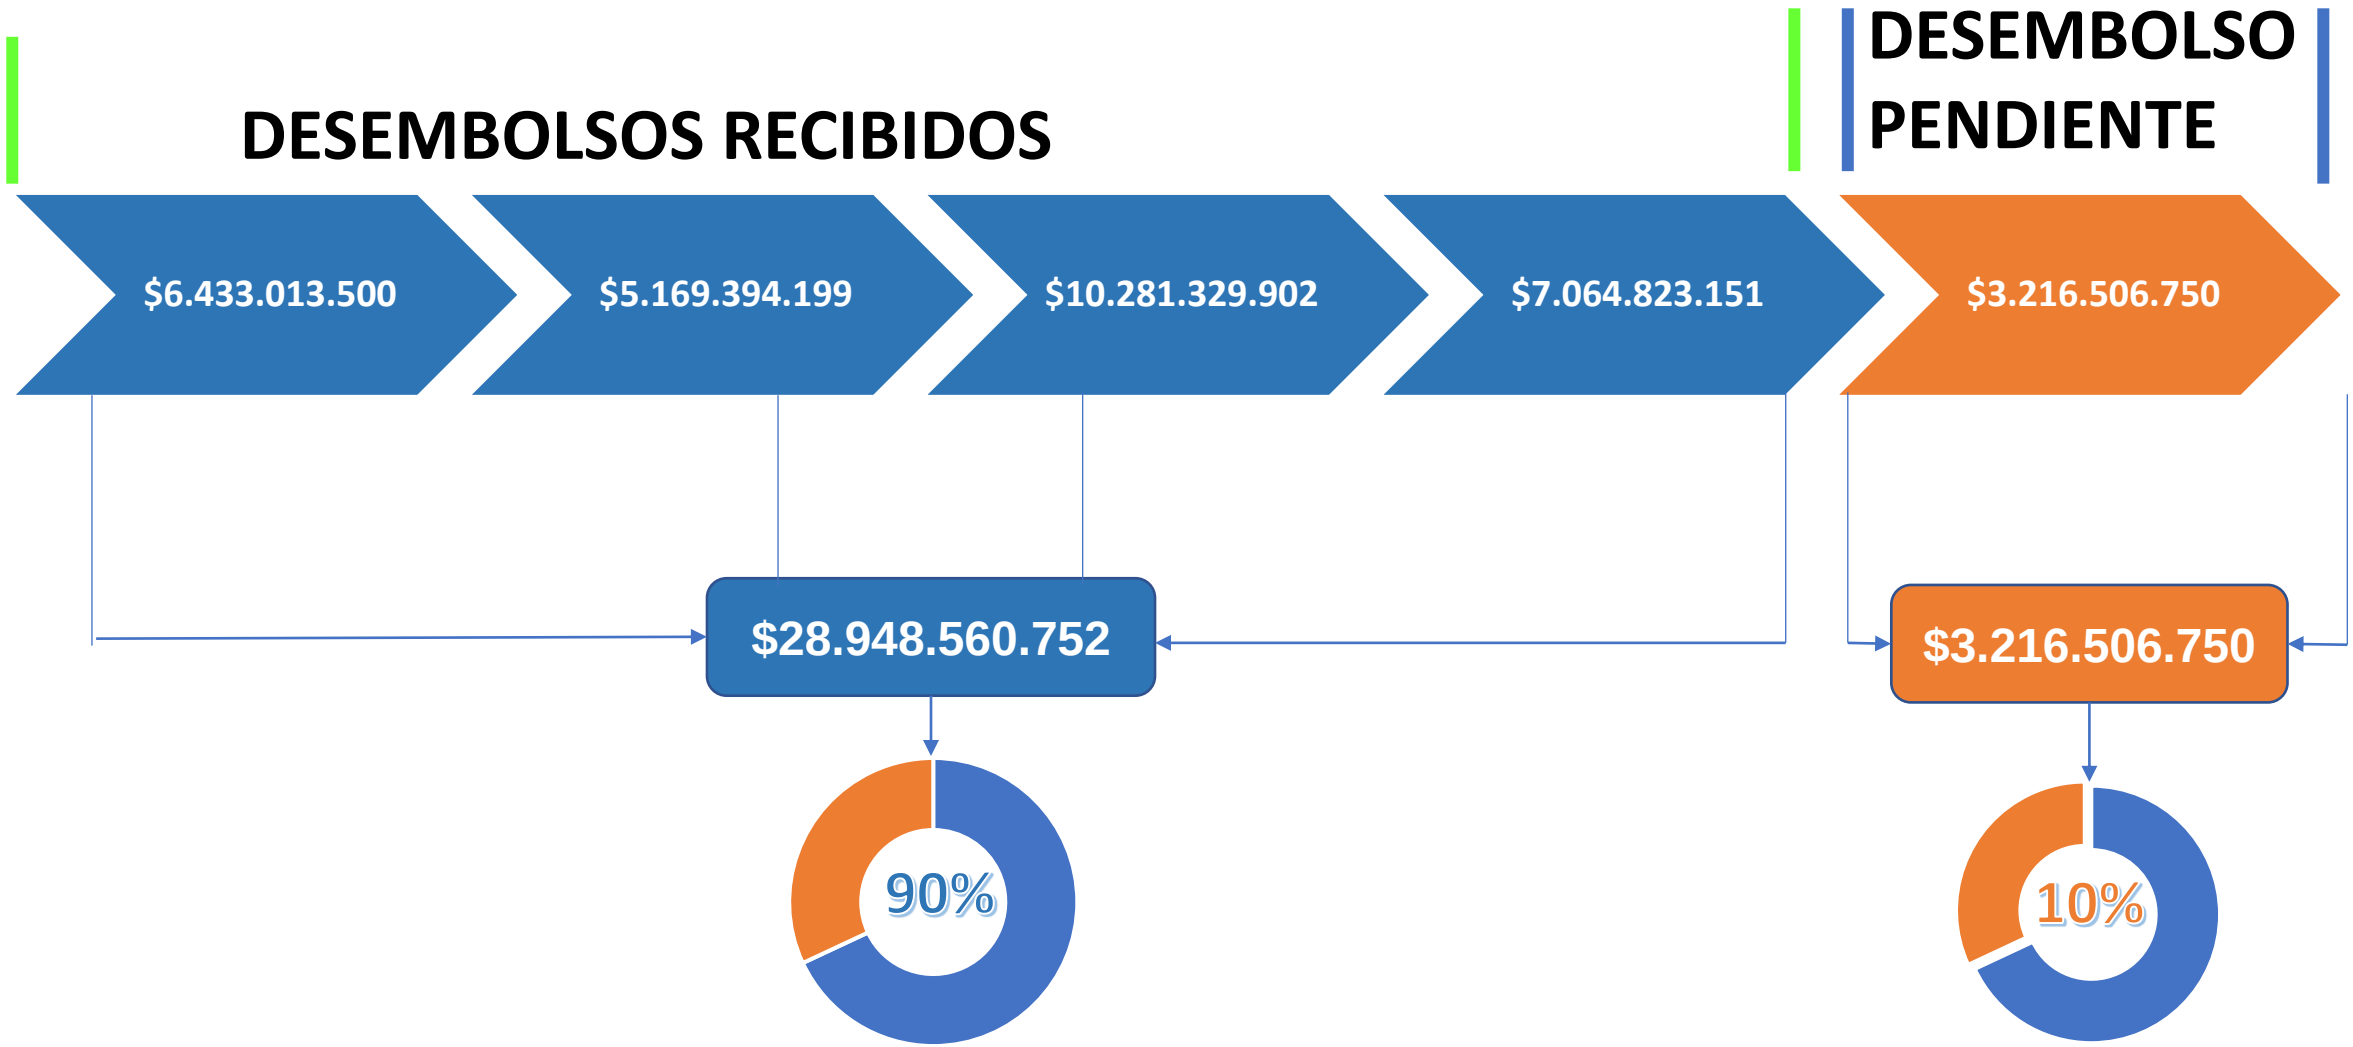

2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

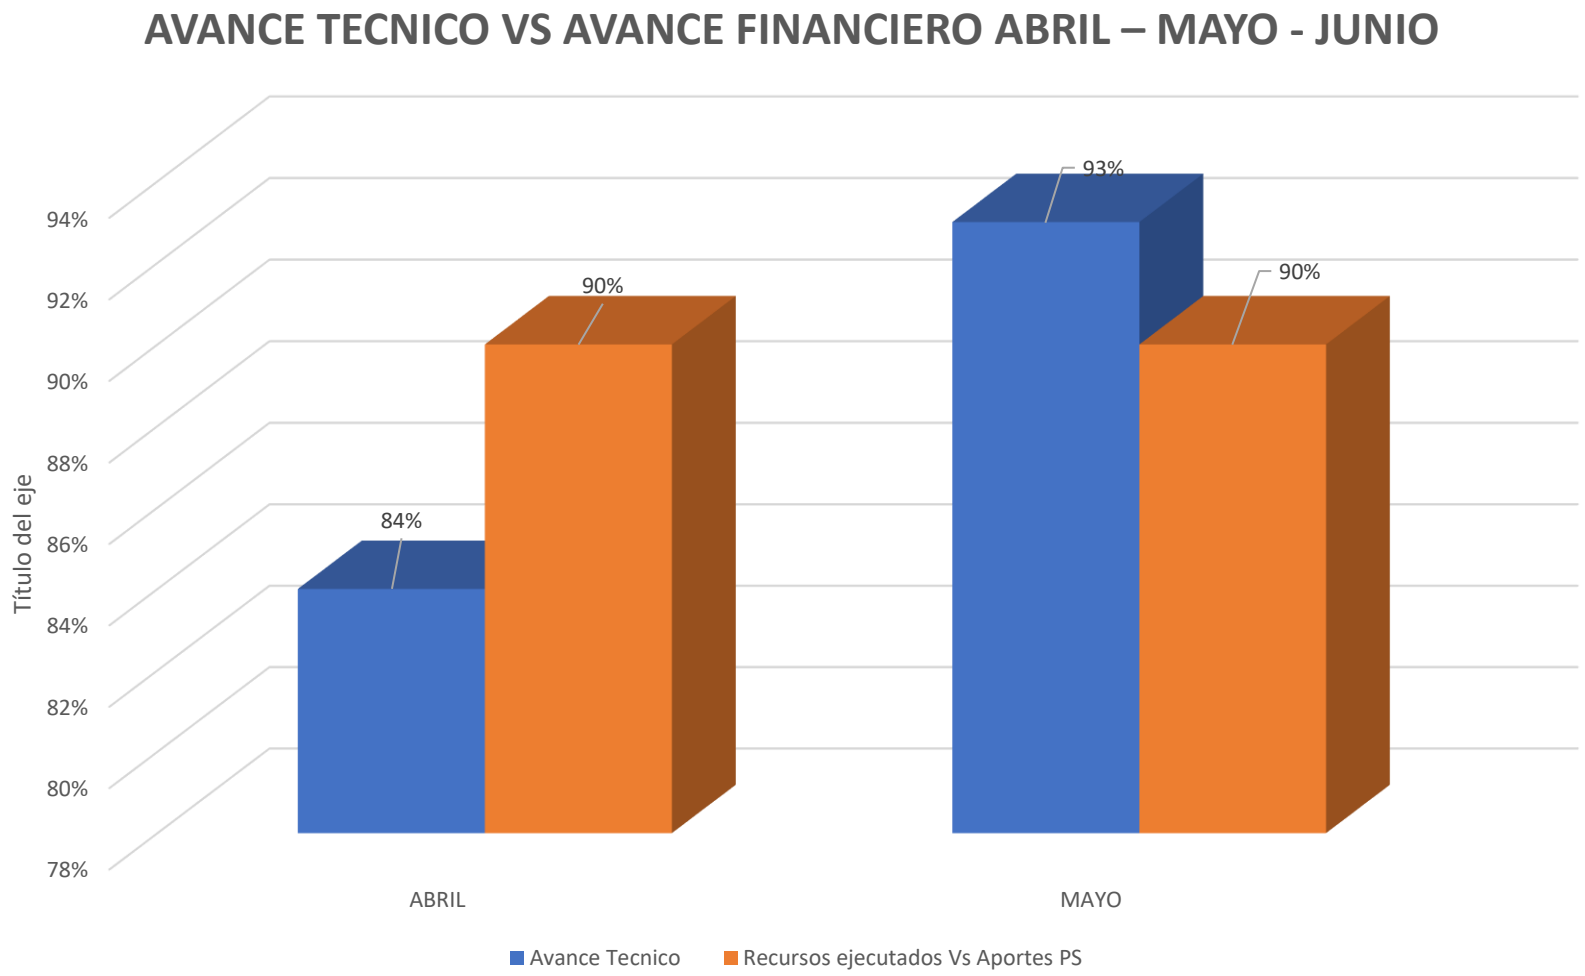



La equidad es de todos | Prosperidad Social

2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL CORTE 30 JUNIO								
Línea Presupuestal	**Vr. Programado**	**Vr. Acumulado Legalizado Corte Marzo 2021**	**Vr Presentado a legalizar abril y en subsanacion 2021**	**Vr presentado a legalizar mayo 2021**	**Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar**	**Vr en subsanacion y/o por presentar JUNIO 2021**	**Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar**	**Saldo por ejecutar**
1. TALENTO HUMANO	$ 9.482.702.047,46	$ 8.067.016.619,67	$ 1.375.553.332,00	$ 0,00	$ 9.442.569.951,67	$ 40.132.095,79	$ 9.482.702.047,46	$ 0,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 4.855.714.826,00	$ 3.215.994.866,33	$ 135.124.040,49	$ 8.763.000,00	$ 3.359.881.906,82	$ 1.495.832.919,18	$ 4.855.714.826,00	$ 0,00
3. INVERSIÓN	$ 15.989.600.000,00	$ 1.086.819.856,44	$ 441.244.834,00	$ 1.566.221.106,35	$ 3.094.285.796,79	$ 12.895.314.203,21	$ 15.989.600.000,00	$ 0,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 38.596.140,00	$ 5.604.420,00	$ 0,00	$ 44.200.560,00	$ 18.199.440,00	$ 62.400.000,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.629,00	$ 427.065.099,00	$ 5.500.000,00	$ 0,00	$ 432.565.099,00	$ 1.342.085.530,00	$ 1.774.650.629,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 32.165.067.502,46**	**$ 12.835.492.581,44**	**$ 1.963.026.626,49**	**$ 1.574.984.106,35**	**$ 16.373.503.314,28**	**$ 15.791.564.188,18**	**$ 32.165.067.502,46**	**$ 0,00**
Porcentaje de legalización Vs Total aportes DPS	**$ 32.165.067.502,46**	39,91%	6,10%	4,90%	50,90%	49,10%	100,00%	
Porcentaje de legalizacion Vs Desembolso DPS	**$ 28.948.560.752,00**	44,34%	6,78%	5,44%	56,56%	54,55%		

2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

RECURSOS CONTRAPARTIDA CORTE 30 JUNIO								
Línea Presupuestal	**Vr. Programado**	**Vr. Acumulado Legalizado Corte Marzo 2021**	**Vr Presentado a legalizar abril y en subsanacion 2021**	**Vr presentado a legalizar mayo 2021**	**Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar**	**Vr en subsanacion y/o por presentar JUNIO 2021**	**Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar**	**Saldo por ejecutar**
1. TALENTO HUMANO	$ 751.680.000,00	$ 703.299.159,00	$ 15.200.000,00		$ 718.499.159,00	$ 33.180.841,00	$ 751.680.000,00	$ 0,00
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 776.466.677,05	$ 111.394.101,83	$ 0,00	$ 57.926.000,00	$ 169.320.101,83	$ 607.146.575,22	$ 776.466.677,05	$ 0,00
3. INVERSIÓN	$ 12.588.128.652,00	$ 96.999.999,00	$ 0,00	$ 2.389.608.801,00	$ 2.486.608.800,00	$ 10.101.519.852,00	$ 12.588.128.652,00	$ 0,00
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 14.116.275.329,05**	**$ 911.693.259,83**	**$ 15.200.000,00**	**$ 2.447.534.801,00**	**$ 3.374.428.060,83**	**$ 10.741.847.268,22**	**$ 14.116.275.329,05**	**$ 0,00**
Porcentaje de legalizacion Vs Aportes Union temporal	**$ 14.116.275.329,05**	6,46%	0,11%	17,34%	23,90%	76,10%	100,00%	

3. AVANCE TÉCNICO

❑ PRESENTACIÓN DEL POA

- Contratación Equipo Local
- Alistamiento - transferencia
- Socialización y Concertación con Autoridades
- Socialización y Concertación con Comunidades
- Vinculación de Hogares
- Caracterización de Entrada
- ICOE de Entrada y Visión de Desarrollo
- Diagnóstico Comunitario
- Implementación de proyectos
- Otros y Varios




Etapa – Alistamiento

Contratación equipo local

Meta Total: 4 contratos

Programado:	4	**100%**
Ejecutado:	4	

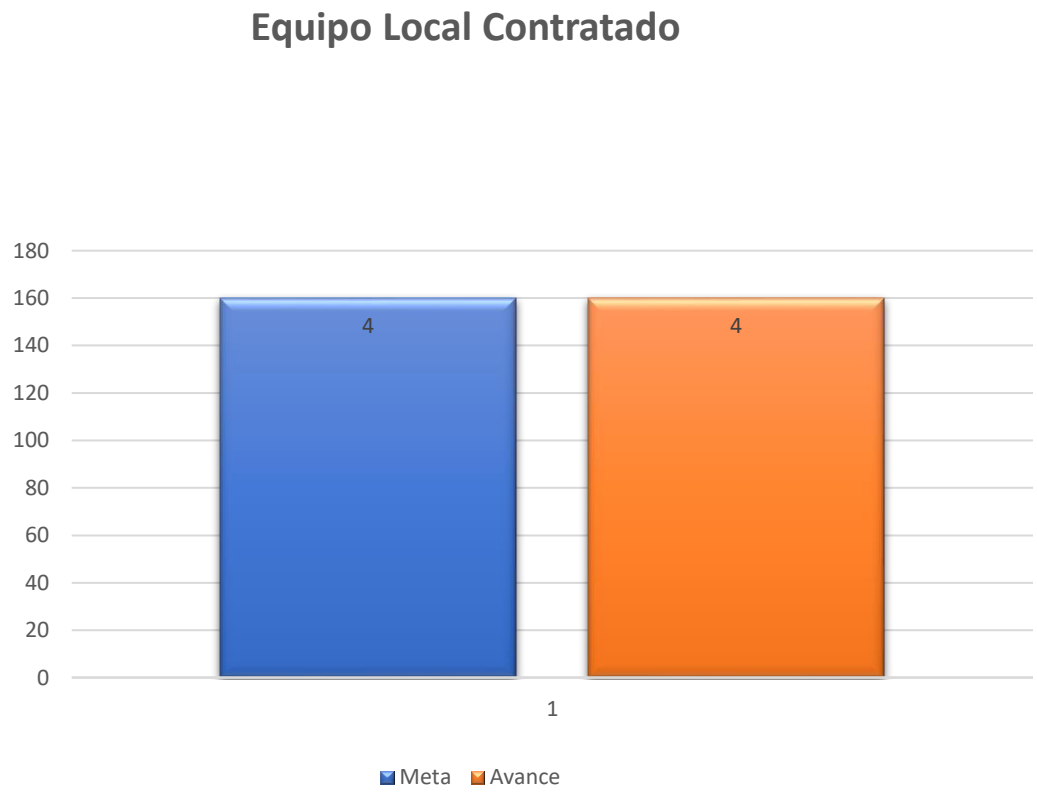

De acuerdo a los compromiso establecidos, fue contratado la totalidad del equipo local.




Etapa – Alistamiento

Contratación equipo zonal

Meta Total: 8 contratos


Programado:	8	**100%**
Ejecutado:	8	

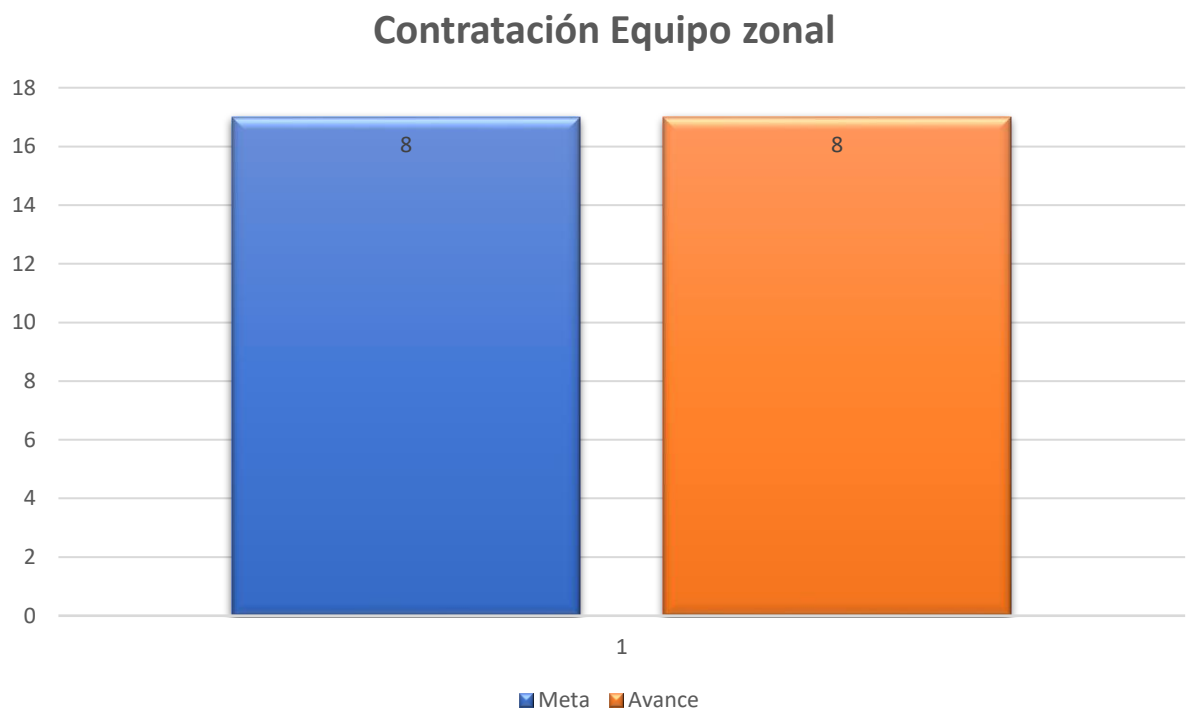



Etapa – Alistamiento

Rotación equipo acumulado

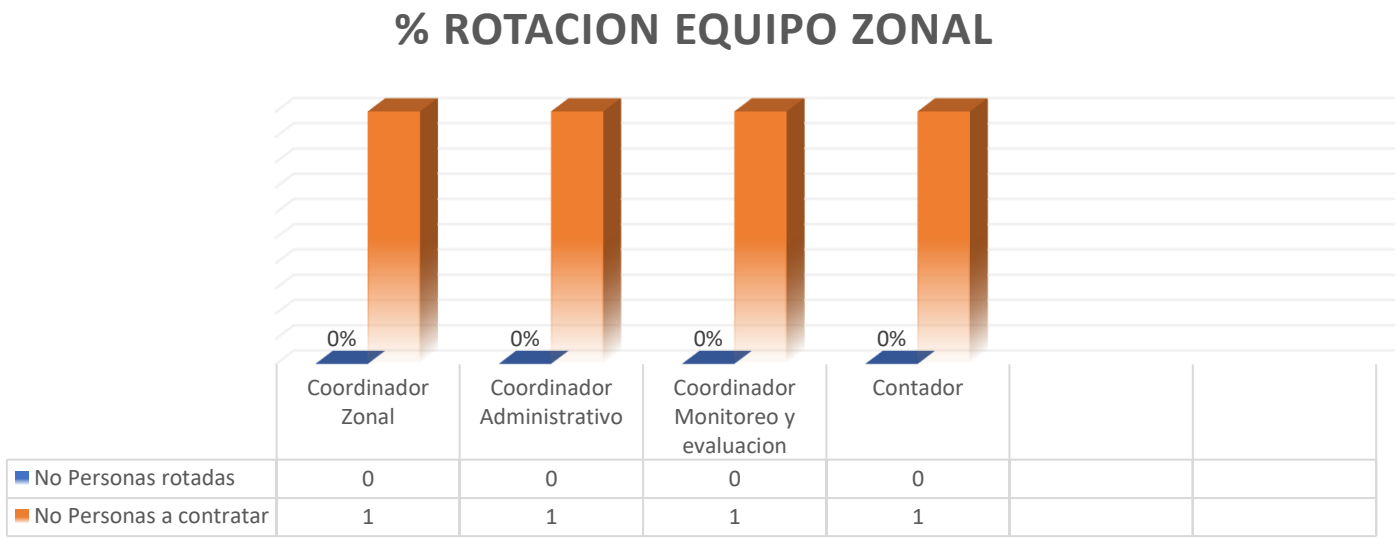


ROTACIÓN EQUIPO LOCAL MES DE JUNIO:

- Se ajusta el personal al requerido para cerrar el convenio 213.

JUNIO

- No se presenta variación

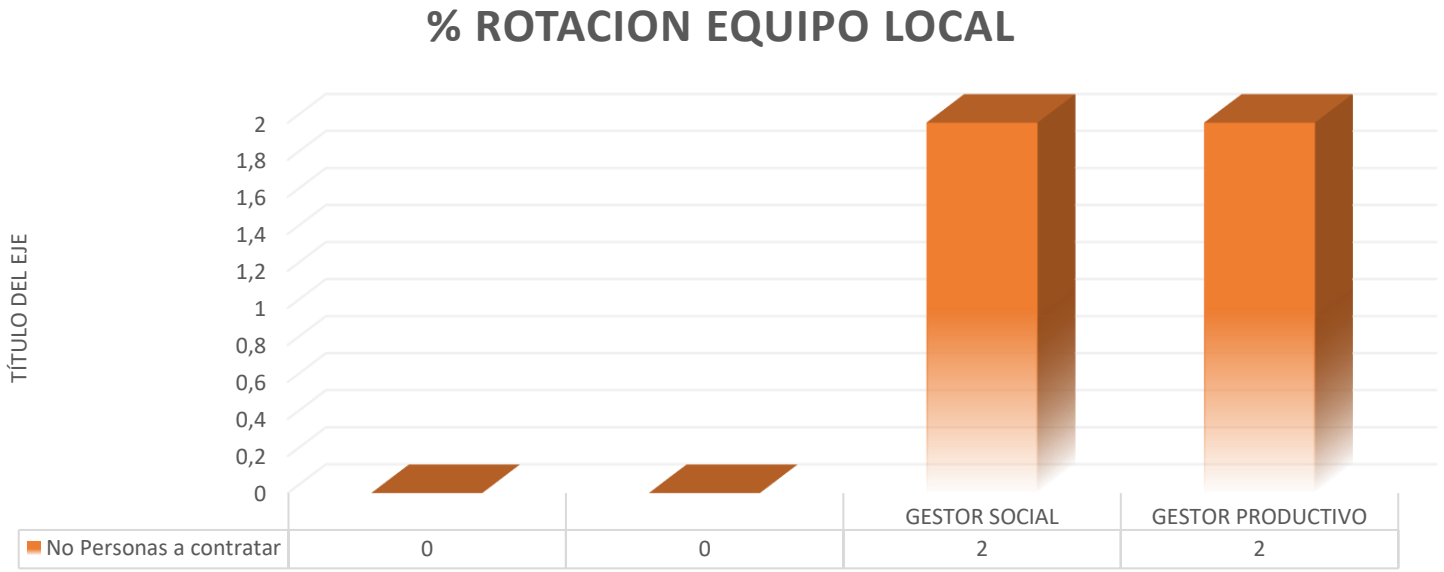

La equidad es de todos | Prosperidad Social

Etapas superadas en mes anteriores

Programado:	40	100%
Ejecutado:	40	

ACTIVIDAD POA	EJECUCION
CONTRATACION DE EQUIPO LOCAL	100%
ALISTAMIENTO-TRANSFERENCIA	100%
SOCIALIZACION CON AUTORIDADES	100%
SOCIALIZACION Y CONCERTACION CON COMUNIDADES	100%
VINCULACION DE HOGARES	100%
CARACTERIZACION DE ENTRADA	100%
ICOE DE ENTRADA	100%
VISION DE DESARROLLO	100%
DIAGNOSTICO COMUNITARIO	100%
FICHAS DE PROYECTO	100%
SOCIALIZACION DE FICHAS	100%
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	98%

Las evidencias de la presentes actividades ya fue validada por Prosperidad Social en un 100%



4. FICHAS DE PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	N° HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	GUAPI	C.C. ALTO GUAPI	160	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	19/10/2020	IMPLEMENTACION	16/09/2020	IMPLEMENTACION	26/01/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. GUAPI ABAJO	160	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	16/09/2020	IMPLEMENTACION	15/04/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO GUAJÚI	260	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	19/10/2020	IMPLEMENTACION	11/09/2020	IMPLEMENTACION	14/04/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO NAPI	160	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	26/02/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	9/03/2021
CAUCA	GUAPI	C.C. RÍO SAN FRANCISCO	60	IMPLEMENTACION	14/11/2020	IMPLEMENTACION	15/02/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO ENTREGA
CAUCA	TIMBIQUÍ	C.C. RENACER NEGRO	600	IMPLEMENTACION	24/09/2020	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	9/06/2021	IMPLEMENTACION	25/02/2021
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. ATABAPO	20	IMPLEMENTACION	24/10/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020	IMPLEMENTACION	24/02/2021	IMPLEMENTACION	23/02/2021
GUAINIA	INÍRIDA	R.I. PAUJIL	280	IMPLEMENTACION	27/10/2020	IMPLEMENTACION	24/11/2020	IMPLEMENTACION	24/02/2021	IMPLEMENTACION	24/11/2020

4. FICHAS DE PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	N° HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
NARIÑO	BARBACOAS	R.I. HOJAL LA TURBIA	500	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR EL PORVENIR	80	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR PROMINGA TAPAJEÑA	80	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	05/02/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR SOCIO TAPAJÉ	80	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR TRIBUNA DEL PUEBLO	100	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	06/10/2020	IMPLEMENTACION	EN PROCESO
NARIÑO	EL CHARCO	C.C. MENOR UNIÓN TAIJEÑA	100	IMPLEMENTACION	21/04/2021	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO	IMPLEMENTACION	EN PROCESO
NARIÑO	RICAURTE	R.I. ALTO CARTAGENA	17	IMPLEMENTACION	07052021	IMPLEMENTACION	23/04/2021	IMPLEMENTACION	23/04/2021	IMPLEMENTACION	23/04/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. CHAQUÍ-CHIMBUZA-VEGAS-SAN ANTONIO	90	IMPLEMENTACION	28/04/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. EDEN CARTAGENA	14	IMPLEMENTACION	12/05/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. GUALCALÁ	15	IMPLEMENTACION	27/04/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	26/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. INTEGRADO LA MILAGROSA	140	IMPLEMENTACION	29/04/2021	IMPLEMENTACION	24/03/2021	IMPLEMENTACION	24/03/2021	IMPLEMENTACION	24/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. LIBERTAD TELEMBÍ	37	IMPLEMENTACION	25/04/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021	IMPLEMENTACION	29/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. MAGÜI	70	IMPLEMENTACION	24/04/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. NULPE MEDIO - ALTO RÍO SAN JUAN-PUEBLO AWA	142	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021	IMPLEMENTACION	16/02/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PALMAR	35	IMPLEMENTACION	26/04/2021	IMPLEMENTACION	30/03/2021	IMPLEMENTACION	30/03/2021	IMPLEMENTACION	30/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. PIALAPÍ-PUEBLO VIEJO-SAN MIGUEL YARÉ	39	IMPLEMENTACION	23/04/2021	IMPLEMENTACION	31/03/2021	IMPLEMENTACION	31/03/2021	IMPLEMENTACION	31/03/2021
NARIÑO	RICAURTE	R.I. RAMOS MONGÓN	20	IMPLEMENTACION	22/04/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021	IMPLEMENTACION	25/03/2021

4. FICHAS DE PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO COMUNIDAD	N° HOGARES	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	FECHA DE ENTREGA	PROYECTO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA	FORTALECIMIENTO SOCIAL	FECHA DE ENTREGA	FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO	FECHA DE ENTREGA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	C.C. BAJO MIRA Y FRONTERA	450	IMPLEMENTACION	19/05/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA	IMPLEMENTACION	19/05/2021	IMPLEMENTACION	COMPRADA PROCESO ENTREGA
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ GUACARAY	200	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020	IMPLEMENTACION	25/10/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. INDÁ ZABALETA	418	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021	IMPLEMENTACION	18/02/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. LA BRAVA	200	IMPLEMENTACION	18//03/2021	IMPLEMENTACION	18//03/2021	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	18//03/2021
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PEÑA ALEGRIA	66	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020	IMPLEMENTACION	17/09/2020
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	R.I. PULGANDE CAMPOALEGRE	66	IMPLEMENTACION	4/11/2020	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	20/04/2021	IMPLEMENTACION	20/04/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. AIWA KUNA TSEPAJIBO	92	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	23/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. CHOLOLOBO MATATU	16	IMPLEMENTACION	15/03/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	08/12/2020	IMPLEMENTACION	21/01/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. RÍO TOMO Y BEWERI	62	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	26/02/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	26/02/2021
VICHADA	CUMARIBO	R.I. SANTA TERESITA DEL TUPARRO	70	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	07/04/2021	IMPLEMENTACION	21/01/2021	IMPLEMENTACION	14/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. CAMPOALEGRE Y RIPIALITO	48	IMPLEMENTACION	26/03/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021	IMPLEMENTACION	29/01/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. EL TROMPILLO	113	IMPLEMENTACION	1/02/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021	IMPLEMENTACION	16/03/2021
VICHADA	LA PRIMAVERA	R.I. YAJOTA WAIPIJIWI	17	IMPLEMENTACION	20/10/2020	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021	IMPLEMENTACION	30/01/2021
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO GUARIPA	103	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021	IMPLEMENTACION	14/12/2020	IMPLEMENTACION	17/03/2021
VICHADA	PUERTO CARREÑO	R.I. CAÑO MESETAS DAGUA	100	IMPLEMENTACION	15/04/2021	IMPLEMENTACION	17/03/2021	IMPLEMENTACION	30/10/2020	IMPLEMENTACION	11/05/2021

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA EJECUTADO MAYO-JUNIO 2021

MUNICIPIO		TERRITORIO COLECTIVO-COMPONENTE	OBRA FISICA A CONSTRUIR		CANTIDAD	VALOR/ UNIDAD	VALOR/ TOTAL	% AVANCE	
EL CHARCO		SOCIO TAPAJE-PPC-01	PIARA 63 M2	DINAMIZACION DE LA ECONOMIA A TRAVES DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE, EN EL CONSEJO COMUNITARIO SOCIO TAPAJE DEL MUNICIPIO DEL CHARCO-NARIÑO. 63M2	1	$ 18.800.000	$ 18.800.000	91,00%	$ 17.108.000,00
			PIARA 84 M2	DINAMIZACION DE LA ECONOMIA A TRAVES DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE, EN EL CONSEJO COMUNITARIO SOCIO TAPAJE DEL MUNICIPIO DEL CHARCO-NARIÑO. 84M2	1	$ 26.000.000	$ 26.000.000	90,00%	$ 23.400.000,00
		FS- UNION TAIJEÑA	CAMINO A CEMENTERIO	ADECUACIÓN DE UN CAMINO PEATONAL DE ACCESO AL CAMPO SANTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS ANCESTRALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO MENOR DE UNIÓN TAIJEÑA	1	$ 18.000.000	$ 18.000.000	87,00%	$ 15.660.000,00
		PPC-UNION TAIJEÑA	PIARA 63M2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS AGROPECUARIOS DEL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN TAIJEÑA DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE. 63M2	1	$ 18.800.000	$ 18.800.000	87,41%	$ 16.433.080,00
		FC-TRIBUNA DE PUEBLO	ADECUACION TIENDA	SE INCLUYE COMO SUMINISTRO	1	$ 2.500.000			$ -
		PPC-TRIBUNA DEL PUEBLO	PIARA DE 84 M2	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA COMUNITARIA EN EL CONSEJO COMUNITARIO MENOR DEL PUEBLO. 84M2	2	$ 25.027.782	$ 50.055.564	88,00%	$ 44.048.896,32
		PPC- EL PORVENIR	PIARA 63 M2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS DEL CONSEJO COMUNITARIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE.. 63 M2	2	$ 18.784.088	$ 37.568.176	86,00%	$ 32.308.631,36
		FS-PROMINGA TAPAJEÑA	CUBIERTA PUESTO SALUD	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	1	$ 14.000.000	$ 14.000.000	0,00%	$ -
		FC-PROMINGA TAPAJEÑA	ADECUACION TRAPICHE	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAL DEL TRAPICHE DE CAÑA DEL CONSEJO COMUNITARIO PROMINGAS TAPAJEÑA	1	$ 14.100.000	$ 14.100.000	0,00%	$ -
		PPC-PROMINGA TAPAJEÑA	PIARA 63 M2	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS AGROPECUARIOS DEL CONSEJO COMUNITARIO PROMINGA TAPAJEÑA DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO A TRAVÉS DE LA PRODUCCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE	2	$ 18.784.088	$ 37.568.176	85,00%	$ 31.932.949,60

La equic es de to peridad l

AVANCE DE OBRA

TUMACO		PULGANDE-PPC-01	PIARA 84 M2	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA PARA CEBA EN EL RESGUARDO PULGANDE CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE TUMACO. 84M2	1	$ 26.000.000	$ 26.000.000	53,65%	$ 13.949.000,00
			PIARA 63 M2	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA PARA CEBA EN EL RESGUARDO PULGANDE CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE TUMACO. PIARA 63M2	1	$ 18.800.000	$ 18.800.000	56,05%	$ 10.537.400,00
		PEÑA ALEGRIA FSC-001	ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CULTURA DEL RESGUARDO PEÑA ALEGRÍA, MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL	1	$ 11.502.500	$ 11.502.500	100,00%	$ 11.502.500,00
		LA BRAVA-FSC-001	ADECUACION 3 RESTAURANTES ESCOLARES	ADECUACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES Y DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE LAS COMUNIDADES: LA BRAVA, PILVÍ Y LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	3	$ 28.651.754	$ 85.955.262	0,00%	$ -
		LA BRAVA-PPC-001	PIARAS 84 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA	4	$ 25.027.782	$ 100.111.128	62,35%	$ 62.419.288,31
		LA BRAVA-PPC-001	CENTRO DE ACOPIO 84 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA	1	$ 40.708.359	$ 40.708.359	62,00%	$ 25.239.182,58
		LA BRAVA-PPC-001	SECADEROS - MADERA MARQUESINA 36 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA	8	$ 6.733.725	$ 53.869.800	68,00%	$ 36.631.464,00
		LA BRAVA-FC-001	ADECUACION CENTRO DE ARTESANIAS - VENTANAS, PUERTAS Y DINTELES	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL COMO ALTERNATIVA PARA RESCATAR PRÁCTICAS ANCESTRALES ECONÓMICAS LA SIMBOLOGIA PROPIA EN LA GUARDIA INDIGENA DEL RESGUARDO LA BRAVA	1	$ 16.086.595	$ 16.086.595	65,00%	$ 10.456.286,75

La equidad es de todos

AVANCE DE OBRA

		FS-INDA SABALETA	ADECUACION CENTRO DE SALUD	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE	1	$ 30.279.420	$ 30.279.420	54,63%	$ 16.541.647,15
TUMACO		FC-INDA SABALETA	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE MAIZ, COCO Y BOROJÓ EN EL RESGUARDO INDIGENA INDA SABALETA DEL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO	1	$ 40.708.400	$ 40.708.400	45,00%	$ 18.318.780,00
		FS-INDA GUACARAY	ADECUACION CUBIERTA ESCUELA	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO DE LOS HABITANTES DEL RESGUARDO INDA GUACARAY A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INDA GUACARAY Y LA VISIBILIDAD DE LA GUARDIA INDÍGENA.	1	$ 17.791.307	$ 17.791.307	75,00%	$ 13.343.480,25
		HOJAL LA TURBIA-FSC-001	CASA DE PASO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL RESGUARDO HOJAL LA TURBIA, CON LA REPARACIÓN DE SUS INSTALACIONES Y EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN.	1	$ 42.135.000	$ 42.135.000	0,00%	$ -
		PPC- HOJAL LA TURBIA	PIARAS 112 M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLA COMO ALTERNATIVA RENTABLE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA HOJAL LA TURBIA - 6 PIARA 112M2	6	$ 33.893.135	$ 203.358.810	46,68%	$ 94.927.892,51
			CENTRO DE ACOPIO 84M2	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLA COMO ALTERNATIVA RENTABLE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA HOJAL LA TURBIA -CENTRO DE ACOPIO	1	$ 40.708.359	$ 40.708.359	46,68%	$ 19.002.661,98
		FS-BAJO MIRA	MEJORAMIENTO CASA DE GOBIERNO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CASA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1	$ 35.604.703	$ 35.604.703	75,00%	$ 26.703.527,25

AVANCES DE OBRA

PUERTO CARREÑO		PPC-CAÑO MESETAS	PIARA 84 M2	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA FUENTE DE INGRESOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MESETAS DAGUA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 84M2	1	$ 25.027.782	$ 25.027.782	80,24%	$ 20.082.292,28
			PIARA 63 M2	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA FUENTE DE INGRESOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MESETAS DAGUA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA. 63 M2	2	$ 18.784.088	$ 37.568.176	86,00%	$ 32.308.631,36
		PPC- CAÑO GUARIPA	PIARA 84 M2	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE CERDOS EN LA LÍNEA DE CEBA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO GUARIPA 84M2	1	$ 25.027.782	$ 25.027.782	85,00%	$ 21.273.614,70
			PIARA 63 M2	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE CERDOS EN LA LÍNEA DE CEBA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO GUARIPA 63 M2	2	$ 18.784.088	$ 37.568.176	88,00%	$ 33.059.994,88

AVANCE DE OBRA

GUAPI		PPC-RIO GUAJUI	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO DE LAS LINEAS AGROPECUARIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO RIO GUAJUI.	1	$ 40.708.359	$ 40.708.359	25,00%	$ 10.177.089,75
		PPC-ALTO GUAPI	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS FAMILIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO ALTO GUAPI	1	$ 40.708.359	$ 40.708.359	100,00%	$ 40.708.359,00
		PPC-SAN FRANCISCO	CENTRO DE ACOPIO	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE LIMÓN, CAÑA Y PLÁTANO Y LA ADECUACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN EL CONSEJO COMUNITARIO RIO SAN FRANCISCO	1	$ 40.708.359	$ 40.708.359	0,00%	$ -
							$ 54.461.609,00		**$ 24.848.524,20**
LA PRIMAVERA		PPC-TROMPILLO	CENTRO DE ACOPIO	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE YUCA AMARGA COMPLEMENTADO CON UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL ASENTAMIENTO DEL TROMPILLO-KUWAY	1	$ 40.708.359	$ 40.708.359	49,79%	$ 20.268.691,95
		FS- TROMPILLO	CASA CULTURAL	ADECUACIÓN CASETA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL TROMPILLO - KUWAY - MUNICIPIO LA PRIMAVERA.	1	$ 13.753.250	$ 13.753.250	33,30%	$ 4.579.832,25
					56	**TOTAL**	**$ 1.300.290.161**		$ 722.923.174,22
								VALOR	$ 722.923.174,22
								% DE AVANCE	76,07%

La equidad es de todos | Prosperidad Social

AVANCE DE OBRAS

- MUNICIPIO DEL CHARCO





Resguardo Tribuna del Pueblo





Resguardo Socio Tapaje






Resguardo Unión Taijeña

AVANCE DE OBRAS

- MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO





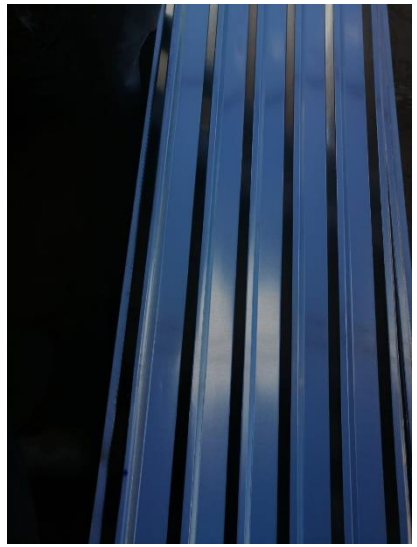

Rresguardo Caño Guaripa





Construcción de Piaras Caño Guaripa

AVANCE DE OBRAS

- MUNICIPIO DE TUMACO








Entrega de materiales Resguardos La Brava y Pulgande



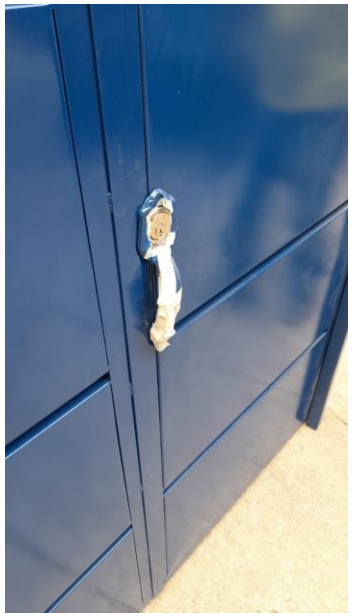






AVANCE DE OBRAS

- MUNICIPIO DE TUMACO



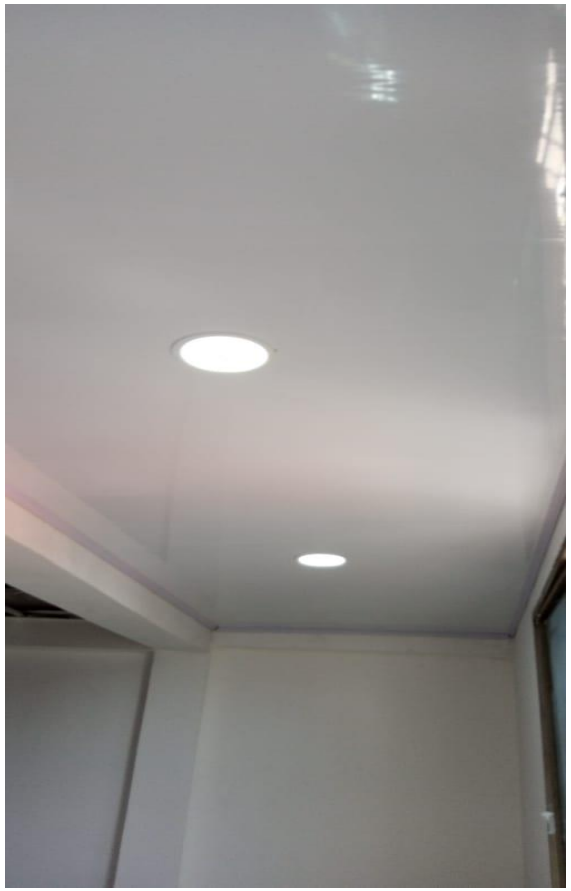





Adecuacion Casa de
Gobierno Bajo Mira

RESUMEN DE COMPONENTES

IRACA® - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS - ZONA I		
SEGURIDAD ALIMENTARIA - SA		
Fecha de Corte: mayo 2021		
Cumplimiento Promedio / Meta Total por Actividad:	96,7%	99%

IRACA® - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS - ZONA I		
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS		
Fecha de Corte: mayo 2021		
Cumplimiento Promedio / Meta Total por Actividad:	97,4%	98,4%

IRACA® - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS - ZONA I		
FORTALECIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO		
Fecha de Corte: mayo 2021		
Cumplimiento Promedio / Meta Total por Actividad:	98%	99,%

IRACA® - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS - ZONA I		
FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO		
Fecha de Corte: mayo 2021		
Cumplimiento Promedio / Meta Total por Actividad:	96%	98%

ENTREGAS

AVANCES DE OBRA SOCIO TAPAJE



AVANCES DE OBRA UNION TAIGEÑA





ENTREGA EN R.I. RAMOS MONGON





ENTREGA DEL COMPLEMENTARIO RIO GUAJUI C. QUIROGA





ENTREGA EN GUAPI





ENTREGA EN GUAPI





PANORAMA REGIONAL

PANORAMA REGIONAL

SWI swissinfo.ch

Desplazamiento forzado se duplicó en Colombia en el primer semestre de 2021

13 julio 2021 - 16:22

Bogotá, 13 jul (EFE).- El desplazamiento masivo y forzado en Colombia se duplicó en el primer semestre de 2021, respecto al año anterior, y se produjeron 102 eventos que afectaron a 44.290 personas de 15.340 familias, según el último informe publicado este martes por la Defensoría del Pueblo.

EL PACÍFICO, EL MÁS AFECTADO

La zona más afectada por ambos fenómenos es la costa pacífica, donde los grupos armados se disputan los corredores del narcotráfico o explotaciones ilegales de minerales y extracciones ilícitas, y que suelen coincidir con los departamentos donde se producen más masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales.

Así, en Nariño ocurrieron más de la mitad de los episodios de desplazamiento masivo de este año, con 14.708 personas afectadas; seguido por Valle del Cauca (con 25 episodios y 9.189 personas) y Cauca (14 eventos que afectaron a 4.700 personas).

"Los más afectados por el desplazamiento forzado -dijo el defensor- son las comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes) con un equivalente al 59 % y las comunidades no étnicas (campesinos principalmente) en un 41 %".



EL TIEMPO

COLOMBIA | BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA SANTANDER BOYACÁ LLANO MÁS CIUDADES

Luto por asesinato de Danilo Torres, líder afro de la costa Pacífica

FOTO: Archivo particular

La víctima era el representante legal del Consejo Comunitario Manos Unidas en el río Patía.

RELACIONADOS: NARIÑO | OEA | PASTO | ASESINATO DE LÍDERES | LÍDER SOCIAL

SR REDACCIÓN EL TIEMPO
30 de junio 2021, 08:39 P. M.

Seguir Otras Ciudades | Comentar | Guardar | Reportar | Portada

El líder de las comunidades afrodescendientes de la **Costa Pacífica de Nariño, Danilo Torres,** fue asesinado por desconocidos en zona rural del municipio de Magüí Payán.

La Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, informó en la tarde de este martes la ocurrencia del lamentable hecho de violencia.

"La Alcaldía de Magüí Payán confirmó el asesinato del **líder afro Danilo Torres** en ese municipio", indicó esa organización.

El alcalde de esa localidad, Alejandro Juvenal Quiñonez, lamentó su muerte y extendió su voz de condolencia a sus familiares.

"Expresamos nuestro más enérgico rechazo, condena e indignación por los hechos que le costaron la vida a **nuestro líder comunitario**. A todos sus familiares, amigos y demás allegados les enviamos nuestros más sinceros sentimientos de solidaridad y fortaleza", indicó el funcionario.

(Le recomendamos: Denuncian caso de transfobia al interior de la cárcel La Vega)

La nueva víctima era el representante legal del **Consejo Comunitario Manos Unidas** en la zona del río Patía, pero su mayor liderazgo lo había ejercido en su vereda Nansalví Las Villas, donde se había ganado el reconocimiento de toda la comunidad.

PANORAMA REGIONAL

LA FM

Última actualización hace: 33 segundos

Noticias | Colombia | Bogotá | Política | Coronavirus | Deportes | Internacional | Salud

Está escuchando en vivo
LA FM CON LUIS CARLOS V...

Compartir



COLOMBIA

15 Jul 2021 - 06:23 AM

Denuncian asesinato de líder social en el municipio de Morales, Cauca

La mujer de 37 años de edad, se había destacado por liderar varios procesos en el distrito ocho de su comunidad y en el ambiente político.

POR: CARLOS QUILINDO
@CarlosQuilindo1

PANORAMA REGIONAL

EL MORICHAL
EL PERIÓDICO DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA

OPINIÓN VICHADA GUAINÍA REGIÓN POLÍTICA SALUD EDUCACIÓN DEPORTES NO



Cumaribo Periódico Vichada

Para exigir el arreglo de la carretera, transportadores bloquean la vía al Vichada

29 junio, 2021 Redacción ElMorichal 0 comentarios Transportadores Vichada

Desde la mañana del pasado lunes 28 de junio los transportadores del Vichada mantienen un bloqueo de la vía que de Puerto Gaitán (Meta) conduce hacia el municipio de Cumaribo. El paro lo realizan en el sector de Los Mangos, unos 25 kilómetros antes de llegar a la inspección de El Viento.

La decisión de los camioneros obedece al pésimo estado en que se encuentra la vía. Reclaman que se hagan inmediatamente los trabajos de mantenimiento anunciados por el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, el pasado 8 de junio, en donde esa administración departamental se comprometió a intervenir el tramo vial entre Los Mangos y El Viento.

Según los transportadores, aunque al lugar llegó maquinaria amarilla, los trabajos no han avanzado. "En conclusión, no se ha hecho nada. Así como van, se acaba el invierno y no han hecho nada", le dijo a EL MORICHAL Luis Mosquera, uno de los camioneros que se encuentra en lugar.

EL MORICHAL
EL PERIÓDICO DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA

OPINIÓN VICHADA GUAINÍA REGIÓN POLÍTICA SALUD EDUCACIÓN DEPORTES NOT



La Primavera Portada Vichada

Dos toneladas de marihuana fueron incautadas en La Primavera

3 julio, 2021 Redacción ElMorichal 0 comentarios Incautación Mariuhana Vichada

En una operación de control territorial las autoridades militares y de policía incautaron 2.268 kilos de marihuana tipo 'creepy' que eran transportados en una volqueta, en un sector conocido como Tamanaco, en zona rural del municipio de La Primavera, Vichada.

PANORAMA REGIONAL

EL MORICHAL
EL PERIÓDICO DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA

OPINIÓN · VICHADA · GUAINÍA · REGIÓN · POLÍTICA · SALUD · EDUCACIÓN · DEPORTES · NOT



Cumaribo · Portada · Salud · Vichada

Las limitaciones que enfrenta la vacunación COVID en la ruralidad vichadense

19 julio, 2021 · Redacción ElMorichal · 0 comentarios · Vacunación COVID-19 Vichada y Guainía

La vacunación contra la COVID-19 en el área rural de los municipios de Vichada aún no arranca. Han pasado más de 5 meses desde que en el país se aplicó la primera dosis del biológico, pero comunidades indígenas y campesinas siguen esperando la oportunidad de inmunizarse.

Según la Secretaría de Salud Departamental (SSD), factores geográficos y la dispersión poblacional, entre otros, han influido en el nulo avance de la vacunación rural.

"Cuando se dio inicio al Plan de Vacunación se le solicitó al Ministerio de Salud tener un trato preferencial para con el departamento del Vichada, dadas las características del territorio y que nos era imposible llegar a la ruralidad aplicando dos dosis, porque era difícil encontrar dos veces a las personas para ser vacunados", dijo Consuelo Sierra, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la SSD, a EL MORICHAL.



PROPOSICIONES Y/O VARIOS

¡Gracias!
