ACTA No. 4
COMITÉ DE SEGUIMIENTO
CONTRATO No. 20200530 (MADR)

Ciudad y Fecha: Bogotá, D C., 26 de noviembre de 2021

Asistentes:

Nombre	Cargo/Entidad
Carlos Hernando Arevalo García	Coordinador financiero Fiduagraria
Edgar Alfonso Lorduy Garay	Jefe administración de negocios Fiduagraria
Jose Heberth Rada Chilatra	Ejecutivo de negocios fiduciarios Fiduagraria
Helbert Alfonso Suarez	Abogado Senior Fiduagraria
Miriam Pantoja Otero	Coordinadora Nacional del Equipo Implementador del Proyecto EIP
Rodrigo Antonio Buelvas	Asesor de la coordinación nacional EIP
Pedro Miguel Salazar Salazar	Contador Equipo Implementador del Proyecto EIP
Angeliza Melissa Carvajal Infante	Asesora Financiera Equipo Implementador del Proyecto EIP
Maria Cristina Castillo Perez	Enlace Equipo Implementador del Proyecto EIP con fiducia
Adriana Mercedes Ibarra Oyaga	Supervisora técnica Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Gisella del Carmen Torres Arena	Supervisora financiera Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Objeto del contrato: Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto.

Objetivo del comité: El presente Comité tiene el propósito de realizar seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato con información de corte a mayo y junio 2021.

Orden del Día propuesto:

1. Presentación fiduciaria
2. Presentación EIP
3. Acordar fecha del siguiente comité
4. Proposiciones y varios

Convocatoria de la reunión:
La reunión se programó por Teams para el 26 de noviembre de 2021 de 10:00 am a 11:30 am. Se realizó grabación de la sesión realizada.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QzYTYwYTAtY2JmZi00YWVlLTk3N2UtMWJjNDUwZmQ5OTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
Anexo 1: correo convocatoria comité de seguimiento No. 4

Desarrollo de la Reunión:

1. ***Presentación Fiduciaria***

La presentación de la fiduciaria corresponde a los temas financieros del contrato 20200530 con corte octubre 2021.

A continuación, se presenta el resumen de la información presentada. El detalle se encuentra en la presentación.
Anexo 2: presentación fiduciaria PPT

- Flujo consolidado (en MM de pesos)

Saldo Flujo	6.970
Saldo balance	6.971
Diferencia	-1

- Avance recursos en MM

Total recursos a administrar	$157.691,00
Valor recursos recibidos	$55.000,00
Valor recursos ejecutados	$46.030,00
Valor pendiente de ejecutar	$6.970,00
Valor recursos por recibir	$102.691,00

- Rendimientos financieros en MM

Rendimientos	$148
Pago rendimientos DTN	$143
Rendimientos pendientes de pago a la DTN	5

Los rendimientos del mes de octubre de 2021 fueron girados el día 03 de noviembre de 2021 a la DTN.

- Saldo cuenta bancaria a 31 de octubre de 2021: $6.969.970.283,56 con una ejecución sobre los recursos transferidos a la fecha del 87,38%.
- Saldo cuenta bancaria a 25 de noviembre de 2021: $51.574.728.641,61.

- Resumen general contratación

	2020	**2021**	**Total**	**En tramite**
Contratos prestación de servicios	216	75	291	1
Órdenes de compra	2	1	3	
Mínima cuantía	1	0	1	
Convenios de cooperación				1
Total	219	76	295	2

Contratos	**2020**	**2021**
Instruidos MADR	**219**	**76**
Prestación de servicios	200	74
EIP	51	64
Operador regional	0	8
Preinversion	149	0
Liquidado anticipadamente	0	2
Órdenes de compra	2	1
Mínima cuantía	1	0
Anulados – instrucción revocada	16	1

De los contratos del 2020, actualmente solo hay uno en ejecución, correspondiente a la orden de compra de los tiquetes.

De los contratos del 2021 hay 63 en ejecución, 55 del EIP y 8 del operador regional.

- Ejecución presupuestal

Año	2020	2021
Asignación presupuestal	$ 40.000.000.000,00	$ 112.901.147.216,80
Ejecución presupuestal	$ 36.818.839.641,16	$ 20.779554147,40
Pagos efectuados	$ 36.543.198.882,16	$ 9433.267.597,00
Saldo x pagar	$ 275.640.759,00	$ 11.343.447.153,40
Devolución recursos no comprometidos	$ 3.181.160.358,68	
Disponibilidad presupuestal	$ 0,16	$ 92.121.593.069,00

En este comité se incluyó la información acerca de los patrimonios autónomos que hasta ahora se han realizado en el contrato

Los patrimonios constituidos corresponden a las alianzas cofinanciadas con recursos de la vigencia 2020.

Patrimonios constituidos a 31 de octubre de 2021	
Activos	177
En liquidación	1
Total	178

Contratación derivada		
Rubro	**Cantidad**	**Valor inicial**
Insumos	3	214
Asistencia técnica	60	1.591
Operador local	176	7.401
Plan de manejo ambiental	11	131
Plan social	58	1.381
Total general	309	10.719

Tarjetas de firmas en físico a 16 de septiembre 2021	
Patrimonios autónomos en liquidación	1
Pendientes	13
Recibidas	164
Total	178

Pagos ejecutados		
Mes	**Valor**	**cantidad**
Julio	$ 148	12
Agosto	$ 573	54
Septiembre	$ 510	60
Octubre	$ 520	94
	$ 1.752	66

La supervisión informa que la información de los patrimonios que le ha llegado contiene los POAs de meses anteriores (los POA con corte junio o julio) y no con fecha actualizada (a octubre), la fiduciaria solicita se la informe cuales son para dar la respuesta formal.

Se informa que hay diferencias entre lo reportado por la fiduciaria y el EIP respecto a la ejecución del valor del IM. Se identifica que esta diferencia corresponde a los pagos directos que se realizan desde el IM (como el gerente aprendiz) que según manual no requieren contrato. Se solicita a la fiduciaria remitir la información completa de la ejecución del IM incluyendo contratos y pagos directos.

Así mismo, se solicita presentar la información del IM y de la ejecución de otras fuentes de financiación.

Frente a esto la fiduciaria informa que están trabajando en el proceso de automatización para la presentación de esta información a través de un aplicativo que esta en fase de pruebas y esperan presentarlo muy pronto.

Para las próximas presentaciones la fiduciaria tendrá en cuenta la inclusión del porcentaje de avance con respecto al IM.

La fiduciaria finalizó su presentación con los siguientes temas varios que consideró importante exponer:

- **Gastos bancarios:** A octubre del 2021, se encuentra pendiente reintegros por valor $**775.445,08** correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre 2021.

- Liquidación patrimonio asociación Asomudepas
  Tramites cumplidos:
  - Giro de totalidad de los recursos
  - Elaboración y remisión de la rendición final de cuentas
  - EEFF se encuentran en ceros con corte a octubre 2021
  - Cuenta bancaria y fondos de inversión cancelados

- Acta de liquidación elaborada y remitida (25nov2021)

Solo se encuentra pendiente recibir el acta de liquidación suscrita por parte del fideicomitente.

2. Presentación EIP

La presentación del EIP corresponde a los temas técnicos del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas PAAP, financiado a través del contrato 20200530. EL detalle se encuentra en la presentación anexa.
Anexo 3: Presentación EIP PPT

Resultados 2020

- Inversión asignada: $41.000 mm se aclara que de estos, $40.000 mm son administrados por la fiduciaria
- Inversión ejecutada: $40.0940 mm
- Inversión IM: $32.965 mm
- 178 convenios alianza (890 contratos derivados P.A.)
- 6.682 beneficiarios (62% mujeres)

- Avance operadores locales

Se han contratado el 100% de los Operadores Locales. El operador que faltaba, de la alianza Nueva Santa Inés, fue contratado en octubre y le aprobaron la póliza el 23 de noviembre con lo cual inició ejecución.

El EIP presenta el avance de la contratación derivada con corte a 31 de octubre de 2021, haciendo una comparación entre las solicitudes enviadas y las aprobadas en fiduciaria

Contratación derivada corte octubre 2021		
Rubro	**Solicitudes**	**Aprobados**
Insumos	22	3
Asistencia técnica	134	60
Plan de manejo ambiental	22	14
Plan social	136	58
Total general	314	135
	43%	

Además, informan que durante octubre 2021 se hicieron talleres presenciales (dos talleres por regional y uno para la regional Santanderes) de fortalecimiento para el tema de contratación derivada, solo el taller de San Andres se hizo virtual.

Adicionalmente el EIP presentó el avance de la contratación derivada con corte a 25 de noviembre de 2021:

Contratación derivada corte 25 noviembre 2021		
Rubro	**Solicitudes**	**Aprobados**
Insumos	26	9
Asistencia técnica	147	98
Plan de manejo ambiental	24	14
Plan social	153	90
Total general	350	211
	60%	

Proyección 2021

- Inversión asignada: $112.901 mm
- Inversión ejecutada: $15.000 mm
- Inversión IM: $88.400 mm
- 442 convenios alianza (2.210 contratos derivados P.A.)
- 17.680 beneficiarios
- Focalizado: mujeres y jóvenes rurales

- Avances 2021

Se está realizando la legalización de 478 convenios de alianza 2021, de los cuales a 31 de octubre se han realizado 152 y se han remitido 353 procesos de vinculación.

REGIONALES	CONVENIOS LEGALIZADOS	TOTAL CONVENIOS	AVANCE
AMAZONIA	31	48	64%
CARIBE 1	13	58	22%
CARIBE 2	0	69	0%
CENTRAL	2	78	2%
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	53	67	79%
LLANOS Y ORINOQUIA	21	54	39%
PACIFICO	17	71	23%
SANTANDERES	15	33	45%
Total general	**152**	**478**	**35%**

* CORTE 31 DE OCTUBRE

Para el contrato de Patrimonio Autónomo, se ha realizado revisión de listas restrictivas así:

31/10/2021								
REGIONAL	PERFILES REGIONAL	ALIANZAS APROBADAS REGIONAL	PERFILES ENVIADOS LISTAS RESTRICTIVAS	PERFILES PENDIENTES POR ENVIAR A LISTAS RESTRICTIVAS	PROPUESTO PARA CONVENIO	REVISIÓN SARLAFT	REVISIÓN CARTA ACEPTACIÓN	REVISIÓN FACTURA
AMAZONIA	54	49	46	3	48	0	4	2
CARIBE 1	65	62	44	18	58	3	26	18
CARIBE 2	77	69	69	0	69	7	7	24
CENTRAL	92	79	62	17	78	0	0	0
EJE CAFETERO Y ANT	80	73	68	5	67	2	36	2
LLANOS Y ORINOQU	65	54	58	0	54	2	54	54
PACIFICO	77	75	62	13	71	0	0	0
SANTANDERES	38	33	33	0	33	10	10	10
TOTAL PERFILES	548	494	442	56	478	24	137	110

Desde el 27 de octubre se inició el envió de solicitudes de vinculacion a fiducia, y con corte a 31 de octubre se han solicitado 79 asi:

VINCULACIÓN 31/10/2021		
REGIONAL	ALIANZAS A COFINANCIAR	ENVÍO CORREO VINCULACIÓN A FIDUCIA
AMAZONIA	48	0
CARIBE 1	58	8
CARIBE 2	69	20
CENTRAL	78	0
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	67	21
LLANOS Y ORINOQUIA	54	18
PACIFICO	71	2
SANTANDERES	33	10
TOTAL	478	79

Aun no hay patrimonios autónomos constituidos por lo tanto no hay giros del IM desde el encargo.

- Ejecución POA 2021

Estrategias: Se inició la estructuración de los estudios previos para la contratación

Materiales, comunicaciones: Se legalizó la orden de compra con Veneplast y se dio inició al proceso de mínima cuantía para la contratación del operador logístico Telecafé.

Incentivo modular: aun no se ha ejecutado el IM dado que están en el proceso de legalización de convenios. Se han legalizado 152 convenios.

El avance general del Poa es del 43%[1], tal como se observa a continuación:

2021						
COMPONENTES	CATEGORIAS	RUBRO	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	APROBADO CIN 75	COMPROMETIDO	% Avance
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	1.1.1	Apertura del registro verificación de perfiles	$ 754.825.500	$ 754.676.000	100%
		1.1.2	Preinversiones	$ 6.174.740.000	$ 6.173.507.200	100%
		1.1.3	Seguimiento y monitoreo	$ 8.783.099.485	$ 8.632.333.333	98%
	SUBTOTAL			$ 15.712.664.985	$ 15.529.183.200	99%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	2.1.1	Incentivo Modular	$ 88.400.000.000	$28.034.327.000	32%
	Estrategias	2.1.2	Estrategias *	$ 2.500.000.000	$ 0	0%
	SUBTOTAL			$ 90.900.000.000	$ 28.034.327.000	32%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	3.1.1	Contratación EIP	$ 4.400.000.000	$ 4..364.013.334	99%
		3.1.4	Sistema de Monitoreo y Seguimiento	$ 300.000.000	$ 220.433.333	73%
		3.1.5	Costos fiduciaria	$ 483.396.329	$ 483.396.329	100%
	Gastos operativos	3.2.1	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 745.085.902	$ 148.355.188	19%
		3.2.2	Materiales, comunicaciones *	$ 360.000.000	$ 2.839.397	0,7%
	SUBTOTAL			$ 6.288.482.232	$ 5.219.037.581	82%
TOTAL				$ 112.901.147.217	$ 48.782.547.781	43%

Temas varios:

- El EIP continúa impulsado que los tiempos de respuesta para los procesos de vinculación y contratación de las alianzas sean mas rápidos para constituir los patrimonios autónomos y hacer el giro respectivo.
- Se solicita a la fiduciaria, en cumplimiento de la obligación 13, Implementar el formato diseñado por el Ministerio para reportar la ejecución de los patrimonios autónomos y poder hacer seguimiento en todos los niveles (compromisos, pagos directos, rubro)
- Desde enero 2022 se comienzan a vencer los contratos de los PA de las 177 alianzas que actualmente se encuentran en ejecución y por lo tanto, se recomienda a la fiduciaria debe estar preparada para realizar el otro si de las alianzas fase I. Se encuentra pendiente un concepto que saldrá el lunes de la siguiente semana.
- Se recomienda a la fiduciaria fortalecer la socialización del Manual operativo de los PA.

[1] Este avance corresponde al mismo reportado con corte a julio 2021.

3. Presentación supervisión:

- Observaciones al oficio VNO-10276:

Se presentan las observaciones realizadas al oficio VNO-10276 del 27 de septiembre de 2021:
Se informa que en el link enviado se encuentran 22 contratos y se solicitó la información para 103.
https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/DOCUMENTOS%202021/39%20Contratos%20Solicitados?csf=1&web=1&e=OIz1dh

Se informa que de los contratos 2020 aun se encuentran pendientes por publicar en SECOP el 86, 87, 101, 107 y el 169.

Se informa que de los contratos 2021 que se encontraban pendientes por publicar, se encontraron publicados el número 44 y 56, aún se encuentran pendientes por publicar los demás contratos del listado remitido.

Los detalles de las observaciones se encuentran en el oficio VNO-10276.
Anexo 4: Oficio VNO-10276 con observaciones.

La fiduciaria informa que de los contratos 2020 han realizado la revisión y verificación de los documentos cargados en el SECOP, de esta manera ha realizado el cargue de los documentos pendientes incluyendo las ejecuciones correspondientes a los pagos y/o cuentas de cobro presentadas por los contratistas que avalan la prestación del servicio y la aprobación por parte del Ministerio para el respectivo pago.

Para los contratos del 2021, también realizaran el mismo ejercicio.

- Excel contratación derivada

Se realizaron observaciones al archivo que envía la fiducia en Excel de la contratación derivada, particularmente a la hoja de patrimonios autónomos, la hoja de contratación derivada 2020 y la hoja de contratación derivada 2021. La mayoría de las observaciones están relacionadas con las fecha que allí se registra.

El detalle de las observaciones realizadas se encuentra en la presentación de supervisión. **Anexo 5: Presentación supervisión PPT**

4. Conclusiones generales (Corte a octubre de 2021)

Se ha girado el IM de las 178 alianzas de la vigencia 2020, se encuentra en liquidación la alianza Asomudepas de la cual ya se devolvieron los recursos del IM al Tesoro Nacional. Es decir quedan en ejecución 177 alianzas de recursos 2020.

Los rendimientos financieros se han pagado en su totalidad.

El total de contratos derivados del encargo es de 295 (219 del 2020 y 76 del 2021).

El total de contratos derivados de los patrimonios es de 309.

De las 178 alianzas del 2020, se han contratado 177 de operadores locales. Se encuentran en ejecución 100%, considerando que la alianza Asomudepas se encuentra en proceso de liquidación.

El EIP presenta un avance financiero del POA (encargo) 2021 del 43%, con un valor total comprometido de $20.370.479.411.

- **Compromisos.**

Los que se han descrito a lo largo del documento

En constancia se firma,

Coordinadora EIP
Miriam Pantoja Otero

Fiduagraria
Edgar Alfonso Lorduy Garay

Revisó: MelissaCarvajal
CristinaCastillo

Supervisor financiero DCPyGI
Gisella Torres Arenas

Supervisor técnico DCPyGI
Adriana Mercedes Ibarra Oyaga

Anexos

Anexo 1: correo convocatoria comité de seguimiento No. 4
Anexo 2: presentación fiduciaria PPT
Anexo 3: Presentación EIP PPT
Anexo 4: Oficio VNO-10276 con observaciones.
Anexo 5: Presentación supervisión PPT

Anexo 1:



Comité de seguimiento No. 4 contrato 20200530

Adriana Mercedes Ibarra

Aceptar | Provisional | No aceptar | Proponer nueva hora

Necesario: Mauricio Ordoñez Gomez; Edgard Alfonso Lorduy Garay; Helbert Alfonso Suarez; mbray@fiduagraria.gov.co; Carlos Hernando Arevalo Garcia; Jose Heberth Rada Chilatra; Miriam Pantoja Otero; Angelica Melissa Carvajal Infante; Maria Cristina Castillo Perez; Rodrigo Antonio Buelvas Guerra; Pedro Miguel Salazar Salazar; **y 1 usuario más**

jueves 18/11/2021 3:37 p. m.

viernes, 26 de noviembre de 2021 10:00 a. m.-11:30 a. m. teams

Buenos días respetados doctores

Me permito invitar a comité de seguimiento No. 4 con el fin de realizar seguimiento técnico y financiero contrato de fiducia 20200530.

Adicionalmente, se realizará seguimiento a los compromisos para avanzar en los procesos de contratación alianzas Fase I y fase II.

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

Infórmese | Opciones de reunión | Legal

El futuro es de todos

Gobierno de Colombia
Minagricultura

EF ALIANZAS PRODUCTIVAS 20200530

La información contenida en el presente documento es de propiedad de Fiduagraria S.A. y se encuentra clasificada como confidencial. Las opiniones y conceptos aquí contenidos son a título informativo, y podrán ser modificados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. La Fiduciaria no se hace responsable por el uso que terceros den a la información.

Great Place To Work.
Certificado
DIC 2020 - NOV 2021
COL

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario
Semilla de Inversión
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

Flujo Consolidado

Información en pesos y MM a agosto 2021

Cuenta de ahorros - Bancolombia No. 031 0000 1428 Saldo Inicial	Acumulado2021	Acumulado agosto 2021 en MM
ingresos	**55.148.770.349,81**	**55.149**
(+) Saldo anterior	0,00	0
(+) Aportes Vigencia 2020	40.000.000.000,00	40.000
(+) Aportes Vigencia 2021	15.000.000.000,00	15.000
(+) Rendimientos	138.186.914,61	138
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	3.748.335,19	4
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagadoxinstrucion MADR	6.835.100,01	7
Egresos	**46.928.312.652,56**	**46.928**
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	32.965.913.618,00	32.966
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	6.773.910.163,00	6.774
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	3.181.160.358,68	3.181
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	3.157.699.181,00	3.158
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	536.286.603,00	536
(-) Pagos Comision Fiduciaria	178.078.646,00	178
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	132.468.115,39	132
(-)Gastos bancarios	2.730.228,49	3
(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos Nov. 2020 pagado bancolombia	65.739,00	0
Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784	**8.220.457.697,25**	**8.220**
Total saldo	**8.220.457.697,25**	**8.220**
SALDO FLUJO	**8.220.457.697,25**	**8.220**
SALDO BALANCE	**8.220.732.810,52**	**8.221**
DIFERENCIA	**-275.113,27**	**0**

Avance recursos Ejecutados

Información en MM a agosto 2021

POA	Total Recursos a administrar	Valor Recursos recibidos	Valor Recursos Ejecutados	Valor Pendiente de ejecutar	Valor Recursos por recibir
2020	40.000,00	40.000,00	39.662,00	338,00	0,00
2021	112.901,00	15.000,00	7.210,00	7.790,00	97.901,00
2022	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
Total	**157.691,00**	**55.000,00**	**46.872,00**	**8.128,00**	**102.691,00**

Detalle Rendimientos Financieros

Información en MM a agosto 2021

Mes	Rendimientos Generados	Rendimientos pagados al DTN
sep-20	0,00	0,00
oct-20	9,82	0,00
nov-20	20,87	9,82
dic-20	18,80	20,87
ene-21	20,63	18,80
feb-21	19,73	20,63
mar-21	9,39	19,73
abr-21	9,46	9,39
may-21	8,84	9,46
jun-21	7,66	8,84
jul-21	7,27	7,66
ago-21	5,72	7,27 *
Totales	**138,19**	**132,47**

***Nota:** Los rendimientos del mes de agosto de 2021 fueron girados el día 02 de septiembre de 2021.

Saldo Cuenta Bancaria

Información a julio 2021

El saldo de la cuenta de ahorros Bancolombia No.031 00001428 en la cual se administran los Recursos del Encargo Fiduciario al corte 31 de agosto del 2021 es de: **($8.220.457.697,25)**, presentando una ejecución sobre los recursos transferidos a la fecha del 85,24%.

Resumen General Contratación

Información a agosto 2021

RESUMEN GENERAL CONTRATACION			
ALIANZAS PRODUCTIVAS	2020	2021	TOTAL
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216	70	286
ORDENES DE COMPRA	2	0	2
MÍNIMA CUANTÍA	1	0	1
TOTAL			289

CONTRATOS EF PAAP - 2020		EJECUTADOS	EJECUCIÓN
1. INSTRUÍDOS MADR	219		
1.1 PRESTACION DE SERVICIOS	**200**	200	0
1.1.1 EIP	51	51	0
1.1.2 PREINVERSIÓN	149	149	0
1.2 ORDENES DE COMPRA	2	1	1
1.3 MÍNIMA CUANTÍA	1	1	0
1.4 (ANULADOS-INSTRUCCIÓN REVOCADA)	16	0	0

CONTRATOS EF PAAP 2021		EJECUTADOS	EJECUCIÓN
1. INSTRUÍDOS MADR	70		
1.1 PRESTACION DE SERVICIOS	**70**	0	63
1.1.1 EIP	61	5	55
1.1.2 OPERDOR REGIONAL	8	0	8
1.1.3 LIQUIDADO ANTICIPADAMENTE EIP	1	1	0
1.2 ORDENES DE COMPRA* (contrato de 2020 - tiquetes)	0	0	1
1.3 MÍNIMA CUANTÍA	0	0	0
1.4 (ANULADOS-INSTRUCCIÓN REVOCADA)	1	0	0

Ejecución Presupuestal 2020

Información a agosto 2021

COMPONENTE	CATEGORIAS	CONCEPTO ELEGIBLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PAGOS EFECTUADOS	SALDO X PAGAR	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO COMPROMETIDOS	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PREPARACIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS (Preinversión)	SERVICIOS DE APOYO	PREINVERSIÓN	2.362.200.000,00	2.359.599.968,00	2.287.633.294,00	71.966.674,00	2.600.032,00	0,00
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO	193.600.000,00	191.760.000,00	178.500.000,00	13.260.000,00	1.840.000,00	0,00
		APERTURA DEL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE PERFILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.555.800.000,00	2.551.359.968,00	2.466.133.294,00	85.226.674,00	4.440.032,00	0,00
EJECUCIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS (Inversión)	INCENTIVO MODULAR	INCENTIVO MODULAR	35.960.000.000,00	32.965.913.618,00	32.965.913.618,00	0,00	2.994.086.382,00	0,00
SUBTOTAL			35.960.000.000,00	32.965.913.618,00	32.965.913.618,00	0,00	2.994.086.382,00	0,00
GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO (Seguimiento y Gerencia)	SERVICIOS DE APOYO	CONTRATACIÓN EIP	899.263.068,00	897.320.526,00	803.669.591,00	93.650.935,00	1.942.541,84	0,16
		AUDITORÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EVALUACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COSTOS FIDUCIARIA	171.263.567,00	171.263.567,00	156.124.876,00	15.138.691,00	0,00	0,00
	COSTOS OPERATIVOS	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	373.673.365,00	206.126.893,00	62.098.101,00	144.028.792,00	167.546.472,00	0,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000,00	26.855.069,16	26.855.069,16	0,00	13.144.930,84	0,00
SUBTOTAL			1.484.200.000,00	1.301.566.055,16	1.048.747.637,16	252.818.418,00	182.633.944,68	0,16
TOTAL			40.000.000.000,00	36.818.839.641,16	36.480.794.549,16	338.045.092,00	3.181.160.358,68	0,16

Ejecución Presupuestal 2021

Información a agosto 2021

COMPONENTE	CATEGORIAS	CONCEPTO ELEGIBLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PAGOS EFECTUADOS	SALDO X PAGAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS (OR)	SERVICIOS APOYO	APERTURA DEL REGISTRO Y VERIFICACIÓN PERFILES	754.825.500	754.676.000	587.082.400	167.593.600	149.500
		PREINVERSIÓN	6.174.740.000	6.173.507.200	2.439.786.000	3.733.721.200	1.232.800
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8.783.099.485	8.601.000.000	1.712.593.600	6.888.406.400	182.099.485
SUBTOTAL			15.712.664.985	15.529.183.200	4.739.462.000	10.789.721.200	183.481.785
EJECUCIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS (Inversión)	INCENTIVO MODULAR	INCENTIVO MODULAR	88.400.000.000	0	0	0	88.400.000.000
	ESTRATEGIAS	ESTRATEGIAS	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000
SUBTOTAL			90.900.000.000	0	0	0	90.900.000.000
GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACIÓN PROYECTO (Seguimiento y Gerencia)	SERVICIOS APOYO	CONTRATACIÓN EIP	4.400.000.000	4.396.180.001	2.272.365.991	2.123.814.010	3.819.999
		SISTEMA MONITOREO Y SEGUIMIENTO	300.000.000	199.433.333	104.333.334	95.099.999	100.566.667
		COSTOS FIDUCIARIA	483.396.329	483.396.329	21.920.874	0	0
	COSTOS OPERATIVOS	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	745.085.902	71.819.002	71.819.002		673.266.900
		MATERIALES Y SUMINISTROS	360.000.000	0	0	0	360.000.000
SUBTOTAL			6.288.482.232	5.150.828.665	2.470.439.201	2.218.914.009	1.137.653.566
TOTAL			112.901.147.217	20.680.011.865	7.209.901.201	13.008.635.209	92.221.135.351

Varios

Gastos Bancarios

- A agosto del 2021, se encuentra pendiente reintegros de gastos bancarios por valor $**275.113,08**, correspondiente al mes de agosto 2021.
- En el mes de agosto Bancolombia reintegro el valor de $ 1.584.956,7 correspondiente a gastos bancarios de enero a agosto del 2021- dentro de los cuales en el mes de septiembre 2021 el encargo Fiduciario reintegró a la sociedad Fiduagraria el valor de $1.227.480,78, correspondiente al reintegro de gastos bancarios pagados por Fiduagraria al EF. (junio 2021) de los periodos enero a mayo 2021.


¡Gracias!

Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas

Comité de Seguimiento No. 4

Viceministerio de Desarrollo Rural
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

26 NOVIEMBRE 2021

Resultados 2020

METAS AL 2020



$41.000 mm Inversión Asignada
$40.940 mm Inversión ejecutada
$32.965 mm Inversión IM



178 Convenios Alianza
890 Contratos Derivados P.A



6.682 Beneficiarios
62% Mujeres



AVANCES 2021

- ✓ Contratación de los **Operadores Regionales** mes de mayo.
- ✓ Contratación de **Operadores Locales (99%).**
- ✓ Impulsando el acompañamiento en los procesos de contratación y pagos.

Avance Contratación Derivada

31/10/2021	ASISTENCIA TÉCNICA		TÉCNICO AMBIENTAL		TÉCNICO SOCIAL		INSUMOS	
REGIONAL	SOLICITUDES	APROBADOS	SOLICITUDES	APROBADOS	SOLICITUDES	APROBADOS	SOLICITUDES	APROBADOS
AMAZONIA	15	6	2	2	15	7	9	0
CARIBE 1	19	5	10	8	20	6	3	2
CARIBE 2	14	4	9	3	18	4	1	0
CENTRAL	15	10	0	0	13	9	3	1
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	24	7	1	1	22	4	0	0
LLANOS Y ORINOQUIA	20	16	0	0	17	17	1	0
PACIFICO	15	7	0	0	20	6	5	0
SANTANDERES	12	5	0	0	11	5	0	0
TOTAL PERFILES	**134**	**60**	**22**	**14**	**136**	**58**	**22**	**3**

TOTAL SOLICITUDES	314
TOTAL EN EJECUCIÓN	135
	43%

TALLERES DE FORTALECIMIENTO		
FECHA	REGIONAL	CIUDAD
14/10/2021	AMAZONIA	Mocoa
20/10/2021	AMAZONIA	S. José del Guaviare
7/10/2021	CARIBE 1	Cartagena
19/10/2021	CARIBE 1	San Andrés
11/10/2001	CARIBE 2	Montería
19/10/2021	CARIBE 2	Santa Marta
8/10/2021	CENTRO	Bogotá
11/10/2021	CENTRO	Ibagué
12/10/2021	EJE CAFETERO	Medellín
13/10/2021	EJE CAFETERO	Pereira
7/10/2021	ORINOQUIA	Arauca
8/10/2021	ORINOQUIA	Villavicencio
12/10/2021	PACÍFICO	Popayán
14/10/2021	PACÍFICO	Quibdó
15/10/2021	SANTANDERES	Bucaramanga

PENDIENTE OL NUEVO SANTA INÉS

05/10/2021 se aprueba vinculación

Proyección 2021

METAS AL 2021

$112.901 mm Inversión Asignada
$88.400 mm Inversión IM
$15.000 mm Inversión ejecutada

442 Convenios de Alianzas
2.210 Contratos derivados P.A

17.680 Beneficiarios
Focalizado: Mujeres y jóvenes rurales

AVANCES 2021

- ✓ Se está impulsando la legalización de los **478** convenios de alianzas 2021.
- ✓ Con corte 31 octubre se legalizaron **152** convenios
- ✓ **353** procesos de vinculaciones remitidos



Convenios de Alianzas

REGIONALES	CONVENIOS LEGALIZADOS	TOTAL CONVENIOS	AVANCE
AMAZONIA	31	48	64%
CARIBE 1	13	58	22%
CARIBE 2	0	69	0%
CENTRAL	2	78	2%
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	53	67	79%
LLANOS Y ORINOQUIA	21	54	39%
PACIFICO	17	71	23%
SANTANDERES	15	33	45%
Total general	**152**	**478**	**35%**

* CORTE 31 DE OCTUBRE

Avance Constitución PA

REVISIÓN LISTAS RESTRICTIVAS

31/10/2021								
REGIONAL	PERFILES REGIONAL	ALIANZAS APROBADAS REGIONAL	PERFILES ENVIADOS LISTAS RESTRICTIVAS	PERFILES PENDIENTES POR ENVIAR A LISTAS RESTRICTIVAS	PROPUESTO PARA CONVENIO	REVISIÓN SARLAFT	REVISIÓN CARTA ACEPTACIÓN	REVISIÓN FACTURA
AMAZONIA	54	49	46	3	48	0	4	2
CARIBE 1	65	62	44	18	58	3	26	18
CARIBE 2	77	69	69	0	69	7	7	24
CENTRAL	92	79	62	17	78	0	0	0
EJE CAFETERO Y ANT	80	73	68	5	67	2	36	2
LLANOS Y ORINOQU	65	54	58	0	54	2	54	54
PACIFICO	77	75	62	13	71	0	0	0
SANTANDERES	38	33	33	0	33	10	10	10
TOTAL PERFILES	**548**	**494**	**442**	**56**	**478**	**24**	**137**	**110**

VINCULACIÓN 31/10/2021		
REGIONAL	ALIANZAS A COFINANCIAR	ENVÍO CORREO VINCULACIÓN A FIDUCIA
AMAZONIA	48	0
CARIBE 1	58	8
CARIBE 2	69	20
CENTRAL	78	0
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	67	21
LLANOS Y ORINOQUIA	54	18
PACIFICO	71	2
SANTANDERES	33	10
TOTAL	**478**	**79**

Ejecución POA

2021						
COMPONENTES	**CATEGORIAS**	**RUBRO**	**CONCEPTO GASTO ELEGIBLE**	**APROBADO CIN 75**	**COMPROMETIDO**	**% Avance**
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	1.1.1	Apertura del registro verificación de perfiles	$ 754.825.500	$ 754.676.000	**100%**
		1.1.2	Preinversiones	$ 6.174.740.000	$ 6.173.507.200	**100%**
		1.1.3	Seguimiento y monitoreo	$ 8.783.099.485	$ 8.632.333.333	**98%**
	SUBTOTAL			**$ 15.712.664.985**	**$ 15.529.183.200**	**99%**
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	2.1.1	Incentivo Modular	$ 88.400.000.000	$28.034.327.000	**32%**
	Estrategias	2.1.2	Estrategias *	$ 2.500.000.000	$ 0	**0%**
	SUBTOTAL			**$ 90.900.000.000**	**$ 28.034.327.000**	**32%**
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	3.1.1	Contratación EIP	$ 4.400.000.000	$ 4..364.013.334	**99%**
		3.1.4	Sistema de Monitoreo y Seguimiento	$ 300.000.000	$ 220.433.333	**73%**
		3.1.5	Costos fiduciaria	$ 483.396.329	$ 483.396.329	**100%**
	Gastos operativos	3.2.1	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 745.085.902	$ 148.355.188	**19%**
		3.2.2	Materiales, comunicaciones *	$ 360.000.000	$ 2.839.397	**0,7%**
	SUBTOTAL			**$ 6.288.482.232**	**$ 5.219.037.581**	**82%**
TOTAL				**$ 112.901.147.217**	**$ 48.782.547.781**	**43%**



El Incentivo Modular corresponde al **78%** del total de los recursos y su ejecución se realizara aproximadamente para los meses de Noviembre y Diciembre

- **Estrategias:** Se inicio la estructuración de los estudios previos para desarrollar las estrategias del PAAP
- **Materiales, comunicaciones:** Se legalizó la orden de compra con Veneplast y se dio inicio el proceso de contratación del operador logístico Telecafe, así como un proceso de mínima cuantía
- **Incentivo modular:** Se dio inicio a la suscripción y legalización de los convenios de alianzas con corte 31 de octubre, se legalizaron 152

Temas Varios



- Seguir impulsando los tiempos de respuesta en los procesos de vinculación y contratación de las Alianzas 2021
- Dar inicio lo más pronto possible al giro del Incentivo Modular
- Obligación 13. Patrimonios autónomos: “Presentar al MINISTERIO dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes, un informe consolidado de ejecución presupuestal del incentivo modular de los patrimonios autónomos constituidos, **de acuerdo con el formato diseñado para tal efecto por el MINISTERIO** y dentro de los primeros (05) días calendario de cada mes, un informe parcial de pagos”.
- Respuesta de los otro sí a los contratos de encargo fiduciaria Alianzas Fase I
- Socialización del Manual Operativo de los P.A

Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas

Alianzas Productivas
Para la vida

El campo es de todos

Minagricultura

GRACIAS

Bogotá D.C.
VNO-10276

nurc: 02-008844-27092021

Señores
SERGIO ENRIQUE RAMIREZ PAYARES
Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
ADRIANA IBARRA
GISELLA TORRES ARENAS
Supervisora Técnica Contrato 2020530 - Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Supervisora Financiera Contrato 2020530 - Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Avenida Jiménez # 7A-17
Ciudad

REF: Respuesta observaciones supervisión – **Parte A**: Al documento VNO 8084 de respuestas a las observaciones elevadas en el comité 1 de fecha 2 de julio de 2021. – **Parte B:** Elevadas en el marco del comité de seguimiento No. 2 de fecha 20 de agosto de 2021 - Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.

Respetados doctores:

En primera medida, de conformidad con la mesa de trabajo para la explicación del manejo de las plataformas y revisión en SECOP 2 del pasado 27 de agosto de 2021 y previa consulta y aprobación con la jefatura del Encargo se viene adelantado el cargue de los informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios de la vigencia 2020 en adelante, esta actividad presenta un avance a la fecha hasta el contrato 030/2020, y adicionalmente el cargue de los documentos anexos al informe mensual de la fiduciaria al cumplimiento del contrato de Encargo Fiduciario 20200530 en la plataforma SECOP 2 tarea que al momento de la presentación se encuentra al día.

Por otro lado, de conformidad con las observaciones elevadas por la supervisión y en los términos expresados a continuación nos permitimos dar ampliación a las respuestas dadas en VNO 8084, y a las observaciones presentadas en el marco del comité de seguimiento No. 2 de fecha 20 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

PARTE A: Observaciones al VNO 8084:

OBSERVACIÓN 1:

"Adjunto se remite la documentación solicitada de los 39 contratos de la vigencia 2020 con terminación en 2021.
No se encuentra adjunto en el correo".

RESPUESTA FIDUAGRARIA: Una vez revisado el correo remisorio se ha evidenciado que la carpeta que contiene los contratos solicitados no fue enviado y su peso no permite la movilidad por este medio. Por lo tanto fue necesario crear un repositorio en la plataforma One Drive del MADR en el siguiente link:
https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/DOCUMENTOS%202021/39%20Contratos%20Solicitados?csf=1&web=1&e=Olz1dh

OBSERVACIÓN 2:

Solicitud de incluir como anexo al informe mensual de gestión de la Fiduciaria la "Matriz de Riesgos"

RESPUESTA FIDUAGRARIA: La Fiduciaria se permite manifestar que este anexo se viene adjuntando al Informe Mensual de Gestión desde el mes de agosto de 2021.

PARTE B: Respuesta a las observaciones Elevadas en el marco del comité de seguimiento No. 2 de fecha 20 de agosto de 2021 - Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.

OBSERVACIÓN 1:

"

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Contratos derivados 2020 no publicados en secop

De acuerdo a la revisión realizada en secop, exceptuando las órdenes de compra y la mínima cuantía, tenemos 216 contratos en el 2020 de los cuales se encontraron 200 publicados en el secop. De los 16 contratos no publicados, 7 se encuentran anulados y 9 en estado terminado.

No. Contrato	Tercero	Valor Total Contrato y adiciones	ESTADO
006	CARMEN CECILIA JULIO CORTINA	$ -	ANULADO
024	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	$ 16.933.333,00	TERMINADO
064	GLORIA PATRICIA SIERRA LOPERA	$ -	ANULADO
086	ORFA EMPERATRIZ OSPINA RENDON	$ -	TERMINADO
087	NINI JOHANNA AGUDELO CARVAJAL	$ -	TERMINADO
089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	$ 12.700.000,00	TERMINADO
101	LUCY ARBEY RIVERA OSORIO	$ -	TERMINADO
107	EVA PINTO LLANES	$ -	TERMINADO
127	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	$ 29.000.000,00	TERMINADO
128	LEIDY ALEJANDRA MORA CORDOBA	$ -	ANULADO
139	(NO CONTRATAR) DIANA PAOLA VERGARA SALCEDO	$ -	ANULADO
140	(NO CONTRATAR) FABIO ANDRÉS BARROSO ENRIQUEZ	$ -	ANULADO
141	(NO CONTRATAR) JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	$ -	ANULADO
167	JOSE GUILLERMO PUCHE RAMOS	$ -	TERMINADO
169	ERNEY YAMID OSPINA RIOS	$ -	TERMINADO
183	ANGELA MARIA CANO PÉREZ	$ -	ANULADO

Se solicita informar porque no se publicaron los contratos 24, 86, 87, 89, 101, 107, 127, 167 y 169 que presentan estado terminado. Favor aclarar a que se refiere la fiducia al calificar un contrato con estado "Terminado".

"

RESPUESTA FIDUAGRARIA: La Fiduciaria se permite aclarar que los contratos que se reportan como terminados son aquellos que se suscribieron, pero que no iniciaron su ejecución, bien sea por la manifestación expresa del contratista o por su desistimiento tácito al no comparecer con los documentos necesarios para la ejecución.

Acorde con la definición anterior se hace una relación de los contratos señalados de la siguiente manera:

No. CTO	SECOP 2
024-2020	Su publicación se efectuó en abril de 2021, se encuentra en EDICIÓN en la plataforma por lo tanto no se puede visualizar, se procede a la revisión de la publicación y cambio de estado para que pueda ser visible
086-2020	Se procederá a su publicación

087-2020	Se procederá a su publicación
101-2020	Se procederá a su publicación
107-2020	Se procederá a su publicación
127-2020	El contrato fue perfeccionado y ejecutado, no se terminó anticipadamente. Su publicación se efectuó 20/11/2020 3:11 PM, se encuentra en EDICIÓN en la plataforma, por lo tanto no se puede visualizar, se procederá a la revisión de la publicación y cambio de estado para que pueda ser visible.
167-2020	El contrato no fue firmado por el contratista, y no se perfeccionó, por ende no nació a la vida jurídica. Será actualizado a ANULADO y no requiere publicación en SECOP II ya que no existió relación contractual por la ausencia de la firma de las partes sobre el acuerdo contractual.
169-2020	Se procederá a su publicación

OBSERVACIÓN 2:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Contratos derivados 2021 no publicados en secop

No. Contrato	Tercero	ESTADO
031	ANULADO	ANULADO
044	S C H	EJECUCIÓN
045	CORPORACION SEMILLAS DE LOS ANDES	EJECUCIÓN
046	PRODESARROLLO LIMITADA	EJECUCIÓN
047	GRUPO IS COLOMBIA SAS	EJECUCIÓN
048	FUNTECOL	EJECUCIÓN
049	FUNPROSCOM	EJECUCIÓN
050	CORPOAGRO	EJECUCIÓN
051	REDVITAL	EJECUCIÓN
052	ARMANDO SOLORZANO SALAS	EJECUCIÓN
053	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	EJECUCIÓN
054	JAIRO ENRIQUE RIOS URUETA	EJECUCIÓN
055	ANAMARIA PATIÑO SALGADO	EJECUCIÓN
056	CATALINA RESTREPO RUIZ	EJECUCIÓN
057	ANGEL MARIA GUERRERO	EJECUCIÓN
058	AMAURY RAMIREZ CASTRO	EJECUCIÓN
059	DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO	EJECUCIÓN
060	JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	EJECUCIÓN
061	NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO	EJECUCIÓN
062	SHIRLEY MARBEL CARRILLO BARRIOS	EJECUCIÓN
063	CLAUDIA CRISTINA MORA ORTIZ	EJECUCIÓN

Se solicita informar si ya se publicaron los contratos en estado "ejecución", en caso contrario proceder a publicarlos

RESPUESTA FIDUAGRARIA: La Fiduciaria se permite aclarar que los términos en estado ANULADO en el archivo de control se registran, pero los mismo no se perfeccionaron (firma de las partes) y por esta razón no generaron vínculo negocial entre las partes. Por la misma razón no son sujetos de publicación (contrato no existe) y no hay lugar a la publicidad del acto inexistente por sustracción de materia, esto para el caso del contrato 031-2021 y los demás que se registren en el consecutivo.

Respecto de los demás contratos señalados se procederá a su publicación.

OBSERVACIÓN 3:

"

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Contratos 2020 sin fechas

1. En el listado remitido por la fiduciaria se identificaron 15 contratos sin información de fechas de suscripción, inicio y terminación, de los cuales 7 se encuentran en estado anulado y 8 en estado terminado. De los 8 en estado terminado 2 se encuentran publicados en secop correspondientes al 4,17.

No. Contrato	Tercero	Fecha de suscripción – inicio- terminación	Valor Total Contrato y adiciones	ESTADO	Fecha PUBLICACIÓN SECOP
004	OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENO	NA	$ -	TERMINADO	6/11/2020
017	LINETH ALEXANDRA MONTILLA BURBANO	NA	$ -	TERMINADO	9/11/2020
086	ORFA EMPERATRIZ OSPINA RENDON	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
087	NINI JOHANNA AGUDELO CARVAJAL	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
101	LUCY ARBEY RIVERA OSORIO	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
107	EVA PINTO LLANES	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
167	JOSE GUILLERMO PUCHE RAMOS	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
169	ERNEY YAMID OSPINA RIOS	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra

Se solicita informar fechas de estos 8 contratos en estado terminado o informar si la razón por la que no se registran. En informe de julio incluyeron fechas del contrato 152.

".

RESPUESTA FIDUAGRARIA: Una vez revisada la información en el archivo de la fiduciaria se evidencia lo siguiente:

No. CTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
004-2020	14-oct-20
017-2020	14-oct-20
086-2020	14-oct-20
087-2020	14-oct-20
101-2020	14-oct-20
107-2020	14-oct-20
167-2020	El contrato no fue firmado por el contratista, y no se perfeccionó, por ende no nació a la vida jurídica. Será actualizado a ANULADO y no requiere publicación en SECOP II ya que no existió relación contractual por la ausencia de la firma de las partes sobre el acuerdo contractual.
169-2020	27-oct-20

OBSERVACIÓN 4:

"



"

RESPUESTA FIDUAGRARIA: Con la finalidad de atender la solicitud la información solicitada se ha cargado en el repositorio en la plataforma One Drive del MADR en el siguiente link: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/DOCUMENTOS%202021/39%20Contratos%20Solicitados?csf=1&web=1&e=OIz1dh

OBSERVACIÓN 5:

"



No. Contrato	Tercero	Fecha Terminación fiducia	Otro si modificatorio duración
089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	10/01/2021	
208	JACQUELINE LUCIA GAVILANES BRAVO	20/01/2021	
209	DIANA MARCELA APUDIA SJOGREEN	20/01/2021	
210	EDSON FERNEY BARON SOLANO	20/01/2021	Si, 20/01/2021
211	JAVIER FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	20/02/2021	
212	ANA MARIA CALVO CARRILLO	20/01/2021	Si, 20/01/2021
213	BELKIS MARINETH ORTIZ MENDOZA	20/01/2021	
214	DUBAN DARIO RENDON ARANGO	20/01/2021	Si, 20/01/2021
215	EMIRO RAFAEL PEREZ CHAMORRO	20/02/2021	
216	CLARA LICETH VARGAS SANCHEZ	20/02/2021	Si, 20/02/2021

"

RESPUESTA FIDUAGRARIA: Con la finalidad de atender la solicitud la información solicitada se ha cargado en el repositorio en la plataforma One Drive del MADR en el siguiente link: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/DOCUMENTOS%202021/39%20Contratos%20Solicitados?csf=1&web=1&e=OIz1dh

OBSERVACIÓN 6:

"



".

RESPUESTA FIDUAGRARIA: Con la finalidad de atender la solicitud la información solicitada se ha cargado en el repositorio en la plataforma One Drive del MADR en el siguiente link: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/DOCUMENTOS%202021/39%20Contratos%20Solicitados?csf=1&web=1&e=OIz1dh

OBSERVACIÓN 7:

La supervisión del contrato 20200530 solicita le sea incluido el rol a cada contrato relacionado en el anexo de contratación.

RESPUESTA FIDUAGRARIA: La Fiduciaria informa que, a partir del mes de octubre 2021 se remitirá con el rol de cada contrato la relación de la actividad contractual reportada.

Cordialmente,

MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ
Representante Legal
FIDUAGRARIA S.A.
en calidad de Mandataria del E.F.
No. 20200530

Elaboró aspectos jurídicos: HELBERT ALFONSO SUÁREZ GÓMEZ – Abogado Senior.
Elaboró aspectos financieros: JOSE HEBERT RADA CHILATRA - Ejecutivo de Negocios Fiduciarios.
Elaboró aspectos financieros: CARLOS HERNANDO ARÉVALO GARCÍA - Coordinador Financiero Alianzas Productivas
Revisó: EDGARD LORDUY GARAY - Jefe de Negocios Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.

El campo es de todos

Minagricultura

Supervisión contrato 20200530

Dirección de Capacidades de Productivas y Generación de Ingresos

01. Observaciones oficio VNO - 10276



02. Revisión de los informes de fiducia


Excel contratación derivada

- Hoja de patrimonios autónomos

Columna fecha de inicio: 136 de 309 registros no tienen formato fecha correcto.

EL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE MOREROS DE SOTARA – ASOMOREROS tiene fecha de inicio del 24jun24

Los 4 links que colocan en el oficio VNO-10276 son el mismo y llevan a 22 contratos de los 103 solicitados, que contienen minuta y aprobación de póliza, así:

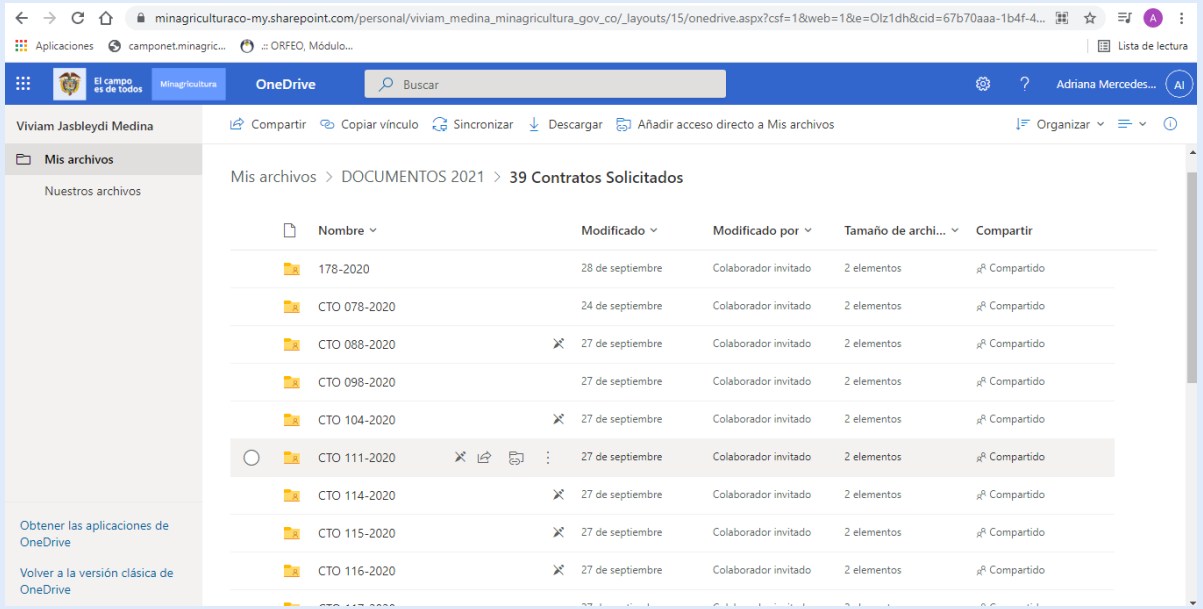



Que documentos se producen en la ejecución del contrato, cual es la documentación completa?

Excel contratación derivada

- Hoja contratación deriv. 2020

En la columna fecha de suscripción hay 166 registros de 219 sin formato fecha

Los contratos 4,17,86,87,101,107 y 169 siguen con fecha de suscripción NA y con la fecha que se informó en el oficio VNO- 10276

El contrato 142 y el 143 tiene fecha de inicio de 14/10/202


En la columna fecha de inicio hay 11 registros de 219 sin formato fecha

En la columna fecha de terminación hay 78 registros de 219 sin formato fecha

En la columna estado el contrato 167 sigue con la descripción de terminado y no anulado como se informó en el oficio VNO- 10276

Excel contratación derivada

- Hoja contratación deriv. 2021



En la columna fecha de terminación hay 60 registros de 76 sin formato fecha

En la columna fecha de inicio hay 2 registros de 76 sin formato fecha

En la columna fecha de suscripción hay 17 registros de 76 sin formato fecha

En la columna fecha de suscripción hay 4 registros de 76 con fecha del 29 de enero 2020

El contrato No. 40 aparece en ejecución, pero la fecha de terminación del contrato es del 18 de agosto de 2021.

El archivo dice que hay 66 contratos EIP en ejecución, pero el EIP reporta un número menor.

Los contratos 64,65 y 73 en ejecución dicen que el perfil es EIP, pero el EIP informa que no forman parte del EIP, si no del equipo para la creación del sistema de alianzas.

Los contratos 22, 23 y 59 en ejecución dicen que el perfil es EIP, pero el EIP informa que no forman parte del EIP, si no del equipo para la creación del sistema de alianzas.

El campo es de todos

Minagricultura

Muchas Gracias

Supervisión
