INFORME DE SUPERVISIÓN No. 21
(Período del 01 al 31 de enero de 2022)

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el Período del 01 al 31 de enero del 2022.

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera.
2. Gestión Administrativa y Jurídica
3. Gestión Técnica operativos
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar:

GESTIÓN FINANCIERA.

El valor del contrato fue por $108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Costo total de la operación: $ 9.138.418.331,88
- Recursos de capital semilla: $ 87.506.364.697,00
- GMF: $ 386.579.132,12
- Cuota de Gerencia: $ 11.903.827.839,00 (incluye adición de $3.842.570.499)

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

INFORMACIÓN FINANCIERA CUENTA BANCARIA

BANCO BBVA	
CUENTA NO. 00130309000200045797	
CO1.PCCNTR.1471299	
MOVIMIENTO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022	
SALDO ANTERIOR 31-12-2021	**63.903.726.594,11**
MAS:	
INTERESES GANADOS	79.669.910,00
MENOS:	
PAGO TERCEROS PROVEEDORES	0,00
GMF	0,00
TRASLADO FIDUCIA	0,00
SALDO FINAL	**63.983.396.504,11**

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este componente:

Cuota de gerencia:

En este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de $4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo

Plan operativo

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Plan Operativo. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 12 de noviembre propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 12 de noviembre de 2021 en la Junta Administradora. Con base en lo anterior, se presenta el avance del plan operativo, el cual es validado con el SENA, el operador, entrega mensualmente un informe de gestión finacniera

Descripción	Plan operativo V4 12/11/2021	Valor comprometido a 31/01/2022	Valor ejecutado a 31/01/2022
Convocatoria nacional 77 - Multisectorial	$ 11.918.038.045	$ 11.561.644.548	$ 8.746.700.229
Convocatoria nacional 78 - Naranja	$ 9.723.838.959	$ 9.475.838.959	$ 7.352.010.752
Convocatorias cerradas	$ 21.844.247.198	$ 19.958.648.243	$ 4.558.500.437
Recursos para línea de sostenibilidad	$ 40.000.000.000	$ 0	$ 0
Crowdfunding	$ 4.000.000.000	$ 0	$ 0
Evaluación de planes de negocio (automatización)	$ 438.383.396,00	$ 656.883.396,00	$ 656.883.396,00
Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	$ 218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidos convenios de cofinanciación)	$ 203.240.495,00	$ 193.000.000,00	$ 178.000.000,00
Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	$ 4.848.768.000,00	$ 4.848.768.000,00	$ 1.335.494.080,68
Póliza de deudor	$ 108.900.000,00	$ 108.900.000,00	$ 7.965.642
Fiduciaria	$ 96.891.764,00	$ 96.891.764,00	$ 96.891.764,00
FNG (Unidos por Colombia)	$ 2.284.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
Neoserra (12 meses)	$ 190.000.000,00	$ 176.664.303,00	$ 176.664.303,00
Firmas digitales	$ 14.616.924,00	$ 14.616.924,00	$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	$ 487.399.992,00	$ 487.399.992,03	$ 389.919.994,00
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	$ 175.238.255,88	$ 175.000.001,00	$ 122.500.000,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	$ 24.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00
Cobro de Cartera	$ 68.320.000,00	$ 0,00	$ 0,00
GMF	$ 386.579.132,12	190.310.367	93.837.933
Total costos de operación	**$ 97.031.362.161**	**$ 47.944.566.497**	**$ 23.729.985.455**

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Como parte de la contratación derivada, se continuo con la ejecución de los contratos y durante el mes de enero no se realizaron pagos.

SALDOS

La supervisión verificó que ha corte de enero de 2022, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario asciende a la suma de $ $ 24.243.437.091,12,, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos gen erados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

RENDIMIENTOS

Del mismo modo la supervisión verifico que durante el mes de enero de 2022, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos por valor total de $78.175.033,71; de otra parte, las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de enero por valor de $38.915,40. Finalmente durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total de $ 55.399.506,65 por concepto de rendimientos acumulados.

INFORME FINANCIERO DE ADHESIONES SUSCRITAS

A corte 31 de enero de 2022, el recaudo de las adhesiones suscritas es equivalente al 100% de los 22 contratos de adhesión firmados y se discriminan así:

Fecha de contrato	Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
20/11/2020	24/12/2020	Tauramena – Casanare	$ 500.000.000	$ 8.335.839,55
29/10/2020	18/12/2020	Villanueva – Casanare	$ 300.000.000	$ 70.409.361,40
15/12/2020	23/12/2020	San Juan de Urabá – Antioquia	$ 300.000.000	$ 177.201.947,13
11/12/2020	15/12/2020	Yarumal – Antioquia	$ 300.000.000	$ 758.078,24
20/11/2020	16/12/2020	Planadas – Tolima	$ 308.000.000	$ 1.189.076,12
17/12/2020	27/01/2021	Departamento de Sucre	$ 571.000.000	$ 25.936.366,59
30/11/2020	24/12/2020	Caldas - Antioquia	$ 600.000.000	$ 62.935.647,27
20/11/2020	22/12/2020	Bugalagrande – Valle	$ 350.000.000	$ 18.395.221,97
30/11/2020	28/12/2020	Carmen de Viboral – Antioquia	$ 600.000.000	$ 24.019.279,15
15/12/2020	29/12/2020	Planeta Rica – Córdoba	$ 500.000.000	$ 6.618.966,34
20/11/2020	16/12/2020 22/12/2020	Barrancabermeja – Santander	$ 750.000.000	$ 44.174.290,58
23/12/2020	24/12/2020 29/01/2021	Quebradona s.a.s	$ 750.000.000	$ 18.581.311,84
29/10/2020	23/12/2020 02/02/2021	Itagüí- Antioquia	$ 1.000.000.000	$ 141.240.910,68
19/11/2020	13/01/2021	Garzón- Huila	$ 300.000.000	$ 23.818.240,34
15/12/2020	14/01/2021 29/01/2021	Gramalote Limited	$ 746.132.550	$ 67.503.805,45
10/12/2020	03/02/2021 08/02/2021 16/03/2021	Secretariado Nacional de Pastoral Social	$ 460.816.609	$ 119.663,60
15/02/2021	16/04/2021	Ministerio del Interior	$ 1.000.000.000	$ 310.435.276,54
3/05/2021	28/05/2021	Municipio de Manizales	$ 1.485.000.000	$ 1.103.190.109,25
24/05/2021	6/08/2021	Municipio de La Virginia	$ 273.000.000	$ 273.133.876,55
9/06/2021	25/08/2021	Departamento de Norte de Santander	$ 650.000.000	$ 650.284.876,65
2/08/2021	27/08/2021	Acacias	$ 600.000.000	$ 603.651.394,00
11/08/2021	8/10/2021	Riohacha	$ 300.000.000	$ 301.341.042,00
	Total		**$ 12.643.949.159**	**$ 3.933.274.581,24**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones administrativas presentadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Desde la supervisión se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del SENA.

CONTRATOS DE ADHESIÓN

Se ha recibido por parte del SENA, con corte a 31 enero, el documento soporte de 23 entidades territoriales relacionadas a continuación. Mensualmente se reciben los informes mensuales de gestión de los contratos de adhesión, lso cuales son también entregados por parte del SENA a cada aliado. Durante cada mes se realizan los Comités de Seguimiento cuando así el aliado lo amerite.

LÍNEA CRECER

Este proceso de contratación responde a obligación contenida en el numeral 16, inciso 1.2 de la cláusula tercera, que indica “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”. Actualmente se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y MATRIX CRÉDITOS S.A.S.

GESTIÓN TÉCNICA

CONVOCATORIA

Durante el mes de enero de 2022 las convocatorias asociadas al contrato CO1.PCCNTR.1471299 suscrito con la Universidad Nacional no tuvieron modificación en sus términos o calendarios.

ACREDITACIÓN

Durante el mes de enero de 2022 no se realizaron actividades de acreditación ni de publicación parcial o final de informes.

EVALUACIÓN

En este periodo no se realizaron actividades de evaluación de planes de negocio.

DESISTIMIENTOS

Durante en el mes de enero de 2022 se gestionaron y formalizaron 5 nuevos desistimientos a los 29 informados previamente con corte el 31 de diciembre de 2021, por lo que al 31 de enero de 2022 se han recibido un total de 29 desistimientos a los recursos de financiamiento aprobados por consejo Directivo Nacional a las convocatorias del Fondo Emprender para las convocatorias Operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato CO1.PCCNTR.1471299, en la siguiente tabla se muestra la relación de los desistimientos recibidos, conocidos por la Supervisión.

No	ID	PLAN DE NEGOCIO	NOMBRE EMPRENDEDOR	FECHA DE DESISTIMIENTO	CV CIERRE	RECURSOS ASIGNADOS
1	73056	GENOVAS SANTAFEREÑAS	PATRICIA LOZANO RODRIGUEZ	11/03/2021	77	$80.182.931
2	68673	CHERRY PROMOCIONALES	KARENTH GIORNEIDY BUITRAGO BORRERO	12/03/2021	78	$122.892.421
3	73336	ROPA FLIK	GASTON GIRALDO CAMACHO	16/04/2021	78	$123.907.752
4	73452	GLAMPING CASANARE AMAZING SAS	JUAN ALEJANDRO SANTANA VELASQUEZ	31/05/2021	78	$124.000.000
5	68829	AGUA MIA DE LA COSTA	ANA CAROLINA MONTES MEJIA	23/07/2021	80 -C1	$79.996.920
6	72773	RECIGLASS SAS	YEISON LEANDRO RENDÓN GARCIA	27/07/2021	80 – C1	$79.995.616
7	73596	CASA HOJALDRE S.A.S	CAROLINA GONZALEZ JIMENEZ	01/07/2021	80 - C1	$79.999.435
8	74176	SU SOLUCIÓN	OSCAR DARIO OSPINA VILLA	02/07/2021	167 - C1	$124.000.000
9	74445	SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.S	LUIS ALBERTO CONTRERAS	27/08/2021	168 - C2	$123.559.536
10	74224	HUEVOS DEL RANCHO SAS	OMAIRA MELO BERNAL	19/04/2021	169 - C1	$123.569.643
11	74237	TE GUIO	JULIAN VANEGAS LOPEZ	10/08/2021	177 – C1	$79.878.930
12	74510	AGRICOLA SAN MIGUEL	EMERSSON EDUARDO ESPINOSA VELEZ	30/06/2021	177 – C2	$79.878.723
13	74183	PRODUCTOS KORA	JUAN GUILLERMO ORTEGA SARMIENTO	16/06/2021	178 – C1	$91.099.082

No	ID	PLAN DE NEGOCIO	NOMBRE EMPRENDEDOR	FECHA DE DESISTIMIENTO	CV CIERRE	RECURSOS ASIGNADOS
14	74240	GANADERIA LA PALMERA	OSCAR EDUARDO SEPULVEDA ORREGO	26/06/2021	181 – C1	$109.957.460
15	72970	EL MOLINO DE AGUA	SERGIO CAMILO ARBELAEZ VARGAS	03/08/2021	182 – C1	$79.991.824
16	72882	CULTIVOS HIDROVIDA	YEISON STIVEN MEJIA EUSSE	17/08/2021	185 – C1	$80.000.000
17	74475	APICOLA CAMPO ALEGRE	ALEJANDRA CASTRO MONTOYA	31/08/2021	185 - C2	$79.951.139
18	73523	RISE HEALTH	MARITZA ANGARITA MERCHAN	08/09/2021	78	$124.000.000
19	72834	TECHMOTION	CESAR AUGUSTO NUÑEZ ORJUELA	08/09/2021	77	$122.014.617
20	73612	ROYAL KNIGTH	ANDRES GIRALDO MAYA	22/10/2021	80	$79.877.103
21	74112	EKOCLEAN SAS	GENIA SOLANGIE PIÑEROS CASTIBLANCO	25/11//2021	168 – C1	$123.999.861
22	74073	PIÑATEXTIL	LEONARDO ALVAREZ JIMENEZ	25/11/2021	168 – C2	$121.325.323
23	74452	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN	OLVER ANDRES LASSO MEDINA	07/12/2021	176 – C3	$83.594.438
24	74507	D'LOUISE ACCESORIOS	LUISA FERNANDA SISQUIARCO	07/12/2021	177 – C2	$79.876.530
25	71932	CAMPO GRAND FOOD	MARCELA DIAZ RAMÍREZ	27/12/2021	77	$123.641.454
26	73442	PROYECTO AQUATEX	PABLO ENRIQUE NEMOCÓN SOLANO	13/1/2022	77	$110.737.426
27	74340	AGROTURISMO SANTA LUCIA	JORGE MANUEL REPIZO OROZCO	14/1/2022	176 - C2	$83.881.048
28	74604	POIESIS CONTINUA	NATALIA MORALES GOMEZ	17/01/20222	182 – C2	$79.945.033
29	74263	TRIGO Y AROMAS	OSCAR DANIEL ACEVEDO HERNÁNDEZ	20/1/2022	177 – C3	$79.879.010
TOTAL RECURSOS PLANES CON DESISTIMIENTOS						**$2.875.633.255**

En este aspecto, el SENA ha sido insisitente con el Oeprador, en que se realicen lso seguimientos del caso para conocer a profundidad las razones para desistir de su plan de negocios

INTERVENTORÍA:


- El presente informe relaciona las actividades desarrolladas en el proceso de interventoría, que dan respuesta a las obligaciones contractuales descritas en la cláusula 1.4 Obligaciones de Gestión de Interventoría. Se contemplan seis (6) bloques de proyectos, con la siguiente distribución:

- Primer bloque: (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020) Proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial y 78 - Naranja.
- Segundo bloque: (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021) Proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego.
- Tercer bloque: (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021) Proyectos de las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande

- Cuarto bloque: (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquía).

- Quinto Bloque: (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021) Convocatorias 172 – Yarumal, 175 – Sucre, 176 – Planadas, 177 – Caldas, 178 – Carmen de Viboral, 179 – Planeta Rica, 182 – Barrancabermeja, 184 – Quebradona, 185 – Gramalote y 186 – Samaniego.
- Sexto Bloque: (Sesión No. 1588 del 20 septiembre de 2021) Convocatorias 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 183 – Pastoral Social, 185 – Gramalote, 187 – Ministerio del Interior y 188 – Manizales.

Imagen 6. Estado - Puesta en marcha – corte 31 de enero

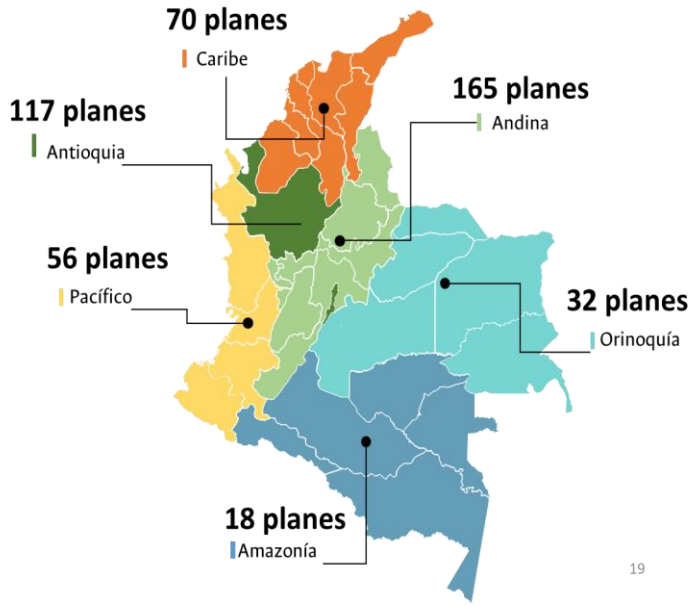

Valores Agregados:

Según lo acordado en la última sesión de seguimiento del contrato el día 17 de diciembre de 2021, se acordó la presentación de avances desarrollados a la fecha para cada uno de los valores agregados por parte de la Universidad Nacional en el mes de enero. Pese a lo anterior, por motivos de agendas y contrataciones internas al interior del SENA, esta sesión se pospuso para la primera semana del mes de febrero del año 2022. Dado lo anterior, en el periodo de referencia se adelantaron actividades de perfeccionamiento, consolidación de información, validación de propuestas iniciales e informes para cada uno de los valores agregados.

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

Informes de gestión y financiero:

A la fecha el operador UNIVERSIDAD NACIONAL se encuentra al día con los informes de gestión mensual solicitados, tanto del informe detallando el uso del recurso público, es decir la ejecución de la cuota de gerencia, el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y el informe financiero fue entregado por el operador a la fecha y se encuentra al día**.**

Comité Técnico de Mejora:

Como parte del proceso de supervisión que realiza el Coordinador Nacional de Emprendimiento, se tiene el espacio de los comités durante cada mes, para este se llevó a cabo El día 31 de enero de 2022.

Comités de seguimiento línea crecer:

Como parte del proceso de seguimiento, se tiene establecido este espacio con la participación del operador de los recursos, la Universidad Distrital, el operador Financiero Matrix Créditos y el SEN para analizar y hacer seguimiento a los avances de la línea. E este mes se programó para el 01 de febrero de 2022 - Comité seguimiento Línea de sostenibilidad UDIS - Matrix

Reuniones de seguimiento estratégico:

Se desarrollan cada 15 días o cada 8 según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo del Operador, el Supervisor del Contrato junto con el equipo de SENA que se considere necesario para hacer seguimiento a las actividades, avances, y compromisos. En el mes de enero se realizaron para tratar temas de interés en este caso en particular seguimiento a la línea de sostenibilidad y las contrataciones derivadas.

Junta Administradora:

En este periodo no se realizó junta administradora.

OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN ESTE PERIODO

- Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a lo visto en al carpeta https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1yNAAugdqQKlQs8378MESEkZhRDctqJRR

La supervisión da visto bueno a la gestión del presente periodo del operador Nacional, por lo cual firma el presente informe en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de mayo de 2022



CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO
Coordinador Nacional de Emprendimiento
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020
