ANEXO TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (AT)	**Fecha**	Abril de 2022
ÁREA SOLICITANTE:	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	

1. OBJETO DEL BIEN O SERVICIO

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, social y legal) de la ejecución de las obras para los mejoramientos de vivienda rural priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat.

2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC, V.14.080)

La obra objeto del presente proceso de selección esta codificada en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
77101800	Auditoría ambiental
80101500	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80101600	Gerencia de proyectos
80111500	Desarrollo de recursos humanos
80121700	Servicios de responsabilidad civil
81101500	Ingeniería civil y arquitectura
80111618	Servicios temporales de construcción
84111600	Servicios de auditoría
93141500	Desarrollo y servicios sociales

3. NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien)

La INTERVENTORÍA debe hacer la revisión de las disposiciones legales para la verificación de su respectivo cumplimiento en el desarrollo de los procesos de mejoramiento habitacional rural a cargo del CONTRATISTA de obra. De igual manera, debe realizar la orientación y acompañamiento al CONTRATISTA de obra en los aspectos que se requieran. Se contempla la siguiente normatividad legal colombiana de orden distrital y nacional, así como normas técnicas relacionadas con los sectores de infraestructura, vivienda y ambiental.

3.1. Normatividad Legal de Orden Distrital y Nacional

- Ley 367 de 1997, "*Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones*". Congreso de la República de Colombia.

- Decreto Nacional 1538 de 2005, "*Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997"*. Presidencia de la República de Colombia.

- Ley 400 de 1997, "*Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes*". Congreso de la República de Colombia.

- Resolución 0536 del 19 de Octubre de 2020 "*Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.10.1.1.1.1; 2.1.10.1.1.4.3; 2.1.10.1.1.4.6 y 2.1.10.1.1.5.1 del Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015*"

- Resolución 0410 del 02 de agosto de 2021 "*Por la cual se adopta el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural- PNVISR en el marco de la Política Publica de Vivienda de Interés Social Rural*"

- Resolución 4100 de 2004, "*Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional*". Ministerio de Transporte.

- Resolución 180398 de 2004, "*Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones*". Ministerio de Minas y Energía; demás normas relacionadas que la modifiquen.

- Resolución 1409 de 2012, "*Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas*". Ministerio del Trabajo.

- Resolución 0012335 de 2012, "*Por la cual se reglamenta el registro de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada y se dictan otras disposiciones*". Ministerio de Transporte.

- Decreto 1443 de 2014, "*Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)*". Presidencia de la República de Colombia.

- Decreto 1072 de 2015, "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*". Presidencia de la República de Colombia.

- Decreto Nacional 1285 de 2015, "*Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de construcción sostenible para edificaciones*". Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

- Decreto Distrital 613 de 2015, "*Por el cual se adopta un esquema de incentivos para construcciones nuevas que adopten medidas de ecourbanismo y construcción sostenible aplicables a viviendas de interés social (VIS) e interés prioritario (VIP) y se dictan otras disposiciones*". Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

- Resolución 0312 de 2019, "*Por el cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"*. Ministerio del Trabajo.

- Acuerdo Distrital 761 de 2020, "*Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI*". Concejo de Bogotá, D. C.

- Decreto Distrital 145 de 2021, "*Por el cual se adoptan los lineamientos para la promoción, generación y acceso a soluciones habitacionales y se dictan otras disposiciones*". Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

- Resolución 586 de 2021, "*Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento, asignación y ejecución de subsidios de vivienda en las modalidades de vivienda progresiva, habitabilidad y vivienda rural en sus diferentes tipos de intervención según los componentes del subsidio*". Secretaría Distrital del Hábitat.

- Resolución 770 de 2021, "*Por medio de la cual se modifica la Resolución 586 de 2021 Por la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento, asignación y ejecución de subsidios de vivienda en las modalidades de vivienda progresiva, habitabilidad y vivienda rural en sus diferentes tipos de intervención según los componentes del subsidio*". Secretaría Distrital del Hábitat.

- DOCUMENTO TÉCNICO DE PARAMETRIZACIÓN Subsidio Familiar de Vivienda Rural - SFVR

  Vivienda Nueva de Interés Social Rural y Mejoramientos de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

- Decreto 1071 de 2015.

- Decreto 555 de 2021, "*Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C.*". Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000, 2000.

- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - Norma NSR-10, 2010.

- Manual de presentación de proyectos del Consejo Profesional de Arquitectura Y Profesiones Auxiliares, 2017.

- Resolución 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.

- Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos artículos del Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 y resolución 40908 de decide la permanencia del reglamento de acuerdo a lo estipulado en el Diario Oficial.

- Código Eléctrico Colombiano - NTC 2050.

- NTC ISO 9001:2015.

- NTC ISO 45001:2018.

- NTC 6304: accesibilidad de las personas al medio físico.

- Resolución 1138 de 2013, "*Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras determinaciones*". Secretaría Distrital de Ambiente.

- Decreto 586 de 2015, "*Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.*". Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

- Decreto 1076 de 2015, "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*". Presidencia de la República de Colombia.

- Resolución 330 de 2017, "*Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009*". Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

- Resolución 472 de 2017, "*Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones*". Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Resolución 2184 de 2019, "*Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones".* Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Resolución 076 de 2021, "*Por la cual se adopta el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico rural y se dictan otras disposiciones*". Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

- Resolución 1257 de 2021, "*Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones*". Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Las demás normas legales vigentes aplicables.

4. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

4.1. Alcance

La contratación tiene como propósito adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social y legal para ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de mejoramiento habitacional rural, en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

La INTERVENTORÍA verificará que el contratista garantice que las intervenciones a realizar en las viviendas, cada una no supere los 22 SMLMV[1] (más 3 SMLMV adicionales que corresponden a subsidio de sostenibilidad). En todo caso, el CONTRATISTA de obra debe garantizar que está en la capacidad de ejecutar

[1] Decreto 145 de 2021

el número de viviendas entregadas por la Secretaría Distrital del Hábitat. El tiempo empezará a contar a partir de la entrega de estos conforme a la programación descrita en el presente documento y deberá garantizar el personal mínimo.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la magnitud del proyecto para realizar la interventoría, y atendiendo la necesidad de la entidad para culminar la implementación en el menor tiempo posible, la Secretaría Distrital del Hábitat establece adelantar el presente proceso con un presupuesto de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($815.948.757) M/CTE este valor incluye I.V.A. y demás impuestos de ley, así como los costos derivados de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, de esta manera la entidad reduce el riesgo para asegurar la ejecución del contrato.

Es de precisar que la implementación de los mejoramientos se ejecutará en la zona rural de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Usme. La Secretaría Distrital del Hábitat ha priorizado ciento ochenta (180) hogares para ser beneficiarios en este territorio.

Para el desarrollo del objeto contractual se adelantará la asignación de ciento ochenta (180) subsidios de vivienda rural bajo la modalidad de mejoramiento habitacional. Esto implica, como se menciona en el numeral 3.10 del artículo 3 del Decreto 145 de 2021, *"corregir las condiciones de habitabilidad y/o salubridad de una edificación, de propiedad o en posesión del hogar beneficiario, y puede comprender intervenciones a cualquiera de los siguientes elementos de la vivienda, tales como, iluminación, ventilación, protección contra la intemperie y saneamiento básico, y en general a aquellos cuya deficiencia podría afectar la salud física y sicológica de sus habitantes. Las intervenciones procurarán la instalación o adecuación de elementos para la implementación de prácticas sostenibles conforme a la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible 2. Tratándose de hogares con integrantes en situación de discapacidad la solución de mejoramiento habitacional podrá contemplar la realización de adecuaciones físicas para acceder a la edificación de la respectiva vivienda o para su uso."*

La Secretaría Distrital del Hábitat entregará al CONTRATISTA los expedientes de cada hogar beneficiario con mínimo la siguiente información:

- Plano de georreferenciación del predio viabilizado.
- Levantamiento esquemático de la vivienda.
- Detalle arquitectónico del área a intervenir (planimetría).
- Ficha de priorización de las intervenciones de acuerdo con la modalidad del mejoramiento, con su respectivo registro fotográfico.
- Caracterización social del núcleo familiar que contenga como mínimo el número de personas que conforman el hogar.

El monto máximo asignado por hogar beneficiario es de 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de 2022 y con este valor el CONTRATISTA de obra, deberá cubrir los costos directos e indirectos de la intervención a desarrollar en cada hogar.

En todo caso, el contratista de interventoría debe garantizar que está en la capacidad de adelantar la interventoría simultáneamente a la ejecución de la totalidad de las fases de cada contrato en las viviendas entregadas por SDHT a cada contratista de obra.

[2] Decreto 566 de 2015


Conforme lo anterior y teniendo en cuenta la magnitud del proyecto a realizar y atendiendo la necesidad de la entidad para culminar la implementación el menor tiempo posible, la SDHT establece adelantar el proceso de obra con un presupuesto a monto agotable. Este valor incluye costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio y demás impuestos de ley, así como los costos derivados de la implementación del Protocolo de Bioseguridad. De esta manera la entidad mitiga el riesgo de concentrar la ejecución en un solo contratista de obra, por cuanto contar con dos grupos simplifica la logística y el tiempo de ejecución se logra adelantar en el tiempo estimado por la entidad.

Es de precisar que la implementación de los mejoramientos se ejecutará en los territorios descritos anteriormente, no obstante, la entidad podrá incluir más mejoramientos en cualquiera de los demás territorios que sean objeto de estructuración según sea la necesidad y hasta agotar el monto de cada contrato.

4.2. Localización


Los territorios en los cuales se desarrollarán las intervenciones de mejoramientos habitacionales rurales y donde la INTERVENTORÍA llevará a cabo el desarrollo de actividades, se localizan en el suelo rural de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Usme. En el siguiente mapa se relacionan las localidades descritas, donde el color verde corresponde a suelo rural, el color rosa a suelo de expansión y el color gris a suelo urbano.

Ilustración 1 Localización general

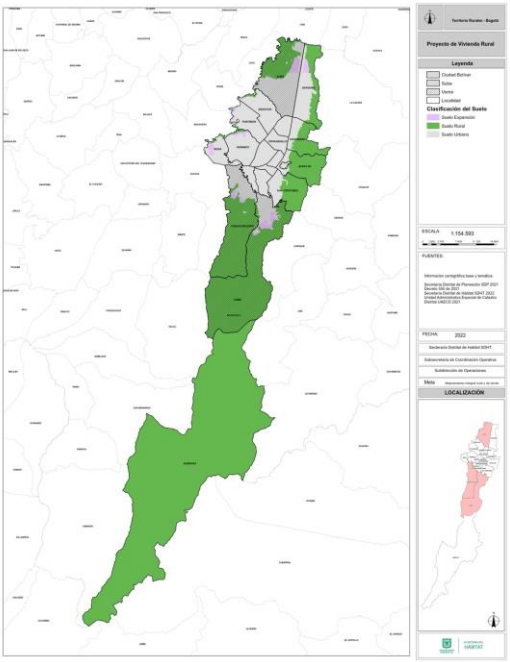


Fuente: Subdirección de Operaciones 2022

Ilustración 2 Suelo rural Suba

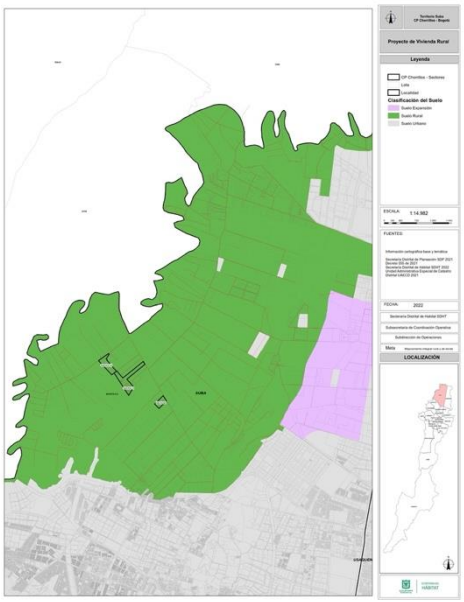


Fuente: Subdirección de Operaciones 2022

Ilustración 3 Suelo rural Ciudad Bolívar

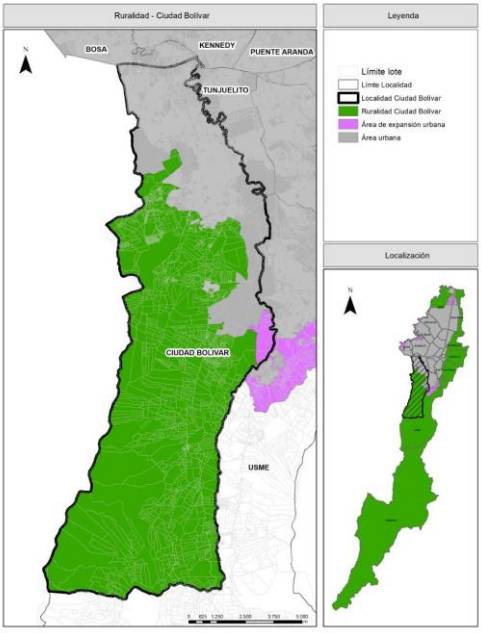

Fuente: Subdirección de Operaciones 2022

Ilustración 4 Suelo rural Usme

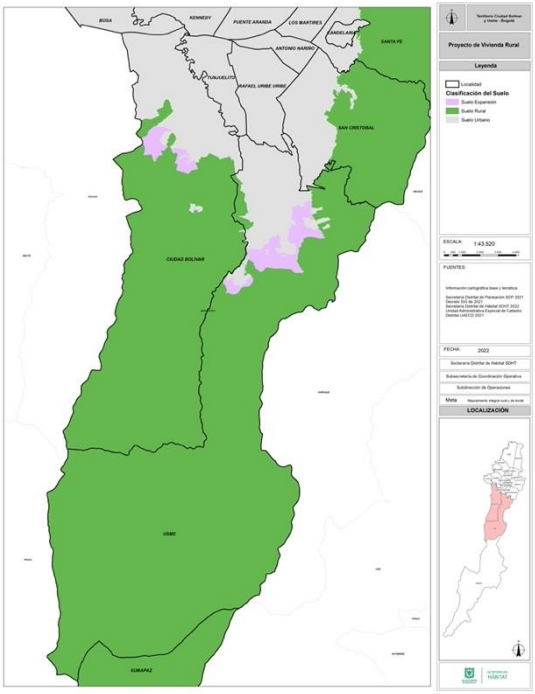

Fuente: Subdirección de Operaciones 2022

4.3. Etapas del contrato

A continuación, se realiza la descripción de las etapas definidas para el desarrollo del objeto contractual de la interventoría:

- Etapa 1 – Pre construcción / Validación (un mes equivalente a 30 días): En esta fase el CONTRATISTA deberá realizar las visitas a cada uno de los hogares beneficiados y verificar las condiciones en las que se encuentra cada una de las viviendas, así como planear una priorización de intervenciones a desarrollar.
- Etapa 2 – Ejecución de obras (5 meses): Durante este tiempo el CONTRATISTA realizará y entregará las intervenciones aprobadas por la INTERVENTORÍA en cada una de las viviendas beneficiadas.
- Etapa 3 – Cierre y liquidación (1 mes): se hará la revisión y aprobación de los documentos requeridos para la liquidación del contrato de obra y de interventoría.

El plazo total para la ejecución del presente contrato de INTERVENTORÍA es de siete (7) meses

5. COMPONENTE TÉCNICO

Para realizar la interventoría a la ejecución del contrato de obra se han considerado tres fases:

5.1. Fase de Pre construcción[3] / Validación: Corresponde a la fase en donde la INTERVENTORÍA realizará el acompañamiento pertinente a cada una de las viviendas, con el fin de validar la información entregada por la SDHT y verificar el estado de cada una de las viviendas junto con el CONTRATISTA de obra. Esta fase inicia al día siguiente de la suscripción del Acta de Iniciación de la Ejecución del Contrato, y terminará cuando se verifique el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos. Se aclara que para establecer el tiempo de duración ésta fase, la sumatoria de los días no deberá superar los 30 días calendario y por tanto, puede desarrollarse sin continuidad hasta dos meses antes de la fecha final del contrato.

Una vez suscrita el acta de inicio, la INTERVENTORÍA deberá citar al CONTRATISTA y a la SDHT a una reunión de apertura del contrato en la cual se socialicen los respectivos equipos de trabajo, obligaciones y en la cual se realizará la entrega de los expedientes de cada vivienda.

Teniendo en cuenta que las familias beneficiadas pueden haber adelantado mejoras a sus viviendas con posterioridad a la estructuración, esta situación modifica el alcance inicialmente previsto para atención en cada una de las viviendas, por lo que se requiere que la interventoría acompañe y apruebe la validación de la información realizada por el contratista de obra para determinar de esta manera el alcance definitivo.

En ese orden de ideas, la INTERVENTORÍA acompañará al CONTRATISTA de obra durante la validación de la información vivienda a vivienda, la cual revisará, realizará las recomendaciones pertinentes y aprobará la consolidación de la información definitiva y este será quien de fé de las cantidades de obra finales, realizadas por el contratista y aprobadas por este.

Durante las visitas técnicas de validación vivienda a vivienda, la INTERVENTORÍA deberá realizar la labor de acompañamiento y verificación del alcance inicial entregado por la SDHT y la validación y aprobación del alcance definitivo por cada vivienda conforme a lo solicitado en el anexo técnico de obra.

En esta fase, la INTERVENTORÍA deberá revisar y aprobar el plan de ejecución entregado por el contratista de obra, que cual debe contener como mínimo lo siguiente:

a. Cronograma de ejecución general en Microsoft Project o similar y en PDF, indicando la metodología a aplicar para el control de la programación y su flujo de caja, el cual debe estar conformado por cada vivienda, indicando el tiempo de ejecución general de las obras y por cada vivienda.

Nota: Será responsabilidad del CONTRATISTA de obra e INTERVENTORÍA cumplir con los plazos pactados para la entrega de la documentación completa revisada y aprobada, se deberá prever los tiempos de revisión y aprobación dentro de la programación de la fase 1 (validación y apropiación) entregada por el contratista de obra y así no generar demoras para el inicio de la fase 2 (ejecución de obras), el interventor podrá revisar y aprobar avances parciales de validación con el fin de avanzar con la ejecución del contrato.

Nota 1: La INTERVENTORÍA deberá revisar con el CONTRATISTA de obra, la asignación de un espacio en el Punto de Atención al Ciudadano, en donde desarrollará actividades inherentes a la naturaleza del contrato, así como acompañamiento al CONTRATISTA de obra para la atención de ciudadanía y demás requerimientos que la Secretaría Distrital del Hábitat disponga.

---

[3] Consiste en realizar las actividades de diagnóstico, estudios, diseños, presupuesto y viabilización del proyecto de intervención. Resolución 0536 de 2020, Artículo 7 Definiciones, Artículo 54.

En todo caso, el Contratista deberá validar en cualquier momento la información entregada por parte del equipo de estructuración del proyecto en cada uno de los expedientes y ajustarla a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto ejecutar de mejor manera el contrato derivado del presente proceso, cumpliendo con lo establecido en todos los documentos anexos al presente proceso. El Contratista dará noticia al Interventor, de las validaciones o modificaciones, entregándole al interventor los documentos técnicos que correspondan como son: informe de validación, presupuesto ajustado y cronograma de ejecución. Por lo anterior, la INTERVENTORÍA deberá aprobar los informes de validación de cada expediente.

Teniendo en cuenta que las familias beneficiadas pueden haber adelantado mejoras a sus viviendas con posterioridad a la etapa de estructuración, durante la fase de validación se podrá ajustar el alcance inicialmente previsto en cada una de las unidades de vivienda verificadas por parte de la SDHT, de tal modo que se requerirá adelantar la actualización de la información por parte del CONTRATISTA de obra para determinar el alcance final a realizar en cada una de las viviendas. En ese sentido, la INTERVENTORIA velará por asegurar el cumlimiento del objeto del contrato y mediará con los hogares y contratista de obra las intervenciones a priorizar.

En particular, durante la Etapa de Pre construcción se ejecutarán las siguientes actividades:

1. Verificar y diagnosticar las condiciones de la vivienda objeto de mejoramiento y del predio donde se encuentra
2. Corroborar el alcance de las intervenciones propuestas
3. Identificar y priorizar los componentes de la vivienda que deben ser objeto del mejoramiento para establecer las actividades de obra que se van a ejecutar
4. Realizar las mediciones pertinentes
5. Determinar las cantidades de obra a tener en cuenta por unidad de vivienda
6. Elaborar el presupuesto por unidad de vivienda sin superar el valor máximo establecido por subsidio. Igualmente, deberá contemplar la totalidad de costos directos e indirectos, incluyendo costos de transporte de materiales, de estudios y diseños y los que correspondan al proceso de acompañamiento social.
7. En el caso de requerir costos reembolsables el contratista deberá informar a la interventoría y a la supervisión del contrato previo a su ejecución, quienes deberán aprobar anticipadamente tal actividad sin afectar el valor de contrato, ni el valor máximo por vivienda.
8. Elaboración del informe de validación por cada expediente incluyendo planos de detalle por parte del contratista (en los casos que aplique), presupuesto y cronograma de ejecución. Dichos informes deberán reflejar la consistencia, veracidad, y modificación de la información suministrada en cada expediente por parte de los postulantes. Así mismo, presentarán alternativas de intervención a las viviendas rurales cuando se presente alguna variación observada en la visita de validación, respecto a la información consignada en el expediente inicial. En situaciones radicales de cambio de las condiciones iniciales de las viviendas, el contratista deberá elaborar el informe de validación, evidenciando la imposibilidad de continuar con la ejecución de las obras, el cual, será presentado a la Interventoría y a la Supervisión del contrato para que en comité de obra se determinen los pasos a seguir[4].

[4] Si en esta etapa llegare a determinarse que el predio para la construcción del mejoramiento no cumple con los requisitos señalados, deberá liberarse el cupo habilitado y asignarlo a otro hogar. Resolución 0536 de 2020, Artículo 54 Parágrafo 2

9. En los casos que aplique, el contratista deberá evaluar los módulos tipo[5] para la realización del mejoramiento y verificar el que más se adapte a cada caso.

10. Movilización del equipo y del personal necesarios por el contratista para iniciar la etapa de construcción: De conformidad con los documentos del proceso, el contratista deberá tener a su disposición tanto el equipo como el personal, los materiales y demás insumos que requiera para la iniciación de la etapa de construcción dentro del plazo fijado para el efecto.

11. Presentación de los informes de validación por cada expediente al Interventor. Esta actividad deberá ser realizada dentro del plazo máximo establecido por la Entidad para el efecto, so pena de incurrir en la sanción correspondiente. Aunque el Interventor tiene la obligación frente a la SDHT (no frente al Contratista), de analizar dichos informes y advertir y comunicar al Contratista, antes del inicio de la Etapa de Construcción, cualquier inconsistencia evidenciada en los informes y la posibilidad de obtener los resultados requeridos en el Contrato, sus apéndices y en las Especificaciones Técnicas del proceso, esta comunicación del Interventor no servirá de excusa al Contratista para el no cumplimiento de los resultados requeridos en el Contrato. En caso de desacuerdo respecto a los informes de validación del Contratista permiten o no conseguir los resultados exigidos en el Contrato, sus apéndices y los contenidos en las Especificaciones del proceso, se asignará la competencia para dirimir dicha controversia a cualquiera de los métodos alternativos de solución de conflictos que se prevean en el contrato.

12. Informe de excedentes financieros, el cual deberá ser aprobadopor parte de la INTERVENTORIA

Las anteriores actividades se listan a título enunciativo, existiendo la posibilidad de añadir otras que sean requeridas de manera previa a la ejecución de la etapa de construcción. Los informes de validación presentados por el contratista deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y garantizar en su integridad los resultados plasmados en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad. Una vez culminada la etapa de Pre construcción iniciará la etapa de construcción. Durante ésta se deberán ejecutar las obras, de acuerdo con los expedientes actualizados por el contratista y los resultados establecidos por la entidad en las Especificaciones Técnicas de Construcción y en el presupuestador.

Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Contratista durante la Etapa de Construcción, serán a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos en el proceso de selección. El contratista, no podrá superar el valor máximo establecido por cada vivienda de 25 SMLMV. Adicionalmente, el número de validaciones realizadas por el contratista en la etapa de pre construcción podrá ser superior y deferir en relación del numero de viviendas rurales mejoradas. La validación de cada vivienda se considera un paso importante parte integral del contrato derivado del presente proceso, previo a la construcción y ejecución efectiva de las obras. Igualmente, se aclara que el número total de viviendas mejoradas puede variar dependiendo de los excedentes financieros.

La INTERVENTORIA deberá acompañar las visitas a cada uno de los hogares beneficiados y verificar las condiciones en las que se encuentra cada una de las viviendas, así como planear una priorización de intervenciones a desarrollar. Durante la ejecución de esta etapa el contratista deberá realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de las obras de construcción y aquellas obras complementarias, de acuerdo con lo establecido en el contrato, así como en las especificaciones de construcción que se establezcan en el proceso de contratación.

[5] Módulos tipo definidos en el documento de parametrización de vivienda rural ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Mejoramiento de vivienda rural.

Para efectos de realizar la priorización de las obras y ajuste al presupuesto de cada vivienda rural a mejorar se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones (Mejoramiento habitacional rural 22 SMLMV):

I. **Tipos de proyecto de mejoramiento de vivienda rural**. Para la modalidad de mejoramiento de vivienda rural se definen los siguientes tipos de proyectos:

   a. **Locativo:** mejoramiento habitacional de la infraestructura existente. Para éste tipo de intervención se priorizarán las obras en primera instancia mejorando condiciones de salubridad y saneamiento básico[6], seguidas de las condiciones de habitabilidad (cerramientos) propiamente dichas y por último las relacionadas al confort y bienestar (acabados).

   b. **Modular[7]:** módulos independientes de ampliación o complemento a la infraestructura existente. Acorde a los módulos complementarios definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tal como se establece en su Documento de Parametrización. (Módulo habitación - habitación, cocina – habitación, baño – cocina, baño – habitación)

II. En los casos en donde se priorice adicionalmente tres (3) SMMLV como parte del subsidio de Sostenibilidad para incentivar la implementación de prácticas sostenibles, la priorización de obras se realizará acorde a lo establecido por la Secretaría Distrital del Hábitat. En ese sentido, se entiende como implementación de prácticas sostenibles aquellas que propenden por el uso eficiente de los recursos. A continuación, se refleja la priorización de obras con el siguiente orden:

   a. Uso eficiente del agua: Instalación de ducha ahorradora, instalación de llaves ahorradoras, instalación de sanitario ahorrador, recolección de aguas lluvias para reuso, etc.
   b. Uso eficiente de energía eléctrica: Arreglo de la red eléctrica para evitar daños por sobrecarga, instalación de lámparas led, instalación de tomas de seguridad en puntos que sean fundamentales como baños y cocina, apertura de ventanas si es posible para promover la buena iluminación natural.
   c. Uso eficiente del aire: Promover la buena ventilación y la recirculación del aire.
   d. Confort: Instalación de tejas termo acústicas, instalación de cielo raso en pvc, aislamientos térmicos, aplicación de pinturas ecológicas, entre otras.

---

[6] Según el Decreto 1071 de 2015 ***"Vivienda Saludable Rural***. *Acción que se refiere a aquellas obras que tienen como 'finalidad mantener vivienda rural en debidas condiciones sanitarias, sin afectar la estructura portante o de soporte existente, sus características funcionales, culturales ni volumétricas. La condición para su desarrollo es cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente y la disponibilidad de una fuente mejorada de agua por parte de solución de vivienda existente.*
Esta acción está asociada a dos o de las siguientes actividades:
1.1. Habilitación o instalación de baños adecuados, redes hidráulicas y evacuación adecuada tradicional o alterativa de aguas sanitarias.
1.2. Habilitación o instalación lavadero y cocina adecuada, redes hidráulicas y evacuación adecuada tradicional o alternativa aguas residuales.
1.3. Mantenimiento, sustitución, restitución o mejoramiento los materiales pisos, cielorrasos, enchapes, cubiertas parciales y pintura en general.
1.4. Sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, y sanitarias.
1.5. Sustitución, mejoramiento o ampliación de redes instalaciones eléctricas.
1.6. Sustitución de en tierra o en materiales precarios, conforme a lo definido en el manual operativo.
1.7. Sustitución o mejoramiento por vetustez de redes eléctricas, de acueducto, de redes secundarias y acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado, únicamente para viviendas rurales agrupadas.

[7] DOCUMENTO TÉCNICO DE PARAMETRIZACIÓN Subsidio Familiar de Vivienda Rural - SFVR Vivienda Nueva de Interés Social Rural y Mejoramientos de Vivienda, Ministerio de vivienda Ciudad y Territorio 2021.

Nota: En cualquier caso, las obras resultantes de la ejecución del contrato derivado del presente proceso deberán ser funcionales, acordes al entorno rural y los parámetros técnicos establecidos en la normatividad vigente.

El contratista de obra podrá iniciar la ejecución de las obras de los mejoramientos de vivienda ya validadas y aprobadas por la interventoría, previendo que mínimo 30 días antes de la terminación del contrato el 100% de las viviendas ya deben estar validadas y aprobadas por la interventoría.

En todo caso, el contratista de obra deberá justificar a solicitud de la SDHT o de la interventoría en los casos que se requiera, las modificaciones y/o ajustes realizados durante la validación en las viviendas para su inicio de ejecución, de lo contrario se mantendrá la estructuración inicial y las obras ejecutadas sin autorización correrán por cuenta y riesgo del contratista de obra sin afectar el valor del presupuesto de la vivienda.

En esta fase, el contratista de obra deberá entregar a la interventoría un plan de ejecuciónque incluya entre otras cosas: Cronograma de ejecución general teniendo en cuenta planeación y programación de actividades en Microsoft Project o similar y en PDF, el cual debe estar conformado por cada vivienda que conforman el proyecto, indicando el tiempo de ejecución por cada vivienda y el valor a ejecutar en cada una de estas. Dicho cronograma deberá ser presentado dentro de los primeros cinco (5) días calendario posteriores a la firma del acta de inicio.

LA INTERVENTORÍA aprobará el cronograma y programación de actividades, en el cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.

Se deberá realizar la programación para cada una de las viviendas a intervenir dentro de un mismo diagrama de GANTT.

Dentro del Cronograma que deberá presentar el CONTRATISTA es importante resaltar que deberá contener:

1. Definir las actividades: Identificar cada una de las acciones que se deben ejecutar para la ejecución del contrato desde la validación hasta la ejecución de cada vivienda y en su conjunto la totalidad de la obra.

2. Secuenciar las actividades: Analizar qué tipo de dependencias y precedencias existe entre las actividades de obra que derive cada mejoramiento habitacional.

3. Estimar la duración de las actividades: Calcular el tiempo necesario para Completar cada actividad, teniendo en cuenta factores constructivos, los cuales presentarán variables, respecto a necesidad del hogar.
   Desarrollar el cronograma: En el marco del plazo establecido, el cual deberá integrar de manera clara y tacita en un diagrama Gantt en comento la secuencia, establecer parámetros de entrega, cumpliendo así con cada uno de los requisitos de recursos, restricciones y duración de actividades para cada vivienda según se establezca, definiendo fecha de inicio y fecha de terminación, partiendo de la característica principal que serán 180 mejoramientos habitacionales, que representan atributos y modalidades constructivas cambiantes.

4. Por último y de manera conjunta con La INTERVENTORÍA, El CONTRATISTA deberá controlar el cronograma, monitoreando continuamente la ruta crítica y estados de ejecución de avance físico de la obra por cada una de las viviendas y el estado general del contrato, así como gestionar actualizaciones de contingencia o cambios en el cronograma (Previa aprobación de la Interventoría y Visto Bueno de la Supervisión).

A continuación se relaciona el resumen esquemático relacionado con la ejecución de la fase 1 y sus evidencias mínimas a entregar para revisión.

Producto	Acciones	Evidencias
Validación de cada vivienda	Acompañar y aprobar el estado de cada una de las viviendas entregadas por la SDHT.	Informe de validación y aprobación que debe contener: • Número de viviendas que conforman el proyecto. • Presupuesto y cantidades de obra finales a ejecutar.

5.2. Fase de ejecución de obras: la INTERVENTORÍA realizará el respectivo control y vigilancia sobre la ejecución a las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda que conforman el proyecto.

Cumplida la etapa de pre construcción / validación de la información, y una vez aprobados todos los documentos previos para el inicio de la fase 2 (ejecución de obra), la INTERVENTORÍA procederá a realizar las actividades inherentes a la supervisión para la ejecución de los mejoramientos.

Nota: Se aclara que el archivo denominado presupuestador que incluye insumos y análisis de precios unitarios, entre otros; así como las especificaciones técnicas, hacen parte integral del presente contrato. En caso de ser necesario, se deberá consultar dichos documentos para dirimir inquietudes que surjan durante la ejecución del contrato.

En el marco de las actividades técnicas a adelantar para esta fase, la INTERVENTORÍA deberá realizar un acompañamiento técnico, administrativo, logístico y de control presupuestal, tal y como se describe a continuación:

Control Técnico

- Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo planos, diseños, especificaciones, etc.).
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.
- Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la SDHT las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.
- Solicitar que la SDHT haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes.
- Supervisar las actividades de mejoramiento adelantadas en cada una de las unidades de vivienda.
- Las demás que a criterio propio estime el contratista de interventoría y/o la SDHT para lograr el cumplimiento del objeto del contrato de obra.

Control Administrativo

- Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
- Coordinar las instancias internas de la SDHT relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, aprobación polizas plataforma SECOP, impuestos, y documentos para la celebración del contrato, etc.

- Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control o la SDHT.
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Las demás que a criterio propio estime el contratista de interventoría y/o la SDHT para lograr el cumplimiento del objeto del contrato de obra.

Coordinación y seguimiento Presupuestal

- Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de cada una de las viviendas terminadas.
- Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.
- Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato.
- Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.
- Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.
- Las demás que a criterio propio estime el contratista de interventoría y/o la SDHT para lograr el cumplimiento del objeto del contrato de obra.

Control Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo

La INTERVENTORÍA debe hacer control y registro documental del seguimiento y acompañamiento que realiza al CONTRATISTA de obra en la gestión ambiental y el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizará, entre otras, las siguientes actividades:

- Revisar los documentos del Plan de Gestión Ambiental de obra y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentados por el CONTRATISTA de obra en un plazo máximo de dos (2) semanas a partir de la firma de acta de inicio, verificando los lineamientos estipulados para cada componente en el anexo técnico del proceso contractual de ejecución de obras. En esta revisión, la cual tiene plazo de una (1) semana, debe realizar las observaciones correspondientes en caso de ser necesario, para proceder a la posterior revisión y aprobación, que no excederá el tiempo de una (1) semana. Los dos documentos deben estar aprobados y socializados en comité antes de iniciar la fase de ejecución de obras.
- Prestar apoyo al CONTRATISTA de obra en la orientación requerida y en la implementación del Plan de Gestión Ambiental de obra y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Verificar el estado estructural, estético y funcional de los materiales de construcción.
- Acompañar y/o verificar los procesos de disposición de residuos sólidos, residuos de construcción y demolición y demás relacionados.
- Prestar apoyo en la gestión, solicitudes y/o reportes ante las autoridades ambientales y/o entes de control.
- Coordinar actividades de sensibilización para el óptimo comportamiento y desempeño ambiental de las obras, así como para la prevención de cualquier situación de riesgo en obra.

- Documentar todo proceso de revisión de información, acompañamiento y ejecución de actividades.

Control de Calidad

- Elaborar el Plan de Gestión de Calidad propio y aprobarlo, en un plazo máximo de tres (3) semanas a partir del acta de inicio.
- Revisar el Plan de Gestión de Calidad presentado por el CONTRATISTA de obra y emitir las correspondientes observaciones o aprobación, en donde la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA debe darse máximo a la tercera (3) semana posterior a la firma del acta de inicio.
- Verificar la aplicación de lineamientos establecidos en las NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 y/o 45001:2018, en los casos que aplique.
- Implementar el Plan de Gestión de Calidad en los procesos administrativos y de campo, en los aspectos que se requiera aplicar.
- Documentar todo proceso de revisión de información, acompañamiento y ejecución de actividades.

Control Implementación Protocolo de Bioseguridad

- Revisar y aprobar el Protocolo entregado por parte del contratista de obra, previo al inicio de la fase 1 de validación, en ningún caso se podrá ingresar a las viviendas sin la implementación del Protocolo.
- Revisar y aprobar el presupuesto de implementación del Protocolo de Bioseguridad General y por cada vivienda conforme a lo indicado en el Anexo Técnico de Obra y a la normatividad vigente.
- Revisar y verificar la implementación del Protocolo de Bioseguridad en cada una de las viviendas intervenidas conforme a las cantidades y actividades descritas en el mismo.
- Hacer seguimiento al uso eficiente de los diferentes elementos de protección personal de bioseguridad y a la correcta disposición de los residuos generados,
- Consolidar las evidencias que den fe de la implementación del protocolo en carpeta independiente por cada vivienda.

Bitácora de Obra

Igualmente, el interventor deberá garantizar que el contratista de obra cuente con una bitácora por vivienda, que en ella se registre las actividades adelantadas desde el día uno (1) de ejecución hasta su finalización. Se debe garantizar que en la misma se consigne la entrega de los materiales a la vivienda, las actividades realizadas, imprevistos, observaciones, con el fin de llevar el registro de la ejecución de cada vivienda, esta deberá contener reportes escritos por parte del contratista de obra, el interventor y el beneficiario, si lo desea, deberá mantenerse protegida contra el daño, deterioro o pérdida. En la bitácora como mínimo debe incluir:

- Información sobre actividades de obra.
- Listado de materiales disponibles en obra.
- Anomalías o incidencias presentadas que afecten el normal desarrollo del contrato de obra.
- Observaciones y aclaraciones presentadas durante la ejecución.
- Recomendaciones y/o solicitudes del interventor, así como las demás que se estimen convenientes durante la ejecución de las obras.
- Solicitudes de modificaciones de obra o presupuesto realizadas por el beneficiario.

A continuación, se señala el resumen esquemático relacionado con la ejecución de la fase 2 y sus evidencias mínimas a entregar para revisión y aprobación.

Producto	Acciones	Evidencias
Ejecución obras	1. Ejecutar las obras de mejoramiento en cada vivienda. 2. Realizar las actas de inicio por el beneficiario y la interventoría. 3. Suministrar bitácora de obra por vivienda. 2. Realizar las actas de recibo a satisfacción por el beneficiario y la interventoría.	- Número de actas de inicio de obras por vivienda. - Bitácora de obra para cada vivienda. - Número de actas de recibo a satisfacción por vivienda. - Matriz con las actividades clasificadas

NOTA: La SDHT suministrará al contratista seleccionado el formato Excel Matriz para el diligenciamiento de las actividades clasificadas e información de cada vivienda ejecutada (valor final por vivienda) e información que refleje practicas sostenibles que hayan sido ejecutadas dentro de los procesos de mejoramiento habitacional.

El CONTRATISTA realizará entrega de las obras ejecutadas recibidas a satisfacción por el beneficiario y la INTERVENTORÍA máximo quince (15) días calendario después de la finalización de la intervención de cada vivienda.

Igualmente, para la liquidación del contrato, deberá hacer entrega a la INTERVENTORÍA de la documentación actualizada que surja durante la ejecución del contrato, en original por cada vivienda terminada de cada uno de los mejoramientos de vivienda ejecutados.

Nota 1: En el caso en que alguno de los beneficiarios se niegue a firmar el acta de recibo a satisfacción y liquidación, esta podrá ser recibida únicamente por parte de la INTERVENTORÍA dejando la anotación respectiva de la inconformidad presentada por el beneficiario, siempre y cuando esta certifique que las obras que se ejecutaron cumplen con las especificaciones técnicas y cantidades de obra previamente aprobadas, ejecutadas y facturadas.

5.3 Fase de cierre de obras: la INTERVENTORÍA deberá revisar y aprobar la entrega de las obras ejecutadas por el contratista de obra, recibidas a satisfacción por el beneficiario.

Para la ejecución de esta fase, la INTERVENTORÍA deberá garantizar que se cuente con la totalidad de las actas de entrega a satisfacción debidamente firmadas tanto por el beneficiario como por la interventoría y el contratista de obra. Igualmente, deberá entregar un informe ejecutivo de obra por la totalidad de las viviendas realizadas, en donde se debe consignar el balance general de la ejecución de los mismos.

En esta misma fase, la INTERVENTORÍA deberá hacer entrega del mismo número de expedientes entregados y terminados, alimentado con los documentos originales elaborados durante las dos (2) fases debidamente foliados y actualizado el formato de lista de chequeo.

Producto	Acciones	Evidencias
Entrega actas de finalización de las obras y	1. Recolectar las actas debidamente firmadas por el beneficiario, contratista de obra	- Número de actas firmadas a satisfacción por cada viviendas.

Producto	Acciones	Evidencias
expedientes actualizados.	y la interventoría. 2. Alimentar los expedientes de cada una de las viviendas.	- Número de expedientes debidamente actualiuzados. - Matríz con las actividades clasificadas

Nota 1: En el caso en que alguno de los beneficiarios se niegue a firmar el acta de recibo a satisfacción, esta podrá ser recibida únicamente por parte de la INTERVENTORÍA dejando la anotación respectiva de la inconformidad presentada por el beneficiario, siempre y cuando esta certifique que las obras que se ejecutaron cumplen con las especificaciones técnicas y cantidades de obra contratadas.

De igual manera, la INTERVENTORÍA deberá recopilar, aprobar y remitir toda la documentación exigida para la liquidación del contrato de obra e interventoría.

6. COMPONENTE SOCIAL

La interventoría realizará un plan de seguimiento a la ejecución de la obra con las acciones del componente social en el marco del objeto contractual a la luz de las especificaciones del presente anexo técnico. A continuación, se relaciona las acciones de seguimiento que desde el componente social de la interventoría debe implementar, en las tres fases (3) establecidas:

6.1. Etapa de Validación

Inicialmente la INTERVENTORÍA revisará y aprobará el Plan de Acompañamiento Social presentado por el contratista de obra de acuerdo al alcance del anexo técnico de obra, una vez sean radicados dichos documentos, en los tiempo definidos y construirá su Plan de Gestión Social.

La INTERVENTORÍA deberá revisar, emitir las observaciones que haya lugar y aprobar las estrategias, metodologías, documentos, informes y pautas para dar cumplimiento a los objetivos propuestos de cada una de las fases del objeto contractual para cada grupo de obra asignado.

Un informe mensual de control y seguimiento a la estructuración y ejecución del Plan de Gestión Social, en donde se relacionan todas las actividades y gestión realizadas como interventoría y en conjunto con el contratista de obra. Recopilar todo el registro documental realizado. Este informe debe estar elaborado en su totalidad y disponible para el primer día viernes hábil de cada mes.6.1 Etapa de Validación

Inicialmente la Interventoría revisará y aprobará el Plan de acompañamiento Social presentado por el contratista de obra de acuerdo al alcance del anexo técnico de obra, una vez sean radicados dichos documentos, en los tiempos definidos y construirá su Plan de Gestión Social. Así mismo, la INTERVENTORÍA deberá revisar, emitir las observaciones que haya lugar y aprobar las estrategias, metodologías, documentos, informes y pautas para dar cumplimiento a los objetivos propuestos de cada una de las fases del objeto contractual para cada grupo de obra asignado.

6.1.1 Socialización de la obra a las personas beneficiarias

En el marco de la participación ciudadana, la INTERVENTORÍA verificará previamente a la socialización del proyecto que el contratista planee, organice y programe con las acciones pertinentes para que cada uno de los

beneficiarios del Mejoramiento habitacional rural tenga claro el objetivo del contrato, el alcance y el esquema de ejecución de la obra.

Para esta actividad la INTERVENTORÍA deberá acompañar, apoyar y hacer seguimiento a la reunión que como mínimo el contratista de obra realizará con los beneficiarios, la cual deberá llevarse a cabo dentro de la fase de validación, este deberá garantizar que la totalidad de los beneficiarios fueron informados de la reunión de inicio y presentar los soportes de los asistentes finales.

A partir de la acción adelantada por el CONTRATISTA de obra, a continuación, se mencionan los documentos y actividades que la interventoría deberá revisar, hacer seguimiento y aprobar:

Productos:

- Propuesta metodológica (alistamiento y desarrollo) de la reunión.
- Acta de reunión y listados de asistencia
- Registro fotográfico

Así mismo, la INTERVENTORÍA deberá elaborar los soportes correspondientes que den cuenta del seguimiento, revisión, observaciones, y aprobaciones de los documentos y acciones adelantadas por el contratista de obra.

6.1.2 Caracterización social

Durante la fase de validación los profesionales sociales deberán reconocer para iniciar el proceso de actualización de la caracterización social de cada una de las familias. Verificando la caracterización social de estructuración.

La INTERVENTORÍA realizará el acompañamiento y seguimiento al inicio del proceso de validación y actualización de la caracterización social de cada una de las familias que conforman el proyecto, verificando que esta se realice en el formato correspondiente el cual es proporcionado por la Secretaria Distrital de Hábitat.

Productos:

- Formato de caracterización social por familia beneficiada y sistematización de la información.
- Base de caracterización social revisada y aprobada por la INTERVENTORÍA.

NOTA: El formato de caracterización social aplicado a las familias beneficiadas deberá reposar (original) en el expediente individual de cada mejoramiento de vivienda, por lo cual es importante que este tenga todos los campos diligenciados correctamente, sin enmendaduras, ni tachones y deberá estar firmado por el beneficiario o un integrante del núcleo familiar mayor de edad que se encuentre caracterizado durante la estructuración del mejoramiento de vivienda, el profesional social de obra y social de interventoría.

La SDHT suministrará al CONTRATISTA seleccionado el formato Excel la caracterización social con la que debe ser actualizada, dicho archivo debe mantener en línea (drive) compartido con la entidad y/o enviarlo vía correo al profesional social y líder programa de mejoramiento de vivienda en cada corte de factura y alimentarse a medida que se van validando las viviendas.

6.1.3 Historias de vida de familias beneficiarias

La INTERVENTORÍA, verificará que antes de iniciar las obras, durante y al culminar las mismas, que cada contratista implementé el proceso de historias de vida el cual *"permite reconstruir y reflexionar a partir de la "memoria viva" de los sujetos, el cúmulo de experiencias de la vida de la sociedad" (Aceves, 1999, p.5), siendo una técnica que puede ser usada en el campo de la intervención social"*[8]. Para ello la interventoría velara que el contratista de obra desarrolle las visitas, encuentros, reuniones con las familias que sean necesarias para cumplir con el objetivo.

Durante la fase de validación la INTERVENTORÍA realizara el respectivo seguimiento para que cada contratista de obra identifique las posibles familias que harán parte de las historias de vida.

Se propone que los criterios para seleccionar a las familias pueden ser los siguientes, además de los que el contratista de obra y/o la interventoría consideren:

- Familias donde se evidencie que con las intervenciones de mejoramiento de vivienda tendrán un cambio significativo en la transformación de calidad de vida.
- Mayor Impacto físico del mejoramiento en la intervención de la vivienda.
- Personas que realicen en su vivienda alguna labor social como, por ejemplo, hogares de bienestar social, organización o iniciativa comunitarias y de emprendimiento o que vivan adultos mayores y/o población diferencial (mujeres cabeza de hogar, discapacidad, pertenencia étnica y víctima del conflicto armado) dentro de la vivienda. Identificando nivel de afinidad, carisma e interés participar durante el proceso.

Producto:

- Metodología de Historias de vida aprobada por la Interventoría
- Identificación y selección de 5 familias de viviendas intervenidas.
- Aceptación escrita por parte de algún miembro de la familia mayor de edad, de participar en las historias de vida.

Durante la etapa de ejecución de obras se implementará la metodología de historias de vida, productode esta quedará un registro del antes, durante y después de la ejecución del mejoramiento de vivienda.

6.2 Fase de ejecución de obras:

6.2.1 Caracterización social

La INTERVENTORÍA deberá verificar que, durante esta fase, el contratista de obra culmine con la actualización de la caracterización social de familias y conformación del núcleo familiar por cada vivienda que conforma el proyecto, el cual debe ser incorporado al respectivo expediente.

Producto:

- Documento de la validación o actualización de la caracterización social de las familias
- Formato de caracterización social por familia beneficiada
- Matriz de Caracterización social cualitativa y cuantitativa sistematizada (Entrega de todos los

[8] Extraído de: La Historia de Vida como instrumento de aprendizaje del Trabajo Social. Facultad de Trabajo Social. Universidad Complutense 2012, disponible en: https://eprints.ucm.es/27211/1/La%20historia%20de%20vida%20como%20instrumento%20de%20aprendizaje%20%20del%20Trabajo%20Social.pdf

registros incluyendo renuncias y casos especiales)

6.2.2 Historias de vida de familias beneficiarias

La INTERVENTORÍA, verificará durante la ejecución de las obras que el CONTRATISTA realice las acciones plasmadas en el plan de acompañamiento social y por consiguiente en la metodología de historias de vida, en la cual se evidencie la transformación física y social en la calidad de vida a partir del mejoramiento de la vivienda con las obras ejecutadas.

Producto:

- Soportes evidencien implementación de la metodología de historias de vida (entrevista, encuesta, diario de campo, recopilación fotográfica etc.).
- Registro fotográfico de los espacios intervenidos y UN (1) video por cada historia de vida donde se evidencia el desarrollo metodológico del proceso de historia de vida desde la entrevista, apoyovisual del antes, durante y después de la ejecución de la obra de acuerdo al manual de marca del distrito y recomendaciones audiovisuales.

6.2.3Atención de PQRS

En la ejecución de obra posiblemente se pueden generar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias entendidas así:

- Petición es la solicitud o demanda frente alguna necesidad en general de la obra (presentación de personal de obra, cambio de horarios recolección de escombro, información de posible trasladó de material y aclaración).

- Queja es la reclamación o protesta que se hace a causa de un desacuerdo o inconformidad de la obra (presupuesto de obra, proceso constructivo).

- Reclamo es la acción de protestar cuando no se le atendido las peticiones o quejas realizadas.

- Sugerencias son las acciones de pedir que se tenga en cuenta algún aspecto dentro del proceso de ejecución de obra (cambio de personal de obra, cambio de horarios de atención PAC, etc.).

Se espera en lo posible en un plazo no menor de 5 días realizar la atención oportuna e identificar durante los recorridos de obra situaciones prevenibles de PQRS a fin de mitigar alguna circunstancia que se puedan presentar durante la ejecución de las obras.

Producto: Matriz Seguimiento PQRS - por INTERVENTORÍA (con enlace en drive a la SDHT)

NOTA: La SDHT suministrará al contratista e interventoría seleccionado el formato Excel para el Seguimiento PQRS que debe ser actualizado permanente por parte de la interventoría con respuesta de atención por parte de contratista de obra, dicho archivo debe mantener en línea (drive) compartido con la entidad con permiso de ajuste a profesional social y líder programa de mejoramiento de vivienda a fin que la SDHT refiera las peticiones que llegan por el sistema de correspondencia -SDQS de la entidad y este sea verificado a fin de atender de forma oportuna, entregado en informe semana y mensual sumando todas las PQRS desde el inicio a la fecha.

6.3 Etapa de cierre:

La INTERVENTORÍA deberá revisar y aprobar el *"informe de análisis"* de impacto social entregado por el contratista de obra, el cual debe contener las lecciones aprendidas, observaciones, percepciones, recomendaciones, conclusiones, número de personas beneficiadas y las diferentes actividades y acciones desarrolladas durante la ejecución. En el análisis de las variables de caracterización social y de los casos especiales atendidos durante la ejecución de obras de mejoramiento de vivienda, plan de trabajo realizado con las familias y los aprendizajes y aspectos resueltos, por último, análisis de PQRS Peticiones Quejas Reclamó y Sugerencias surgidas durante el proyecto.

Producto: Aprobación de informe de análisis de impacto social.

De igual manera, en esta etapa la INTERVENTORÍA deberá revisar, aprobar, legalizar y remitir a la SDHT toda la documentación anteriormente descrita, adicionalmente la remisión debe contener el acta de liquidación de contrato de obra e interventoría.

Producto: Acta de liquidación de contratos de obra e interventoría y documentación general de la ejecución de contratos de obra e interventoría

NOTA: La interventoría deberá garantizar la articulación entre los dos componentes, técnico y social en el desarrollo de las diferentes acciones de cada una de las fases.

7. INFORMES DE INTERVENTORÍA

7.1. Reporte semanal de ejecución de obra

Con el fin de realizar el seguimiento y acompañamiento oportuno en los casos que lo requieran a través de cada una de las fases, el contratista de interventoría presentará a la SDHT, un informe el primer día hábli de la semana posterior, en donde se consigne mínimo lo siguiente:

1. Avance de ejecución en la fase i. de validación (cuando aplique).
2. Avance de la ejecución de la fase ii y fase iii. de ejecución de las obras en el transcurso de la semana anterior con su respectivo registro fotográfico, este avance debe ser semanal y acumulativo semana tras semana.
3. Estado de avance semanal conforme a lo programado general y por cada vivienda intervenida.
4. Conflictos y anomalías presentadas que impidan el normal desarrollo de las obras.
5. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).
6. Reportes de incidentes en el componente social y técnico.
7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

El reporte deberá contener los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas y presupuestales, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos.

7.2 Informe mensual de ejecución de obra e interventoría

La INTERVENTORÍA presentará a la SDHT, posterior al vencimiento del periodo mensual contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, un informe en donde se consigne como mínimo lo siguiente tanto para cada contrato de obra como el de interventoría:

Aspectos generales

- Número del contrato.
- Partes contratantes.
- Objeto del contrato.
- Valor del contrato.
- Fecha de suscripción, iniciación y terminación del contrato.
- Plazo, vigencia, suspensiones, modificaciones en plazo o valor.
- Nombre del supervisor y/o interventor
- Fecha en la que se rinde el informe.
- Recomendaciones y observaciones para el ordenador del gasto relativas a la ejecución del contrato de obra, debidamente sustentadas y con la indicación de las acciones pertinentes adelantadas previamente por el interventor (si aplica).
- Anexos que den cuenta de contenido del informe.

Aspectos técnicos

- Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general y por vivienda.
- Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad. En este caso, el interventor indicará cuáles fueron las soluciones adoptadas y, si es el caso, formulará las recomendaciones pertinentes, de acuerdo con sus conocimientos y experticia. De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.

Aspectos administrativos

- Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.
- Constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra e interventoría en relación con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello (se deberán anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).
- Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de los mismos y de sus respuestas, si fuere el caso.
- Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

Aspectos sociales

- Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.
- Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.
- Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

Aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Un (1) informe mensual de control y seguimiento a la estructuración y ejecución del Plan de Gestión Ambiental de obra, en donde se relacionan todas las actividades y gestión realizada como interventoría y en conjunto con el contratista de obra. Recopilar todo el registro documental realizado. Este informe debe estar elaborado en su totalidad y disponible para entrega con el informe general mensual.
- Un (1) informe mensual de control y seguimiento a la estructuración y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se relacionan todas las actividades y gestión realizada como interventoría y en conjunto con el contratista de obra. Recopilar todo el registro documental realizado. Este informe debe estar elaborado en su totalidad y disponible para entrega con el informe mensual general.

Aspectos presupuestales

- Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.
- Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.
- Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

A continuación se relaciona el resumen esquemático relacionado con la ejecución de la fase 2 y sus evidencias mínimas a entregar para revisión.

Producto	Acciones	Evidencias
Informe mensual de seguimiento y control en la ejecución	Verificar y controlar la ejecución	1 Informe mensual de interventoría

Información final de interventoría.

La interventoría entregará a la SDHT la documentación final suministrada por el contratista de obra, revisada y aprobada conforme a lo solicitado en el anexo técnico de obra, adicionalmente al último informe mensual de interventoría, deberá entregar como mínimo la siguiente documentación:

1. Información general del contrato que contenga nombre de la entidad contratante, objeto del contrato, número de viviendas intervenidas, nombre del interventor, introducción, justificación, valor, plazo y fecha de informe.
2. Información de cada vivienda ejecutada, valor proyectado y valor final por vivienda y valor total del proyecto.
3. Informe sobre las pólizas y garantías exigidas, modificación y/o actualización de estas.
4. Informe consolidado del componente social, el cual debe contener:
   - Resultados del plan de Acompañamiento social
   - Análisis de la implementación de las acciones social y de participación.
   - Documento análisis y resultado de la validación o actualización de la caracterización social de las familias.
   - Registros audiovisuales generados durante todo el desarrollo del componente (físico y magnético).
   - Documento de análisis con los soportes correspondientes que den cuenta del avance y terminación del proceso de las historias de vida.
5. Informe general de la implementación de los protocolos de bioseguridad implementados por el contratista de obra en las viviendas.
6. Paz y salvo por todo concepto, expedido por el interventor.

8. PERSONAL CLAVE - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL.

Para desarrollar el objeto de la presente convocatoria, el INTERVENTOR debe contar con el personal que cumpla con la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y la experticia para desarrollar el objeto contractual. El equipo mencionado a continuación deberá permanecer durante toda la ejecución de obra y será criterio habilitante de la oferta:

CANT	*CARGO*	*FORMACIÓN ACADÉMICA*	*EXPERIENCIA PROFESIONAL*	*EXPERIENCIA RELACIONADA*	*DEDICACIÓN EN TERRITORIO*
2	*Director de Interventoría de Obra*	*Ingeniero civil, Arquitecto o Constructor con título de posgrado a nivel de especialización, maestría o doctorado en áreas de gerencia y/o dirección de proyectos. Con tarjeta profesional vigente.*	*Mínimo diez (10) años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.*	*Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia relacionada como Director de Interventoría Obra.* *Dentro de las certificaciones aportadas deberá acreditar por lo menos un (1) contrato como Director de Interventoría de Obra, en un (1) proyecto de vivienda, con un plazo no menor a seis (6) meses.*	*100% (En terreno)*
4	*Residente de interventoría de Obra*	*Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor. Con tarjeta profesional vigente.*	*Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional, contados apartir de la expedición de la tarjeta profesional..*	*Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia relacionada como Residente de Interventoría Obra.* *Dentro de las certificaciones aportadas deberá acreditar por lo menos un (1) un contrato como Residente de Interventoría de Obra, en proyectos de vivienda, con un plazo no menor a seis (6) meses.*	*100% (En terreno)*

NOTA IMPORTANTE: De conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 3° y siguientes del Decreto No 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, la Entidad exige que el proponente con su propuesta allegue dentro de los profesionales habilitantes aquí requeridos la inclusión de mínimo una (1) mujer para la ejecución del futuro contrato. Las mujeres objeto de ofrecimiento para el presente proceso se deberán mantener durante toda la ejecución del contrato que resulte del presente proceso de contratación.

Los documentos para acreditar el equipo de trabajo habilitante se encuentran descritos en el estudio previo.

El proponente seleccionado deberá allegar con la propuesta técnica, las certificaciones que acrediten la formación académica, la experiencia laboral y la experiencia relacionada, así como el formato denominado "Carta de Compromiso de Equipo Humano Mínimo" para participar en el proceso. En el evento en el que el oferente sea adjudicatario, dicho anexo deberá ser suscrita por cada profesional con la información de contacto mínima (Nombre completo, dirección, correo electrónico y teléfono), sin perjuicio de garantizar el equipo de trabajo establecido en el anexo técnico, para realizar las labores propias del contrato.

8.1 Equipo de trabajo mínimo - Personal clave

Requisitos de formación académica y experiencia del personal profesional y técnico

Para desarrollar el objeto de la presente convocatoria, el INTERVENTOR debe contar con el personal que cumpla con la idoneidad, el conocimiento, y la experticia para desarrollar el objeto contractual. El equipo mínimo mencionado a continuación deberá permanecer durante toda la ejecución de obra y deberá cumplir con la cantidad de vinculación de mujeres indicada en la propuesta.

CANT.	*CARGO*	*FORMACIÓN ACADÉMICA*	*EXPERIENCIA PROFESIONAL*	*EXPERIENCIA RELACIONADA*	*% DEDICACIÓN*
1	*Especialista en Estructuras*	*Ingeniero Civil con posgrado a nivel de especialización o maestría en estructuras o áreas relacionadas. Con tarjeta profesional vigente.*	*Mínimo cinco (5) años deexperiencia profesional,contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.*	*Aportar mínimo tres (3) años como asesor en estructuras en proyectos de construcción, remodelación o adecuación de viviendas .*	*10%*
1	*Especialista en geotecnia*	*Ingeniero Civil con posgrado a nivel de especialización o maestría en geotecnia. Con tarjeta profesional vigente,*	*Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional,contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.*	*Aportar mínimo tres (3) añoscomo asesor en geotecnia en proyectos de construcción, remodelación o adecuación de viviendas .*	*10%*
1	*Especialista en redes eléctricas*	*Ingeniero Eléctrico o electricista. Con tarjeta profesional vigente.*	*Mínimo cinco (5) años deexperiencia profesional,contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.*	*Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia específica como profesional en redes eléctricas preferiblemente con experiencia en sistemas foltovoltaicos (energía sola)r.*	*10%*

1	*Especialista en redes hidrosanitarias*	*Ingeniero Civil o Sanitario con posgrado a nivel de maestría o especialización en redes hidrosanitarias. Con tarjeta profesional vigente.*	*Mínimo cinco (5) años deexperiencia profesional,contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.*	*Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia específica como profesional en redes hidrosanitarias en proyectos de construcción, remodelación o adecuación de viviendas.*	*20%*
1	*Profesional de presupuestos*	*Ingeniero civil.*	*Mínimo tres (3) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.*	*Acreditar mínimo un (1) año de experiencia específica como profesional de presupuestos en construcción o remodelación de edificios residenciales.*	*20%*
3	*Profesional Social*	*Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología*	*Mínimo tres (3) años de experiencia Profesional, contados a partir de la terminación de materias o de la matrícula profesional (según aplique).*	*Aportar mínimo un (1) contrato como profesional social de interventoría en proyectos de obra de mejoramiento de vivienda y en sumatoria demostrar un plazo no menor a seis (6) meses.*	*100% (En terreno)*

1	*Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo*	*Profesional en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo, o con licencia aprobada y vigente en SG-SST y demás afines, con curso de 50 horas.*	*Mínimo tres (3) años de experiencia Profesional, contados a partir de la terminación de materias o de la matrícula profesional (según aplique).*	*Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia específica como profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en proyectos del sector construcción o en gestión de SST relacionada con obras en el sector público. Dentro de las certificaciones aportadas deberá acreditar por lo menos un contrato como profesional interventor de Seguridad y Salud en el Trabajo a proyectos de construcción con un plazo no menor a seis (6) meses.*	*50% (En terreno)*
1	*Profesional Ambiental*	*Profesional en gestión ambiental, Ingeniería Ambiental, Administración Ambiental, Ingeniería Sanitaria y demás afines a la gestión ambiental*	*Mínimo tres (3) años de experiencia profesional contados a partir de la obtención de diploma académico o tarjeta profesional (según aplique).*	*Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia específica como profesional ambiental en proyectos del sector construcción o en gestión ambiental relacionada con obras en el sector público.*	*30% (administrativo y de campo)*

NOTA 1: Los requisitos anteriormente indicados deben ser cumplidos por cada profesional presentado.

NOTA 2: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución de cada una de las Fases del contrato, no obstante, en caso de necesitar un personal adicional idóneo al mínimo requerido para la entrega de productos a desarrollar durante la ejecución del contrato, el INTERVENTOR deberá garantizar la presencia de estos, sin que llegaré a generar costos adicionales para el CONTRATANTE.

El personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio para la ejecución del contrato, por lo cual el contratista lo deberá tener en cuenta y considerar su totalidad al momento de elaborar su oferta económica, sin embargo, el contratista de obra podrá emplear personal adicional al mínimo solicitado con el fin de cumplir con el objeto del contrato en el plazo estipulado y sin costos adicionales para la Entidad contratante. El personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio, por lo cual los contratistas lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad al momento de elaborar su oferta económica.

Teniendo en cuenta que la experiencia profesional podrá ser contada a partir de la terminación de materias u obtención del título o expedición de tarjeta profesional, según aplique, se hace necesario allegar la correspondiente certificación vigente, con el fin de contabilizar el tiempo desde dicho momento.

La experiencia profesional y la relacionada, deberá estar debidamente soportada con certificación o acta de terminación y/o liquidación del contrato, la cual debe estar suscrita por la empresa o entidad contratante que certifica al profesional.

Si el interesado es el mismo que certifica al profesional propuesto, además de la certificación, debe presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el profesional y el proponente que lo certifica.

Si dentro del personal propuesto hay personas que hayan obtenido sus títulos profesionales o de postgrados fuera del país, se deberá adjuntar la correspondiente convalidación de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación y/o de acuerdo con las normas vigentes al respecto.

Una vez la SDHT adjudique el contrato, el adjudicatario y/o interventor **NO PODRÁ MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA**, la cual deberá ser sustentada ante la Supervisión del contrato de la SDHT, para su evaluación y posterior autorización. El reemplazo del profesional se realizará únicamente por otro profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las del personal que haya presentado con su propuesta.

8.2 ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO PUESTO A DISPOSICIÓN:

Para acreditar la formación académica, debe anexarse a la propuesta, los siguientes documentos:

- ✓ Fotocopia de diploma y/o actas de grado y/o certificados de obtención del título correspondiente. La formación académica obtenida en el exterior deberá estar Homologada por el Ministerio de Educación Nacional.
- ✓ Matrícula profesional expedida por los respectivos Consejos Profesionales, en los casos en que aplique.
- ✓ Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma.
- ✓ Para los profesionales, técnicos o tecnologos que cuenten con matrícula profesional, deben anexar adicionalmente certificado de vigencia de la matrícula, expedida por el organismo competente.

La **experiencia habilitante** (profesional y relacionada) se acreditará mediante certificaciones o actas de liquidación o cualquier otro documento en el conste la participación del profesional en la ejecución del proyecto.

En todos los casos, la experiencia profesional y relacionada de los distintos profesionales que integren el equipo, deberá ser certificada y no se tendrá como tal, la mera presentación del acta de grado, o con la fecha de expedición de la tarjeta y/o matrícula profesional.

NOTA. TRASLAPOS: Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea (tiempos traslapados), con una o varias certificaciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez con base en la certificación que mayor tiempo de experiencia tenga.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, la auto-certificación, no serán tenidas en cuenta para evaluar su experiencia relacionada. Cuando las certificaciones del personal propuesto son emitidas por el mismo proponente o algunos de sus integrantes, adicionalmente se deberá adjuntar la certificación y/o Contrato y/o acta final y/o acta de liquidación firmada por el contratante y copia de la licencia de construcción respectiva que dio origen al contrato para el caso de certificar obras privadas, donde conste que el proponente ejecutó el objeto contractual, así mismo, deberá adjuntar copia del contrato entre el profesional y la Empresa contratante.

El reemplazo del profesional se realizará únicamente por otro profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las definidas en el presente documento.

8.3 Funciones de perfiles profesionales

Funciones del Director de Interventoría

El Director de Interventoría deberá conocer plenamente las condiciones y las adendas tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría, las condiciones del contrato y el desarrollo del mismo desde la suscripción del acta de inicio hasta su liquidación. Además, será el responsable de vigilar la organización y programación de los trabajos de mejoramiento de cada una de las viviendas, deberá actuar como enlace de primera instancia con la SDHT; participará en forma indelegable en los comités que programe la SDHT; revisará y avalará las soluciones planteadas por el contratista de obra a los problemas originados durante la ejecución del contrato de obra, será el responsable de la presentación de los informes que le solicite la SDHT; mantendrá una disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se realicen por parte de la SDHT; revisará y aprobará los respectivos presupuestos, y llevará el respectivo control de inversión del proyecto en general y cada unidad de vivienda intervenida que no sobrepase el valor asignado para cada una de estas; elaborará las facturas y sus anexos para pago; será el encargado de presentar oportunamente los informes técnicos y demás soportes de los trabajos ejecutados por parte del contratista de obra. El Director de Interventoría deberá manejar tanto los aspectos técnicos, administrativos, sociales y presupuestales, realizando visitas permanentes a las obras en ejecución del contrato, lo cual deberá quedar soportado en bitácora; todas las demás que el contratista de interventoría o la SDHT crea necesarias y oportunas para el normal desarrollo del contrato de obra y de interventoría.

- **Funciones del Residente de Interventoría**

El Residente de Interventoría será el encargado de vigilar el cumplimiento de la programación de obra y del personal empleado por el contratista de obra, calidad de los materiales utilizados en obra, elaboración de informes; realizará las actas de seguimiento al contratista de obra; llevará el registro de las actividades diarias en la bitácora de obra, vigilará el cumplimiento del programa de salud ocupacional y el plan de calidad entregados por el contratista de obra; actuará como enlace entre la interventoría y el beneficiario de cada vivienda; tomará medidas preventivas y correctivas en forma oportuna, llevara el respectivo control de las cantidades de obra realizadas en cada una de las viviendas intervenidas, realizar las memorias de cantidades de obra; todas las demás que el contratista de interventoría o la SDHT crea necesarias y oportunas para el normal desarrollo del contrato de obra y de interventoría.

- **Funciones del Especialista de Estructuras**

El especialista en estructuras será el encargado de verificar, validar, avalar u observar la propuesta estructural tanto de los módulos complementarios, como en lo casos que se requiera un concepto de la estabilidad de la estructura de las viviendas existentes. Así mismo, acompañará la realización de las obras en cuanto a

intervenciones estructurales, revisará y aprobará los conceptos de obra presentados por el Contratista, y asegurará cumplimiento de las normas para los métodos y técnicas de construcción, a fin de garantizar la óptima ejecución de los mejoramientos.

Igualmente, participará en reuniones cuando se requiera con el personal de obra e interventoría de las obras para hacer una inspección ocular del trabajo y proponer solución a problemas presentes en la ejecución de las mismas.

- **Funciones del Especialista de Geotecnia**

El especialista en Geotecnia será el encargado de verificar, validar, avalar u observar los informes del suelo mediante la utilización del método inspección visual, tal como lo establece la norma vigente. Lo anterior, principalmente en los casos que el mejoramiento de vivienda rural se realice por modulo complementario. Igualmente, acompañara las obras relacionadas al componente geotécnico cuando se requieran conceptos, como intervenciones; como también, revisará y aprobará conceptos de obra, y asegurará cumplimiento de las normas y técnicas de construcción vigentes, a fin de garantizar la óptima ejecución de los mejoramientos.

Igualmente, participará en reuniones cuando se requiera con el personal de obra e interventoría de las obras para hacer una inspección ocular del trabajo y proponer solución a problemas presentes en la ejecución de las mismas.

- **Funciones del Especialista de Redes Eléctricas**

El profesional en Redes Eléctricas será el encargado de verificar, validar, avalar u observar la propuesta de diseño eléctrico tanto de los módulos complementarios, como en lo casos que se requiera un mejoramiento de redes eléctricas en las viviendas existentes. Así mismo, emitirá conceptos técnicos de obra, dando cumplimiento de las normas para los métodos y técnicas de construcción vigentes, a fin de garantizar la óptima ejecución de los mejoramientos. Igualmente, el especialista en Redes Eléctricas será el encargado de inspeccionar las obras realizadas por el contratista de obra, en relación con las Redes Eléctricas que se intervengan.

Así mismo, participará en reuniones cuando se requiera con el personal de obra e interventoría para hacer una inspección ocular del trabajo y proponer solución a problemas presentes en la ejecución de las mismas.

- **Funciones del Especialista de Redes Hidrosanitarias**

El especialista en Redes Hidrosanitarias será el encargado de verificar, validar, avalar u observar la propuesta de diseño hidrosanitario tanto de los módulos complementarios, como en lo casos que se requiera un mejoramiento de redes hidrosanitarias en las viviendas existentes. Igualmente, revisará y aprobará conceptos de obra, dando cumplimiento a las normas para los métodos y técnicas de construcción vigente, a fin de garantizar la óptima ejecución de los mejoramientos. Asimismo, será el encargado de inspeccionar la realización de las obras realizadas por el contratista de obra en cuanto a Redes Hidrosanitarias.

Igualmente, participará en reuniones cuando se requiera con el personal de obra e interventoría de las obras para hacer una inspección ocular del trabajo y proponer solución a problemas presentes en la ejecución de las mismas.

- **Funciones Profesional en Presupuestos**

El profesional Financiero de interventoría será el encargado de llevar el control financiero tanto del contrato de obra como el de la interventoría; deberá efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la SDHT solicite; revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra y verificar que la ejecución del mismo no sobrepase el valor del contrato de obra, igualmente deberá llevar el control de los costos de estructuración vs las validaciones aprobadas y los valores finales de ejecución de cada una de las viviendas.

- **Funciones del Profesional Social**

El o la profesional Social de interventoría será la persona encargada de realizar el seguimiento a la planeación, programación y operación con base en el marco jurídico, reglamentos, normas del proyecto desde un enfoque desarrollo social y humano adelantado por el contratista de obra. Será el o la profesional que liderará el componente de seguimiento social y controlará la aplicación del plan de acompañamiento social de obra e impartirá las ordenes a cada profesional social de interventoría con el fin de dar cumplimiento al plan de acompañamiento social.

Desarrollará funciones administrativas y operativas en función de garantizar que desde el componente social se minimicen factores de riesgos asociados al proyecto. Su actuación en materia de acción social será de responsabilidad directa a la ejecución del proyecto desde el seguimiento a la atención inmediata y oportuna, respuesta efectiva, control y seguimiento, soporte efectivo al equipo social en la solicitudes y acompañamientos para el efectivo desarrollo del plan de acompañamiento social presentado por el contratista de obra.

Informará a la SDHT todos aquellos aspectos sociales propios surgidos y adelantados de la gestión desarrollados por el contratista de obra durante el proyecto según las etapas y momentos.

Deberá dirigir y coordinar al equipo social de interventoría, responsabilizándose de la correcta implementación de las obligaciones y del plan de seguimiento social en la aplicación, así como del correcto cumplimiento de los procedimientos administrativos.

Asistirá a los comités de seguimiento realizados e informará sobre las acciones realizadas por el contratista de obra e informará sobre el seguimiento adelantado por la interventoría en aras de dar cumplimiento al plan de Acompañamiento Social adelantado por el contratista de obra. En general cualquier otras tareas afines a la categoría del perfil y semejantes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas por la Secretaria Distrital de Hábitat SDHT y resulten necesarias por razones del proyecto, entre estas entregar y atender de forma oportuna las solicitudes, requerimientos e informes que se le sean solicitados por la Secretaria Distrital de Hábitat SDHT.

Adicionalmente estará encargada de recepcionar reportes, informes y demás información requerida de carácter social y hacer la verificación y validación de la información. De igual forma será quien realice las recomendaciones, ajustes y observaciones que considere pertinente durante la ejecución de cada una las fases en el marco del plan de acompañamiento social del contratista de obra .

Igualmente es el profesional que debe atender, resolver o redireccionar todas las solicitudes, requerimientos e informes entregados por el o la profesional social de obra, fortaleciendo aspectos entre la ejecución social de obra y la comunidad en aras de dar cumplimiento al componente social.

- **Funciones del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo**

El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo se encargará de i) revisar y aprobar el documento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado por el CONTRATISTA de obra, ii) verificar y apoyar en el cumplimiento de la normatividad legal y técnica definida para el área de SST, iii) realizar control y seguimiento a la gestión del CONTRATISTA de obra, así como a las condiciones de los puntos de obra, iv) apoyar y acompañar al CONTRATISTA de obra en la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, v) registrar e informar sobre situaciones o comportamientos que puedan presentar riesgo a la integridad del personal de obra, vi) documentar y elaborar informes sobre la gestión que realiza la INTERVENTORÍA en marco del componente SST, vii) coordinar actividades en SST con sus pares del CONTRATISTA de obra, viii) apoyar al Profesional Ambiental en los aspectos que se necesiten y las demás actividades requeridas para el cumplimiento de objetivos.

- **Funciones del Profesional Ambiental**

El Profesional Ambiental de la INTERVENTORÍA tendrá las actividades de i) revisar y aprobar el documento del Plan de Gestión Ambiental de obra elaborado por el CONTRATISTA de obra, ii) verificar y apoyar en el cumplimiento de la normatividad legal y técnica definida para la gestión ambiental en sus diferentes componentes, iii) realizar control y seguimiento a la gestión del CONTRATISTA de obra y la adecuación de los puntos de obra, iv) apoyar y acompañar al CONTRATISTA de obra en la implementación del Plan de Gestión Ambiental de obra, v) apoyar al CONTRATISTA DE OBRA en la gestión, solicitud y/o reportes ante autoridades ambientales y/o entes de control en caso de requerirse, vi) documentar y registrar sobre la gestión que realiza la INTERVENTORÍA en marco del componente de gestión ambiental, vii) coordinar actividades de gestión ambiental con sus pares del CONTRATISTA de obra, viii) apoyar al Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos que se necesiten y las demás actividades requeridas para el cumplimiento de objetivos.

8.4 Uniformes y dotación

La INTERVENTORÍA deberá contar con chaquetas de identificación para el personal profesional y técnico con el logo de la empresa o persona jurídica constituida y los demás aspectos requeridos por la oficina de prensa y comunicaciones de la SDHT, así como el carnet de identificación, señalando el número del contrato y nombre de la firma contratista. De la misma manera, deberá hacer el suministro de todos los elementos de protección personal a su equipo de trabajo.

9. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Obligaciones Específicas

1. Cumplir y hacer cumplir cada una de las cláusulas contractuales del contrato de interventoría.
2. Presentar al supervisor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten las calidades y la experiencia relacionada del personal mínimo requerido (no evaluable) para la ejecución del contrato para posterior suscripción del acta de inicio.
3. Garantizar el personal solicitado conforme a lo indicado en los REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL del presente Anexo Técnico.
4. Revisar y aprobar el plan de ejecución y el cronograma realizado por el contratista de obra dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico.
5. Revisar, aprobar y verificar la implementación del Protocolo de Bioseguridad entregado por el contratista de obra, para lo cual deberá informar a la SDHT sobre el cumplimiento de este en los informes semanales y mensuales, así mismo, deberá realizar un expediente individual con las evidencias presentadas en cada vivienda.

6. Elaborar su propio Protocolo de Bioseguridad e implementarlo durante la ejecución del proyecto cumpliendo las normativas vigentes.
7. Elaborar el Plan de Seguimiento Social al plan de Plan de Acompañamiento Social de obra.
8. Revisar y aprobar el Plan de Acompañamiento Social de ejecución de obra.
9. Revisar y aprobar los documentos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Gestión Ambienta de obra, presentados por el CONTRATISTA de obra.
10. Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del marco normativo relacionado en el numeral 3, por parte del CONTRATISTA de obra, así como de la misma INTERVENTORÍA.
11. Revisar y aprobar previo a la suscripción del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia profesional y relacionada del personal mínimo requerido (no evaluable) y demás documentos entregados por cada contratista de obra.
12. Para el cumplimiento del objeto contractual en el plazo de ejecución estipulado, es obligatorio que la interventoría cumpla con el horario de trabajo que estipule el contratista de obra, el cual podrá ser doble turno de trabajo o jornadas continúas extendiendo los horarios, lo cual permitirá cumplir con los plazos estipulados en la programación de obra y garantizará la presencia de la interventoría durante la ejecución de todas las actividades en obra.
13. Velar por el desarrollo de las obras de acuerdo al presupuesto y especificaciones técnicas entregadas por la SDHT y ajustadas en la fase 1 (de ser el caso).
14. Supervisar, revisar, controlar, aprobar o rechazar las actividades de obra contratadas por la SDHT, velando por los intereses de la misma, dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad.
15. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos, antes, durante y después.
16. Realizar reuniones con la supervisión tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones será convenida por las partes, en todo caso no debe como mínimo una vez cada quince (15) días, con el fin de verificar el desarrollo del contrato de obra y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.
17. Presentar informes semanales, mensuales y final de interventoría, conforme a lo solicitado en el anexo técnico de interventoría.
18. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de las obras derivadas del mismo, el personal profesional exigido. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, conforme los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso el supervisor deberá aprobar previamente el remplazo.
19. Velar por el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el cronograma aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberán ser informados oportunamente a la supervisión del contrato y recomendar las acciones y correctivos, con el fin de adelantar las acciones a que haya lugar.
20. Advertir e informar de manera inmediata a la supervisión cualquier irregularidad o situación especial que pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas.
21. Conceptuar y recomendar a la SDHT frente a los posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra.
22. Diligenciar diariamente la bitácora de obra por cada vivienda, para llevar un adecuado control durante el desarrollo del contrato. El uso de este instrumento debe llevarse a cabo con la mayor responsabilidad, pulcritud, veracidad y objetividad tomando en consideración todos los programas relacionados con la obra, las especificaciones técnicas, las observaciones de calidad de la obra tanto en materiales como en mano de obra, los agentes internos y externos de diversa índole que en forma directa e indirecta puedan afectar el cumplimiento del contrato de obra.
23. Solicitar por lo menos con diez (10) días hábiles de anticipación a la supervisión del contrato de ser necesario, la adición, prórroga y/o modificación del contrato de obra y de interventoría, la cual

deberá estar plenamente justificada, de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión de la SDHT.

24. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones y dificultades.
25. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parámetros definidos en el proceso de legalización y la normatividad vigente aplicable.
26. Suscribir en conjunto con el contratista de obra, las actas de inicio y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo las actas de recibo parcial, suspensión, reiniciación, liquidación, entre otras.
27. Suscribir con el supervisor, el acta de inicio y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato de interventoría.
28. Establecer los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
29. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la supervisión, relacionadas con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.
30. Disponer y administrar los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato.
31. Adelantar la debida vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con los documentos precontractuales y solicitar los cambios que fuesen necesarios para el normal desarrollo del mismo.
32. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o modificación de las mismas si fuere el caso.
33. Hacer entrega de los expedientes de cada vivienda terminada, alimentado con los documentos originales elaborados durante las dos (2) fases debidamente foliadas y actualizada el formato de lista de chequeo, incluyendo los documentos de la implementación de los protocolos de bioseguridad.
34. Preparar conjuntamente con el contratista de obra el acta de liquidación del contrato de acuerdo con las indicaciones que la supervisión efectúe y a las condiciones que el contrato establezca.
35. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente, durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento del anexo técnico a cabalidad.
36. Entregar mensualmente al supervisor o cuando esta lo requiera, el pago de aportes de salud, pensión, ARL y parafiscales del personal empleado por el interventor en la obra.
37. El contratista de interventoría realizará los respectivos cargues en el SECOP II de toda la documentación e información que hacen parte de la ejecución del contrato y las demás que le sean requeridas por parte de la Entidad contratante.
38. Contar con el personal especializado que se pueda requerir durante la ejecución del contrato.
39. Conceptuar y realizar un acompañamiento a la SDHT cuando se evidencien situaciones que puedan derivar en la posible aplicación de cláusulas penales, condiciones resolutorias, cláusulas de apremio, o de cualquier otra cláusula sancionatoria prevista en el contrato.
40. Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la información del contrato objeto de INTERVENTORÍA, incluyendo todas actas que se puedan generar durante la ejecución del mismo. Además, entregar las respectivas copias en medio físicas y digital a La SDHT
41. Enviar copia a LA SDHT de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al CONTRATISTA de obra.
42. Ordenar la suspensión de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato de obra de mejoramiento de vivienda, previa autorización de la SDHT.
43. Dar aplicación estricta a la normatividad vigente referida al mejoramiento de vivienda rural, especialmente lo consignado en el Decreto 145 del 2001 y el reglamamento operativo que le da aplicación a este Decreto.
44. Las demás anexas a los requerimientos técnicos de la presente interventoría.

Implementación de los protocolos de bioseguridad.

1. Elaborar y entregar a la SDHT dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Protocolo de Bioseguridad conforme a la normativa vigente al momento de su elaboración para revisión y aprobación, si durante la ejecución de la obra llegara a ser modificada la normativa para la mitigación de la propagación del COVID-19 se deberá actualizar el protocolo e implementarlo en obra en un plazo no mayor a cinco (5) días por parte del contratista sin generar costos adicionales a la Entidad, en todo caso no se podrá ingresar a las viviendas sin la debida implementación del protocolo.
2. Entregar el protocolo de bioseguridad avalado y firmado por un profesional de seguridad y salud en el trabajo para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los términos y condiciones exigidos por el Gobierno Nacional y Distrital, el cual deberá ser aporbado por la SDHT.
3. El interventor deberá realizar los ajustes y/o actualizaciones al protocolo de bioseguridad según la actualización de los lineamientos que la administración nacional o distrital expida o a petición de la Secretaría Distrital del Hábitat.
4. Atender las recomendaciones que realice la SDHT sobre el control y seguimiento a cada uno de los aspectos de la implementación de los protocolos de bioseguridad.

Nota: El Protocolo de Bioseguridad, el cual podrá ser actualizado, modificado, adicionado según nuevos lineamientos del gobierno nacional o distrital, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.

10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Suelo rural de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Usme.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de siete meses (7) contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del supervisor y el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Nota 1: El acta de inicio se suscribirá dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (aprobación de la póliza y el registro presupuestal por parte la Entidad).

Nota 2: La INTERVENTORÍA deberá disponer del personal necesario para realizar las respectivas liquidaciones tanto del contrato de obra como el de interventoría sin generar costos adicionales a la Entidad.
Nota 3: En el caso de que una vez se encuentre adjudicada la obra y no se haya celebrado contrato de interventoría, la firma del acta de inicio se llevará a cabo hasta tanto se suscriba el acta de inicio de la Interventoría, puesto que ambos contratos coexisten entre si.

12. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO

Valor del contrato:

El presupuesto oficial estimado para esta contratación corresponde a la suma de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

PESOS ($815.948.757) M/CTE EL PRESENTE VALOR INCLUYE TODOS LOS COSTOS, TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ASOCIADOS AL CONTRATO.

El valor total del contrato será el valor total de la propuesta presentada por el proponente a quien se adjudique el presente proceso de contratación, o el valor total corregido de la misma, si a ello hubiere lugar.

Forma de pago:

El valor del contrato se pagará por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat bajo las siguientes condiciones:

- Actas parciales hasta llegar al NOVENTA (90%) por ciento del valor del contrato de interventoría en las que se pagará de manera proporcional a la facturación del contratista de obra. (Solo se tendrán en cuenta las obras terminadas).

Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; la deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y en general todos los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato.

La SDHT no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que se requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.

NOTA 1: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe a llegar el día siguiente a la notificación del acto de adjudicación los siguientes documentos:

1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, no mayor a tres (30) días de expedición.
2. Cámara de Comercio de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato.
3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato.
4. Fotocopia cédula de representante legal.

Adicional Para consorcios:

- Fotocopia cédulas integrantes del consorcio.
- Copia del Acta consorcial.

- Un pago final correspondiente al DIEZ (10%) por ciento del valor total del contrato, contra la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, El último pago queda supeditado a la entrega del 100% de los expedientes de cada vivienda conforme a la obligación 4.4.31 indicada en el anexo técnico y a la firma de las actas de recibo y liquidación finales del contrato.

Para cada pago, el Interventor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social, así como los parafiscales el SENA, ICBF y Cajas de Compensación, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, cuando corresponda.

Todas las demoras que se generen por la presentación inadecuada o inoportuna de las facturas o los documentos soporte serán responsabilidad del Interventor, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el Interventor no presente las respectivas facturas a la SDHT.

Los pagos estipulados se efectuarán mediante el Sistema Automático de Pagos, con la trasferencia de los recursos a la cuenta que indique el contratista mediante certificación bancaría. Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SDHT, sin generar intereses moratorios.

NOTA 2: La SDHT efectuará los descuentos de ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad y con la actividad objeto del contrato, así mismo se dará estricto cumplimiento al descuento por concepto de estampilla y contribución de obra.

13. ANEXOS

No aplica

14. APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SDHT

Concepto	Nombre y apellidos	Cargo – Dependencia	Firma
Elaboró	Javier Oswaldo Mora Taiero	Contratista - Subdirección de Operaciones	
	Lina María Ramírez Flórez	Contratista - Subdirección de Operaciones	
	Santiago Hincapié García	Contratista - Subdirección de Operaciones	
Revisó	Ginna Mercedes Toro Vallejos	Contratista - Subdirección de Operaciones	
Aprobó	César Augusto Marín Clavijo	Subdirector de Operaciones	
