INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS

Periodo revisado: enero 2022

Elaboró: Lenae Echeverri

Supervisa y aprueba: Ángela María Flórez Álvarez

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las funciones propias de los proveedores y contratistas suscritos al proyecto de regalías "FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON MECANISMOS PARA GESTIONAR EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL SARSC-COV-2 MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PRUEBA MOLECULAR POR RT-PCR DIRECTA EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGÚN, TUCHÍN, CHINÚ, SAN ANDRES SOTAVENTO" código BPIN 2020000100618, aprobado por el OCAD según Acuerdo No. 101 del 30 de noviembre de 2020. Código proyecto Uniremington: 4000000285, de acuerdo a lo consignado en cada contrato, sin restarle peso al informe de supervisión realizado de forma externa por los entes de control que vigilan el proyecto en cuestión.

ALCANCE

Este informe cubre los contratos que presentaron soporte de ejecución financiera y técnica durante el periodo de enero 2022 y se toma en cuenta los registros internos, documentos propios de los procesos que se han aportado como evidencia. Durante el mes de enero 2022, treinta y dos (32) contratos cumplieron con los criterios para ser evaluados en este informe se analizará la población completa, los cuales se relacionan a continuación:

Número de contrato	ID Secop II	Tercero	Clase contrato	Nombre del Supervisor
008-2021	CDSO-07-DC-2021	Gustavo Alfonso Mendoza Fandiño	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
009 DEL 2021	CDSO-08-PE-2021	Samir David Rodelo Asfora	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0011-2021	CDSO-12-AE-2022	Nilfa Maria Ramirez Chavez	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0019-2022	CDSO-13-AE-2022	Lilys Johanna Lora Solano	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0012-2021	CDSO-14-AE-2022	Yanina Margarita Martinez Miranda	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0013-2021	CDSO-15-AE-2022	Nasly Ester Lopez Montiel	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0014-2022	CDSO-16-AE-2022	Luisa Fernanda Perez Geney	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 029-2022	CDSO-17-AE-2022	Eliana Maria Romero Clemente	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0015-2022	CDSO-18-AE-2022	Maira Alejandra Contreras Espriella	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0016-2022	CDSO-19-AE-2022	Gabriela Maria German Herrera	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 029-2022	CDSO-20-AR-2022	Maria Emilia Romero Ricardo	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0017-2022	CDSO-21-AR-2022	Marley Viviana Vergara Castillo	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0018-2022	CDSO-22-AR-2022	Maria Andrea Alvarez Polo	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 0020-2022	CDSO-23-AR-2022	Luz Marina Alvarez Perez	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 021-2022	CDSO-24-BT-2022	Camilo Toro Bertel	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 022-2022	CDSO-25-BT-2022	Jorge Rafael Martinez de la Cruz	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 023-2022	CDSO-26-BT-2022	Omar Isaac Ortiz Caraballo	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 024-2022	CDSO-27-BT-2022	Laura Cristina Ochoa Palomino	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 025-2022	CDSO-28-CL-2022	Ana Stefanny Bernal Mejía	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 026-2022	CDSO-29-IA-2022	Mauricio José Rosso Pinto	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 027-2022	CDSO-30-SST-2022	Corina Concepción Ruiz Molina	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS- 028-2022	CDSO-31-IC-2022	Carlos Andres Burgos Galeano	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
PS-06-2021	CDSO-11-CP-2022	VTM Lógisticas & Suministros SAS	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
15 del 2021	CRECO 16-HL-2021	GATEWAY TI MONTERIA S.A.S.	compraventa	Ángela MariaFlorez
14 del 2021	CDSO-10-GD-2021	Gestión Empresarial y Proyectos GEXMA SAS	compraventa	Ángela MariaFlorez
011 del 2021	CRECO-09-KP-2021	Union Temporal Reactivos y Suministros 2021	compraventa	Ángela MariaFlorez
004-2021	CDSO-04-CA-2021	Januario Hamel Hernandez	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
005-2021	CDSO-05-AA-2021	Cesar Ivan Serrano Florez	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
003-2021	CDSO-02-AF-2021	Lenae Echeverri Calderón	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
006-2021	CDSO-06-CJ-2021	Jose Ivan García Alvarez	Prestación de servicios	Ángela MariaFlorez
001 del 2021	CRECO-14-AO-2021	Visión Inmobiliaria. M Ltda	Arrendamiento	Ángela MariaFlorez
018 del 2021	CRECO-19-GP-2022	VTM Lógisticas & Suministros SAS	compraventa	Ángela MariaFlorez

Fuente: Matriz seguimiento presupuesto- Proyecto de regalías

De los treinta y dos contratos cuatro (4) corresponden a contratos de tipo Compraventa, veintisiete (27) de tipo Prestación de Servicios y uno (1) de arrendamiento.

RESULTADO DE LA VERIFICACION

A continuación, se desarrollan los aspectos analizados y los resultados del seguimiento efectuado por la administración del proyecto, frente al cumplimiento de las obligaciones propias del proveedor y contratista y la gestión adelantada por la administración del proyecto.

Funciones de los supervisores de los contratos:

Si bien el manual de contratación de la Corporación no establece funciones específicas para supervisar contratos y considerando que el proyecto opera de forma diferente a las operaciones diarias de la Corporación, se han establecido algunas funciones básicas, la vigilancia jurídica, técnica, administrativa, financiera y contable, entre las cuales, a criterio de la supervisión, se destacan las siguientes:

1. ***Revisar que el contratista/ proveedor haya cumplido efectivamente los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato antes de suscribir el acta de inicio.***

   Para todos los tipos de contrato, se observa que la respectiva acta de inicio se realizó una vez se perfeccionaron y legalizaron todos los requisitos del contrato.
   Para el caso de los contratos de Compraventa, cada uno de ellos estaba sujeto a pólizas, las cuales se observa se obtuvieron de forma oportuna antes de la suscripción del acta de inicio.
   De igual manera, el contrato de arrendamiento cumplió con los requisitos previos al acta de inicio.

2. ***Exigir al contratista que utilice personal idóneo para la ejecución del contrato, debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato suscrito, y que cumpla oportunamente con los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA, cajas de compensación familiar).***

   Los contratos de compraventa y de arrendamiento que corresponden a personas jurídicas, cumplieron con el requisito de presentar el certificado de paz y salvo de pagos a seguridad social y parafiscales firmado por contador público y/o revisor fiscal cuando aplica.

3. ***Efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas y las ofertadas.***
   Para los contratistas personas naturales, presentaron cada uno sus informes de actividades asociados a las responsabilidades adquiridas en los contratos.
   Los contratos número CRECO 16-HL-2021 del tercero Gateway Ti Monteria SAS y el contrato número CRECO-09-KP-2021 del tercero Unión Temporal Reactivos y Suministros 2021 cumplieron satisfactoriamente con su objeto contractual.

Para los demás contratos tipo Compraventa, en sus contratos se estableció un anticipo del 50% para dar inicio a sus actividades, por lo que aún no han presentado avance en el cumplimiento de su objeto contractual, más allá de la presentación de documentos para el trámite del desembolso del anticipo.
Para el caso del contrato de Arrendamiento no se exigió informe de actividad pues prestan el servicio de arrendamiento el cual se ha hecho efectivo para el equipo administrativo del proyecto.

4. ***Cuando el contratista sea una persona natural, exigir y verificar que el contratista haya realizado el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones y ARL durante toda la vigencia del contrato y que lo acredite como requisito para cada pago periódico, en los porcentajes establecidos por las normas vigentes***

Como condición de pago, en los contratos se estableció que para proceder con el pago deberá aportar soportes de afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, pensiones y ARL. Ante lo anterior se observa que los contratistas aportaron las evidencias pertinentes

Es importante aclarar que por política interna de la Corporación Universitaria Remington se realizan los aportes a seguridad social del mes que va a solicitar pago, a modo de ejemplo, si va a cobrar honorarios del mes de junio, debe adjuntar el soporte de la seguridad social correspondiente al mes de junio y así sucesivamente, toda vez que dichos documentos se presentan de forma vencida, es decir, siguiendo el ejemplo anteriormente planteado, los honorarios de junio se presentarían a final del mes de junio y se desembolsarían finalizando el mes de julio.

5. ***Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obra, seguimientos a los contratos, terminación, entrega y recibo final y de liquidación requeridas durante la ejecución del contrato utilizando los formatos establecidos para el efecto.***

Los contratos cuentan con las respectivas actas de inicio. Los contratistas personas naturales presentaron su respectivo informe de actividades.

Los contratos número CRECO 16-HL-2021 del tercero Gateway Ti Monteria SAS y el contrato número CRECO-09-KP-2021 del tercero Unión Temporal Reactivos y Suministros 2021 cumplieron satisfactoriamente con su objeto contractual y cuentan con su respectivo recibido a satisfacción. Al momento de realizar este informe el acta de liquidación se encontraba en trámite de firma por parte de los representantes legales.

6. ***Mantener actualizada la documentación de los contratos.***

En la contratación que se analizó, se observa en las carpetas digitales manejadas por la administración del proyecto, que se tiene archivado toda la etapa pre contractual y contractual, es decir hasta la etapa de legalización y perfeccionamiento del contrato.

7. ***Exigir al contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que considere conveniente.***

La Corporación estableció el formato: *"informe de actividades del contratista"* en el que el contratista indica la ejecución realizada de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato. Este informe a su vez es firmado por esta supervisión. Una vez aprobado, se da inicio al trámite del pago de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

8. ***El recibo a satisfacción deberá realizarse conforme lo pactado en el contrato. Cuando el objeto del contrato sea la compra o adquisición de bienes, el supervisor o interventor del contrato deberá certificar que aquellos corresponden a los plazos pactados, así como, gestionar la entrada en almacén de los bienes.***

Los contratos de tipo Compraventa asociados a los terceros Gestión Empresarial y Proyectos GEXMA SAS y VTM Logísticas & Suministros SAS no han iniciado ejecución pues en el contrato se estableció que iniciaban con el cumplimiento de su objeto contractual una vez se desembolsara un anticipo del 50%, por lo que en esta oportunidad están solicitando dicho desembolso para dar inicio a sus labores asociadas al contrato suscrito.

Los recibos a satisfacción de los bienes entregado por parte del tercero Gateway Ti Montería SAS y Unión Temporal Reactivos y Suministros 2021 se encuentra debidamente diligenciado y firmado.


Recibosatisfacción_ ServidorVPs_.pdf


RECIBO A SATISFACCIÓN.pdf


Para el caso del contrato de Arrendamiento no se exigió recibido a satisfacción dado pues prestan el servicio de arrendamiento el cual se ha hecho efectivo para el equipo administrativo del proyecto.

9. ***Realizar y entregar informes mensuales de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con los documentos necesarios para aprobación de las Ordenes de Pago Presupuestales- ODP y No Presupuestales por parte de la Supervisión encargada a Minciencias.***

A partir del mes de noviembre 2021 recibimos nuevos lineamientos para la entrega de los informes. Las fechas de entrega ya no serían los días 10 calendario, sino los días 5 de cada mes informando el mes inmediatamente anterior. Los anexos también fueron actualizados, siendo solo necesario la presentación de los anexos 1,2,3 y 4. En estos mismos lineamientos se abrió la posibilidad de entregar los informes vía Drive, por lo que el proyecto se acogió a esta opción.


Los informes están compuestos por:

- Anexo 1: M801PR15F03 – Se reportan los avances de tipo técnico.
- Anexo 2: M801PR15F01- Informe de ejecución financiera consolidado.
- Anexo 3: M801PR15F02- Informe detallado de Gastos por Rubro.
- Anexo 4: Ejecución Presupuestal.

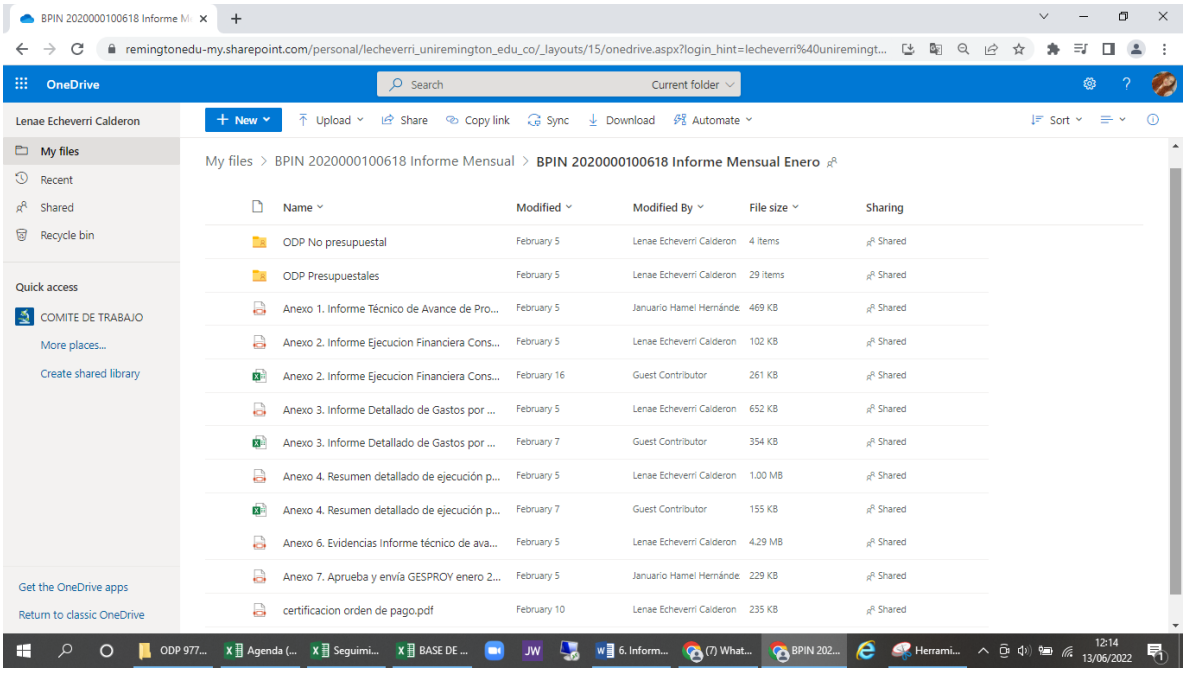


Fuente: OneDrive BPIN2020000618 Informe Mensual Enero / Proyecto de regalías

Para el periodo de enero el envío de estos informes fue el día 5 de febrero. Para esta misma fecha se entregó los soportes requeridos por Minciencias para tramitar pago de veintinueve (29) ODPs radicadas, cuya fecha de pago fue programada para el 18 de febrero 2022. Si bien los contratos que cumplieron con los requisitos de ejecución técnica y por ende se podría tramitar su pago fueron treinta y dos (32), solo 29 contratistas entregaron los documentos pertinentes y oportunamente.

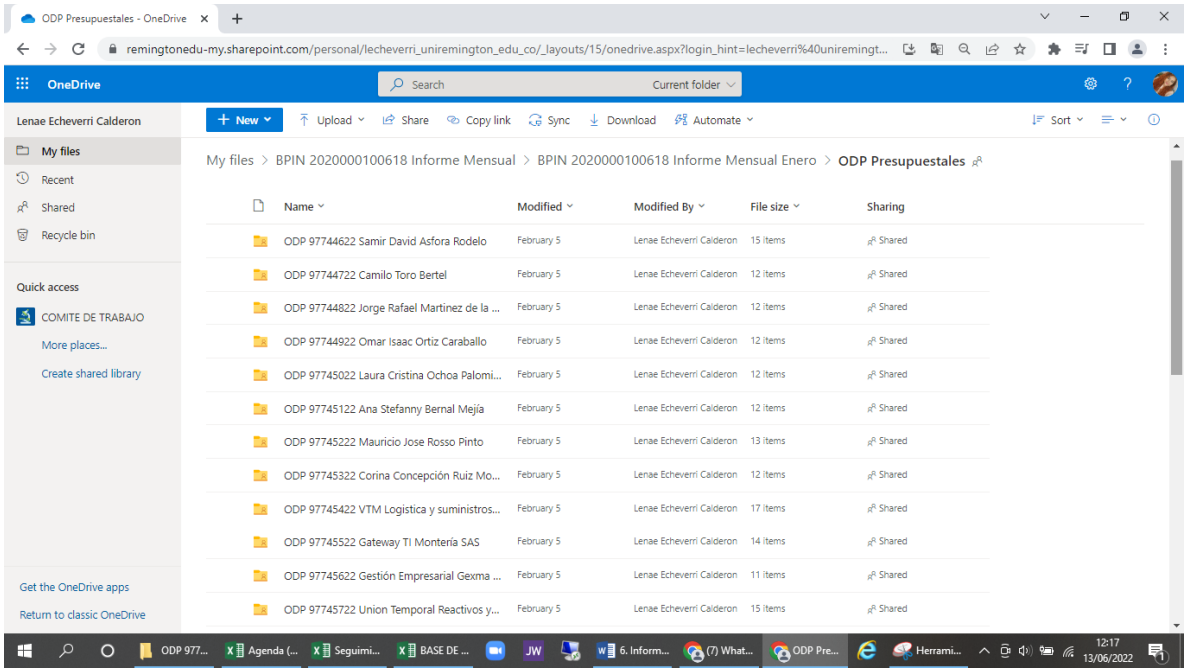

Fuente: OneDrive BPIN2020000618 Informe Mensual Enero> ODP PRESUPUESTALES/ Proyecto de regalías

En este mismo periodo se radicó una (1) Orden de Pago No Presupuestal con fecha de pago del 18 de febrero 2022.

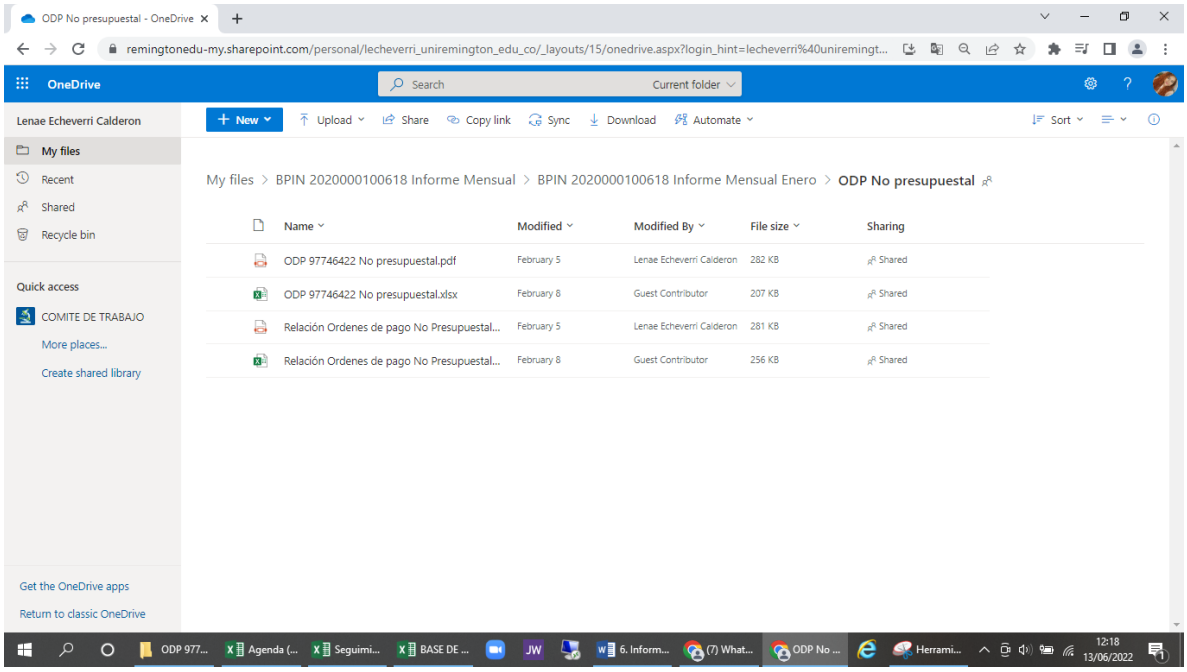

Fuente: OneDrive BPIN2020000618 Informe Mensual Enero> ODP NO PRESUPUESTALES / Proyecto de regalías

Conclusiones y Recomendaciones


1. De acuerdo a lo revisado en estos once contratos se observa que la administración ha cumplido con la buena tenencia de los documentos en la etapa pre contractual y contractual, además de la oportuna gestión de los requisitos por parte de los terceros involucrados.

2. Con relación al seguimiento y verificación de cada una de las obligaciones pactadas en los contratos, no se observó inconsistencia o incumplimiento.

3. Se observa que cada contratista tiene su informe de actividad con la respectiva firma de aprobación.

4. El acta de liquidación de los contratos número CRECO 16-HL-2021 del tercero Gateway Ti Montería SAS y el contrato número CRECO-09-KP-2021 del tercero Unión Temporal Reactivos y Suministros 2021se encuentran en trámite de firma por parte de los representantes legales.

5. La administración cumplió con el envió oportuno de los informes mensuales requeridos por parte de la supervisión de Minciencias.



_____

Ángela María Flórez Álvarez
Supervisor
