CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 2
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 6
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST 6
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 7
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **22000891 H3 de 2022**
Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN HAR S.A.S., NIT 900.545.202 - 5**
Periodo del informe: **Desde el 01 de julio de 2022 al 30 de julio de 2022.**
Fecha del informe: **01 de agosto de 2022**
Nombre del Interventor:
Área perteneciente: **Dirección Regional Centro Sur**

INFORMACION CONTRACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	
FECHA ACTA DE INICIO:	18 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	15 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL:	$ 188.643.938,00 COP M/CTE
VALOR ACTUALIZADO:	$ 188.643.938,00 COP M/CTE

* Incluir filas de prorrogas o adiciones generadas.

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LOS PROGRAMAS DE MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, VECTORES Y ROEDORES EN LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES ADSCRITOS A LA REGIONAL CENTRO SUR.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el período reportado y de acuerdo con el seguimiento realizado desde la supervisión del contrato, se ha evidenciado que el contratista ha realizado la totalidad de visitas del primer ciclo de intervenciones, para el mes pasado restaban las locaciones relacionadas con acceso restringido del Aeropuerto El Dorado, sin embargo, a la fecha ya se cubrieron las mismas.

En referencia a las situaciones presentadas durante la ejecución del contrato relacionadas en el informe N°1, se convocó a una reunión presencial al contratista con el ánimo de aclarar dichas situaciones, es importante resaltar que dicha reunión tuvo que ser aplazada en dos ocasiones, lográndose surtir hasta el día 26 de julio de 2022; como resultado de lo anterior, se relaciona el Acta N°2 mediante la cual se definieron los compromisos principales mediante los cuales se dará una adecuada ejecución del contrato. Los compromisos definidos en esta acta son:

1. Las cantidades ejecutadas durante la primera intervención se validarán mediante el uso de fotografías que tengan sello en la imagen y presenten las coordenadas, fecha, y hora del registro. En el caso de las trampas a roedores y otros animales (cebaderas) se fijarán en el sitio y se diligenciara la fecha de la intervención en la tabla correspondiente.
2. El contratista entregará a la supervisión un inventario por sitio de la presencia de cajas cebaderas a fin de esclarecer cantidades contratadas para el presente contrato.
3. El contratista realizará un ajuste de los diagnósticos presentados; lo anterior debido a las diferencias en lo reportado por el contratista, lo reportado en sitio y lo reportado por los Gerentes Aeroportuarios o en reportes de SST.
4. La entidad realizará el ingreso a almacén de los Ultrasonidos adquiridos por el contrato, con el fin de mantenerlos en inventario.
5. Se socializará con los administradores y gerentes aeroportuarios, que no se firmarán remisiones del contratista, sin cantidades diligenciada y validadas.
6. El contratista debía remitir un cronograma ajustado para la ejecución de las actividades restantes en el contrato; este fue recibido el día 27 de julio de 2022.
7. De acuerdo con las dificultades presentadas para el ingreso al CGAC Y ÁREAS RESTRINGIDAS, el contratista se compromete a remitir los documentos de ingreso cinco (5) día antes con el ánimo de dar el soporte necesario y así garantizar el ingreso a las instalaciones de la entidad.
8. El contratista se retracta del primer envío de documentos de cuenta N°1 y se compromete a remitirlos nuevamente, de acuerdo con los ajustes solicitados, sin incluir cajas cebaderas, ni ultrasonidos hasta contar con el inventario de la Organización SAS; en este sentido, el contratista remitió documentos de Acta Parcial N°1 el día 29 de julio de 2022. VER No 9.

9. Se requieren los conceptos sanitarios por sitio de ejecución toda vez que estos no fueron evidenciados en la documentación recibida por parte de la supervisión que forman parte integral de los documentos para dar trámite a la(s) acta parcial(es).
10. Es necesario por parte de la supervisión, solicitado por el ordenador del Gasto, evaluar y revisar lo relacionado con un otrosí modificatorio necesario para intervenir la Estación de Normandía en la ciudad de Bogotá D.C, en lo relacionado con las trampas y cebos para el control de roedores.

Los compromisos anteriores se generan con el ánimo de dar respuesta a las dificultades que se evidenciaron en algunos sitios en los cuales no se encontraron las cantidades reportadas por el contratista en sus documentos e informes, así como, las demás reportadas en el informe N°1.

PERÍODO: día 01 al día 30 de mes de julio del año 2022		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Observar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación del servicio, la efectividad de los derechos e intereses de LA AEROCIVIL, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, así como la observancia de los principios de transparencia, eficacia, lealtad y buena fe.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado.	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Al cumplimiento del contrato de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso, la propuesta general, la Resolución de Adjudicación y a lo previsto en el presente contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el Formato 9 – Matriz de Riesgos.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ

PERÍODO: día 01 al día 30 de mes de julio del año 2022		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato, con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Desarrollar las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Cumplir con el plan de garantías ofertadas.	No aplica para el período reportado.	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.	No aplica para el período reportado.	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Coordinar con el Interventor/Supervisor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la supervisión/Interventoría con el fin	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ

PERÍODO: día 01 al día 30 de mes de julio del año 2022		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
de que la entidad responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.		
Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la Aerocivil, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a la Aerocivil y a las autoridades competentes.	No aplica para el período reportado.	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ

PERÍODO: día 01 al día 30 de mes de julio del año 2022		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Atender las instrucciones del supervisor/interventor de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del consultor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Suscribir – conjuntamente con la Aerocivil – las actas y los demás documentos necesarios para la	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ

PERÍODO: día 01 al día 30 de mes de julio del año 2022		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
ejecución y liquidación del presente contrato.		
Presentar a la Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecución del presente contrato.	No ejecutada.	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.	No aplica para el período reportado.	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente.	No aplica para el período reportado.	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
Las demás que se encuentran contenidas en las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Previos del proceso.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ
A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato.	Se ejecuta la actividad durante el período reportado	Soportes disponibles en la carpeta OneDrive del siguiente link: https://cutt.ly/HZbT6uQ

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Las relacionadas en la tabla previa.

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Estos ítems están pendientes por ser validados de acuerdo con el último envío del informe del contratista y los compromisos adquiridos en la última reunión con el contratista y en todo caso lo establecido para lograr el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual con la calidad especificada y dentro del plazo convenido.

CAPITULO	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% DE ADELANDO O ATRASO
CENTRO NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN – CNA	$ 1.349.354,00	$ 950.194,00	24,29%	17,10%	-7,19%
AEROPUERTO FLAMINIO SUÁREZ CAMACHO – GUAYMARAL	$ 844.870,25	$ 445.710,25	20,78%	10,96%	-9,82%
CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA (CGAC) - BOGOTÁ D.C	$ 5.295.180,00	$ -	25,79%	0,00%	-25,79%
SUBESTACIÓN 34-5	$ 108.538,00	$ 121.848,00	24,98%	28,04%	3,06%
BASE SERVICIO AÉREO DE RESCATE (SAR)	$ 388.157,00	$ -	23,35%	0,00%	-23,35%
HANGAR DE LA AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA	$ 321.428,00	$ 121.848,00	50,69%	19,22%	-31,47%
ESTACIÓN AERONÁUTICA EL TABLAZO - SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA	$ 571.220,00	$ 371.640,00	34,87%	22,69%	-12,18%
ESTACIÓN AERONÁUTICA ZIPAQUIRÁ - ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA	$ 571.116,48	$ 571.116,48	39,79%	39,79%	0,00%
AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN - PAIPA, BOYACÁ	$ 776.240,00	$ 377.080,00	23,79%	11,56%	-12,23%
AEROPUERTO PERALES - IBAGUÉ, TOLIMA	$ 8.337.910,00	$ 4.260.870,00	35,78%	18,28%	-17,49%
AEROPUERTO JOSÉ CELESTINO MUTIS - MARIQUITA, TOLIMA	$ 3.318.386,00	$ 567.949,00	46,98%	8,04%	-38,94%
AEROPUERTO SANTIAGO VILA - FLANDES, TOLIMA	$ 3.460.554,00	$ 422.914,00	65,62%	8,02%	-57,60%
ESTACIÓN AERONÁUTICA LOMAS - MARIQUITA, TOLIMA	$ 1.766.135,00	$ 202.475,00	55,57%	6,37%	-49,20%
ESTACIÓN AERONÁUTICA PICALEÑA - PICALEÑA, TOLIMA	$ 1.324.828,00	$ 275.648,00	57,71%	12,01%	-45,70%

CAPITULO	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% DE ADELANDO O ATRASO
AEROPUERTO BENITO SALAS - NEIVA, HUILA	$ 5.698.450,00	$ 1.900.890,00	44,70%	14,91%	-29,79%
AEROPUERTO CONTADOR - PITALITO, HUILA	$ 4.847.080,00	$ 1.049.520,00	51,88%	11,23%	-40,65%
ESTACIÓN AERONÁUTICA EL TOTUMO - NEIVA, TOLIMA	$ 1.348.254,00	$ 299.074,00	57,56%	12,77%	-44,79%
ESTACIÓN AERONÁUTICA LETICIA - LETICIA, AMAZONAS	$ 1.485.671,00	$ 1.002.891,00	39,87%	26,91%	-12,96%
AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO - LETICIA, AMAZONAS	$ 4.813.244,00	$ 3.988.140,00	24,21%	20,06%	-4,15%
AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES - FLORENCIA, CAQUETÁ	$ 1.952.056,00	$ 1.552.896,00	23,03%	18,32%	-4,71%
AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO - SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ	$ 2.087.350,00	$ 1.688.190,00	23,15%	18,72%	-4,43%
AEROPUERTO TRES DE MAYO - PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	$ 2.053.574,00	$ 1.654.414,00	23,12%	18,63%	-4,49%
AEROPUERTO CANANGUCHAL - VILLAGARZÓN, PUTUMAYO	$ 1.132.146,80	$ 732.986,80	29,99%	19,42%	-10,57%

Fuente: documentos del Acta parcial No 1

revisada por el apoyo técnico a la supervisión y el apoyo Jurídico

A continuación se evidencia el seguimiento de la Supervisoría con el registro fotográfico y se cuenta con videos.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 1 caja cebadera en el aeropuerto de Mariquita

En la figura previa se evidencia una de las cajas cebaderas instaladas en el Aeropuerto de Mariquita. Se evidenció en algunas de las inspeccionadas cebos y diligenciamiento del cuadro de control. Por otra parte, también se identificó que algunas de las cajas no fueron intervenidas.

Esta situación se requirió al contratista y como compromiso se estableció que este debía generar un inventario y aclarar las cantidades ejecutadas.



Ilustración 2 cebadera aeropuerto San Vicente del Caguán



Ilustración 7 Cajas cebaderas sin intervenir

Como se manifestó previamente, algunas de las cajas no fueron intervenidas adecuadamente como se presenta en la ilustración 6.

Deben en cada caso diligenciar la fecha de la intervención



Ilustración 8 colocación del cebo aeropuerto San Vicente del Caguán

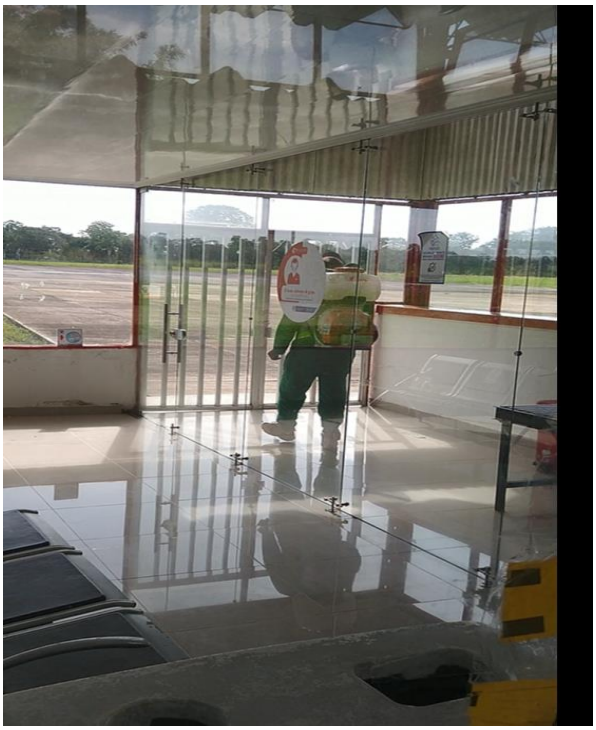


Ilustración 3 Fumigación área aferente a la sala de embarque aeropuerto San Vicente del Caguán



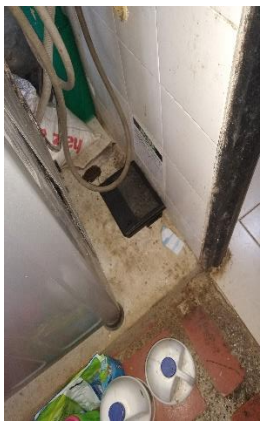


Ilustración 4 trampas cebaderas aeropuerto San Vicente del Caguán



Ilustración 9 cebadera ubicada al costado de la malla y el baño del aeropuerto San Vicente del Caguán



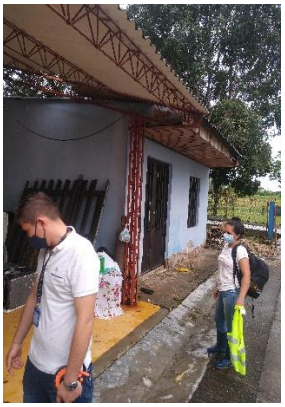


Ilustración 10 trampas cebaderas aeropuerto San Vicente del Caguán casa fiscal administración



Ilustración 5 cebaderas evidencia seguimiento Supervisión aeropuerto San Vicente del Caguán



Ilustración 6 intervención en: área(s) aferente(s) a caseta vigilancia VOR DME; fumigación sala de espera, jardín terminal pax.

Se enfatiza al colaborador contratista ORGANIZACIÓN HAR SAS la necesidad del uso de los elementos de protección personal EPP y el diligenciamiento de la fecha de intervención, como los permisos de trabajo en altura, en general el cumplimiento de la normatividad SST aplicable.

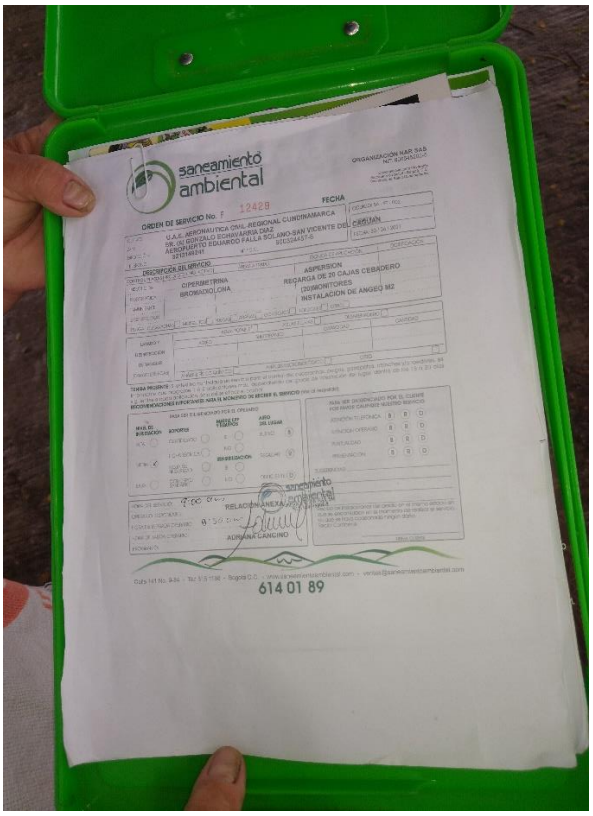


Ilustración 11 original de la orden de servicio papel químico con copia(s)

Se ratifica en este informe lo tratado en reunión presencial con el R/L del colaborador contratista, con el ordenador del gasto y el equipo jurídico: Toda vez que se tienen las evidencias de las no conformidades entre lo firmado en sitio por la Entidad en las ordenes de servicio y lo presentado por el contratista en sus informes.

Nota: también se tiene seguimiento en EDR, CNA, CGAC y locaciones.	

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
NA	NA	NA	SI	NO

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se realizaron las respectivas observaciones en los informes presentados por parte del contratista, dichas observaciones en general se resumen en lo siguiente:

1. Los diagnósticos no fueron socializados con la supervisión como se solicitó en las especificaciones y no se ajustan a lo evidenciado en sitio entre otros la presencia de insectos voladores, abejas, avispas y animales rastreros como serpientes.

2. Se presentan diferencias entre lo evidenciado en sitio contra lo que el contratista reportó en su primer envío para cobro.

3. Es necesario presentar cantidades ejecutadas, cada una con su registro fotográfico con fecha y ubicación (coordenadas), lo anterior debido a que se han presentado inconsistencias en las cantidades relacionados y las evidenciadas en sitio.

4. Es necesario contar con el concepto sanitario favorable de la aplicación, así mismo, deberá constar en un oficio que las intervenciones se hacen a nombre de Organización HAR SAS.

5. Se evidenció que la remisión diligenciada en la original difiere con lo presentado como ejecutado ver (registro fotográfico), esto quiere decir que la(s) cantidad(es) fue(ron) diligenciada(s) posterior a la ejecución del servicio, como se revisó en los informes remitidos por el contratista y en las copias que se tienen, adicionalmente, durante el recorrido se evidenció que no hay monitores instalados en los sitios verificados.

6. Las demás presentadas previamente, mediante reuniones presenciales, comunicaciones por medio de correos y telefónicas.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Las presentadas en los numerales previos y en el registro fotográfico, actas entre otras.

6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI
2	Tipo de riesgo	Riesgo Operacional
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	Debido al seguimiento a la ejecución del contrato se encontraron diferencias frente a las cantidades y diagnósticos en la primera intervención.
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	Atender oportunamente desde la supervisión dichas inconsistencias.
5	¿Fue oportuna la mitigación?	SÍ
OBSERVACIONES:		

7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

7.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
18/05/2022	15/12/2022

7.2 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
18/05/2022	

8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

9.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:

CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($188.643.938) INCLUIDO IVA

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO					
No. PAGO	**FECHA DE RADICACIÓN EN CxP**	**VALOR PAGADO**	**VALOR PAGADO ACUMULADO**	**% EJECUTADO EN PAGOS**	**SALDO POR PAGAR**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

9.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	18/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	15/12/2022
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$188.643.938,00
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 53.851.742,53
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	33,34%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 25.896.074,60
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	13,72%
% DE ATRASO O ADELANTO O DENTRO DEL PLAN (0%)	-19,61%

NOTA: Toda vez que EL CONTRATISTA ORGANIZACIÓN HAR SAS EJECUTÓ OTROS ÍTEMS NO INCLUÍDOS EN EL ACTA No.1 el atraso no representa una preocupación una vez -La Organización HAR- ajusten las observaciones de esta supervisoría.

9.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	Ocho (8) meses
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)	Dos (2) meses
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	25%

10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO:	**NA**
SOLICITUD DE ADICIÓN:	NA
SOLICITUD DE PRORROGA:	NA
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:	NA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:	NA
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA:	NA
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURIDICOS:	Se realizó una reunión con presencia de equipo jurídico para aclarar las condiciones de ejecución del contrato y se suscribió el Acta de seguimiento contractual N°2 con los compromisos necesarios para mejorar la ejecución del contrato.

ESTADO DE LAS GARANTIAS

CLASE DE GARANTÍA:	UNICA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
NUMERO DE GARANTÍA:	33-44-101225658 /33-40-101068514		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:	22 de abril del 2022	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:**	25 de abril del 2022
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:	Cumplimiento- pago de salarios y prestaciones sociales - calidad del servicio- responsabilidad civil extracontractual		
MODIFICATORIO:	NA		
FECHA DE APROBACIÓN:	25 de abril del 2022		
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:	SI		
OBSERVACIONES:	NA		

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Ing. JORGE ESTEBAN ROJAS TORO
APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN

Abogado RAFAEL PATIÑO
APOYO JURIDICO SUPERVISIÓN

Ing. JORGE BELTRÁN
PROFESIONAL AERONAUTICO II DRCS
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
