Rad. 3190
Hora 9:03am.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Fecha 6/09/22 Hora 9:03AM
Rad. 3190

920.40.25

Yopal, 06 de septiembre de 2022

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	Contrato de Consultoría No. 0332 de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de enero de 2022
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TACNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET"

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Item	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	INFORME MENSUAL No. 3	121
2	Anexo No. 1. Soporte de pago – servicios profesionales	2
3	Anexo No. 2. Soporte de pago – servicio de transporte	2
4	Anexo No. 3. Soporte de pago – alquiler de oficina	3
5	Anexo No. 4. Soporte de pago – elaboración de documentos, fotografías y procesamiento, papelería general.	3
6	Anexo No. 5. Soporte de pago – seguridad social	5
7	Anexo No. 6. Soporte correspondencia enviada	12
8	Anexo No. 7. Soporte correspondencia recibida	14
9	Anexo No. 8. Soporte – Actas de comité	9
10	Anexo No. 9. Matriz financiera contrato de prestación de servicio No. 0260 de 2022	13

11	Anexo No. 10. Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del contrato de consultoría No. 0332 de 2022	5
12	Anexo No. 11. Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del contrato de prestación de servicios No. 0260 de 2022	3
13	Anexo No. 12. Soporte Actas de visita.	34
14	Anexo No. 13 Desglose de porcentaje por actividad	5
14	Anexo 14. Informe mensual 3 del contrato de prestación de servicios 0260 de 2022.	407
TOTAL, FOLIOS REMITIDOS		**638**

Atentamente,

ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico de Desarrollo Rural

Anexos: (638) folios

Proyectó: Ginna Xiomara Gomez Sanabria
C.P.S.P. No. 0942 de 2022

Proyectó: Juan Carlos Méndez Antolínez
C.P.S.P. No. 1039 de 2022

Proyectó: Raúl Alfredo Cuevas Monroy
C.P.S.P. No. 0739 de 2022

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

CONTRATO DE CONSULTORIA:

N° CAS-OAJ-CMA-036-2021 Y N° INTERNO 0332 DE 2022-01-24

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSULTOR:

FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET"

INFORME DE AVANCE: NUMERO TRES (03)

PERIODO DE INFORME:

04 DE ABRIL 2022 AL 03 DE MAYO 2022

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

1. OBJETIVO DEL INFORME:

La interventoría mediante el presente documento prevé informar a la entidad contratante la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 0260 de 2022-01-21, suscrito entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Resguardo Productivos 2021. A través del presente tercer informe de avance se consignan de manera general las actividades del control y seguimiento adelantadas por la firma consultora, en desarrollo del contrato de consultoría 0332-2022-01-24, durante el periodo comprendido del 04 de abril al 03 de mayo de 2022.

2. INFORMACION CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 0332-2022-01-24.

En la siguiente tabla, se describe relación de información contractual relevante generada en la ejecución del contrato de consultoría 0332-2022-01-24

CONTRATO N°	CAS-OAJ-CMA-036-2021 Y N° INTERNO 0332-2022-01-24
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATISTA	FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET"
NIT	900.114.779-3
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL DESARROLLO DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO	$ 373.051.722,00
PLAZO EJECUCION INICIAL	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	04-FEBRERO-2022
FECHA DE TERMINACION	18-AGOSTO-2022

2.1 MODIFICATORIOS:

Durante el presente periodo de ejecución no se realizó modificaciones y/o aclaraciones al contrato de consultoría 0332-2022-01-24.

2.2 SOPORTE PRESUPUESTAL:

La Gobernación de Casanare, expidió en marco de la ejecución del Contrato de Consultoría 0332-2022-01-24, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y consecuentemente Registro presupuestal, los cuales garantizan el respaldo económico del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla.

Fuente	Certificado Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
GO4900AD017021 100 202000585004101	21000213	20-10-2021	$ 373.055.127,00	2200332	26-01-2022	$ 373.051.722,00
Valor total				$ 373.051.722,00		

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

2.3 RELACION CANCELACION DE IMPUESTOS ESTAMPILLAS:

Por parte de la firma consultora FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET", en marco de la ejecución del Contrato de Consultoría N° 0332-2022-01-24, efectuó cancelación de estampillas respecto al valor del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla.

Concepto Impuesto Cancelado	Contrato Inicial		
	Fecha	N°	Valor
Estampilla Pro Cultura	31-01-2022	22003689	$ 3.134.900,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	31-01-2022	22003690	$ 9.404.700,00
Estampilla Pro Desarrollo	31-01-2022	22003691	$ 3.134.900,00
Estampilla Pro Deporte	31-01-2022	22001864	$ 7.837.221,00
Estampilla Pro Unitropico	01-02-2022	22008299	$ 4.702.332,00

2.4 SUSPENSIONES:

Durante el periodo de ejecución no se presentaron suspensiones al contrato de consultoría N° 0332 -2022-01-24, al no presentarse situaciones que ameriten dicha exención.

2.5 GARANTIAS:

La FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET", en marco de la ejecución del Contrato de Consultoría N° 0332-2022-01-24, constituyo pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. N° 57-44-101002093 (a la suscripción del contrato), anexo 2 (al acta de inicio), siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula decima Garantías del Contrato de Consultoría 0332-2022-01-24, con total cubrimiento de los montos exigidos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla.

POLIZAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0332 -2022-01-24				
CONDICIONES DE ACUERDO AL CONTRATO INICIAL				
POLIZA N° 57-44-101002093 ANEXO 0				
Descripción de Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Cumplimiento General del Contrato	02-02-2022	24-01-2022	10-12-2022	$ 37.305.172,20
Manejo del Anticipo		24-01-2022	10-12-2022	$ 111.915.516,60
Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones		24-01-2022	10-08-2025	$ 18.652.586,10
Calidad del servicio		24-01-2022	10-12-2022	$ 37.305.172,20

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

POLIZAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0332 -2022-01-24				
CONDICIONES DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO				
POLIZA N° 57-44-101002093 ANEXO 2				
Descripción de Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Cumplimiento General del Contrato	11-02-2022	04-02-2022	21-12-2022	$ 37.305.172,20
Manejo del Anticipo		04-02-2022	21-12-2022	$ 111.915.516,60
Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones		04-02-2022	21-08-2025	$ 18.652.586,10
Calidad del servicio		04-02-2022	21-12-2022	$ 37.305.172,20


2.6 AVANCE DEL CONTRATO:

2.6.1 Proyección Física:

De acuerdo al plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima del contrato de consultoría N°0332-2022-01-24, tiene un plazo de ejecución de seis (6) meses y quince (15) días, a continuación, se relaciona cuadro explicativo de avance de ejecución de tiempo.

Plazo de ejecución inicial	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha acta de inicio	04-FEBRERO 2022
Periodo	04-04-2002 AL 03-05-2022
Meses	03
Número de días ejecutados	90
Porcentaje de tiempo ejecutado del periodo	15.38%
Porcentaje de tiempo acumulado	46.15%

Con la anterior tabla se realiza la descripción de la ejecución del contrato de consultoría N°0332-2022-01-24, en tiempo de acuerdo al plazo de ejecución del contrato, el cual a la fecha de corte del presente informe presenta un avance acumulado de reporte de tiempo de un 46.15% contra un 100% de lo programado.

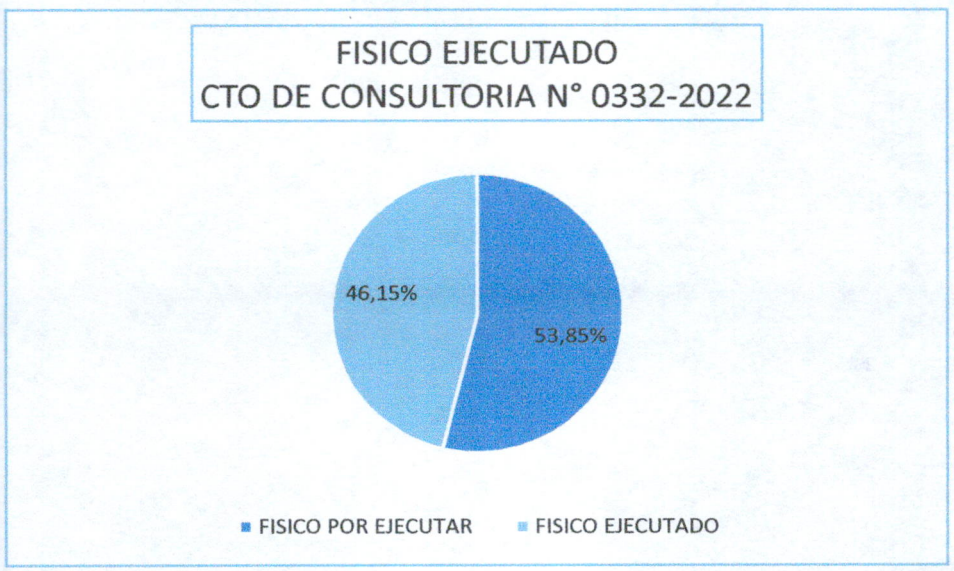

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

2.6.2 Proyección financiera

En desarrollo de la ejecución del contrato de consultoría N°0332-2022-01-24, por la FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET", se avanza con las estipulaciones del orden financiero y contractual generándose una proyección financiera, correspondiente al periodo comprendido del 04 de abril de 2022 al 03 de mayo de 2022. Los soportes de pago de los servicios profesionales se encuentran adjuntos en el anexo 1, servicio de transporte en el anexo 2, alquiler de oficina en el anexo 3 y elaboración de documentos, fotografías y procesamiento, papelería en general se encuentran en el anexo 4.


ITEM	PRODUCTOS	UNIDAD	CANTD	VALOR POR ACTIVIDAD	EJECUCION				
					CANTD	MES 1: 04 FEBRERO AL 03 MARZO 2022	MES 2: 04 MARZO AL 03 ABRIL 2022	MES 3: 04 ABRIL AL 03 MAYO 2022	PORCENTAJE
1	ACTIVIDADES EN ETAPA PRELIMINAR DEL CONTRATO								
1.1	REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	UND	1	$ 23,045,024.12	1	$ 23,045,024.12	$ 0	$ 0	100%
1.2	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCUION								
2	ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION								
2.1	FUNCIONS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	UND	1	$ 15,212,289.62	1	$ 0	$ 2,535,382	$ 2,535,382	0.33
2.3	FUNCIONES TECNICAS	UND	1	$ 183,464,518.10	1	$ 0	$ 33,357,185	$ 33,357,185	0.36
2.5	FUNCIONES CONTABLES	UND	1	$ 15,642,218.82	1	$ 0	$ 3,128,444	$ 3,128,444	0.40
2.9	FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO	UND	1	$ 17,500,429.44	1	$ 0	$ 2,916,738	$ 2,916,738	0.36
3	ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION								
3.1	ACTIVIDADES DE LIQUIDACION CONTRATO PRINCIPAL Y D EINTERVENTORIA	UND	1	$ 58,624,361.96		$ 0	$ 0	$ 0	0.0
				SUB TOTAL		$ 23,045,024.12	$ 41,937,748.71	$ 41,937,748.71	34.11%
				IVA 19%		$ 4,378,554.58	$ 7,968,172.25	$ 7,968,172.25	
				COSTO FINAL		$ 27,423,578.70	$ 49,905,920.96	$ 49,905,920.96	
				VALOR TOTAL ACUMULADO				$ 127,235,420.62	
				PORCENTAJE DE AVANCE		7.35%	13.38%	13.38%	

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Balance Financiero.				
Concepto	Valor del Contrato	Anticipo	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar
Valor Contrato	$ 373.051.722,00			
Valor Anticipo		$ 111.915.516,60		
Valor Ejecución Periodo 1			$ 27.423.578,70	
Valor Ejecución Periodo 2			$ 49.905.920,96	
Valor Ejecución Periodo 3			$ 49.905.920,96	
Valor por Ejecutar				$ 245.816.301,38
Total	$ 373.051.722,00	$ 111.915.516,60	$ 127.235.420,62	$ 245.816.301,38

Con la anterior tabla se realiza la descripción de la ejecución financiera del contrato de consultoría N°0332-2022-01-24, en tiempo de acuerdo al plazo de ejecución del contrato, el cual a la fecha de corte del tres (3) de mayo de 2022 del presente informe presenta un avance de reporte de ejecución de $ 127.235.420,62 equivalente a un 34,11 % contra un 100% de lo programado.

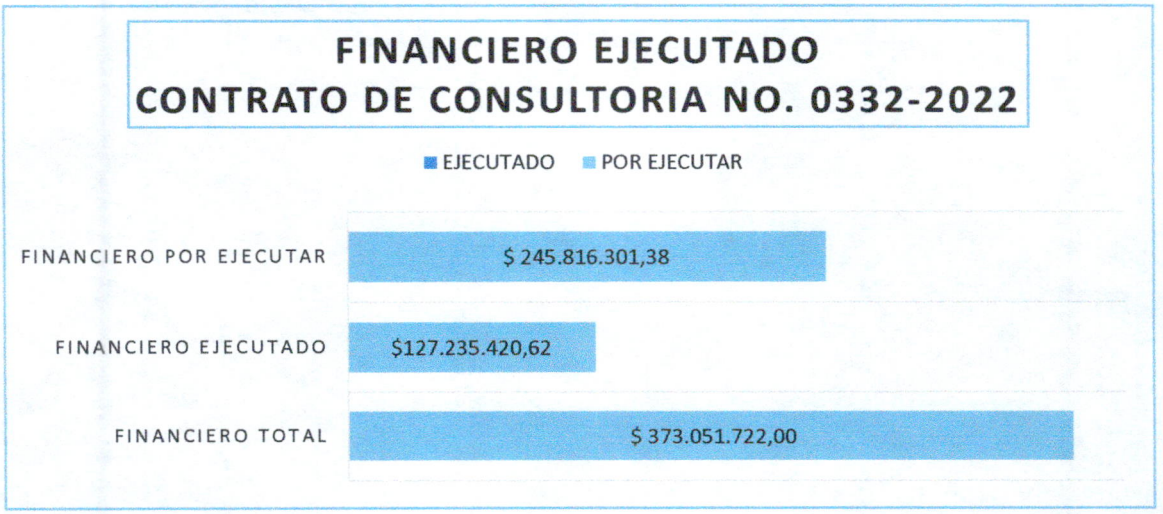

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORIA:

El presente informe de avance da cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de consultoría N° 0332-2022-01-24, a nombre de FIDET y celebrado con el Departamento de Casanare del cual se contrató la interventoría al contrato de prestación de servicios N°0260-2022-01-21 a nombre del Consorcio Resguardos Productivos 2021; soportando el componente administrativo en el recurso humano, servicio de transporte, elaboración de documentos y oficina.

3.1 RECURSO HUMANO:

Se contrató el personal administrativo mediante nomina, con experiencia profesional mínima de tres (3) años, de los cuales deberá acreditar como mínimo un (1) año en experiencia relacionada con la ejecución de

interventorías a proyectos agropecuarios. Correspondiente a profesional categoría 6 de acuerdo con la Resolución 0056 del 23 de febrero de 2018, actualizada al 2020. Así tres (3) Ingenieros Agrónomos y un (1) Médico Veterinario. Para este periodo se hace el cambio de agrónomo una vez fue aprobada la hoja de vida por la Gobernación, el día 26 de abril del 2022. Se aclara que el señor Orlando Barragán estuvo en vigencia hasta el día 26-04-2022, quedando para los siguientes periodos el agrónomo Julio Augusto Parra en vigencia.

Un (1) Profesional con título de Pregrado como Contador, administrador de empresas o administrador financiero, con experiencia Profesional no menos a dos (2) años, correspondiente a profesional Categoría 8 de acuerdo con la Resolución 0056 de 23 de febrero del 2018. Actualizada al 2020.

Un (1) Profesional con título de Pregrado como Abogado, con experiencia Profesional no menos a dos (2) años, correspondiente a profesional Categoría 8 de acuerdo con la Resolución 0056 de 23 de febrero del 2018. Actualizada al 2020.

Ítem	Cargo a Desempeñar	Nombre	Identificación	Dedicación	Fecha Inicio	Fecha salida
1	Ingeniero Agrónomo	Alfonso Sáenz Galindo	17.339.583	65.12%	04-Febrero 2022	Vigente
2	Ingeniero Agrónomo	Juan Esteban Carvajal	17.328.831	65.12%	04-Febrero 2022	Vigente
3	Ingeniero Agrónomo	Orlando Barragán Madrid	1.118.775.293	65.12%	04-Febrero 2022	26-abril-2022
4	Ingeniero Agrónomo	Julio Augusto Parra Leal	19.389.332	65.12%	27-Abril-2022	Vigente
5	Médico Veterinario	Moisés Gualdrón Jaspe	74.865.554	64.19%	04-Febrero 2022	Vigente
6	Contador	Yuly Reyes Ojeda	1.116.776.270	26.05%	04-Febrero 2022	Vigente
7	Abogado	Aldemar Alfonso Rodríguez Lizarazo	74.281.241	25.03%	04-Febrero 2022	vigente

Los soportes de pago de servicios prestados se encuentran relacionados en el Anexo 1, mediante planilla de nómina de FIDET con el personal contratado para el periodo del 04 de abril al 03 de mayo de 2022.

Los soportes de pago de seguridad social y demás se encuentran adjuntos en el Anexo 5. Que a continuación se detallan así: Se anexa la planilla del señor Julio Augusto Parra por sus días laborados en este periodo.

Nombre	No. Planilla	IBC	Valor Cancelado			Vr. Total Cancelado
			Salud	Pensión	ARL	
José William Torres	9434660885	$1.000.000	$40.000	$160.000	$69.600	$309.600
Alfonso Sáenz Galindo	9434649119	$2.858.127	$114.400	$457.400	$15.000	$701.200
Juan Esteban Carvajal	9434649119	$2.858.127	$114.400	$457.400	$15.000	$701.200
Orlando Barragán Madrid	9435670678	$ 2.477.044	$99.100	$396.400	$13.000	$607.600
Julio Augusto Parra Leal	9434649119	$2.572.315	$102.900	$411.600	$13.500	$630.900
		$285.813	$0	$34.300	$0	$34.300
Moisés Gualdrón Jaspe	9434649119	$2.817.309	$112.700	$450.800	$14.800	$691.000

7

Yuly Reyes Ojeda	9434649119	$700.000	$28.000	$112.000	$3.700	$171.700
		$300.000	0	$36.000	0	$36.000
Ademar Alfonso Rodríguez Lizarazo	9434649119	$666.667	$26.700	$106.700	$3.500	$147.200
		$333.334	0	$40.100		$40.100

3.2 RELACION DE CORRESPONDENCIA:

En desarrollo de las labores de interventoría se recibieron comunicaciones procedentes de supervisión y contratista, las cuales han sido atendidas y se han dado sus respuestas en los tiempos acordes durante el periodo comprendido del 04 de abril al 03 de mayo de 2022.

3.2.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

En la siguiente tabla se relaciona las comunicaciones enviadas durante el presente periodo del 04 de abril al 03 de mayo de 2022, por parte de FIDET, los soportes de la correspondencia enviada se encuentran adjuntos en el Anexo 6 así:

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Fecha	**Fecha Radicado**	**Destinatario**	**Asunto**
06-04-2022	06-04-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo	Respuesta a oficio No. 530.29-01 No. 152
08-04-2022	08-04-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo	Respuesta al oficio No. 530-29-01 No. 154 y entrega del informe No. 01 con las correcciones requeridas.
08-04-2022	08-04-2022	Leidis Álvarez Romero	Solicitud de entrega de informe avance No. 02 del contrato No. 0260-2022
08-04-2022	08-04-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo	Respuesta a oficio No. 530.29-01 No. 172 solicitud subsanación hoja de vida para cambio de profesional del contrato de consultoría No. 0322-2022-01-24.
15-04-2022	15-04-2022	Leidis Álvarez Romero	Reiteración de entrega del informe de avance No. 02 del contrato No. 0260-2022.
21-04-2022		María Alejandra Salcedo Restrepo	Respuesta a oficio No. 530-29-02 No. 173 Solicitud información de entradas a almacén.
28-04-2022	29-04-2022	Leidis Álvarez Romero	Solicitud de matriz financiera y cronograma de actividades.
02-05-2022	02-05-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo	Entrega informe de avance No.02 del contrato de consultoría No. 0332-2022-01-24

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

3.2.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

En la siguiente tabla se relaciona las comunicaciones recibidas durante el presente periodo 04 de abril al 03 de mayo de 2022., los soportes de la correspondencia recibida se encuentran adjuntos en el Anexo 7 así:

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
N° Oficio	**Fecha Recibido**	**Origen de Oficio**	**Asunto**
	06-04-2022	Leidis Álvarez Romero R/L Consorcio Resguardos Productivos 2021	Respuesta oficio de fecha 31 de marzo solicitando información
	09-04-2022	Leidis Álvarez Romero R/L Consorcio Resguardos Productivos 2021	Respuesta oficio de fecha 31 de marzo solicitando información.
530.29-01 N° 200	20-04-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Revisión técnica, administrativa y financiera para el tercer mes de ejecución.
	22-04-2022	Leidis Álvarez Romero R/L Consorcio Resguardos Productivos 2021	Entrega informe No. 02 periodo 04 de Marzo al 03 de abril del 2022.
530.29-01 N° 208	25-04-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Tercer comité técnico – Contrato de consultoría No. 0332 de 2022.
530.29-01 N° 211	26-04-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Solicitud matriz financiera, cronograma de actividades y certificado de afiliación del personal vinculado.
530.29-01 N° 219	27-04-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Fecha límite de entrega de informes mensuales del Contrato de consultoría N° 0332 del 24 de enero del 2022.
530.29-01 N° 212	03-05-2022	María Alejandra Salcedo Restrepo – Directora Técnica de Desarrollo Rural	Respuesta a solicitud de evaluación y aprobación cambio de hoja de vida de profesionales propuestos para el desarrollo del contrato de consultoría N0. 0332 de 2022.

3.3 COMITES TECNICOS DE DIRECCION Y MESAS DE TRABAJO:

En la ejecución del contrato por interventoría se realizó apoyo en cada una de las mesas de trabajo o comités técnicos de seguimiento, citada a Dra. Leidis Álvarez Romero la representante legal del Consorcio Resguardos Productivos 2021, contribuyendo a la solución para la normal ejecución del contrato de prestación de servicios 0260-2022-01-21 se relaciona en la siguiente tabla los temas tratados y los compromisos pactados durante el periodo comprendido del 04 de abril al 03 de mayo de 2022. Ver anexo 8.

Ítem	Fecha realizada	Acta/comité /Reunión	Tema Tratado	Compromiso /Conclusiones
1	05-04-2022	Acta reunión N° 1	Programación de nuevas fechas de talleres de campo	Interventoría revisó y aprobó la programación de las nuevas fechas de talleres de campo, con el objeto de rescatar el conocimiento ancestral y manejo técnico de las diferentes especies agrícolas de los bancos de semilla, verifico que dicha programación cumpla con las tematicas establecidas contractualmente. También, dialogaron los temas de cada jornada para los tres resguardos.

2	12-04-2022	Acta reunión N° 2	Demostración de método de adecuaciones del suelo y demostración de métodos de encalado	Interventoría se reúne con el contratista para tratar temas sobre adecuación de suelos y demostración del método de encalado, donde manifiestan el debido procedimiento para dicho proceso.
3	22-04-2022	Acta reunión N° 3	Comité técnico de seguimiento	Se reunieron el contratista con interventoría y supervisores para tratar temas importantes del tercer mes de ejecución, el contratista manifiesta que los talleres de campo los han venido haciendo de acuerdo al cronograma de actividades establecido, de igual forma, manifiesta que están en proceso ante la entidad bancaria para cobrar el anticipo de la cuenta fiduciaria.
4	23-04-2022	Acta reunión N° 4	Protocolo de Bioseguridad	Interventoría revisa y aprueba el protocolo de bioseguridad presentado por el contratista, verifica que el documento cumpla con la normatividad legal vigente emitida por el ministerio de salud y protección social en cuanto a medidas de protección al COVD-19.
5	29-04-2022	Acta reunión N° 5	Tercer comité técnico de seguimiento	Interventoría se reúne con supervisión y el contratista, dialogan sobre las entradas a almacén, igualmente acordaron realizar un plan de mejora para mejorar asistencia de las comunidades y demás.
6	30-04-2022	Acta reunión N° 6	Seguimiento de actividades	La interventoría realizo seguimiento de las actividades en cuanto a preparación de suelo, encalados, trazado, plateado y ahoyado, verificando el cumplimiento de casa una de las actividades antes mencionadas

4. INFORMACION FINANCIERA DE INTERVENTORIA.

La FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET", respetuosa de las condiciones contractuales pactadas respecto a recursos destinados para la ejecución del contrato de consultoría CAS-OAJ-CMA-036-2021 Y N° INTERNO 0332-2022-01-24, suscrito con el Departamento de Casanare, por un valor de $ 373.051.722,00 y un plazo de seis (6) meses y quince (15) días, ha efectuado adecuada ejecución financiera, garantizando el cumplimiento de obligaciones adquiridas por costos directos, a continuación detallamos.

4.1. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.

Conforme a la forma de pago establecida en la cláusula sexta del contrato de consultoría N° 0332-2022-01-24 dice "Se entregará un anticipo equivalente al treinta (30%) por ciento del valor total del contrato previa suscripción del acta de inicio". El cual fue radicado el pasado 08 de febrero de 2022, en la dependencia de oficina jurídica y siguen en vigentes en la operación de la Interventoría.

Contrato N° 0332-2022-01-24		Valor desembolsado por Solicitud Anticipo	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Valor contrato inicial	$ 373.051.722,00	Anticipo contrato inicial	$ 111.915.516,60

4.1.1. INVERSIONES DEL ANTICIPO

Para el presente periodo se informa a la administración departamental que los recursos girados a la cuenta de ahorro N° 629-000015-34, de Bancolombia, para el manejo que el anticipo del contrato 0332-2022 se han

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

realizado sus inversiones en un 100% de la siguiente manera de acuerdo al plan de inversión del anticipo presentado:

Fecha	Beneficiaros	Valor	Descripción del egreso
Febrero	Alfonso Sáenz Galindo	$ 2,858,127	Pago honorarios febrero 2022
	Juan Esteban Carvajal	$ 2,858,127	Pago honorarios febrero 2022
	Orlando Barragán Madrid	$ 2,858,127	Pago honorarios febrero 2022
	Moisés Gualdrón Jaspe	$ 2,817,319	Pago honorarios febrero 2022
	Yuly Reyes Ojeda	$ 686,003	Pago honorarios febrero 2022
	Ademar Alfonso Rodríguez Lizarazo	$ 659,142	Pago honorarios febrero 2022
	Transporte	$18,390,658,65	Pago servicio de transporte a COOTRALLANERO LTDA Periodo del 04 febrero a 03 marzo 2022
	Elaboración Documentos	$ 3,213,000	Pago servicio de papelería a LINA SOFIA CAMELO Periodo del 04 febrero a 03 marzo 2022
	Oficina	$928,200	Pago servicio de oficina a LEIDY JOHANA MORENO Periodo del 04 febrero a 03 marzo 2022
Marzo	Alfonso Sáenz Galindo	$ 2,858,127	Pago honorarios marzo 2022
	Juan Esteban Carvajal	$ 2,858,127	Pago honorarios marzo 2022
	Orlando Barragán Madrid	$ 2,858,127	Pago honorarios marzo 2022
	Moisés Gualdrón Jaspe	$ 2,817,319	Pago honorarios marzo 2022
	Yuly Reyes Ojeda	$ 686,003	Pago honorarios marzo 2022
	Ademar Alfonso Rodríguez Lizarazo	$ 659,142	Pago honorarios marzo 2022
	Transporte	$18.390.658,65	Pago servicio de transporte a COOTRALLANERO LTDA Periodo del 04 marzo a 03 abril 2022
	Elaboración Documentos	$ 3,213,000	Pago servicio de papelería a LINA SOFIA CAMELO Periodo del 04 marzo a 03 abril 2022
	Oficina	$928,200	Pago servicio de oficina a LEIDY JOHANA MORENO Periodo del 04 marzo a 03 abril 2022
Abril	Alfonso Sáenz Galindo	$ 2,858,127	Pago honorarios abril 2022
	Juan Esteban Carvajal	$ 2,858,127	Pago honorarios abril 2022
	Orlando Barragán Madrid	$ 2,477,043	Pago honorarios abril 2022
	Julio Augusto Parra Leal	$ 381.084	Pago honorarios abril 2022
	Moisés Gualdrón Jaspe	$ 2,817,319	Pago honorarios abril 2022
	Yuly Reyes Ojeda	$ 686,003	Pago honorarios abril 2022
	Ademar Alfonso Rodríguez Lizarazo	$ 659,142	Pago honorarios abril 2022
	Transporte	$18.390.658,65	Pago servicio de transporte a COOTRALLANERO LTDA Periodo del 04 Abril a 03 Mayo 2022
	Elaboración Documentos	$ 3,213,000	Pago servicio de papelería a LINA SOFIA CAMELO Periodo del 04 Abril a 03 Mayo 2022
	Oficina	$928,200	Pago servicio de oficina a LEIDY JOHANA MORENO Periodo del 04 Abril a 03 Mayo 2022

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

4.2 CONDICIONES DE PAGO.

Conforme a lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato de consultoría N° 0332-2022-01-24, "*Se entregará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato previa suscripción del acta de inicio. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, deberá reintegrarse a la entidad. El valor del contrato se pagará mediante actas parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato con amortización del anticipo, suscritas con el interventor del contrato y se entregará un Pago final correspondiente al saldo restante del valor facturado que no puede ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato previa suscripción del acta de liquidación.*

Condiciones pago del contrato		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Actas parciales	90%	$ 335.746.549,80
Actas de liquidación	10%	$ 37.305.172,20
Total	100%	$ 373.051.722,00

5. INFORMACION CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAM-040-2021 Y N° INTERNO 0260 DE 2022-01-21.

A continuación, relacionamos la información relevante del proceso en mención su vigencia contractual no se ha modificado para el periodo comprendido del 04 de abril al 03 de mayo de 2022, así:

CONTRATO N°	CAS-OAJ-SAM-040-2021 Y N° INTERNO 0260-2022-01-21
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO RESGUARDO PRODUCTIVOS 2021
NIT	901.556.682-8
OBJETO	DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.329.809.469,00
PLAZO EJECUCION INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	04-FEBRERO-2022
FECHA DE TERMINACION	03-AGOSTO-2022

5.1 MODIFICATORIOS.

Durante el presente periodo de ejecución no se realizaron modificaciones y/o aclaraciones al contrato de prestación de servicios N°0260-2022-01-21.

5.2 SOPORTES PRESUPUESTALES.

La Gobernación de Casanare, expidió en marco de la ejecución del contrato de prestación de servicio No. 0260-2022-01-21, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y consecuentemente Registro presupuestal, los cuales garantizan el respaldo económico del contrato suscrito, para este periodo comprendido del 04 de abril al 03 de mayo de 2022 para este periodo no se ha presentado modificado, como se refleja en la siguiente tabla.

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Fuente	Certificado Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
G04900AD017021100 202000585004101	21000208	07-10-2021	$ 2.329.867.304,02	2200260	26-01-2022	$ 2.329.809.469,00
Valor total			$ 2.329.867.304,02	Valor total		$ 2.329.809.469,00

5.3 RELACIÓN CANCELACIÓN IMPUESTOS ESTAMPILLAS: Por parte de la firma consultora CONSORCIO RESGUARDOS PRODUCTIVOS 2021, en marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicio N° 0260-2022-01-21, efectuó cancelación de estampillas respecto al valor del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla.

Concepto Impuesto Cancelado	Contrato Inicial		
	Fecha	N°	Valor
Estampilla Pro Cultura	28/01/2022	22004822	$ 22.730.200,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	28/01/2022	22004824	$ 68.190.700,00
Estampilla Pro Desarrollo	28/01/2022	22004823	$ 22.730.200,00
Estampilla Pro Deporte	28/01/2022	22001537	$ 56.825.543,00
Estampilla Pro Unitropico	31/01/2022	22001722	$34.095.326,00

5.4 SUSPENSIONES.

Durante el periodo comprendido del 04 de abril al 03 de mayo 2022, de ejecución no se presentaron suspensiones al contrato de prestación de servicios N°0260-2022-01-21, al no presentarse situaciones que ameriten dicha exención.

5.5 GARANTIAS.

El Consorcio Resguardos Productivos 2021, en marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios N° 0260-2022-01-21, constituyo pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales y responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. N° 57-44-101002044 (a la suscripción del contrato), anexo 2 (al acta de inicio) y RC N° 57-40-101000794 (a la suscripción del contrato), anexo 2 (al acta de inicio), siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula novena Garantías del Contrato de prestación de servicio No 0260-2022-01-21, con total cubrimiento de los montos exigidos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla.

POLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0260-2022-01-21				
CONDICIONES DE ACUERDO AL CONTRATO INICIAL				
POLIZA N° 57-44-101002044				
Descripción de Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	02-02-2022	21-01-2022	25-11-2022	$ 232.980.946,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		21-01-2022	25-11-2022	$ 698.942.840,70
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales		21-01-2022	25-07-2022	$ 116.490.473,45
Calidad de Servicio		21-01-2022	25-11-2022	$ 232.980.946,90

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

POLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0260-2022-01-21				
CONDICIONES DE ACUERDO AL CONTRATO INICIAL				
POLIZA N° 57-40-101000794				
Descripción de Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Predios Laborales y Operaciones	02-02-2022	21-01-2022	25-07-2022	$ 400.000.000,00

A continuación, detallamos las garantías que rigen el cubrimiento de las pólizas del contrato N° 0260-2022, las cuales se encuentran vigentes para este periodo de ejecución comprendido del 04 de abril al 03 de mayo de 2022.

POLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0260-2022-01-21				
CONDICIONES DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO				
POLIZA N° 57-44-101002044 ANEXO 2				
Descripción de Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16-02-2022	04-02-2022	09-12-2022	$ 232.980.946,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		04-02-2022	09-12-2022	$ 698.942.84070
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales		04-02-2022	08-08-2025	$ 116.490.473,45
Calidad de Servicio		04-02-2022	09-12-2022-	$ 232.980.946,90

POLIZAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0260-2022-01-21				
CONDICIONES DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO				
POLIZA N° 57-40-101000794 ANEXO 2				
Descripción de Amparos	Fecha Aprobación	Vigencia		Valor Asegurado
		Del	Hasta	
Predios Laborales y Operaciones	16-02-2022	04-02-2022	08-08-2022	$ 400.000.000,00


5.6 AVANCE DEL CONTRATO.

5.6.1 Proyección Física: De acuerdo al plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios N° 0260-2022-01-21 por parte del Consorcio Resguardos Productivos 2021, tiene un plazo de ejecución de seis (6) meses, a continuación, se relaciona cuadro explicativo de avance de ejecución de tiempo. Ver anexo 13, donde se desglosa el porcentaje ejecutado de cada actividad durante el periodo 3.

Plazo de ejecución inicial	SEIS (6) MESES
Fecha acta de inicio	04-FEBRERO 2022
Periodo	04-04-2002 AL 03-05-2022
Meses	3
Número de días ejecutados	90
Porcentaje de tiempo ejecutado del periodo	16.67%
Porcentaje de tiempo acumulado	50.00%

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

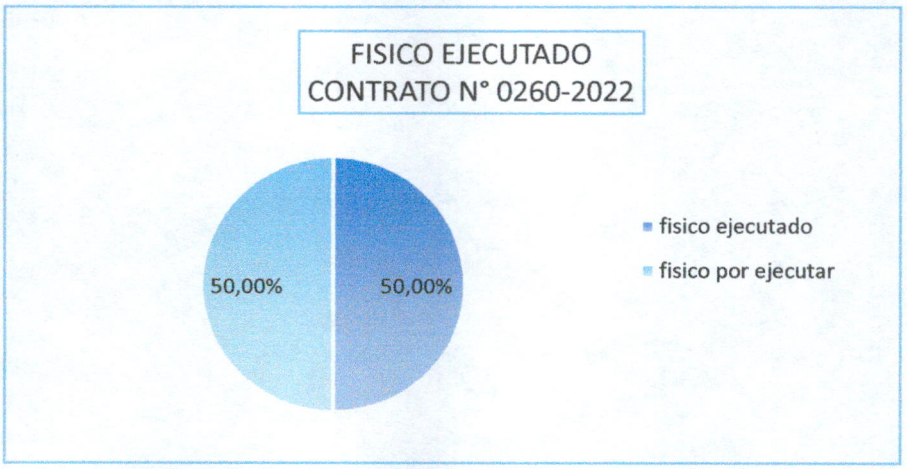

5.6.2 Proyección financiera

EJECUCION PERIODO 3: 04 ABRIL AL 03 MAYO 2022		VR. PROYECTADO	VR. EJECUTADO	% EJECUCION
1.2.COMPONENTE	ADELANTAR PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS ADECUADAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	**$ 295.511.812,50**	**$ 113.431.062,50**	38%
1.3. ACTIVIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAR ADECUADAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	**$ 374.534.375,00**	**$ 74.906.875,00**	20%
2 COMPONENTE	DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	**$ 1.624.734.406,20**	**$ 97.364.750,00**	6%



15

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

COMPONENTES		VR. PROYECTADO	MES 1 04-02-2022 03-03-2022	MES 2 04-03-2022 03-04-2022	MES 3 04-04-2022 03-05-2022	VR. EJECUTADO	% EJECUCION
1 COMPONENTE	IMPLEMENTAR ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 705,075,061	$ 35,028,875.00	$ 169,776,937.05	$ 188,337,937.50	$ 393,143,749.55	55.76%
2 COMPONENTE	DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 1,624,734,406	$ -	$ 483,351,577.80	$ 97,364,750.00	$ 580,716,327.80	35.74%
TOTAL		$ 2,329,809,467	$ 35,028,875.00	$ 653,128,514.85	$ 285,702,687.50	$ 973,860,077.35	41,80%

En desarrollo de la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 0260-2022-01-21 por parte del Consorcio Resguardos Productivos 2021", se cumplió a cabalidad con las estipulaciones del orden financiero y contractual generándose una proyección financiera, correspondiente al periodo comprendido del 04 de abril de 2022 al 03 de mayo de 2022, como se refleja en la siguiente tabla.

5.7 RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA.

Como parte de las actividades propias del contrato de prestación de servicios N°0260-2022-01-21, la interventoría realizo seguimiento a las actividades contractuales, verificando los siguientes ítems para la Actividad 1.2 Adelantar procesos de transferencia de conocimiento en temas relacionados con las adecuadas prácticas de producción agropecuaria en los resguardos indígenas del departamento de Casanare así:

5.7.1. SUBACTIVIDAD 1.2.1 Desarrollo talleres de campo en temas relacionados con el manejo agronómico y cultural de las especies agrícolas a establecer como bancos de semilla en el resguardo indígena de caño mochuelo.

Teniendo en cuenta el tipo de población a la que va dirigida el proyecto, se hace necesario desarrollar talleres de campo en temas alusivos al manejo agronómico y cultural de las especies agrícolas que se establecerán como bancos de semilla. Para el efecto, se debe implementar la metodología de capacitación "Aprender haciendo", ya que a través de esta metodología se podrán generar espacios de confianza y credibilidad con respecto a las actividades a adelantar, pues se debe buscar que los participantes reactiven e intercambien los saberes tradicionales de cada una de las etnias y se integren a las familias que participaran en todo el proceso: desde la preparación de los terrenos, el establecimiento y manejo de cultivos, para finalmente constatar resultados tangibles.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento a las condiciones contractuales pactadas, las actividades de intervención fueron desarrolladas por personal con perfil y experiencia conforme a exigencias de los pliegos de

condiciones definitivos para el presente proceso, en la siguiente tabla se relaciona el personal que ejecutó las labores, durante el periodo comprendido del 04 de abril al 03 de mayo de 2022 y verificados por la interventoría Para esta actividad se contó con el siguiente personal:

Mano de Obra Calificada (1 Ingeniero Agrónomo). Título profesional universitario; experiencia profesional de tres (3) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada.

Mano de Obra Calificada (1 Trabajador social). Título profesional universitario; experiencia profesional universitario de tres (3) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada. De acuerdo, al cronograma de actividades este profesional no hace parte del tercer mes de ejecución.

Mano de Obra Calificada (1 nutricionista). Título profesional universitario; experiencia profesional de tres (3) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada. De acuerdo al cronograma de actividades este profesional no hace parte del tercer mes de ejecución.

Mano de Obra Calificada - Enlace étnico (traductor de lengua) -Título de Bachiller. Se requieren 10 enlaces de cada una de las diferentes etnias pertenecientes al resguardo.

Ítem	Nombre	Identificación	N° Contrato	Tiempo	Valor ejecutado	Valor del contrato
1	Omar Ortiz Barrero	17.325.752	CPSP N°016-2022 ING. AGRONOMO	9 JORNADAS	$11.489.063,50	19.148.437,50
2	Carlos Dabia Wamadawi Badusi	1.006.414.767	CPS N°026-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50
3	Daniel Fernando Rodriguez Carrero	96.122.216	CPS N°027-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50
4	Hugo Alfonso Yaincikjune Dodine	7.363.213	CPS N°028-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50
5	Jakson Arvey Umeje Garcia	1.118.648.152	CPS N°029-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50
6	Luis Alfonso Lara Campo	1.006.559.117	CPS N°030-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50
7	Orgelio Fufuto Cuwei Yaru	6.609.850	CPS N°031-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50
8	Oswaldo Martinez	17.560.093	CPS N°032-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50
9	Pedro Noe Chamarravi Macabare	1.118.648.106	CPS N°033-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50
10	Weinacu Daniel Jarpena Colina	1.117.459.750	CPS N°034-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50
11	Wilson Aldruber Diaz	1.118.648.151	CPS N°035-2022 ENLACE	9 JORNADAS	$643.387,50	1.501.237,50

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Relación del recurso humano vinculado mediante prestación de servicios al contrato de servicios N° 0260-2022-01-21, Los soportes de vinculación laboral del personal mencionado se anexaron en el informe No. 02 del Consorcio Resguardo Productivos 2021, y siguen vigentes. Los soportes de pago por servicios prestados en el anexo 01 del informe N°3 del Consorcio Resguardo Productivos 2021.

Los soportes de pago de seguridad social y demás se encuentran adjuntos en el Anexo 6 del Informe No. 03 del consorcio Resguardos Productivos 2021. Que a continuación se detallan así:

Nombre	No. Planilla	IBC	Valor Cancelado			Vr. Total Cancelado
			Salud	Pensión	ARL	
Omar Ortiz Barrero	9435345779	$1.000.000	$125.000	$160.000	$5.300	290.300
Carlos Dabia Wamadawi Badusi	9434224316	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500
Daniel Fernando Rodriguez Carrero	9433813125	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500
Hugo Alfonso Yaincikjune Dodine	9433761431	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500
Jakson Arvey Umeje Garcia	9434105590	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500
Luis Alfonso Lara Campo	9433841258	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500
Orgelio Fufuto Cuwei Yaru	9434121557	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500
Oswaldo Martinez	7838557572	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500
Pedro Noe Chamarravi Macabare	9433700896	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500
Weinacu Daniel Jarpena Colina	9434112220	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500
Wilson Aldruber Diaz	9434111429	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500

Con respecto a la duración de cada temática de los talleres: En el desarrollo de cada una de las temáticas de los talleres de campo se proyecta una duración de seis (6) horas contemplando que serán dos (2) horas presenciales para el desarrollo de lo teórico contemplado en el contenido de cada temática, y cuatro (4) horas de práctica para intercambio de experiencias entre los beneficiarios del proyecto con el fin de enriquecer los conocimientos y ratificar la importancia de las especies agroalimentarias a establecer, el valor nutricional y el manejo de las mismas en cada uno de los predios de los beneficiarios.

Las jornadas técnicas se desarrollaron en el resguardo indígena de caño mochuelo con talleres teórico-prácticos en temas relacionados con el manejo agronómico y cultural de las especies agrícolas a establecer como bancos de semilla, se realizaron en los siguientes puntos de los resguardos con la consecuente temática:

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
Taller N° 3.	Manejo cultural de los cultivos de especies tradicionales	Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey. Fecha 18-04-2022	Ver anexo 2
		Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio. Fecha 21-04-2022	Ver anexo 2
		Municipio de Hato Corozal Comunidades de: Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito Fecha 25-04-2022	Ver anexo 2

A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones del eje temático que se abordó a través de los talleres de campo para este periodo en las tres comunidades en los puntos de encuentro dentro del resguardo indígena de Caño Mochuelo entre ellos: La Esmeralda, San José y Morichito

Taller N° 3: Manejo cultural de los cultivos de especies tradicionales.		
Hora	**Temática**	**Responsable**
8.00 – 10.20	Bienvenida y protocolos de Bioseguridad	Coordinación
	Presentación y expectativas del taller	Coordinación
	Introducción al manejo agroecológico de cultivos	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Importancia de producir alimentos para el Autoconsumo	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Identificación de cultivos para autoconsumo (pancoger, hortalizas, aromáticas, medicinales, frutales de ciclo corto y largo)	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
10.40 – 12.00	Huertas orgánicas comunitarias	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
12.00 – 1.00	**ALMUERZO**	
1.00 – 3.00	Métodos de rotación, intercalado y escalonado de Cultivos	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Manejo agroecológico de los cultivos para autoconsumo	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
3.20 – 5.00	Manejo de la comunicación y escucha empática para unificar conocimientos	Trabajador social
	Elaboración de mapa parlante en manejos culturales de cultivos	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 3, Manejo cultural de los cultivos de especies tradicionales. Perteneciente a las comunidades de Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey.; fecha de realización 18 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 3: Manejo cultural de los cultivos de especies tradicionales. Perteneciente a las comunidades de San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio; fecha de realización 21 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 3: Manejo cultural de los cultivos de especies tradicionales. Perteneciente a las comunidades de Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito; fecha de realización 25 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
.Taller N° 4.	Planes de fertilidad y manejo fitosanitario de los cultivos.	Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey. Fecha 19-04-2022	Ver anexo 2
		Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio. Fecha 22-04-2022	Ver anexo 2
		Municipio de Hato Corozal Comunidades de: Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito Fecha 26-04-2022	Ver anexo 2

A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones del eje temático que se abordó a través de los talleres de campo para este periodo en las tres comunidades con puntos de encuentro en: La Esmeralda, San José y Morichito.

Taller N° 4: Planes de fertilidad y de manejo fitosanitario de los cultivos.		
Hora	**Temática**	**Responsable**
8.00 – 10.20	Bienvenida y protocolos de Bioseguridad	Coordinación
	Presentación y expectativas del taller	Coordinación
	Introducción al manejo de suelos	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Descripción de la importancia y función del encalado del suelo	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Metodología de aplicación e incorporación de cal al suelo y camas de producción	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
10.40 – 12.00	Función de los minerales e implementación del plan de fertilización	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
12.00 – 1.00	**ALMUERZO**	
1.00 – 3.00	Identificación de plagas y enfermedades	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Efectos y causas de ataques de patógenos y plagas	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
3.20 – 5.00	Métodos de monitoreo de plagas y enfermedades	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Elaboración del plan de manejo integrado de plagas y enfermedades MIPE	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 4: Planes de fertilidad y manejo fitosanitario de los cultivos, en el resguardo de caño mochuelo perteneciente a las comunidades de: Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey, fecha de realización 19 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 4: Planes de fertilidad y manejo fitosanitario de los cultivos, en el resguardo de caño mochuelo perteneciente a las comunidades de San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio, fecha de realización 22 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la Taller N° 4: Planes de fertilidad y manejo fitosanitario de los cultivos, en el resguardo de caño mochuelo perteneciente a las comunidades de: Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito, fecha de realización 26 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
.Taller N° 5.	Prácticas de manejo de control botánico y biológico.	Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey. Fecha 20-04-2022	Ver anexo 2
		Municipio de Paz de Ariporo Comunidades de: San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio. Fecha 23-04-2022	Ver anexo 2
		Municipio de Hato Corozal Comunidades de: Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito Fecha 27-04-2022	Ver anexo 2

A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones del eje temático que se abordó a través de los talleres de campo para este periodo en las tres comunidades con puntos de encuentro en: La Esmeralda, San José y Morichito.

Taller N° 5: Prácticas de manejo de control botánico y biológico.		
Hora	**Temática**	**Responsable**
8.00 – 10.20	Bienvenida y protocolos de Bioseguridad	Coordinación
	Presentación y expectativas del taller	Coordinación
	Introducción a la agricultura orgánica	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Técnicas y prácticas de manejo sostenible de suelos	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Funciones y métodos de incorporación de abonos Orgánicos	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
10.40 – 12.00	Elaboración de abono orgánico tipo Bocashi	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
12.00 – 1.00	**ALMUERZO**	
1.00 – 3.00	Manejo agroecológico de plagas y enfermedades	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Técnicas y prácticas de control biológico y ecológico de plagas y enfermedades	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
20 min	**REFRIGERIO**	
3.20 – 5.00	Funciones y métodos de aplicación de repelentes Orgánicos	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo
	Elaboración de replenete orgánico a base de plantas	Ingeniero agrónomo/ Técnico de apoyo

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 5: Practicas de manejo de control botánico y biológico, en el resguardo de caño mochuelo perteneciente a las comunidades de: Tsamani 2, La Esmeralda, Calvario, Guafiyal, El Merey, fecha de realización 20 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 5: Practicas de manejo de control botánico y biológico, en el resguardo de caño mochuelo perteneciente a las comunidades de San José, Betania, Mañanitas, Topochales, Quinto Patio, fecha de realización 23 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la Taller N° 5: Practicas de manejo de control botánico y biológico, en el resguardo de caño mochuelo perteneciente a las comunidades de: Mochuelo, Mardue, Tsamani 1, Morichito, fecha de realización 27 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Las jornadas técnicas que se desarrollaron en el resguardo indígena Caño Mochuelo concerniente con los talleres teórico, presentó los siguiente soportes para el Alquiler de espacio, Materiales, Transporte y olla comunitaria, durante la ejecución que presenta el contrato de servicios N° 0260-2022-01-21, los soportes de pago se encuentran detallados y adjuntos descritos en el Anexo 02 del informe No.03 del Consorcio Resguardo Productivos 2021.

Ítem	Nombre	Identificación	N° Contrato	Tiempo	Valor
1	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Alquiler de Espacio (Casa Comunitaria) para el desarrollo de las jornadas de capacitación teórico prácticas	9 JORNADAS	$2. 757.375,00
2	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Materiales (Papelería, alquiler de sonido, equipo de cómputo y video Beam, alquiler de cámara fotográfica, alquiler de telón, impresión de memorias de la capacitación, bolígrafos).	9 JORNADAS	$ 7.353.000,00
3	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Olla comunitaria (Almuerzo + refrigerio) - mínimo 70 personas	9 JORNADAS	$ 18.382.500,00
4	CORFORIENTE	900.361.133-4	**CONTRATO N°CPS-036** Transporte personal para el desarrollo de los talleres	9 JORNADAS	$ 20.756.250,00

5.7.2. SUBACTIVIDAD 1.2.2. Desarrollo de talleres de campo sobre temas alusivos a los sistemas de producción de gallinas ponedoras en los resguardos indígenas de la etnia Sáliba del Municipio Orocué

Teniendo en cuenta el tipo de población a la que va dirigido el presente proyecto se debe desarrollar la actividad de talleres de campo en temas alusivos al manejo cultural de las especies menores (gallinas ponedoras) que se va a implementar a través de los sistemas de producción, desarrollando la metodología de capacitación "Aprender haciendo", ya que esta metodología permitirá que se generen espacios de confianza y credibilidad con respecto a las actividades plasmadas y que conlleve a que los participantes reactiven e intercambien los saberes tradicionales de la etnia y también busca que se integren a las familias participantes a participar en todo el proceso: Preparación e implementación en campo e instalaciones, manejo de las gallinas, para finalmente constatar resultados tangibles. (6 talleres para 4 grupos conformados por los resguardos de la Etnia Sáliba del Municipio de Orocué).

Conforme a lo anterior y en cumplimiento a las condiciones contractuales pactadas, las actividades de intervención fueron desarrolladas por personal con perfil y experiencia conforme a exigencias de los pliegos de

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

condiciones definitivos para el presente proceso, en la siguiente tabla se relaciona el personal que ejecuto las labores, durante el periodo comprendido del 04 de abril al 03 de mayo de 2022 y verificados por la interventoría Para esta actividad se contó con el siguiente personal:

Mano de Obra Calificada Mano de Obra Calificada (zootecnista o médico veterinario); Título profesional universitario; experiencia profesional de tres (3) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia relacionada.

Mano de obra Calificada – Técnico Ancestral en Producción Agrícola o en Administración Agropecuaria o Áreas a fines. Enlace étnico (traductor a lengua nativa).

Ítem	Nombre	Identificación	N° Contrato	Tiempo	Valor
1	Wilson Wilches Martínez	74858711	CPSP N°017-2022 ZOOCTENISTA	8 JORNADAS	$ 9.804.000,00
2	Luis María Caribana Darapo	74.848.846	CPS N°036-2022 ENLACE	8 JORNADAS	$ 5.719.000,00

Relación del recurso humano vinculado mediante prestación de servicios al contrato de servicios N° 0260-2022-01-21, los soportes de su vinculación se encuentran detallados y adjuntos en el informe No.2 del Consorcio Resguardo Productivos 2021, siguen vigentes y los soporte de pago por servicios prestados en el anexo 01, del informe N°3 del Consorcio Resguardo Productivos 2021.

Los soportes de pago de seguridad social y demás se encuentran adjuntos en el Anexo 6 del Informe No. 03 del consorcio Resguardos Productivos 2021. . Que a continuación se detallan así:

Nombre	No. Planilla	IBC	Valor Cancelado			Vr. Total Cancelado
			Salud	Pensión	ARL	
Wilson Wilches Martínez	4447545420	$1.500.000	$195.000	$249.600	$16.300	$460.900
Luis María Caribana Darapo	9434862445	$1.000.000	$125.000	$160.000	$10.500	$295.500

Con respecto a la duración de cada temática de los talleres: En el desarrollo de cada una de las temáticas de los talleres de campo se proyecta una duración de seis (6) horas contemplando que serán dos (2) horas presenciales para el desarrollo de lo teórico contemplado en el contenido de cada temática, y cuatro (4) horas de práctica para intercambio de experiencias entre los beneficiarios del proyecto con el fin de enriquecer los conocimientos y ratificar la importancia de las especies agroalimentarias a establecer, el valor nutricional y el manejo de las mismas en cada uno de los predios de los beneficiarios.

Las jornadas técnicas para el desarrollo de talleres de campo en temas relacionados a los sistemas de producción de gallinas ponedoras en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué, se realizaron en los siguientes puntos de los resguardos, con la consecuente temática:

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
Taller N° 3.	Infraestructura y sistemas de producción de aves de corral	Comunidades de: Macucuana y Paravare Fecha 20-04-2022	Ver anexo 2
		Comunidades de: Saladillo y San Juanito Fecha 22-04-2022	Ver anexo 2
		Comunidades de: Suspiro y Duya Fecha 25-04-2022	Ver anexo 2
		Comunidades de: Médano y Consejo Fecha 27-04-2022	Ver anexo 2

A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones del eje temático que se realizó como transferencia de tecnología a través de los talleres teórico - prácticos en campo para este periodo en las cuatro comunidades con puntos de encuentro en: Paravare, San Juanito, El Suspiro y El Médano.

Taller 3: Infraestructura y sistemas de producción de aves de corral		
Hora	**Temática**	**Responsable**
8.30 – 10.00	Bienvenida y protocolos de Bioseguridad	Coordinación
	Presentación y expectativas del taller	Coordinación
	Introducción al manejo de aves de corral	Zootecnista
	Infraestructura y diseño de galpones	Zootecnista
	Sistemas de producción de gallinas semicriollas en traspatio	Zootecnista
20 min	**REFRIGERIO**	
10.20 – 12.00	Prácticas de manejo de aves de corral	Zootecnista
12.00 – 1.00	**ALMUERZO**	
1.00 – 2.00	Importancia nutricional del consumo de huevo y carne de aves de corral	Zootecnista
	Requerimientos nutricionales de las aves de corral	Zootecnista
20 min	**REFRIGERIO**	
2.20 – 3.30	Manejo y selección de huevos	Zootecnista
	Conservación y aprovechamiento de la carne de aves	Zootecnista

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 3 Infraestructura y sistemas de producción de aves de corral en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué perteneciente a las comunidades de: Macucuana y Paravare; fecha de realización 20 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

Calle 10 No. 20-57 Yopal, Casanare – Móvil 320 809 9234 – email fundacionfidet@hotmail.com

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 3 Infraestructura y sistemas de producción de aves de corral en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué, perteneciente a las comunidades de: Saladillo y San Juanito; fecha de realización 22 de abril de 2022.



Locación: infraestructura física



Participación comunitaria:



Materiales



Personal Calificado



Olla Comunitaria



Olla Comunitaria

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 3 Infraestructura y sistemas de producción de aves de corral en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué, perteneciente a las comunidades de: Suspiro y Duya; fecha de realización 25 de abril de 2022.

	
Locación: infraestructura física	**Participación comunitaria:**
	
Materiales	**Personal Calificado**
	
Olla Comunitaria	**Olla Comunitaria**

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

Registro fotográfico de la actividad Taller N° 3 Infraestructura y sistemas de producción de aves de corral en el resguardo Etnia Saliba Municipio de Orocué perteneciente a las comunidades de: Médano y Consejo; fecha de realización 27 de abril de 2022.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Locación: infraestructura física</td><td>Participación comunitaria</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Materiales</td><td>Personal Calificado</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Olla Comunitaria</td><td>Olla Comunitaria</td></tr>
</table>

FIDET

Nit. 900 114 779 - 3

La cuarta jornada técnica para el desarrollo talleres de campo en temas relacionados en el manejo de especies menores como suplemento a la unidad productiva, en la Etnia Saliba del Municipio de Orocué, se realizaron en los siguientes puntos de los resguardos con la siguiente temática:

Jornada/ Taller	Temática	Comunidades/ Fecha	Número de asistentes
Taller N° 4	Manejo de especies menores como suplemento a la unidad productiva	Comunidades de: Macucuana y Paravare Fecha 21-04-2022	Ver anexo 2
		Comunidades de: Saladillo y San Juanito Fecha 23-04-2022	Ver anexo 2
		Comunidades de: Suspiro y Duya Fecha 26-04-2022	Ver anexo 2
		Comunidades de: Médano y Consejo Fecha 28-04-2022	Ver anexo 2

A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones del eje temático que se abordó a través de los talleres de campo para este periodo en las cuatro comunidades con puntos de encuentro en: Macucuana, Saladillo, Duya, Consejo.

Día 4 Taller: Manejo de especies menores como suplemento a la unidad productiva		
Hora	**Temática**	**Responsable**
8.00 – 10.20	Bienvenida y protocolos de Bioseguridad	Coordinación
	Presentación y expectativas del taller	Coordinación
	Introducción a la producción de especies menores	Médico veterinario/Zootecnista
	Identificación de las diferente especies menores	Médico veterinario/Zootecnista
	Elaboración de mapa parlante en la identificación de las especies menores por comunidad	Médico veterinario/Zootecnista
20 min	**REFRIGERIO**	
10.40 – 12.00	Especies menores, comportamiento y distribución	Médico veterinario/Zootecnista
12.00 – 1.00	**ALMUERZO**	
1.00 – 3.00	Tipos de producción avícola	Médico veterinario/Zootecnista
	Identificación de tecnologías para la producción avícola	Médico veterinario/Zootecnista
20 min	**REFRIGERIO**	
3.20 – 5.00	Mapa mental de saberes en manejos preventivos y curativos en el manejo avícola	Médico veterinario/Zootecnista
	Estructuración del plan de manejo y bioseguridad avícola	Médico veterinario/Zootecnista
