1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL					
Tipo de informe:	**Parcial: _X_ Final: _**	**Periodo del Informe:**	**Septiembre 2022**	**Consecutivo:**	**04**
Nombre del Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO				
Objeto del Proyecto	Fortalecer los procesos de producción agropecuaria en 26 municipios del departamento de Nariño afectados por la emergencia declarada por la pandemia del Covid-19.				
BPIN	2020000030074				
OCAD	Regional Pacifico				
Descripción de Aportes	**Acuerdo Aprobatorio**	ACTA			
Fondo de Desarrollo Regional – CAUCA	Acuerdo No. 091 de 2020.				
Valor total proyecto	**$ 6.647.115.150**				
Fuentes al que pertenece el proyecto	Proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías				
Valor de la Interventoría	**$ 118.702.462,25**				
Valor total Regalías	**$ 6.765.817.640**				
Valor total contrapartidas	**$ 0**				
Entidad Ejecutora / Operador del Proyecto	Gobernación de Nariño				
Fecha de entrega del informe (DD/MM/AAAA)	**10/07/2022**				
Duración Proyecto (Contrato)	**Fecha De Aprobación (OCAD)**	**Fecha De Inicio (Contrato)**	**Fecha De Terminación (Contrato)**	**Estado Actual**	
Siete (7) meses		23 de febrero de 2022	07 de enero de 2023	En ejecución	

1.2. CONTRATO INTERVENTORÍA AS DEL VALLE

Contrato	**17733-2022**	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:**	CONCURSO DE MÉRITO		**Línk del proceso:**	
OBJETO:	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID - 19 EN 26 MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”					
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA					
CONTRATISTA	ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE SAS					
NIT	901.177.852-7					
Representante legal	CHRISTIAN ANDRES RUIZ CALVACHE		**Identificación**		1.113.627.700 expedida en Palmira – Valle del Cauca.	
TELEFONO y/o CELULAR	2838382- 3176770374					
FUENTE DE FINANCIACION	SGR	**CDP INICIAL Y VALOR**	2021080004	**RP INICIAL**	2022030002	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Siete (7) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.		**FECHA DEL CONTRATO Dd/mm/aaa**		23/02/2022	
FECHA DE ACTA INICIO	08/06/2022		**FECHA DE VENCIMIENTO**		07/01/2023	

PRORROGAS Y ADICIONES				
ADICION	**FECHA DE INICIO ADICION**	**TIPO DE ADICION**	**FECHA TERMINACION**	**CLAUSULAS Y PARRAFOS MODIFICADOS**
N/A				
FECHA DE TERMINACION	07/01/2023			
SUPERVISOR	**JULIAN ANDRES OSPINA**			

Valor Total del CONTRATO INTERVENTORIA en Pesos ($)					
Valor Total del CONTRATO	$ 118.702.462,25	Aporte SGR-	$118.702.462,25	Valor Contrapartidas	N/A

ACTAS DE PAGOS INTERVENTORIA					
ACTAS DE PAGO		Documento de desembolso			
	Fecha de Pago	Valor Pago	Descuentos	Valor girado	No. Comprobante de egreso
1					
2					
3					
4					

1.1.1. GARANTIAS

POLIZA				
AMPAROS	NUMERO	ASEGURADORA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023
ANTICIPO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023
PRESTACIONES SOCIALES	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECURSOS SGR

Producto MGA	Actividad MGA	Valor o Cantidad Total	Valor ejecutado
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	Mejorar la capacidad de acceso a activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid - 19.	3300	$ 3.866.580.831,35
Costos de interventoría	Costos de interventoría	1	$ 50.872.483,83
Total			$ 3.917.453.315,18

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO:	En el mes se continúa con el seguimiento a las actividades programadas, el operador hace la entrega de los treinta y tres tractores (Con actas de satisfacción), por lo que se cumple con un 66,7% de porcentaje total del contrato GN 2382-2021, El porcentaje restante corresponde a las piezas de herramienta agrícola y este correspondería a un 33,29%. siendo la ejecución del proyecto en el Objetivo específico 1: Proveer suficiente y adecuada maquinariaagrícola y equipos para la producción agrícola en el marco de la pandemia del Covid, y la actividad MGA "Mejorar la capacidad de acceso a activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid – 19. A las programado del total de proyecto, es decir incluyendo todas las actividades, aquellas adicionales a la entrega de tractores y de herramienta agrícola, se puede mencionar que el proyecto presenta un atraso de 30,34%, por lo que se solicita al operador u.t suministro de tractores informe como va ser la entrega de las herramientas que hacen falta para completar los bancos de maquinaria y de esta manera empezar con las actividades que estaba programadas para iniciar el mes de octubre de 2022. Porque esta situación preocupa a la interventoría puesto que representa un atraso considerable tanto en la ejecución técnica y financiera según lo planeado, portanto, se solicita al contratista un plan de contingencia para subsanar la situación. También es importante mencionar que de no ser consistente con los tiempos establecidos en el contrato se prevé que se puede estar generando un incumplimiento a lo contratado y a los tiempos de entregas.		
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO AL MES DEL TOTAL DEL PROYECTO	**92,9%**	**AVANCE EJECUTADO AL MES DEL TOTAL DEL POYECTO**	**61,9%**
DIFERNCIA DE RETRASO	**30,9%**	**ESTADO**	**RETRASADO**

OBJETIVO GENERAL

FORTALECER LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO AFECTADOS POR LA EMERGENCIA DECLARADA

POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Objetivo específico 1: Proveer suficiente y adecuada maquinaria agrícola y equipos para la producción agrícola en el marco de la pandemia del Covid.

No.	ACTIVIDAD MGA	Subactividad	Unidad de medida	Valor o cantidad total	Avance ejecutado Periodo septiembre		acumulado- unidades totales		% avance prog.	% Avance Ejecutado	avance prog. Acumulado	avance ejecutado acumulado	% Ponderado acumulado		DIFERENCIA – RETRASO
	ENTREGABLE				PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA					% Prog. Ponderado	% Ejec. Ponderado	
	mejorar la capacidad de acceso activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid- 19	Entrega de maquinaria en los diferentes municipios	Und	33	33	33	33	33	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	61,9%	61,9%	0,00%

1	*Actividad 1.1. Realizar la adquisición de maquinaria y equipos*	Entrega de herramientas o implementos agrícolas en los diferentes municipios	Und	137	137	0	137	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%	30,9%	0,00%	30,9%
TOTAL, ACTIVIDAD MGA													**92,9%**	**61,9%**	30,9%

Observaciones:	En este mes el operador hace entrega de 33 tractores, diecinueve (19) tractores Deutz Fahr Agrolux 70 y catorce (14) tractores SAME Explorer 95 Especial, tractores que cumplen con los requisitos mínimos , sin embargo cabe aclarar que el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT de cada tractor NO ha sido entregado por parte de la unión Temporal Suministro de Tractores 2021, Y que no hace entrega de dichos seguros, porque estos documentos se asignaran en el momento en que se establezca el comodato a los municipios con el propósito de no perder tiempo del seguro mientras se realizan las entregas en cada alcaldía.
DESCRIPCIÓN:	En la ejecución mensual reportada para este informe, se ve un avance en dinero de $ 3.866.580.834,84 millones equivalentes a diecinueve (19) tractores Deutz Fahr Agrolux 70 y catorce (14) tractores SAME Explorer 95 Especial, Sin embrago queda por ejecutar del total de contrato de suministro $1.929.730.565,2 que corresponde a 137 implementos (Bloque 1: 14 rastra de cince,14Surcadoras, 14 remolques y para el Bloque 2: 19 Cosechadoras cabezal para pastos, 19 Remolques y 19 Surcadoras, 19 renovador, 19 rastra de cincel.
CONCLUSIÓN:	Si bien es cierto que se los 33 tractores fueron recibidos , es de importancia mencionar que la adición en tiempo que requiere este contrato de suministro, dando la posibilidad al operador terminar de entregar los implementos agrícolas que hacen falta y que no fueron entregados en el tiempo estipulado por situaciones mundiales ajenas a su voluntad y que todos conocemos, situaciones que se mencionaron ampliamente por la interventoría en el oficio DR- MA 006 Y DR-MA010, Como siempre la interventoría ha trabajado para que el contrato del operador sea ejecutado de la forma correcta. Sin menos cabo de la anterior es necesario exponer que hay actividades anexas que requieren tiempo y que no solo están en la celeridad con la que pueda actuar el operador, sino en el trabajo de varias entidades como puede ser la nacionalización, la legalización ,el ingreso del almacén, el traslado de dichos tractores con sus respectivos implementos para de esta forma se cumpla con el 100% del contrato y se completen los bancos de maquinarias y estos puedan quedar en las alcaldías correspondientes una vez se adelanten los comodatos y demás requisitos que se requieren para llevar a término el contrato.

2. OTRAS ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA

- La interventoría realizó la revisión de los documentos en las solicitudes del contratista dando los conceptos pertinentes para continuar con el proceso, como la prórroga del contrato en dos meses, porque la actividad de la entrega de tractores se vio afectada por circunstancias de índole mundial que afectan directamente al proyecte y no se pudieron proveer, en donde la interventoría con su equipo técnico y jurídico evaluó las pruebas presentadas por el operador para dar se concepto referente al tema.
- Se realizaron reuniones con la supervisión y el contratista proveedor de maquinaria y demás actividades propias de seguimiento y acompañamiento.
- Se realiza en seguimiento técnico, jurídico, contable a las actividades realizadas por el operador, informando oportunamente a la supervisión para lograr la ejecución de contrato de operación de la mejor manera posible.
- Se informa mensualmente las actividades realizadas, tanto del operador como de la interventoría a la supervisión, tal y como lo establece el contrato.
- Una vez lo equipos fueron entregados el equipo técnico de ka interventoría dio los recibidos a satisfacción de los tractores, dejando las observaciones del caso, como es la entrega del SOAT una vez los equipos se encuentres dispuestos en la alcaldía para cumplir su función, y no en este momento que puede perder tiempo de cobertura.

3. RELACIÓN CONTRATOS Y PERSONAL DEL PROYECTO

3.1. Contratos vigentes Personal Interventoría

Cargo	Perfil	Nombre
Director de Interventoría	Ingeniero agrónomo con maestría en ciencias agrarias	Edgar Mauricio Quintero
Interventor jurídico	Abogado con especialidad en derecho administrativo y contratación estatal	Giovanny González
Interventor contable	Contador con especialidad en gerencia tributaria	Julio Terán
Interventor técnico – Mecánico	Ingeniero Mecánico	James Guerrero

4. LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Informe financiero de la interventoría
Anexo 2. Carpeta de cada tractor, con toda la documentación al día

Anexo 3. Acta de recibido a satisfacción de entrega de maquinaria.

5. BALANCE GENERAL DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL
FISICO	61,9 %
FINANCIERO	61,9%


RELACIÓN DE GASTOS - CONTRATO DE OPERACIÓN			
PRESUPUESTO	$ 5.796.311.400		OBSERVACIONES
PERIODO	VALOR	%	
Junio	0	0%	
Julio	0	0%	
Agosto	0	0%	
Septiembre	$ 3.866.580.834,84	61,9%	
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	$ 3.866.580.834,84	61,9%	

RELACIÓN DE GASTOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA			
PRESUPUESTO	$ 118.702.462,3		OBSERVACIONES
PERIODO	VALOR	%	
Junio	$12.435.496,04		
Julio	$21.479.493,18		
Agosto	$16.957.494,61		
Septiembre	$16.957.494,61		
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	$ 67.829.978,4	0,6%	

Gastos de interventoría

PERSONAL					
CARGO / OFICIO	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)**	**CANTIDAD (Personas) (2)**	**TIEMPO (Meses) (3)**	**PARTICIPACION TOTAL(% Mes) (4)**	**VALOR PARCIAL ($) (1x2x3x4)=(5)**
Coordinador Agricola	3.000.000,00	1,00	4,00	1,00	12.000.000,00
Coordinador Mecanico	2.800.000,00	1,00	4,00	0,50	5.600.000,00
Profesional Juridico	2.319.450,00	1,00	4,00	0,48	4.453.344,00
Profesional Contable	2.319.450,00	1,00	4,00	0,48	4.453.344,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5)=(6)	**26.506.688,00**
FACTOR MULTIPLICADOR F.M. (7)	**2,1504**
COSTO DIRECTO PERSONAL INTERVENTORIA = (6)*(7)=(A)	**56.999.981,88**
IVA = (19%)*(A)=(B)	**10.829.996,56**
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA = (A)+(B)=©	**67.829.978,44**

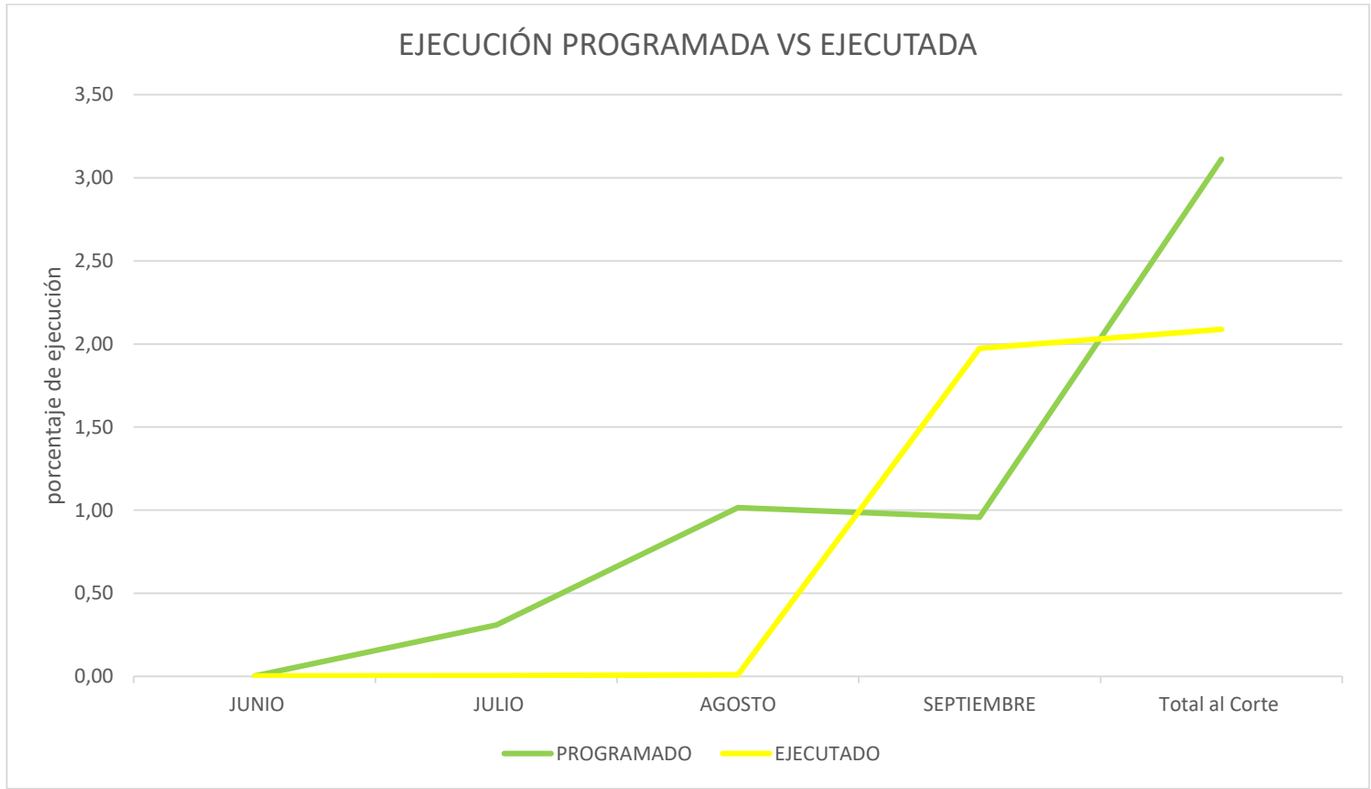

	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total al Corte
PROGRAMADO	0,00	0,31	1,01	0,96	3,11
EJECUTADO	0,00	0,00	0,01	1,97	2,09

Actividad	Valor contratado	Cantidad programada total	Programado JUNIO	Ejecutado JUNIO	Programado JULIO	Ejecutado JULIO	Programado AGOSTO	Ejecutado AGOSTO	Programado SEPTIEMBRE	Ejecutado SEPTIEMBRE	Ejecutado AL CORTE	Pendiente por EJECUTAR
Mejorar la capacidad de acceso a activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid - 19.	5796311400	3300	**0**	**0**	$ 1.950.100.173	**$ -**	$ 1.979.244.099	**$ -**	$ 1.866.967.128	$ 3.866.580.834,84	$ 3.866.580.834,84	**$ 1.929.730.568,60**
			0	0	1700	0	1200	0	400	2201,35	2201,35	1098,65
COSTOS DE INTERVENTORIA	118702462,3	1	$ 16.618.344,72	$ 12.435.496,04	$ 16.618.344,72	$ 21.479.493,18	$ 16.618.344,72	$ 16.957.494,61	$ 16.618.344,72	$ 16.957.494,61	$ 67.829.978,40	$ 50.872.483,85
			0,14	0,10	0,14	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14	0,57	0,43
TOTAL	$ 6.361.203.862,25		$ 16.618.344,86	$ 12.435.496,14	$ 1.966.720.217,86	$ 21.479.493,36	$ 1.995.863.643,86	$ 16.957.494,75	$ 1.883.585.872,86	$ 3.883.540.527,5	$ 3.934.413.011,72	$ 1.980.604.151,53
			$ 0,0026	$ 0,0020	$ 0,3092	$ 0,0034	$ 1,0148	$ 0,0086	$ 0,9577	$ 1,9746	$ 2,0888	$ 1,0515

6. CONCLUSIONES:

- La interventoría revisó y recomendó al contratista y a la supervisión, en relación a las referencias de las llantas R1W.

- A la fecha tenemos la entrega de la maquinaria lo cual pone al operador al día con la subactividad 1, y reporta un avance un avance importante al proyecto, un avance 61,9% del total, sin embargo, está pendiente para la entrega las herramientas agrícolas, que son un porcentaje considerables del proyecto y con lo cual se solicita un plan de contingencia por parte del operador U.T suministro de tractores 2021.

- Se solicita a la supervisión presentar las hojas de vida de los perfiles para iniciar con la verificación de los perfiles y los requisitos que exige el proyecto.

- Se realizó contacto con las Umatas vía correo electrónico observando interés en el proyecto, por tanto, se pone en consideración de la supervisión programar una reunión conlas con las personas encargadas dentro de las alcaldías, para presentar el proyecto e iniciar el proceso de selección de los posibles beneficiarios.

- Se pone en consideración las actividades y subactividades planteadas en el presente informe como estrategia de seguimiento del proyecto, quedando atento a cualquierobservación o comentario.

Quedo a disposición para ampliar o aclarar este informe en el momento en que lo consideren necesario.

Atentamente,



CHRISTIAN ANDRES RUIZ CALVACHE
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 3176770374
