MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC" ARMENIA
REGISTRO
FECHA 28/10/2022 HORA 10:10
Nº RADICADO CENAC
RADICADO A

Radicado No. 1408 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR8-- ESMBAS08

Armenia, octubre 27 de 2022

Señor Mayor
RAFAEL AUGUSTO GIRALDO RESTREPO
Ordenador del Gasto
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA

Asunto: Solicitud Intervención contrato No. 189- DISANEJC/CENACARM-2022- Interventoría

Respetuosamente; me permito informar al Señor Mayor Ordenador del Gasto de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA, con el fin de dar a conocer las novedades que se han venido presentando con señor Interventor OSCAR PARDO de acuerdo a los informes enviados a esa dirección así, oficio radicado 1235 de fecha 15-09-2022- 1364 de fecha 05-10-2022-1383 de fecha 10-10-2022, con el fin de que esa dirección nos pueda orientar jurídica técnica y económicamente para poder iniciar el mantenimiento de las instalaciones según contrato de obra 190 DISANEJC/CENACARM-2022, mediante acta de inicio de fecha 31 de agosto del presente año y a la fecha no se ha iniciado mencionado mantenimiento, situación que me lleva a indicarle teniendo en cuenta que soy la supervisora del contrato de interventoría, esto con el fin de poder llevar a buen término mencionado contrato; dado el tiempo y corroborando que el interventor no ha dado viabilidad al inicio de la obra, le solicito se tomen las acciones legales pertinentes y poder establecer lo pactado en el contrato, sin afectar lo requerido por el establecimiento de sanidad militar BAS 08 en su mantenimiento.
De igual forma solicito de manera atenta realizar todo lo posible dentro de los termino de ley para llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones del Dispensario, teniendo en cuenta que el proceso de adjudicación de recursos es bastante demorado y se requiere que sean usados en el mantenimiento de nuestras instalaciones.

Por lo anterior, el Interventor manifiesta que requiere: ``*una verificación del área de cubierta a intervenir, siendo necesario el envío de la información del personal que iba a realizar las actividades para la verificación del cumplimiento de los requisitos de ley en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo y permisos de altura. De la misma forma, manifiesta que el le solicitó al contratista avanzar con otras actividades que no signifiquen la intervención de la cubierta mientras se hacia la observación de la documentación del personal, según el interventor nunca le allegaron dichos requerimientos; por parte de la interventoría ni del ejército se han autorizado ningún tipo de trabajo, por lo que todo trabajo qué se desarrolle en las instalaciones de Sanidad serán a cuenta y riesgo del contratista``* (texto extraído del informe adjuntado por el interventor).
Consecuentemente; solicito al Ordenador del Gasto del CENAC Armenia su orientación dado que a la fecha no se ha tenido viabilidad por parte del interventor, toda vez que, en reuniones, video conferencias donde han participado personal de la CENAC, Supervisor de interventoría, personal del contrato de obra, personal del dispensario con el único fin de sacar adelante este proceso, llamadas y conversaciones por WhatsApp, así como correos electrónicos, he manifestado mi preocupación y deseos de iniciar esta obra, dado que conozco de primera mano las necesidades del mantenimiento del ESM BAS 08.
Solicito muy comedidamente buscar las vías adecuadas, para dar feliz término este contrato de obra y poder iniciar las actividades a realizar en dicho mantenimiento, con el fin de garantizar una

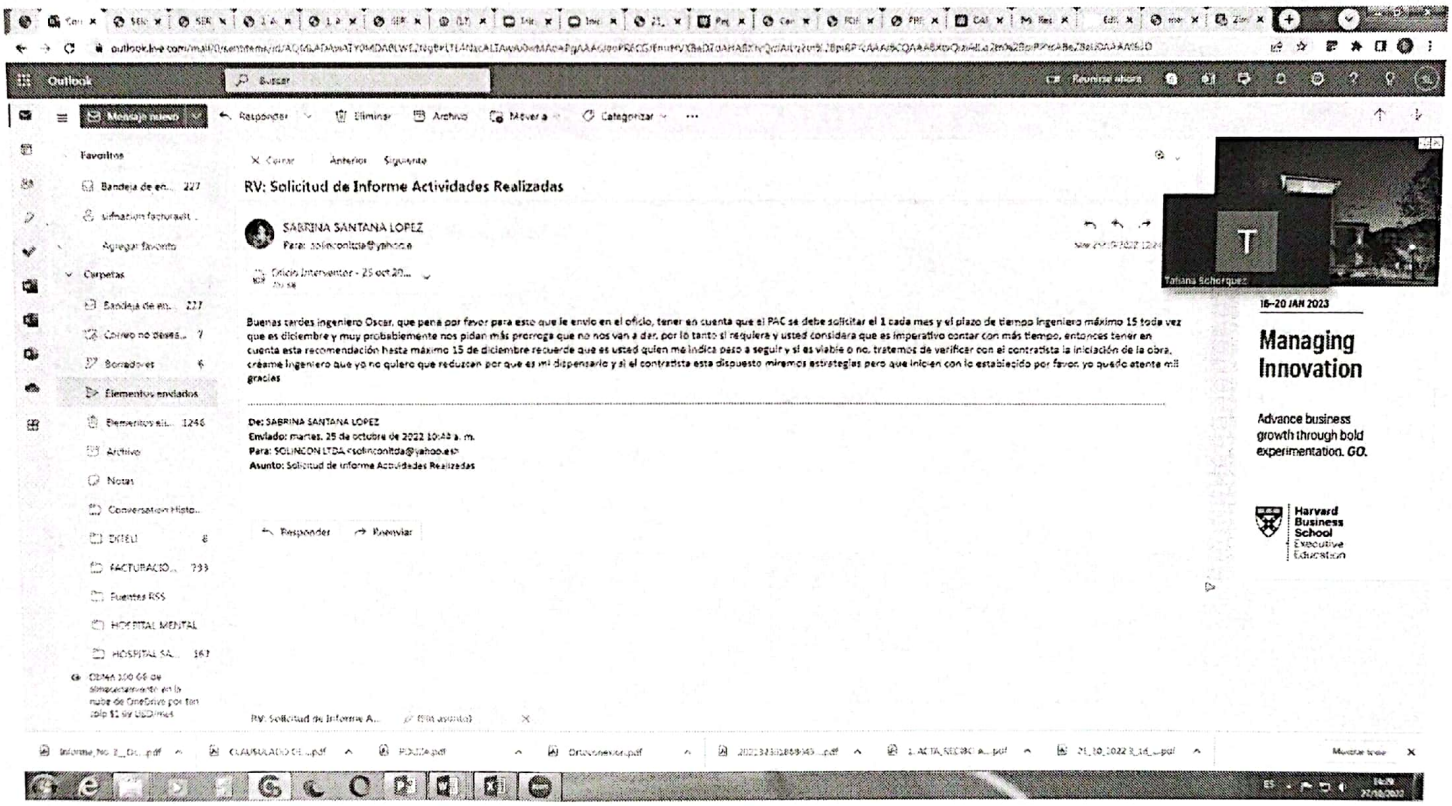
excelente atención a todos nuestros usuarios y beneficiarios del sistema de salud de las fuerzas militares

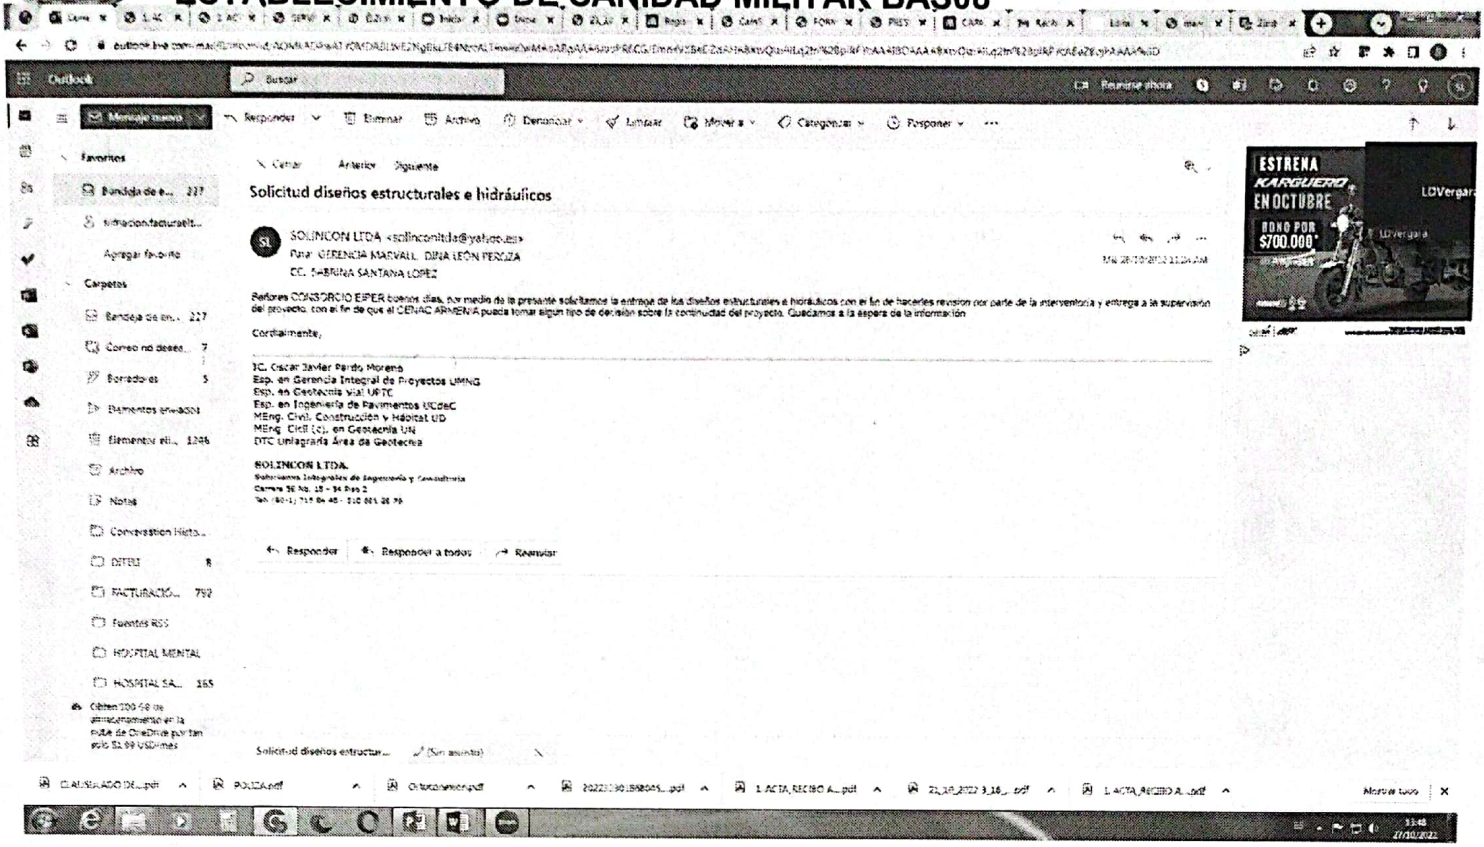
Así mismo, pedir apoyo un experto en la materia dado que no soy ingeniera y lo plasmado por la interventoría es a mi modo de ver dilatar la iniciación de dicho mantenimiento, entiendo que se debe contar con lo requerido por ley, pero creo que se puede verificar condiciones para el inicio de la obra y no puedo ser yo quien manifieste si se debe iniciar o no dado que para ello está el interventor quien nos orienta a la realización de este contrato de obra.

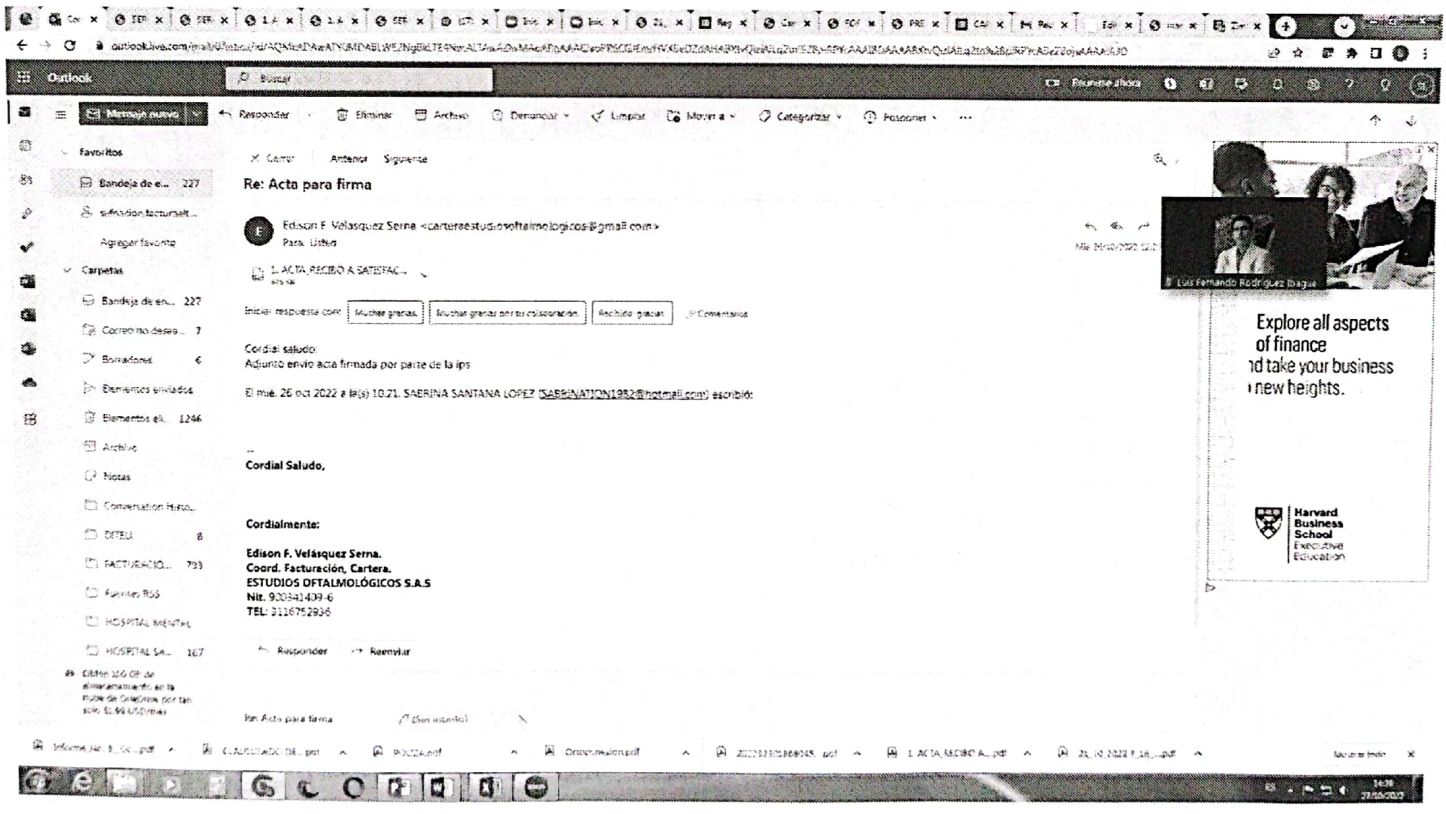
Respetuosamente,

MAYOR SABRINA SANTANA LOPEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUBDIRECTORA CIENTÍFICA ESM BAS08 – ARMENIA

ANEXOS:




Outlook
Buscar
Mensaje nuevo
Responder
Eliminar
Archivo
Denunciar
Limpiar
Mover a
Categorizar
Posponer
Favoritos
Bandeja de e... 227
Carpetas
Solicitud diseños estructurales e hidráulicos
SOLINCON LTDA <solinconltda@yahoo.es>
Para: GERENCIA MARVALL DINA LEON PEROZA
CC: SABRINA SANTANA LOPEZ
Señores CONSORCIO EIPER buenos días, por medio de la presente solicitamos la entrega de los diseños estructurales e hidráulicos con el fin de hacerles revision por parte de la interventoria y entrega a la supervisión del proyecto, con el fin de que el CENAC ARMENIA pueda tomar algun tipo de decisión sobre la continuidad del proyecto. Quedamos a la espera de la información
Cordialmente,
IC. Oscar Javier Pardo Moreno
Esp. en Gerencia Integral de Proyectos UMNG
Esp. en Geotecnia Vial UPTC
Esp. en Ingeniería de Pavimentos UCdeC
MEng. Civil, Construcción y Hábitat UD
MEng. Civil (c), en Geotecnia UN
DTC Unilagrafa Área de Geotecnia
SOLINCON LTDA.
Soluciones Integrales de Ingeniería y Consultoría
Carrera 56 No. 18 - 94 Piso 2
Tel: (60-1) 719 84 48 - 310 861 26 76
Responder
Responder a todos
Reenviar
ESTRENA
KARGUERO
EN OCTUBRE
BONO POR
$700.000*
LOVergara


Outlook
Buscar
Mensaje nuevo
Responder
Eliminar
Archivo
Denunciar
Limpiar
Mover a
Categorizar
Posponer
Favoritos
Bandeja de e... 227
Carpetas
Re: Acta para firma
Edison F. Velasquez Serna <carteraestudiosoftalmologicos@gmail.com>
Para: Ustes
Iniciar respuesta con: Mostrar gracias | Mostrar gracias por su colaboración | Recibido, gracias | Comentarios
Cordial saludo
Adjunto envio acta firmada por parte de la ips
El mié, 26 oct 2022 a la(s) 10:21, SABRINA SANTANA LOPEZ (SABRINATON1982@hotmail.com) escribió:
Cordial Saludo,
Cordialmente:
Edison F. Velásquez Serna.
Coord. Facturación, Cartera.
ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS S.A.S
Nit. 900341439-6
TEL: 3116752936
Responder
Reenviar
Explore all aspects
of finance
and take your business
to new heights.
Harvard
Business
School
Executive
Education

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08

