| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JETIC**

**FECHA INFORME:** Día: 04 Mes: Noviembre Año: 2022

**CONTRATO N°.** 087-00-A-COFAC-GOCOP-2022

**CONTRATISTA:** UT SES 2022

**VALOR DEL CONTRATO:** $ 2,920,860,000.00

**FORMA DE PAGO:** 1° PAGO: Primer pago parcial, que corresponderán a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde la fecha de perfeccionamiento del contrato hasta lo entregado al 30 de septiembre de 2022, con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Los supervisores de las Unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo, números del SAP y evidencias de instalación.

2° PAGO: Segundo pago parcial (final), que corresponderá a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde el 1 de octubre de 2022 al 20 de noviembre de 2022 o la entrega total a satisfacción CXP para ser cancelados en el Primer trimestre de 2023. Los supervisores de las unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo los números del SAP y evidencias de instalación.

**FECHA FIRMA**: Día 25. Mes Julio. Año 2022.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX:** N/A

**FECHA DE FIRMA:** N/A

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29 de Julio hasta el 20 de noviembre del 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 80 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 10,5 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 89,5 %

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| Alexander Cárdenas Linares | Coordinador de Proyecto Principal | Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones CN295-51495 |
| Carlos Fernando Mora | Coordinador de Proyecto Suplente | Ingeniero Electrónico CN206-60508 |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No _X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

__No Aplica_____

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

____No Aplica_____

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No ____ Sí _X_


CRONOGRAMA SITE SURVEY

CTO 087-A-00-A-COFAC-GOCOP-2022

| CRONOGRAMA SITE SURVEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AGOSTO | | | | | | | | | | SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| CACOM 1 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CACOM 2 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CACOM 3 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CACOM 4 | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CACOM 5 | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CACOM 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| CATAM | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMAN | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | |
| GACAR | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| GACAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| EMAVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| BACOF | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| CASOF | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| JETIC | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| CASUB | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |

Con respecto al cronograma del Site Survey se cumplío al 100%, con algunos cambios en las fechas según lo establecido inicialmente, cumpliendo con este item y realizando las visitas respectivas en als diferentes Unidades, verificando los lugares de las instalaciones y posibles novedades que se pudieren presetar al momento de la ejeciucion del mismo.

Por otra parte se realizo el cronograma de las actividades a realizar en las diferentes Unidades a intervenir con el contrato 087-00-A-COFAC-GOCOP-2022, esperando se cumplan con los tiempos de entrega y ejecucion del mismo, como novedad se presenta la adquisicion de la camara "NETWORK CAMERA MK III (LPR) VEHICULAR Q1615-LE" como se ha manifestado en los informes anteriores según lo informado por el personal de conrtatista lo que se veria afectado las Unidades de CACOM 4 y CACOM 5 que serian las UMA's a implementar estos equipos con 2 unidades cada una.
A la fecha se ha venido trabajando y cumpliendo con el cronograma establecido, por lo cual se ve los avances según lo planeado.

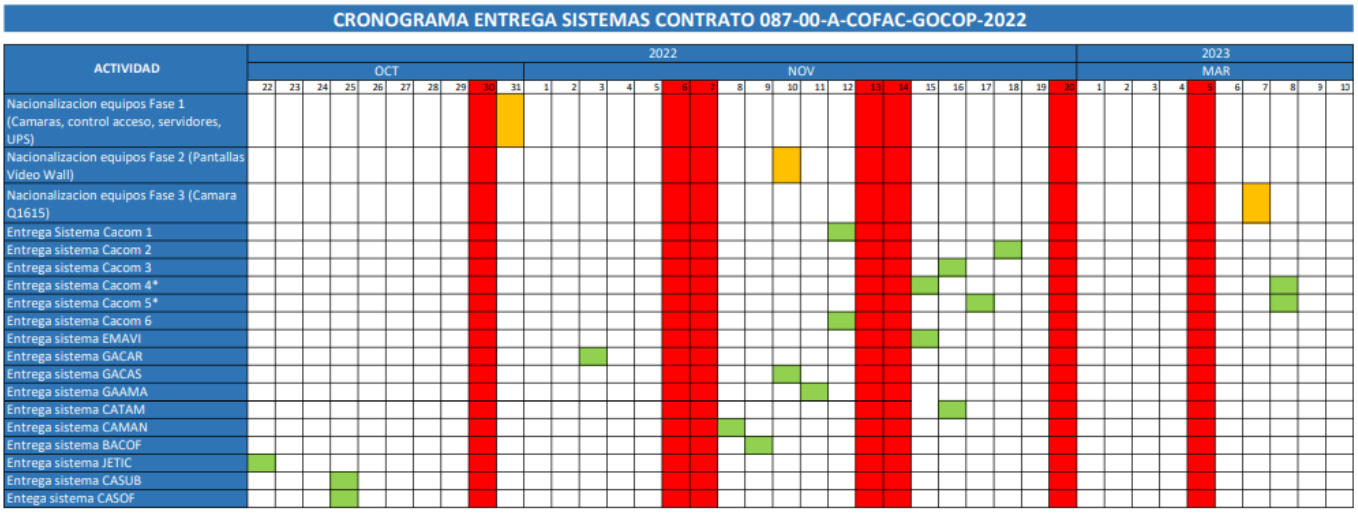


Según lo mencionado anteriormente con respecto al equipo que se tiene inconveniente para adquirir, el contratista propuso unas ofertas para suplir y solventar dicha novedad, con reemplazo de esta con otras referencias, la cual una de estas propuestas fue descartada, ya que aunque cumplía con entrega inmediata del elemento, las características técnicas y económicas eran inferiores a la inicialmente contratada, por lo cual se contempló la segunda propuesta y es el cambio por la cámara de referencia Q3538-LVE, con fecha de entrega aproximada para la segunda semana de diciembre.
Teniendo en cuanta esta situación se realizó la solicitud al señor ordenador del gasto y los diferentes asesores para poder realizar el modificatorio del contrato, la cual se realizará una reunión el dia martes 8/11/2022.

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

__No Aplica__

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**

A la fecha se cumplió según lo estipulado en el site survey con el plan de visitas a las Unidades, verificando los puntos y/o los lugares donde se contemplan las instalaciones de los elementos a contratar en el presente proyecto. Y las Unidades de CACOM 6, GACAR se realizó una preinspección de manera virtual debido a la facilidad y tipos de elementos a implementar en estos puntos, posterior a esto se realizó una reunión para verificar las tareas que dejaron estas visitas y así realizar el cronograma y plan de trabajo para la ejecución del mismo y

continuar con el seguimiento como se había estipulado en la primera reunión.
Se realizan los trabajos correspondientes en las diferentes Unidades según lo estipulado en el cronograma, se realizo un primer pago con el PAC de noviembre como estaba estipulado facturando un 10.5% del total del contrato, con respecto a las condiciones pactadas inicialmente con el la entrega y puesta en funcionamiento de los equipos en sus respectivas Unidades, por el momento se continua con los trabajos programados.
El contratista vuelve a manifestar la novedad con la adquisición de las cámaras de referencia Axis Q1615-LE MK III debido a la falta de componentes para este equipo, por lo cual se le solicitó enviaran una carta manifestando la novedad y diciendo una fecha estimada para la adquisición de la misma, para verificar con el personal de asesores los procesos a continuar y que vengan al caso, lo cual ya se realizó y estamos a la espera de la reunión el día martes 11 de noviembre a las 11:00 hrs.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

| ELEMENTO | UNIDAD | CANT ENTREGADA | VLR UNITARIO | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|
| NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE | CACOM1 | 5 | $ 29.122.000,00 | $ 145.610.000,00 |
| NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE | CACOM 3 | 3 | $ 29.122.000,00 | $ 87.366.000,00 |
| UPS 2 KVA | | 4 | $ 3.875.000,00 | $ 15.500.000,00 |
| NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE | CACOM 4 | 1 | $ 29.122.000,00 | $ 29.122.000,00 |
| NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE | CACOM 6 | 1 | $ 29.122.000,00 | $ 29.122.000,00 |
| | | | | $ 306.720.000,00 |

Estos fueron los elementos facturados a corte 30 de octubre para facturar en el PAC de noiviembre, sgún la entrega y puesta en funcionamiento en las Unidades indicadas.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

- Realizar la reunión para el modificatorio del contrato 087-00-A-COFAC-GOCOP-2022.
- Continuar con las reuniones periódicas entre el personal de contratistas y supervisores del contrato, para ir revisando los avances y novedades que se vayan presentando.
- Continuar con las coordinaciones para la implementación del proyecto y organizar el cronograma de trabajo, teniendo en cuenta los resultados y avances de los trabajos.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:** _____ **NO:** __X__

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: Daniel Orlando Fernández Fernández

FIRMA: 

C.C. No. 1.020.750.891

DEPENDENCIA: JETIC
