PROGRAMACION MONSERRATE

Creado por: Jairo Arenas · Tu respuesta ✔Sí, asistiré.

Hora

2pm - 3pm (Hora estándar de Colombia)

Invitados


✔ Jairo Arenas
melissapachonp@gmail.com

Fecha

lun 24 de oct de 2022

Mis notas


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
1			**780 días**	**$ 71.471.647.004,57**			
2			**113 días**	**$ 5.571.546.866,98**			
3	UN	537,00	15 días	$ 2.739.967.185,75	4	día 45,6875	día 61,625
4	ML	8.249,38	13 días	$ 1.044.143.247,66	6	día 31,875	día 45,6875
5	M2	1.030,00	20 días	$ 29.863.274,10	9	día 98,8125	día 120,0625
6	M2	19.487,56	30 días	$ 56.018.160,47		día 0	día 31,875
7	M2	2.060,00	28 días	$ 927.958.888,80	6FC-10 días	día 21,25	día 51
8	UN	1.006,00	20 días	$ 686.857.978,46	3	día 61,625	día 82,875
9	M2	8.477,45	45 días	$ 86.738.131,74	7	día 51	día 98,8125
10			**0 días**	**$ 0,00**	**5**	**día 120,0625**	**día 120,0625**
11			**166 días**	**$ 11.524.234.803,24**			
12			**140 días**	**$ 6.764.490.093,36**			
13	M3	83.886,69	38 días	$ 4.721.591.481,85	5	día 120,0625	día 160,4375
14	M3	14.403,19	18 días	$ 767.907.083,07	13CC	día 120,0625	día 139,1875
15	M3	9.227,34	25 días	$ 681.995.836,70	17	día 242,25	día 268,8125
16	M3	3.657,27	14 días	$ 495.945.744,12	29	día 208,25	día 223,125
17	M2	1.838,18	18 días	$ 33.580.736,18	16	día 223,125	día 242,25
18	M3	142,44	10 días	$ 63.469.211,44	13	día 160,4375	día 171,0625
19			**0 días**	**$ 0,00**	**15**	**día 268,8125**	**día 268,8125**
20			**14 días**	**$ 241.122.773,43**			
21	M3	387,11	14 días	$ 173.134.722,98	13	día 160,4375	día 175,3125
22	M3	190,58	14 días	$ 67.988.050,45	13	día 160,4375	día 175,3125
23			**0 días**	**$ 0,00**	**21**	**día 175,3125**	**día 175,3125**
24			**148 días**	**$ 4.518.621.936,45**			
25	M3	78,99	20 días	$ 67.052.546,99	21	día 175,3125	día 196,5625
26	M3	677,04	26 días	$ 644.371.208,64	15	día 268,8125	día 296,4375
27	M3	199,24	24 días	$ 165.152.988,74	25	día 196,5625	día 222,0625
28	M3	16,74	9 días	$ 13.736.891,21	21	día 175,3125	día 184,875
29	M3	209,46	22 días	$ 162.941.847,59	28	día 184,875	día 208,25
30	M3	1.953,63	31 días	$ 3.137.165.154,50	14	día 139,1875	día 172,125
31	M3	251,08	22 días	$ 200.166.057,86	30	día 172,125	día 195,5
32	M3	74,22	16 días	$ 128.035.240,92	31	día 195,5	día 212,5
33			**0 días**	**$ 0,00**	**26**	**día 296,4375**	**día 296,4375**
34			**232 días**	**$ 28.800.356.781,63**			
35			**154 días**	**$ 1.938.776.606,44**			
36	M3	202,10	26 días	$ 199.731.204,09	27	día 222,0625	día 249,6875
37	M3	174,05	25 días	$ 164.785.093,98	36	día 249,6875	día 276,25
38	M3	655,46	28 días	$ 602.860.652,47	37	día 276,25	día 306
39	M3	876,35	34 días	$ 875.421.489,65	38	día 306	día 342,125
40	M2	138,92	18 días	$ 11.623.693,40	39	día 342,125	día 361,25
41	M3	6,65	8 días	$ 6.696.275,29	40	día 361,25	día 369,75
42	M3	52,36	15 días	$ 51.236.158,57	41	día 369,75	día 385,6875
43	M3	26,48	10 días	$ 26.422.038,99	41	día 369,75	día 380,375
44			**0 días**	**$ 0,00**	**43**	**día 380,375**	**día 380,375**
45			**185,06 días**	**$ 25.495.424.914,14**			

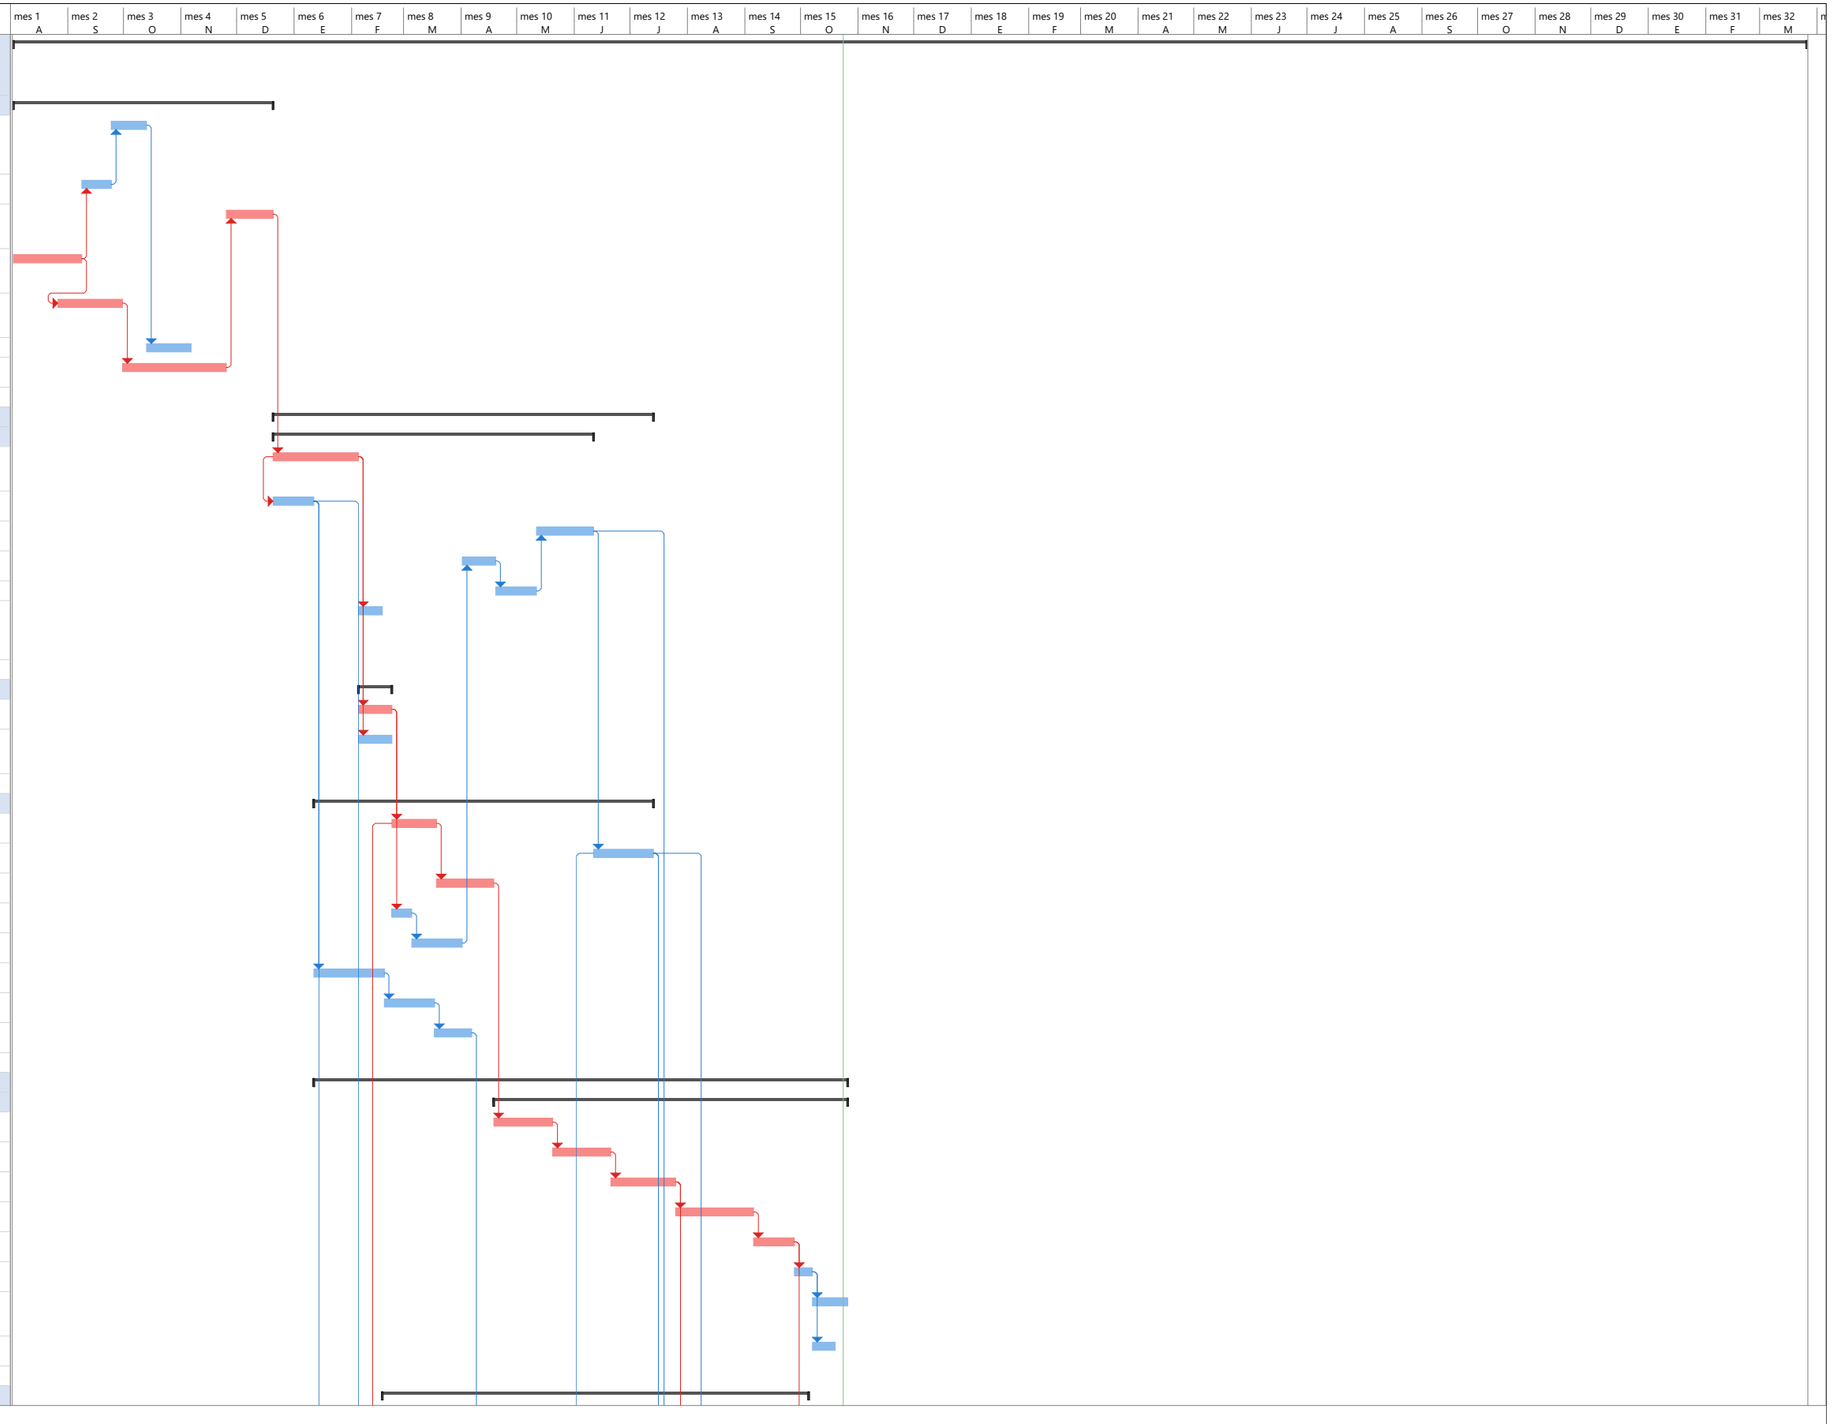

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
46	KG	48.885,93	20 días	$ 234.681.306,70	26CC-4 días	día 264,5625	día 367,6875
47	KG	608.684,96	33 días	$ 3.765.148.643,92	25CC-4 días	día 171,0625	día 302,125
48	KG	799.210,70	38 días	$ 21.495.594.963,52	38	día 306	día 346,375
49			**0 días**	**$ 0,00**	**46**	**día 367,6875**	**día 367,6875**
50			**43 días**	**$ 1.166.112.664,62**			
51	M3	470,20	15 días	$ 491.524.073,11	32	día 212,5	día 228,4375
52	M3	513,02	18 días	$ 608.702.164,86	51	día 228,4375	día 247,5625
53	M3	88,20	10 días	$ 65.886.426,65	52	día 247,5625	día 258,1875
54			**0 días**	**$ 0,00**	**53**	**día 258,1875**	**día 258,1875**
55			**70 días**	**$ 200.042.596,43**			
56	UN	1,00	20 días	$ 86.540.972,34	14	día 139,1875	día 160,4375
57	UN	1,00	20 días	$ 53.279.588,13	56	día 160,4375	día 181,6875
58	M3	9,18	10 días	$ 9.538.842,62	57	día 181,6875	día 192,3125
59	UN	1,00	20 días	$ 50.683.193,34	58	día 192,3125	día 213,5625
60			**0 días**	**$ 0,00**	**59**	**día 213,5625**	**día 213,5625**
61			**106 días**	**$ 1.069.272.345,54**			
62	M2	1.488,05	25 días	$ 85.867.746,68	40	día 361,25	día 387,8125
63	M2	3.082,22	39 días	$ 319.173.836,57	62CC+14 días	día 376,125	día 417,5625
64	M2	615,38	28 días	$ 177.151.206,74	63	día 417,5625	día 447,3125
65	M2	1.924,16	25 días	$ 445.143.236,63	64	día 447,3125	día 473,875
66	M2	135,37	12 días	$ 10.947.719,80	65CC	día 447,3125	día 460,0625
67	ML	60,36	12 días	$ 4.127.709,55	64CC	día 417,5625	día 430,3125
68	ML	489,41	20 días	$ 20.166.158,63	67	día 430,3125	día 451,5625
69	ML	113,29	7 días	$ 6.694.730,94	68	día 451,5625	día 459
70			**0 días**	**$ 0,00**	**65**	**día 473,875**	**día 473,875**
71			**186 días**	**$ 4.852.401.848,72**			
72	M2	255,35	12 días	$ 6.567.392,61	65	día 473,875	día 486,625
73	M2	1.909,36	30 días	$ 62.090.057,78	72	día 486,625	día 518,5
74	M2	255,35	12 días	$ 7.669.005,71	73	día 518,5	día 531,25
75	M2	255,35	10 días	$ 4.196.700,23	74	día 531,25	día 541,875
76	M2	32.623,23	22 días	$ 4.725.578.281,14	74CC	día 518,5	día 541,875
77	M2	2.163,71	18 días	$ 36.432.527,34	75	día 541,875	día 561
78	ML	1.059,27	5 días	$ 9.867.883,91	613	día 363,375	día 368,6875
79			**0 días**	**$ 0,00**	**77**	**día 561**	**día 561**

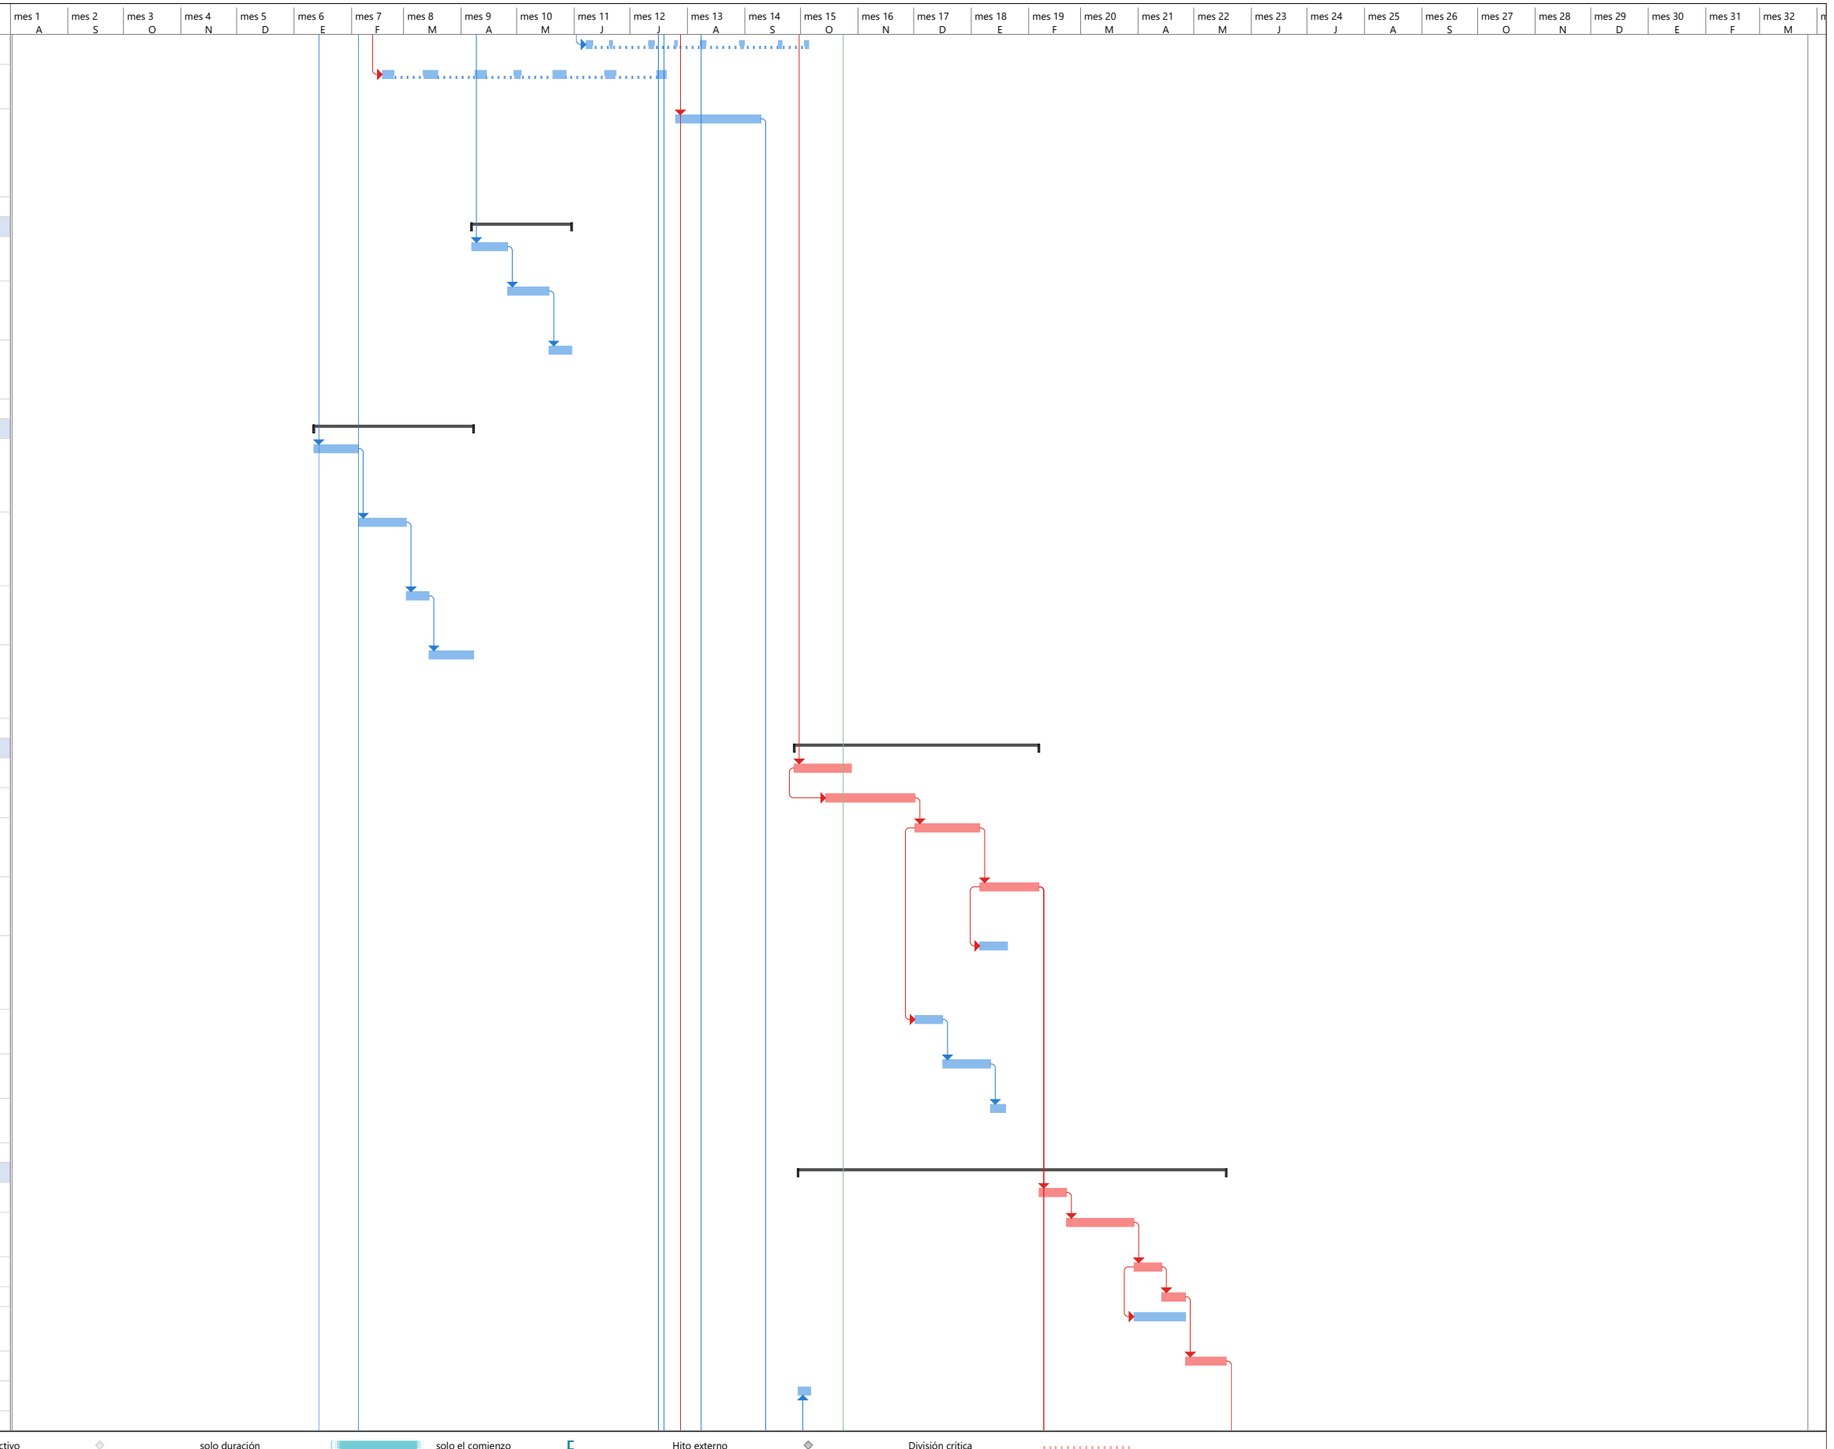

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
80			**229 días**	**$ 703.901.217,08**			
81			**142 días**	**$ 162.975.624,30**			
82	ML	412,67	36 días	$ 22.656.763,24	14FC+20 días	día 160,4375	día 198,6875
83	ML	101,27	10 días	$ 5.781.046,56	82	día 198,6875	día 209,3125
84	ML	90,95	10 días	$ 5.208.696,50	83	día 209,3125	día 219,9375
85	ML	10,57	2 días	$ 648.806,79	84	día 219,9375	día 222,0625
86	ML	83,55	8 días	$ 5.291.434,55	85	día 222,0625	día 230,5625
87	ML	40,28	4 días	$ 2.922.583,88	86	día 230,5625	día 234,8125
88	ML	50,14	5 días	$ 5.724.134,32	87	día 234,8125	día 240,125
89	ML	26,14	2 días	$ 1.623.959,52	88	día 240,125	día 242,25
90	ML	20,94	2 días	$ 2.029.798,38	89	día 242,25	día 244,375
91	ML	39,23	4 días	$ 5.667.378,43	90	día 244,375	día 248,625
92	UN	35,00	3 días	$ 4.520.302,50	91	día 248,625	día 251,8125
93	UN	2,00	1 día	$ 309.912,94	92	día 251,8125	día 252,875
94	UN	3,00	1 día	$ 424.683,69	93	día 252,875	día 253,9375
95	UN	5,00	1 día	$ 729.055,65	94	día 253,9375	día 255
96	UN	45,00	3 días	$ 1.079.507,25	95	día 255	día 258,1875
97	UN	2,00	1 día	$ 75.753,90	96	día 258,1875	día 259,25
98	UN	5,00	1 día	$ 254.758,70	97	día 259,25	día 260,3125
99	UN	15,00	3 días	$ 1.729.890,30	98	día 260,3125	día 263,5
100	UN	17,00	3 días	$ 786.238,44	99	día 263,5	día 266,6875
101	UN	7,00	2 días	$ 223.246,52	100	día 266,6875	día 268,8125
102	UN	4,00	2 días	$ 232.369,80	101	día 268,8125	día 270,9375
103	UN	8,00	2 días	$ 231.846,40	102	día 270,9375	día 273,0625
104	UN	19,00	3 días	$ 495.430,51	103	día 273,0625	día 276,25
105	UN	7,00	2 días	$ 493.143,00	104	día 276,25	día 278,375
106	UN	3,00	3 días	$ 247.661,94	105	día 278,375	día 281,5625
107	UN	3,00	2 días	$ 238.688,16	106	día 281,5625	día 283,6875
108	UN	3,00	3 días	$ 392.530,44	107	día 283,6875	día 286,875
109	UN	3,00	3 días	$ 31.067.787,48	108	día 286,875	día 290,0625
110	UN	1,00	2 días	$ 520.250,20	109	día 290,0625	día 292,1875
111	ML	263,42	18 días	$ 61.367.964,31	110	día 292,1875	día 311,3125
112			**0 días**	**$ 0,00**	**111**	**día 311,3125**	**día 311,3125**
113			**183 días**	**$ 94.548.721,35**			
114	ML	147,98	12 días	$ 17.265.452,56	14	día 139,1875	día 151,9375
115	ML	31,72	4 días	$ 4.898.756,23	114	día 151,9375	día 156,1875
116	ML	105,24	10 días	$ 25.146.969,61	115	día 156,1875	día 166,8125
117	ML	25,28	3 días	$ 1.673.480,89	38	día 306	día 309,1875
118	ML	24,32	3 días	$ 1.631.280,05	117	día 309,1875	día 312,375
119	ML	82,92	8 días	$ 5.042.493,73	118	día 312,375	día 320,875
120	ML	25,44	3 días	$ 1.963.649,75	119	día 320,875	día 324,0625
121	ML	99,98	9 días	$ 9.130.482,54	120	día 324,0625	día 333,625

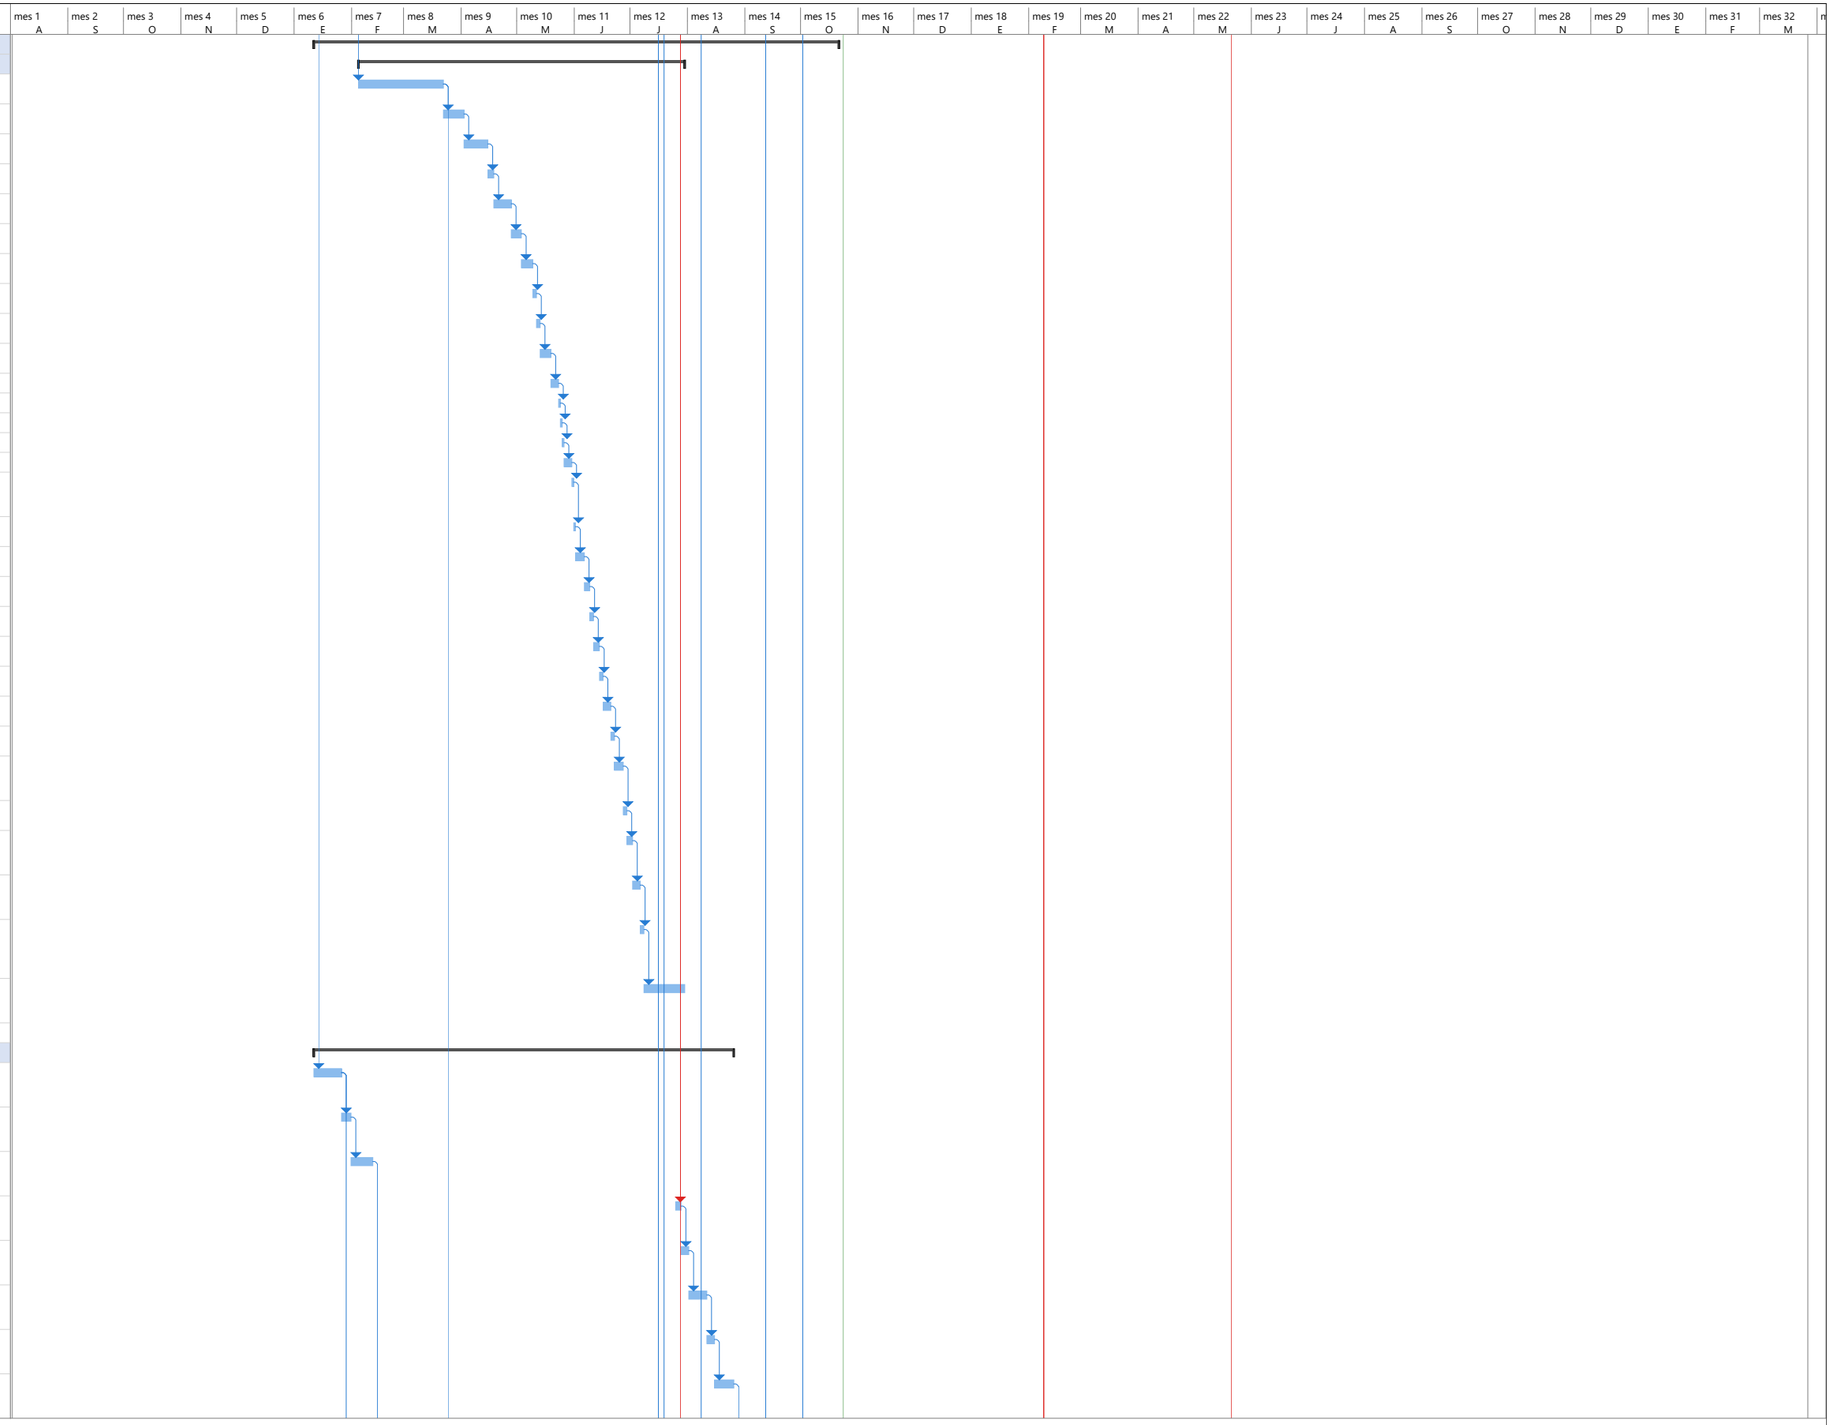

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
122	UN	15,00	7 días	$ 1.107.305,85	116	día 166,8125	día 174,25
123	UN	129,00	18 días	$ 6.187.664,31	122	día 174,25	día 193,375
124	UN	5,00	2 días	$ 369.101,95	123	día 193,375	día 195,5
125	UN	2,00	1 día	$ 90.862,80	124	día 195,5	día 196,5625
126	UN	7,00	3 días	$ 396.062,80	125	día 196,5625	día 199,75
127	UN	4,00	2 días	$ 191.865,56	126	día 199,75	día 201,875
128	UN	1,00	1 día	$ 59.115,39	127	día 201,875	día 202,9375
129	ML	10,00	4 días	$ 591.153,90	128	día 202,9375	día 207,1875
130	UN	2,00	14 días	$ 9.118.144,28	129	día 207,1875	día 222,0625
131	ML	29,85	4 días	$ 3.211.229,27	130	día 222,0625	día 226,3125
132	UN	1,00	15 días	$ 6.473.649,88	114	día 151,9375	día 167,875
133			**0 días**	**$ 0,00**	**121**	**día 333,625**	**día 333,625**
134			**48 días**	**$ 8.836.201,22**			
135	UN	9,00	27 días	$ 4.679.630,73	130	día 222,0625	día 250,75
136	UN	4,00	12 días	$ 2.147.811,48	135	día 250,75	día 263,5
137	UN	2,00	6 días	$ 1.196.587,20	136	día 263,5	día 269,875
138	UN	1,00	3 días	$ 812.171,81	137	día 269,875	día 273,0625
139			**0 días**	**$ 0,00**	**138**	**día 273,0625**	**día 273,0625**
140			**18 días**	**$ 9.775.423,62**			
141	UN	2,00	18 días	$ 9.775.423,62	138	día 273,0625	día 292,1875
142			**0 días**	**$ 0,00**	**141**	**día 292,1875**	**día 292,1875**
143			**147 días**	**$ 376.121.690,27**			
144	ML	59,81	5 días	$ 4.026.331,45	121	día 333,625	día 338,9375
145	ML	79,52	7 días	$ 5.864.439,37	144	día 338,9375	día 346,375
146	ML	193,62	15 días	$ 15.722.761,08	145	día 346,375	día 362,3125
147	ML	35,90	4 días	$ 4.397.220,12	131	día 226,3125	día 230,5625
148	ML	221,52	18 días	$ 29.513.871,63	147	día 230,5625	día 249,6875
149	ML	57,82	5 días	$ 6.853.368,17	148	día 249,6875	día 255
150	UN	20,00	5 días	$ 1.875.370,40	149	día 255	día 260,3125
151	UN	16,07	5 días	$ 2.100.228,80	150	día 260,3125	día 265,625
152	ML	341,79	18 días	$ 187.861.489,78	151	día 265,625	día 284,75
153	ML	26,21	3 días	$ 3.502.901,24	152	día 284,75	día 287,9375
154	ML	46,45	4 días	$ 3.087.040,52	153	día 287,9375	día 292,1875
155	UN	2,00	2 días	$ 2.226.341,84	154	día 292,1875	día 294,3125
156	UN	2,00	1 día	$ 505.579,18	155	día 294,3125	día 295,375
157	ML	93,46	9 días	$ 14.981.054,81	156	día 295,375	día 304,9375
158	ML	53,80	5 días	$ 11.986.522,18	157	día 304,9375	día 310,25
159	ML	7,81	1 día	$ 852.088,73	158	día 310,25	día 311,3125

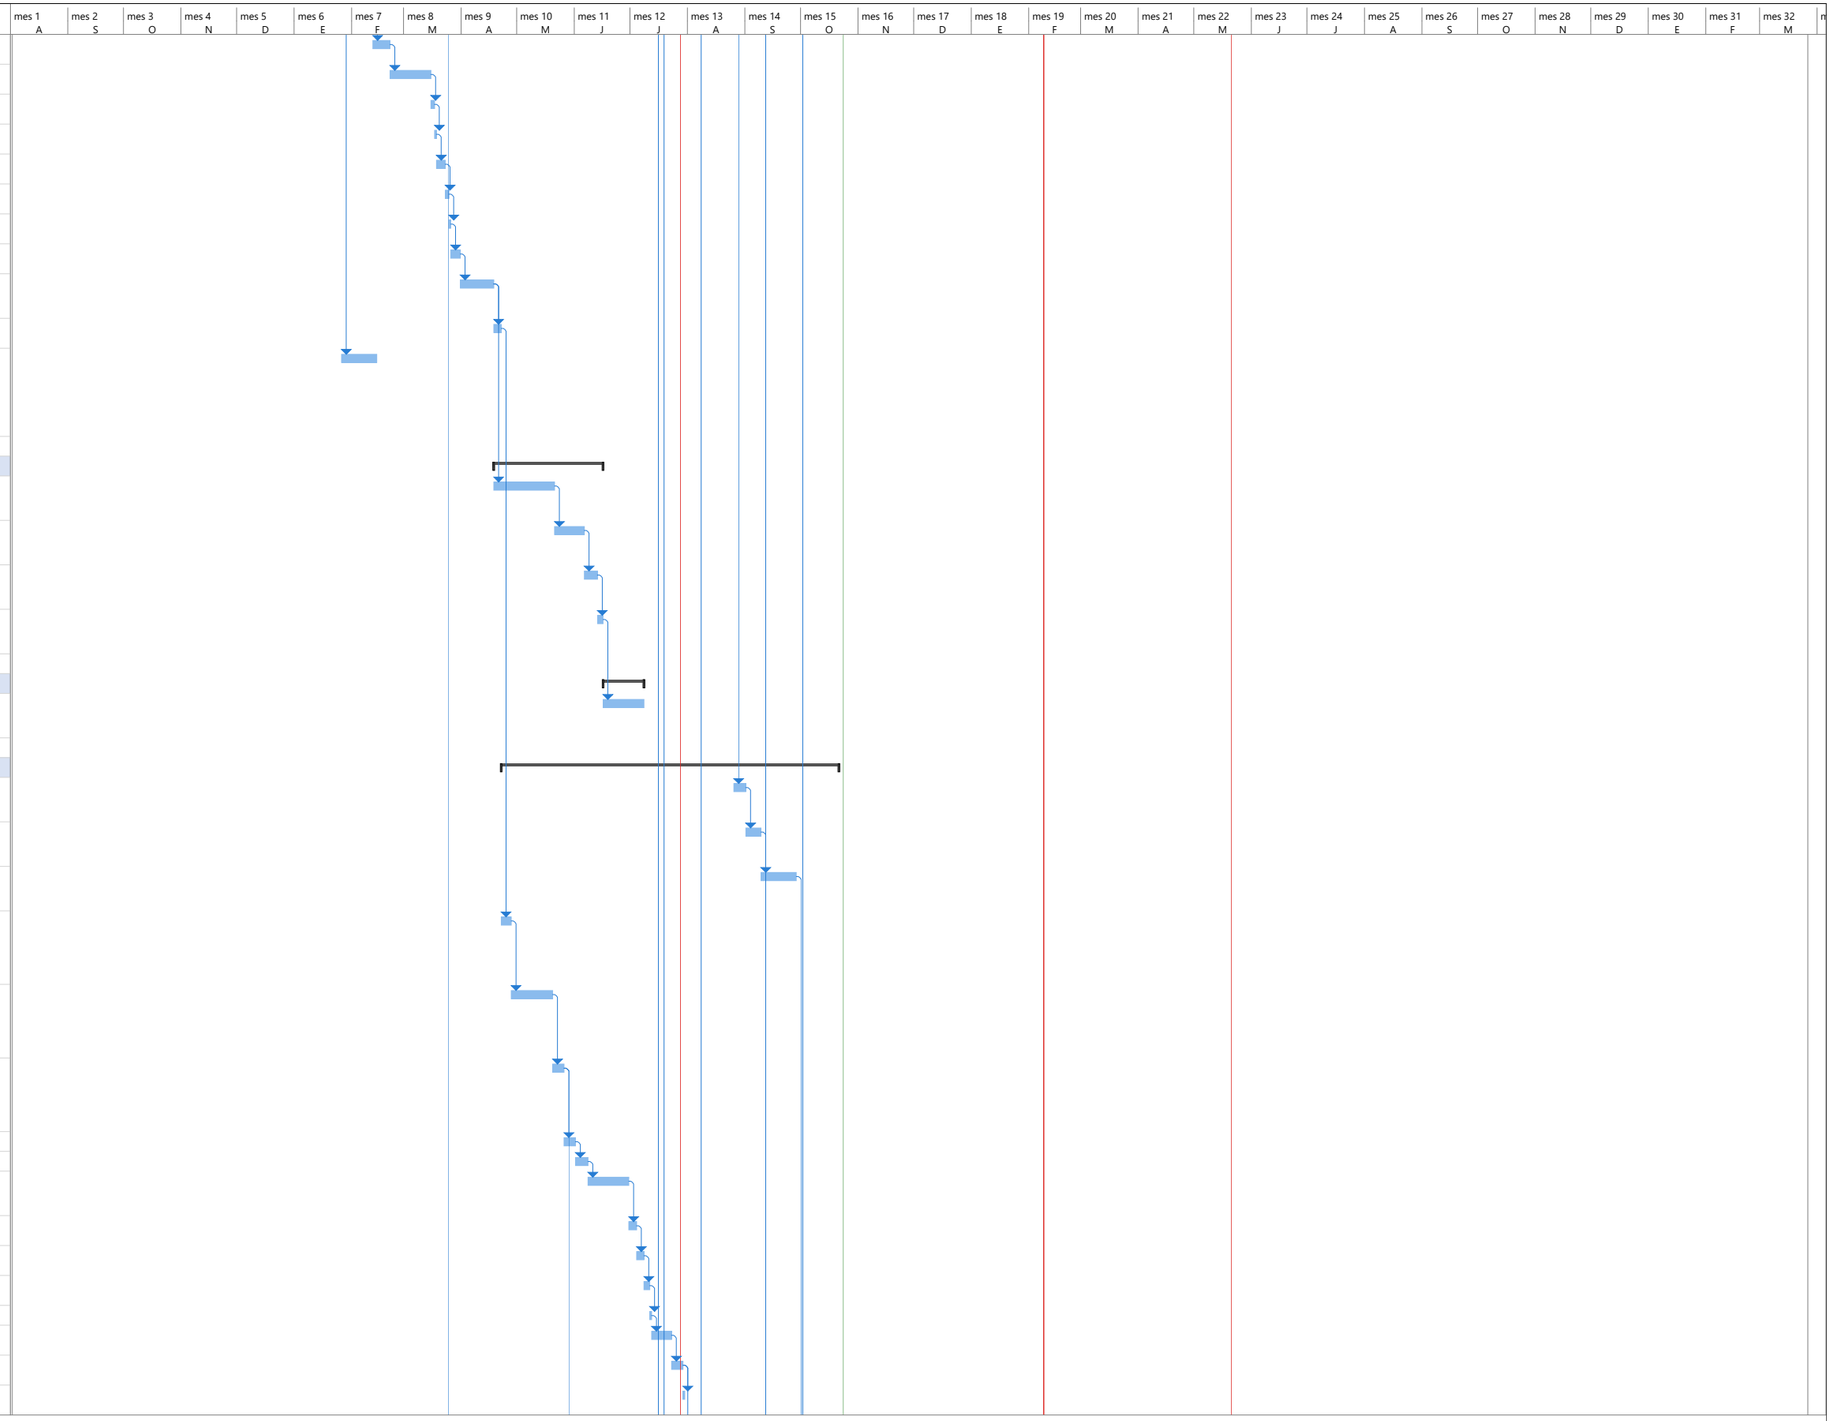

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
160	ML	32,32	18 días	$ 32.826.197,46	149	día 255	día 274,125
161	ML	8,69	7 días	$ 2.438.176,15	158	día 310,25	día 317,6875
162	ML	35,97	14 días	$ 10.907.219,43	161	día 317,6875	día 332,5625
163	ML	44,69	19 días	$ 13.275.366,95	162	día 332,5625	día 352,75
164	ML	72,14	28 días	$ 21.318.120,98	163	día 352,75	día 382,5
165			**0 días**	**$ 0,00**	**164**	**día 382,5**	**día 382,5**
166			**30 días**	**$ 51.643.556,32**			
167	UN	1,00	30 días	$ 14.391.879,62	82	día 198,6875	día 230,5625
168	UN	1,00	30 días	$ 16.884.616,76	167CC	día 198,6875	día 230,5625
169	UN	1,00	30 días	$ 13.681.565,32	167CC	día 198,6875	día 230,5625
170	UN	1,00	30 días	$ 6.685.494,62	167CC	día 198,6875	día 230,5625
171			**0 días**	**$ 0,00**	**170**	**día 230,5625**	**día 230,5625**
172			**112 días**	**$ 221.698.811,41**			
173			**95 días**	**$ 138.664.314,47**			
174	ML	339,51	25 días	$ 16.594.678,42	146	día 362,3125	día 388,875
175	ML	16,30	2 días	$ 1.235.894,04	174	día 388,875	día 391
176	ML	18,28	2 días	$ 1.444.700,02	175	día 391	día 393,125
177	ML	356,53	25 días	$ 38.224.982,46	176	día 393,125	día 419,6875
178	ML	66,01	6 días	$ 8.783.517,67	177	día 419,6875	día 426,0625
179	ML	97,94	9 días	$ 18.162.957,33	178	día 426,0625	día 435,625
180	ML	63,36	6 días	$ 22.352.406,28	179	día 435,625	día 442
181	UN	241,00	20 días	$ 26.020.917,01	180	día 442	día 463,25
182	UN	3,00	20 días	$ 5.844.261,24	174CC	día 362,3125	día 383,5625
183			**0 días**	**$ 0,00**	**181**	**día 463,25**	**día 463,25**
184			**13 días**	**$ 7.332.504,16**			
185	UN	6,00	2 días	$ 774.909,00	181CC	día 442	día 444,125
186	UN	3,00	1 día	$ 2.836.735,50	185	día 444,125	día 445,1875
187	UN	3,00	1 día	$ 207.027,87	186	día 445,1875	día 446,25
188	UN	3,00	1 día	$ 2.195.763,87	187	día 446,25	día 447,3125
189	UN	5,00	2 días	$ 669.062,20	188	día 447,3125	día 449,4375
190	UN	6,00	2 días	$ 335.936,16	189	día 449,4375	día 451,5625
191	UN	6,00	2 días	$ 154.509,78	190	día 451,5625	día 453,6875
192	UN	6,00	2 días	$ 158.559,78	191	día 453,6875	día 455,8125
193			**0 días**	**$ 0,00**	**192**	**día 455,8125**	**día 455,8125**
194			**20 días**	**$ 17.515.579,35**			
195	UN	15,00	20 días	$ 17.515.579,35	192	día 455,8125	día 477,0625
196			**0 días**	**$ 0,00**	**195**	**día 477,0625**	**día 477,0625**
197			**3 días**	**$ 34.769.081,24**			
198	UN	2,00	1 día	$ 2.447.800,58	195	día 477,0625	día 478,125

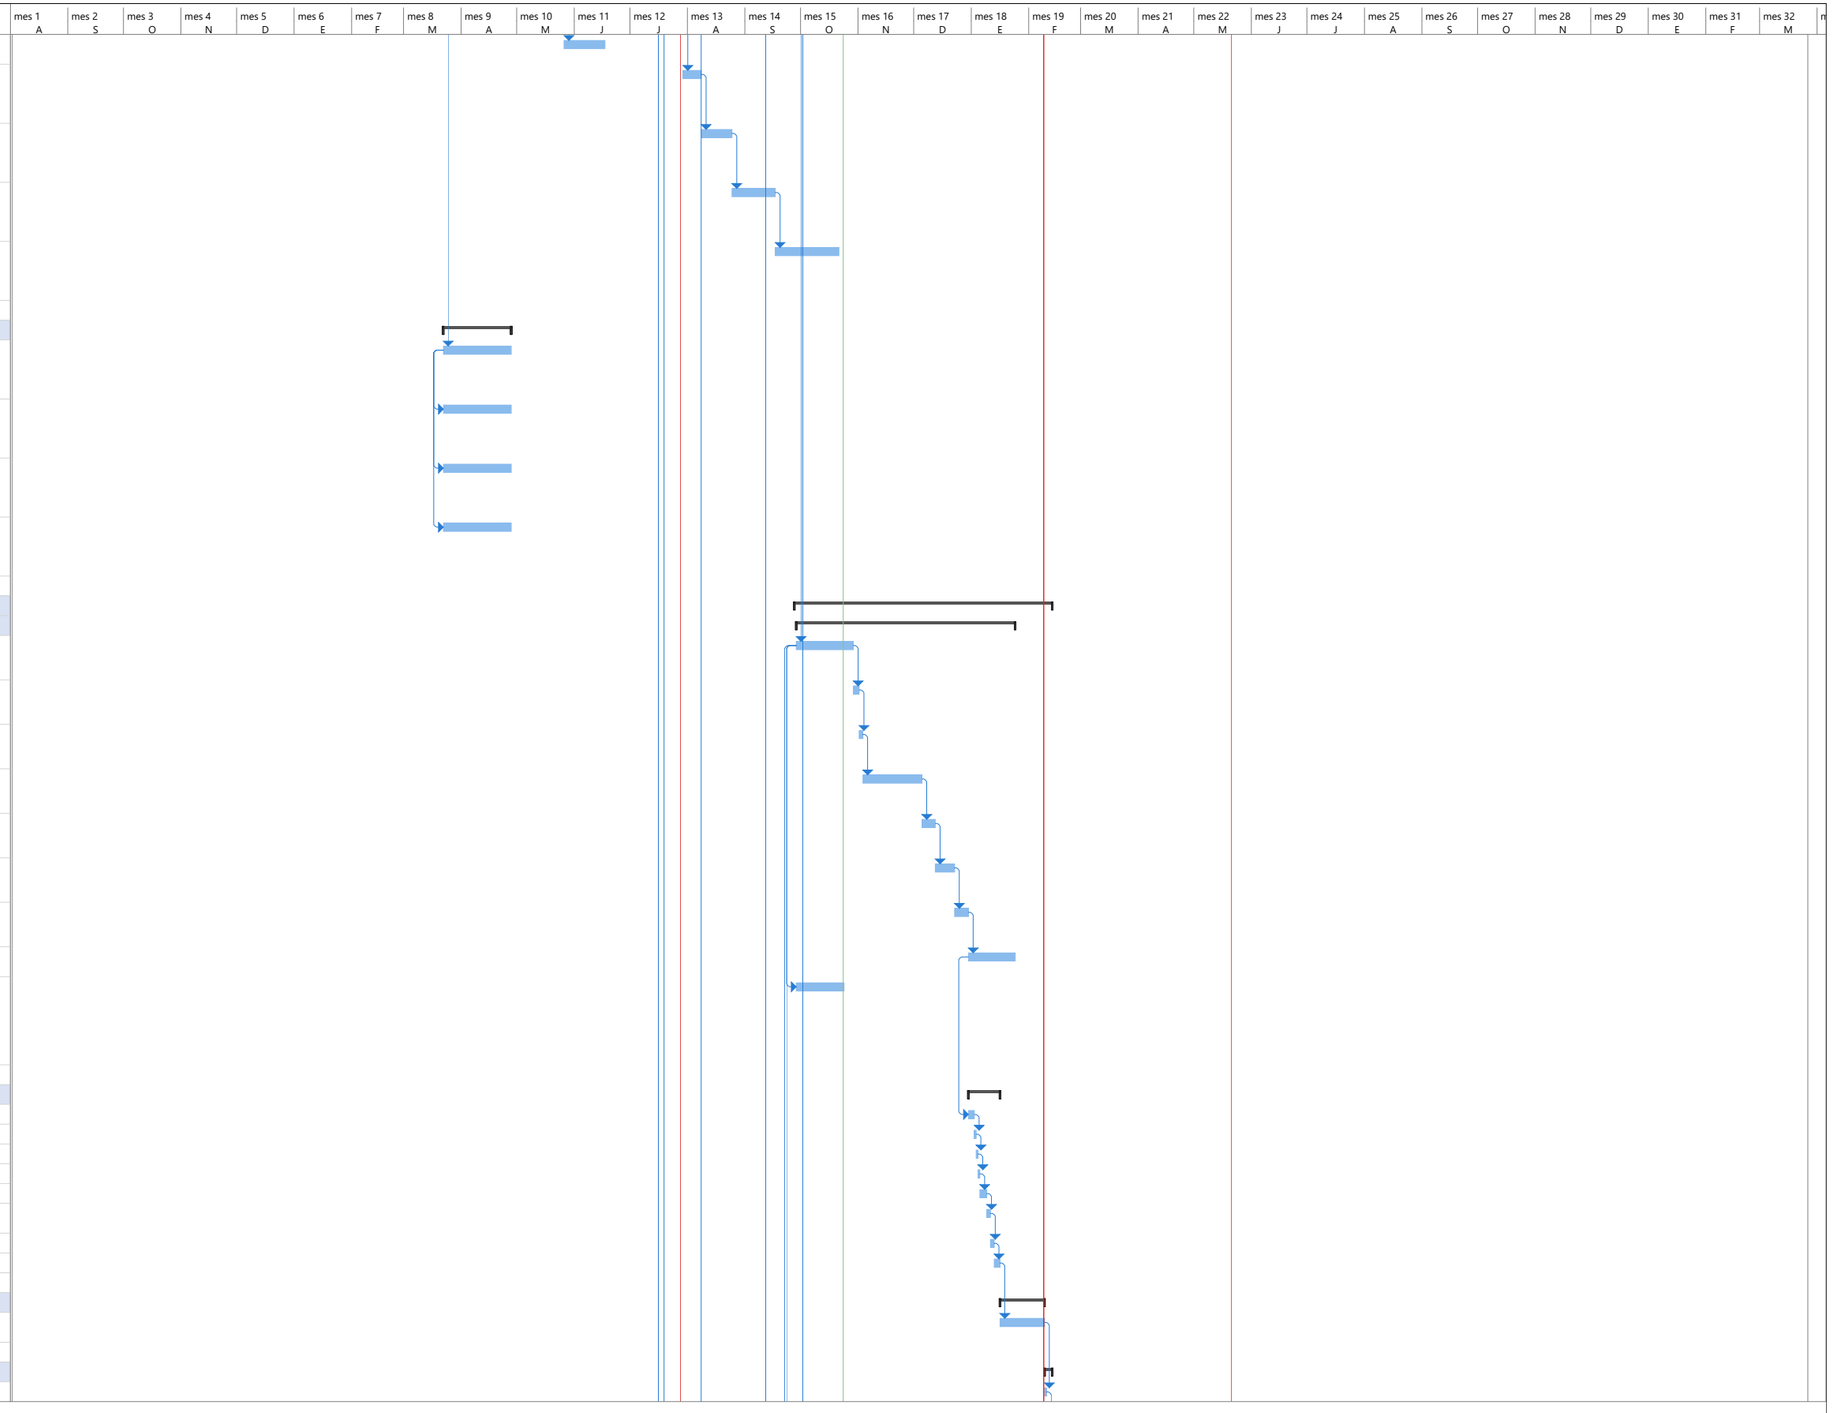

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
199	UN	3,00	2 días	$ 32.321.280,66	198	día 478,125	día 480,25
200			**0 días**	**$ 0,00**	**199**	**día 480,25**	**día 480,25**
201			**54 días**	**$ 23.417.332,19**			
202	UN	110,00	10 días	$ 3.210.969,30	174CC-1 día	día 361,25	día 371,875
203	UN	5,00	1 día	$ 148.668,15	202	día 371,875	día 372,9375
204	UN	19,00	2 días	$ 566.591,97	203	día 372,9375	día 375,0625
205	UN	109,00	10 días	$ 3.222.544,67	204	día 375,0625	día 385,6875
206	UN	195,00	13 días	$ 7.328.807,85	205	día 385,6875	día 399,5
207	UN	22,00	3 días	$ 842.877,86	206	día 399,5	día 402,6875
208	UN	48,00	5 días	$ 1.448.044,32	207	día 402,6875	día 408
209	UN	21,00	3 días	$ 787.891,23	208	día 408	día 411,1875
210	UN	2,00	1 día	$ 279.106,30	209	día 411,1875	día 412,25
211	UN	5,00	1 día	$ 697.675,35	210	día 412,25	día 413,3125
212	UN	4,00	1 día	$ 570.168,60	211	día 413,3125	día 414,375
213	UN	4,00	1 día	$ 582.120,60	212	día 414,375	día 415,4375
214	UN	13,00	2 días	$ 2.008.436,95	213	día 415,4375	día 417,5625
215	UN	8,00	1 día	$ 1.723.429,04	214	día 417,5625	día 418,625
216			**0 días**	**$ 0,00**	**215**	**día 418,625**	**día 418,625**
217			**54 días**	**$ 138.343.726,55**			
218			**54 días**	**$ 138.343.726,55**			
219	UN	2,00	30 días	$ 78.486.588,64	174CC	día 362,3125	día 394,1875
220	UN	1,00	30 días	$ 56.372.645,32	219CC	día 362,3125	día 394,1875
221	UN	1,00	1 día	$ 3.484.492,59	215	día 418,625	día 419,6875
222			**0 días**	**$ 0,00**	**221**	**día 419,6875**	**día 419,6875**
223			**333 días**	**$ 5.678.839.860,35**			
224			**97 días**	**$ 955.461.727,84**			
225	UN	2,00	2 días	$ 2.405.949,84	26	día 296,4375	día 298,5625
226	UN	1,00	1 día	$ 1.497.679,86	225	día 298,5625	día 299,625
227	UN	1,00	1 día	$ 1.109.205,16	226	día 299,625	día 300,6875
228	UN	2,00	2 días	$ 1.355.125,40	227	día 300,6875	día 302,8125
229	UN	1,00	1 día	$ 759.938,77	228	día 302,8125	día 303,875
230	UN	1,00	1 día	$ 250.933,73	229	día 303,875	día 304,9375
231	UN	2,00	2 días	$ 478.417,42	230	día 304,9375	día 307,0625
232	UN	1,00	1 día	$ 10.973.974,62	231	día 307,0625	día 308,125

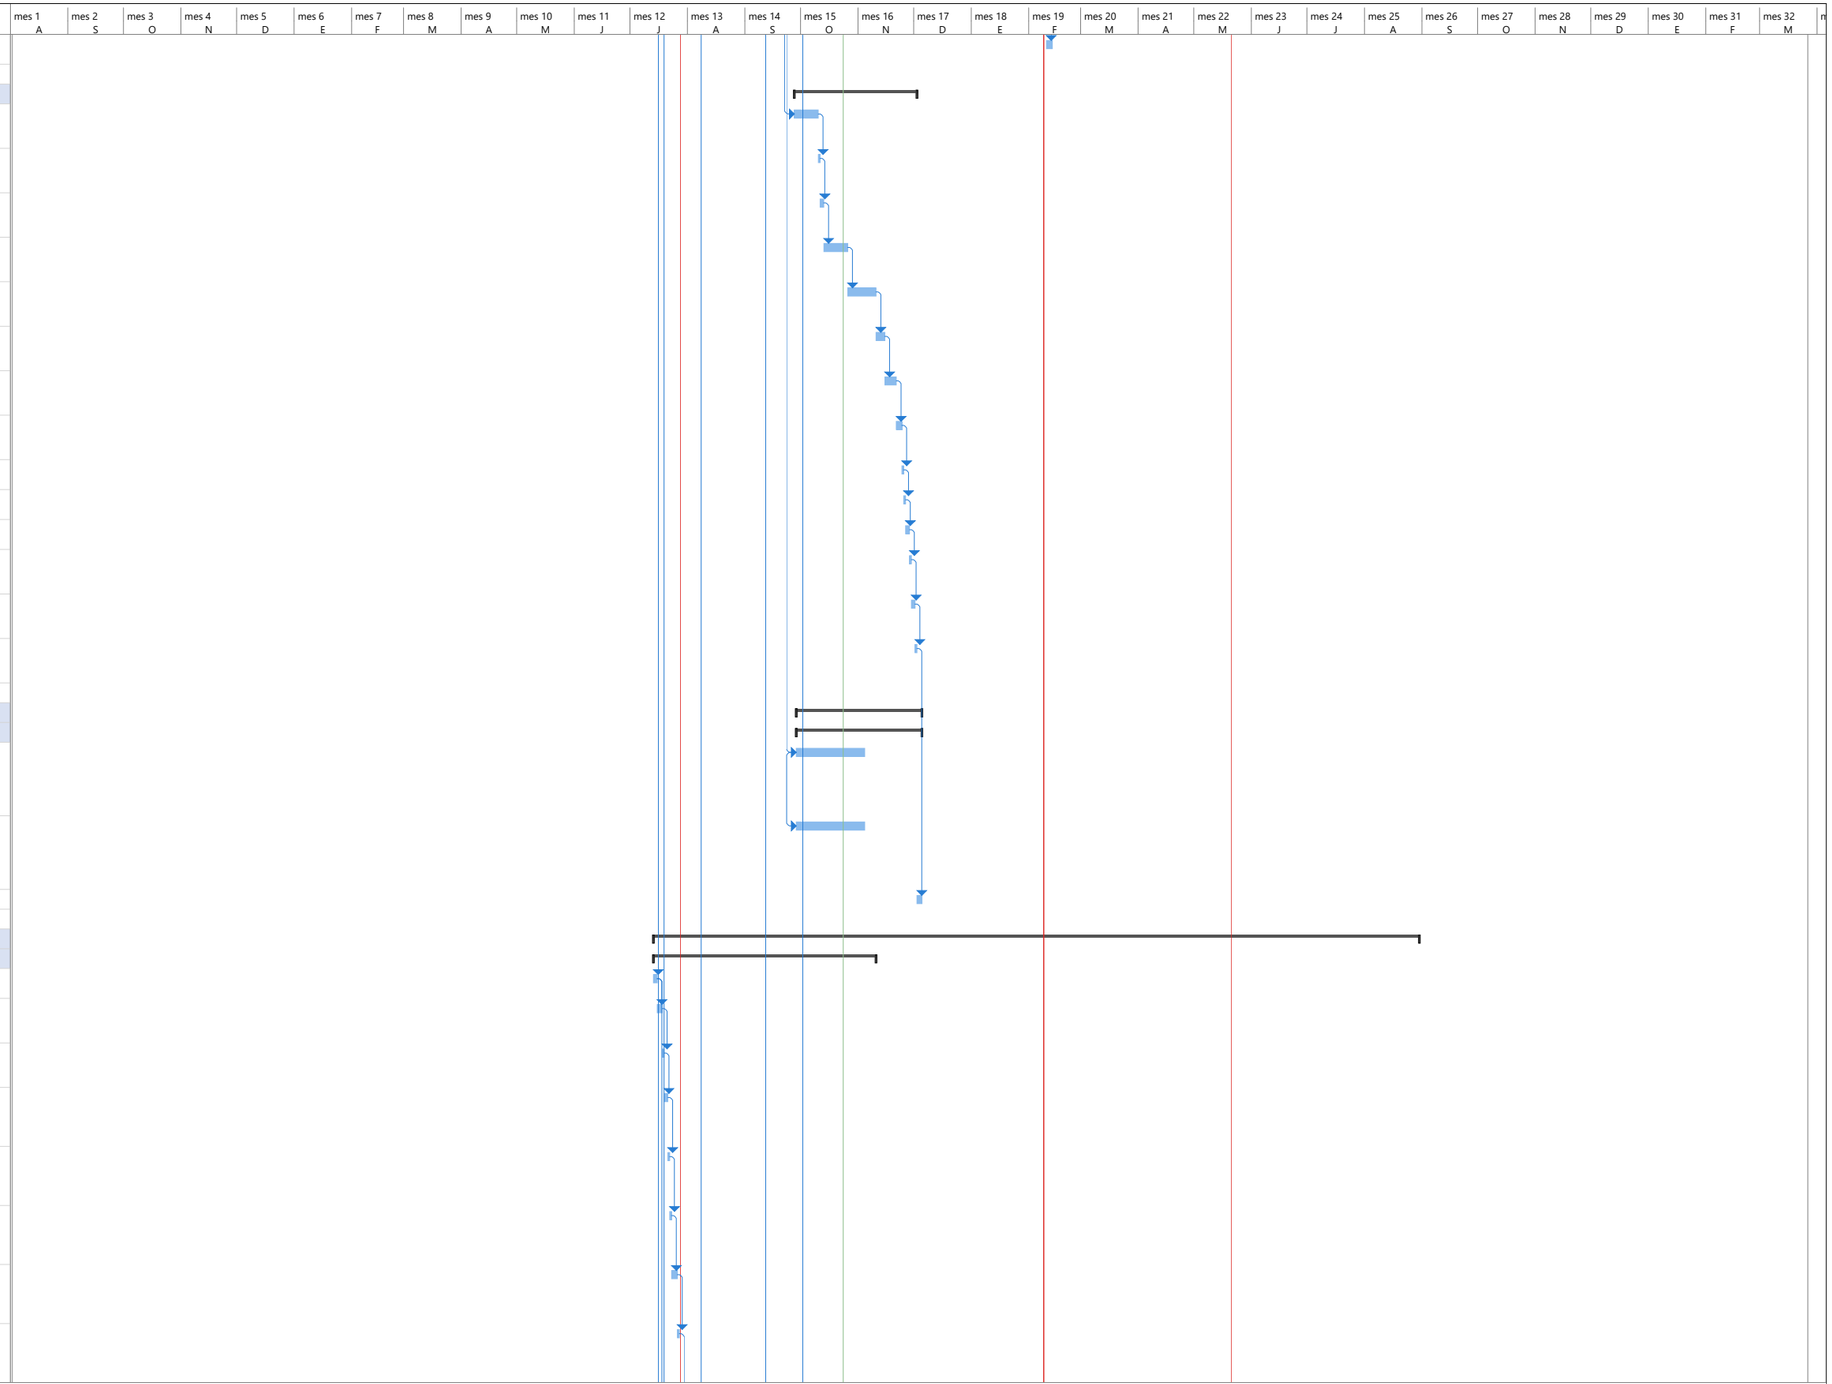

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
233	UN	3,00	1 día	$ 3.172.303,77	232	día 308,125	día 309,1875
234	ML	77,00	6 días	$ 3.190.248,60	233	día 309,1875	día 315,5625
235	ML	35,00	3 días	$ 10.822.828,80	234	día 315,5625	día 318,75
236	ML	27,50	2 días	$ 8.503.651,20	235	día 318,75	día 320,875
237	ML	726,00	20 días	$ 224.496.391,68	236	día 320,875	día 342,125
238	UN	6,00	25 días	$ 2.881.858,08	237	día 342,125	día 368,6875
239	ML	700,40	20 días	$ 675.496.248,41	238	día 368,6875	día 389,9375
240	UN	1,00	1 día	$ 3.417.192,68	239	día 389,9375	día 391
241	UN	1,00	8 días	$ 4.649.779,82	240	día 391	día 399,5
242			**0 días**	**$ 0,00**	**241**	**día 399,5**	**día 399,5**
243			**87 días**	**$ 275.671.870,21**			
244	ML	647,90	9 días	$ 62.026.693,54	240	día 391	día 400,5625
245	ML	390,50	5 días	$ 7.878.884,20	244	día 400,5625	día 405,875
246	ML	92,70	4 días	$ 2.586.422,70	245	día 405,875	día 410,125
247	ML	25,75	2 días	$ 759.512,47	246	día 410,125	día 412,25
248	ML	918,50	13 días	$ 10.249.073,07	247	día 412,25	día 426,0625
249	ML	1.179,85	18 días	$ 22.351.821,71	248	día 426,0625	día 445,1875
250	ML	102,75	5 días	$ 1.698.831,51	249	día 445,1875	día 450,5
251	ML	347,60	5 días	$ 7.313.267,63	250	día 450,5	día 455,8125
252	ML	2.029,50	21 días	$ 116.838.213,53	251	día 455,8125	día 478,125
253	UN	103,00	5 días	$ 43.969.149,85	252	día 478,125	día 483,4375
254			**0 días**	**$ 0,00**	**253**	**día 483,4375**	**día 483,4375**
255			**31 días**	**$ 38.695.451,86**			
256	UN	7,00	1 día	$ 2.430.190,00	253	día 483,4375	día 484,5
257	UN	2,00	1 día	$ 720.592,34	256	día 484,5	día 485,5625
258	UN	7,00	1 día	$ 1.573.469,52	257	día 485,5625	día 486,625
259	UN	1,00	1 día	$ 149.899,85	258	día 486,625	día 487,6875
260	UN	1,00	1 día	$ 1.391.040,24	259	día 487,6875	día 488,75

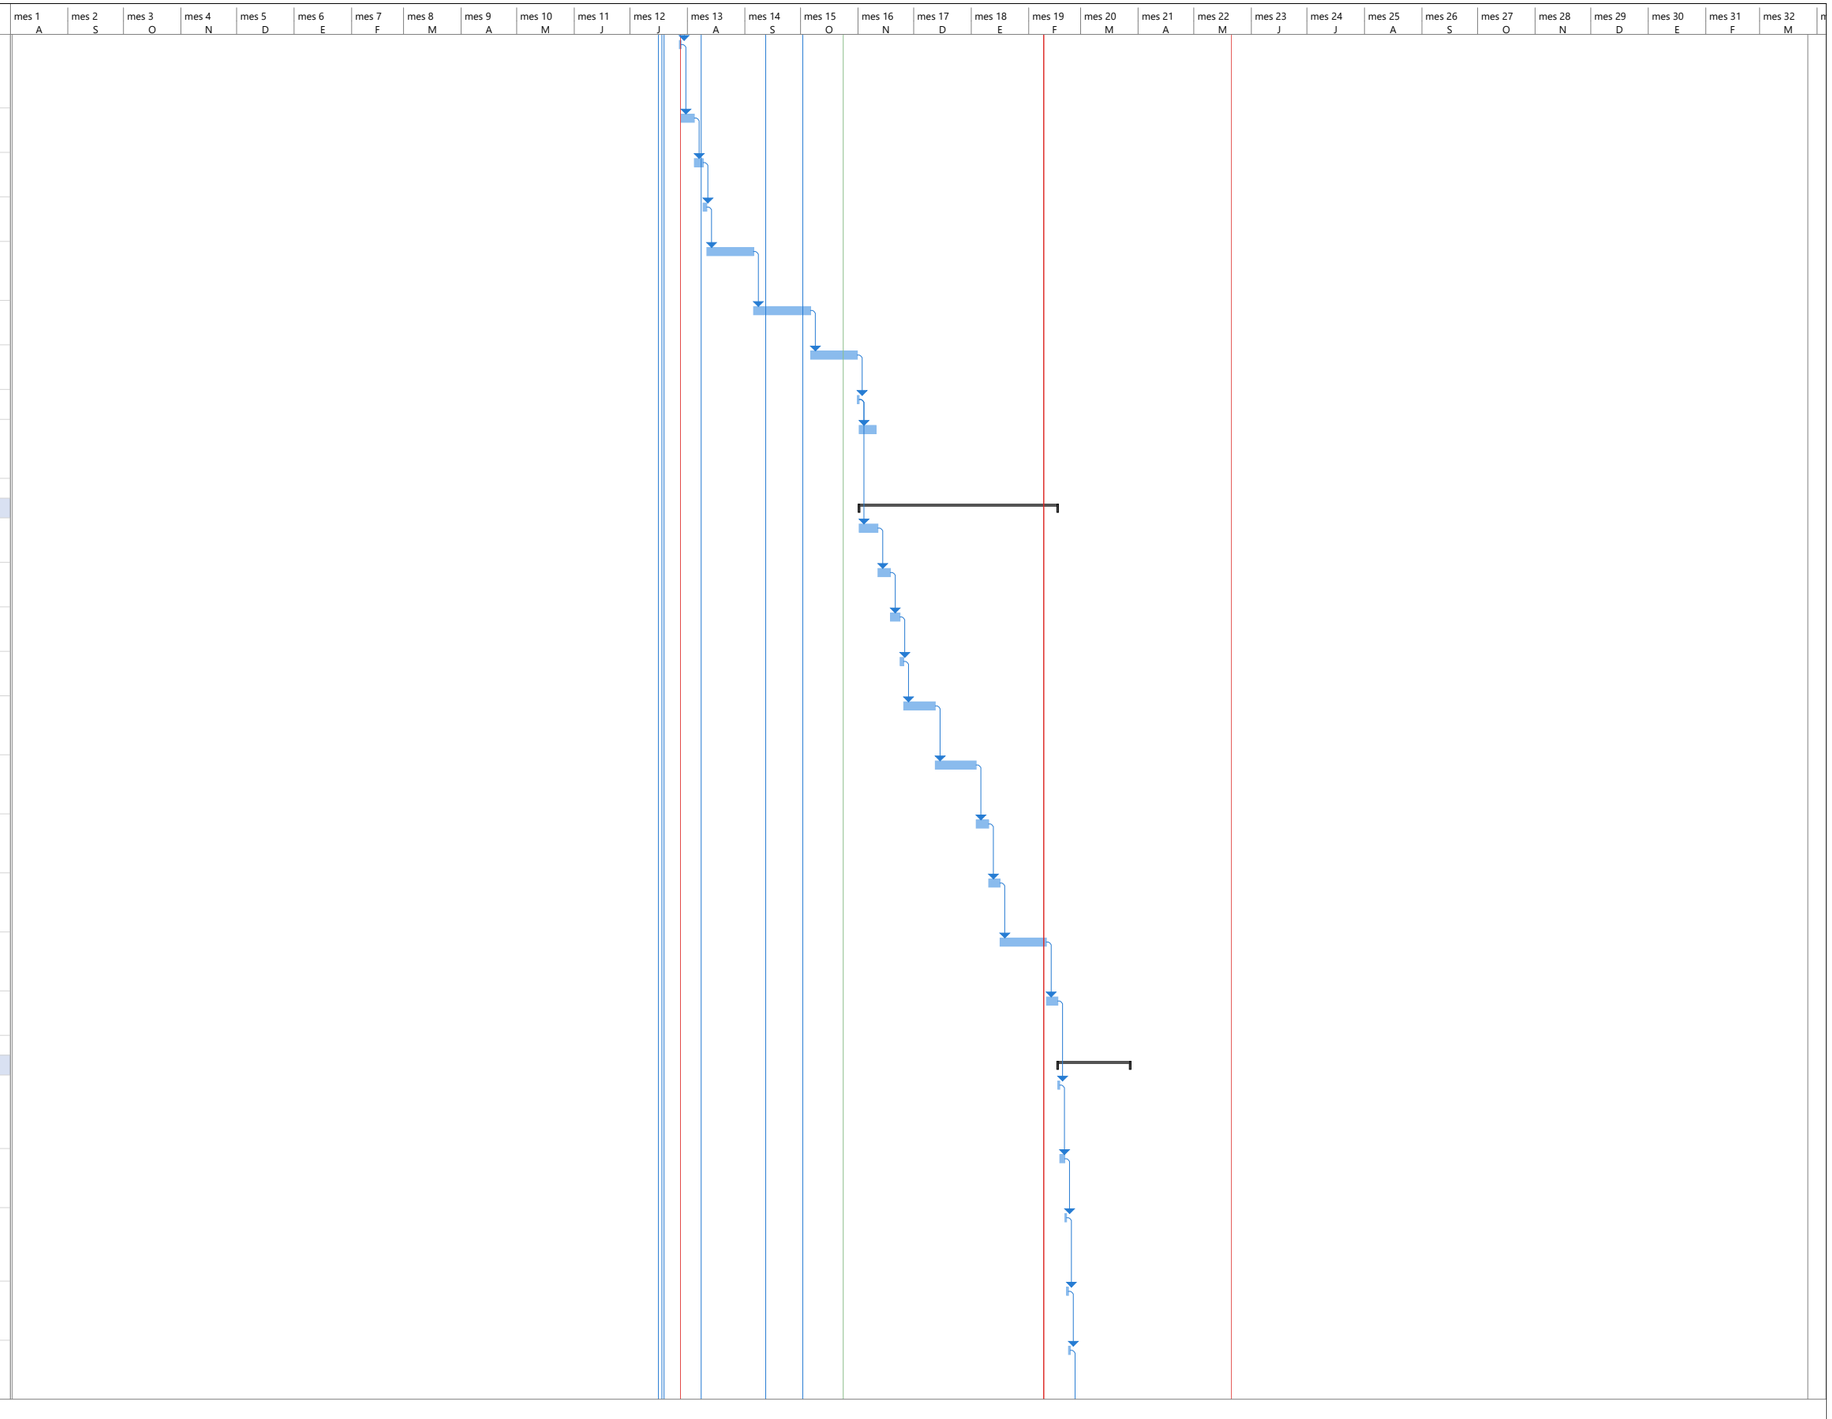

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
261	UN	3,00	1 día	$ 21.780.766,68	260	día 488,75	día 489,8125
262	UN	3,00	1 día	$ 1.044.337,08	261	día 489,8125	día 490,875
263	UN	3,00	1 día	$ 2.114.102,19	262	día 490,875	día 491,9375
264	UN	27,00	3 días	$ 1.188.503,55	263	día 491,9375	día 495,125
265	UN	70,00	10 días	$ 1.846.173,00	264	día 495,125	día 505,75
266	UN	13,00	3 días	$ 488.207,07	265	día 505,75	día 508,9375
267	UN	1,00	1 día	$ 54.518,90	266	día 508,9375	día 510
268	UN	5,00	1 día	$ 272.594,50	267	día 510	día 511,0625
269	UN	8,00	1 día	$ 1.032.746,48	268	día 511,0625	día 512,125
270	UN	20,00	3 días	$ 2.484.105,20	269	día 512,125	día 515,3125
271	UN	1,00	1 día	$ 124.205,26	270	día 515,3125	día 516,375
272			**0 días**	**$ 0,00**	**271**	**día 516,375**	**día 516,375**
273			**82 días**	**$ 103.390.852,20**			
274	ML	201,30	15 días	$ 39.223.127,86	271	día 516,375	día 532,3125
275	ML	113,30	7 días	$ 11.608.916,28	274	día 532,3125	día 539,75
276	ML	11,00	2 días	$ 2.955.481,21	275	día 539,75	día 541,875
277	ML	20,60	2 días	$ 6.494.718,56	276	día 541,875	día 544
278	ML	22,00	2 días	$ 4.222.760,30	277	día 544	día 546,125
279	ML	66,00	4 días	$ 7.966.095,06	278	día 546,125	día 550,375
280	ML	22,00	2 días	$ 2.579.521,56	279	día 550,375	día 552,5
281	ML	44,00	4 días	$ 3.830.168,32	280	día 552,5	día 556,75
282	ML	5,50	1 día	$ 446.364,16	281	día 556,75	día 557,8125
283	ML	5,50	1 día	$ 438.374,09	282	día 557,8125	día 558,875
284	ML	22,00	2 días	$ 1.710.538,06	283	día 558,875	día 561
285	ML	22,00	2 días	$ 1.787.242,82	284	día 561	día 563,125
286	ML	22,00	2 días	$ 1.616.306,56	285	día 563,125	día 565,25
287	ML	11,00	1 día	$ 758.098,77	286	día 565,25	día 566,3125
288	ML	11,00	1 día	$ 630.257,54	287	día 566,3125	día 567,375
289	ML	27,50	2 días	$ 1.655.544,55	288	día 567,375	día 569,5

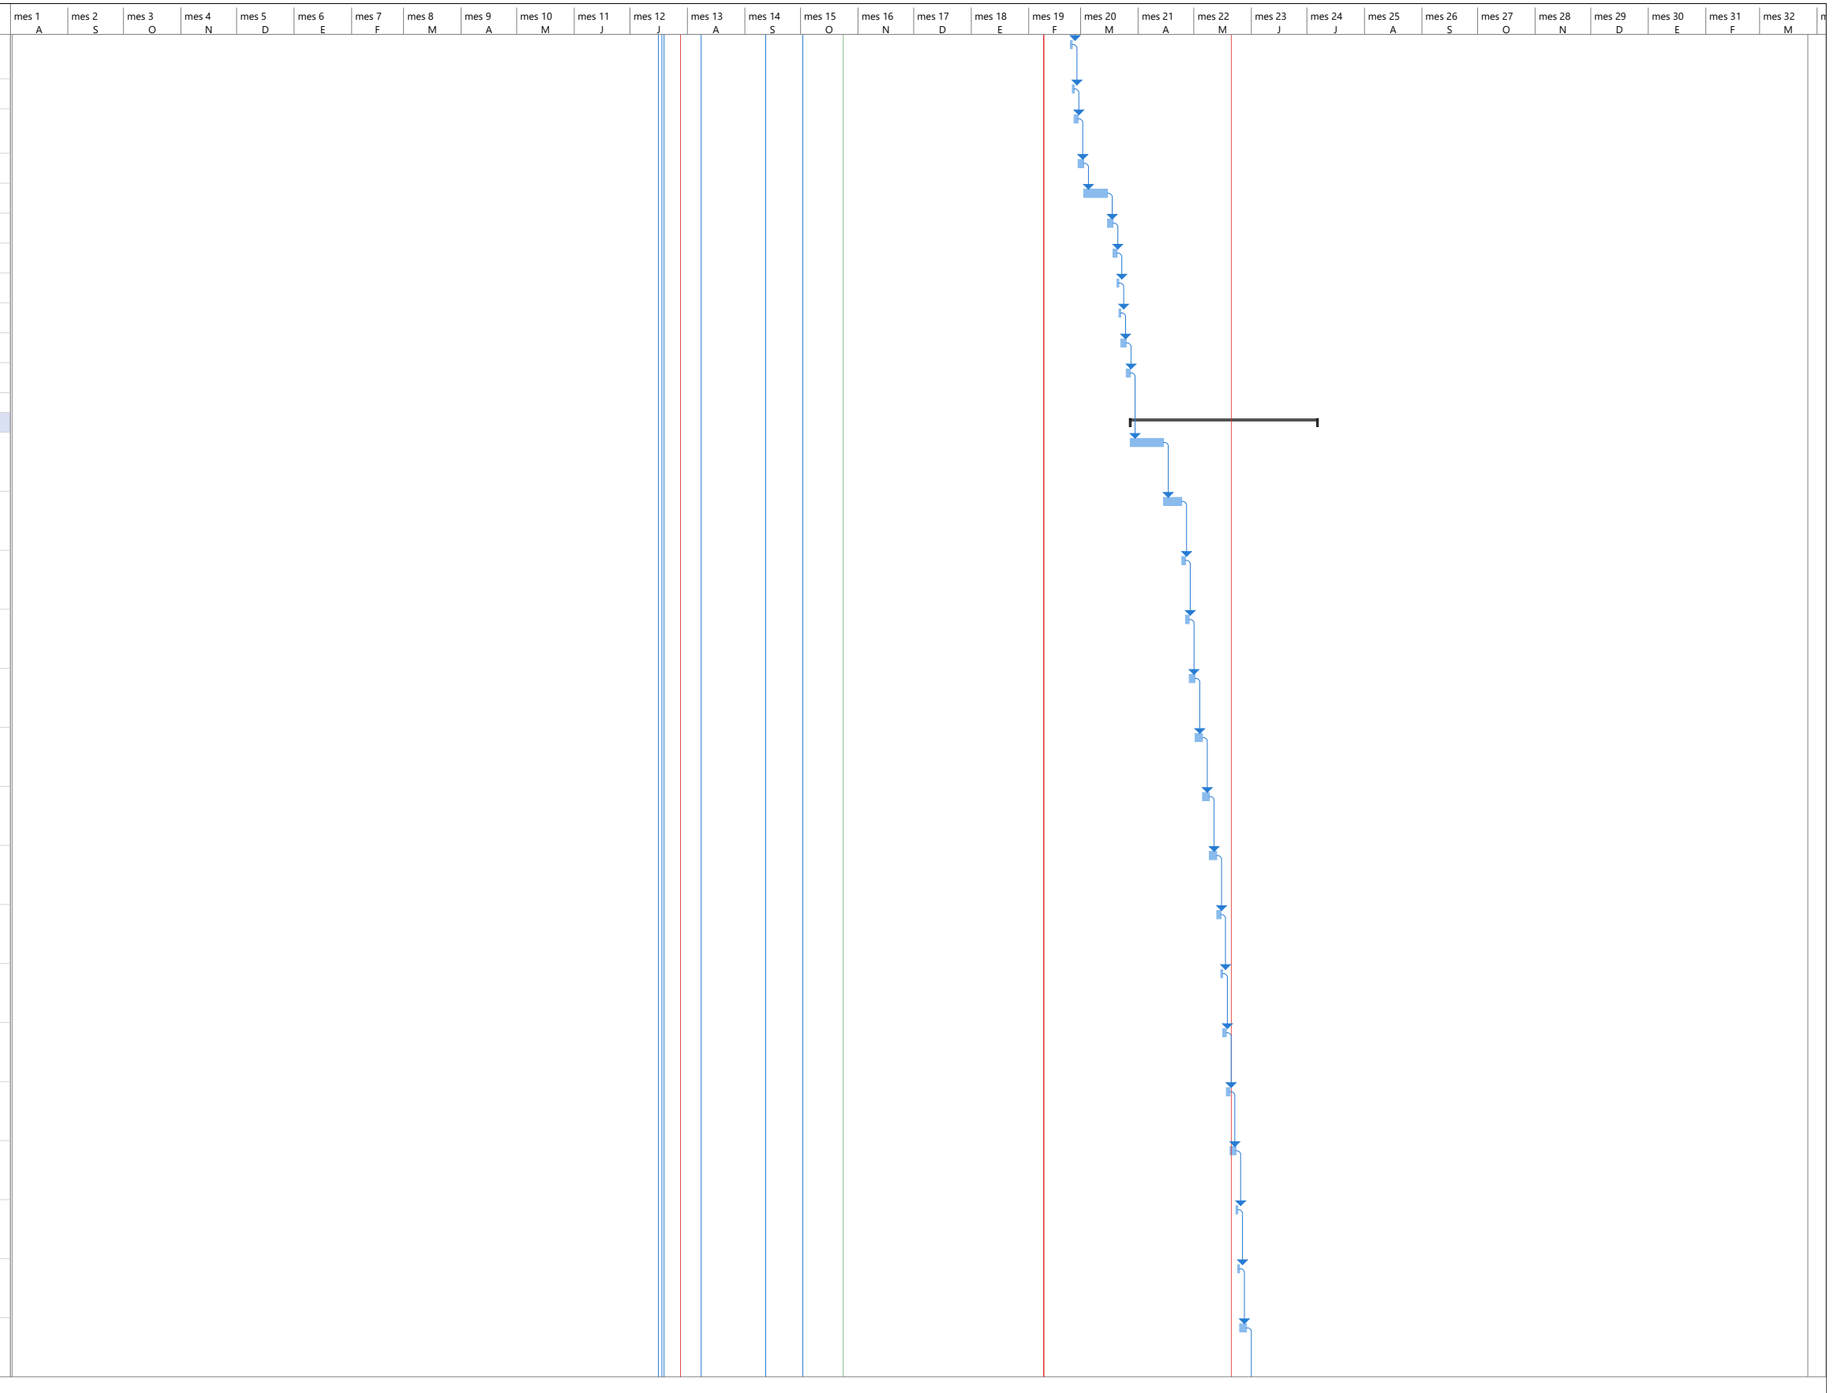

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
290	ML	33,00	3 días	$ 1.986.653,46	289	día 569,5	día 572,6875
291	ML	38,50	3 días	$ 2.317.762,37	290	día 572,6875	día 575,875
292	ML	44,00	4 días	$ 2.521.030,16	291	día 575,875	día 580,125
293	ML	27,50	2 días	$ 4.396.393,10	292	día 580,125	día 582,25
294	UN	11,00	20 días	$ 4.245.497,41	293	día 582,25	día 603,5
295			**0 días**	**$ 0,00**	**294**	**día 603,5**	**día 603,5**
296			**38 días**	**$ 92.086.749,78**			
297	UN	116,00	3 días	$ 11.398.430,28	38	día 306	día 309,1875
298	UN	27,00	1 día	$ 2.830.818,78	297	día 309,1875	día 310,25
299	UN	8,00	1 día	$ 1.086.661,12	298	día 310,25	día 311,3125
300	UN	59,00	2 días	$ 16.082.467,21	299	día 311,3125	día 313,4375
301	UN	34,00	2 días	$ 4.961.741,72	300	día 313,4375	día 315,5625
302	UN	40,00	2 días	$ 3.863.364,80	301	día 315,5625	día 317,6875
303	UN	4,00	1 día	$ 393.045,16	302	día 317,6875	día 318,75
304	UN	29,00	2 días	$ 2.459.722,87	303	día 318,75	día 320,875
305	UN	49,00	2 días	$ 4.509.065,26	304	día 320,875	día 323
306	UN	709,00	15 días	$ 25.223.625,06	305	día 323	día 338,9375
307	UN	474,00	7 días	$ 19.277.807,52	306	día 338,9375	día 346,375
308			**0 días**	**$ 0,00**	**307**	**día 346,375**	**día 346,375**
309			**85 días**	**$ 1.752.012.844,61**			
310	UN	217,00	15 días	$ 24.278.513,35	307	día 346,375	día 362,3125
311	UN	105,00	7 días	$ 6.121.470,60	310	día 362,3125	día 369,75
312	UN	178,00	12 días	$ 383.138.276,94	311	día 369,75	día 382,5
313	UN	2,00	1 día	$ 6.317.484,66	312	día 382,5	día 383,5625
314	UN	214,00	15 días	$ 27.010.545,00	313	día 383,5625	día 399,5
315	UN	9,00	1 día	$ 32.976.733,50	314	día 399,5	día 400,5625
316	UN	68,00	6 días	$ 2.425.944,88	315	día 400,5625	día 406,9375
317	UN	338,00	18 días	$ 6.459.345,62	316	día 406,9375	día 426,0625
318	UN	15,00	2 días	$ 377.217.762,90	317	día 426,0625	día 428,1875
319	UN	88,00	6 días	$ 881.489.313,76	318	día 428,1875	día 434,5625
320	UN	12,00	2 días	$ 4.577.453,40	319	día 434,5625	día 436,6875
321			**0 días**	**$ 0,00**	**320**	**día 436,6875**	**día 436,6875**
322			**1 día**	**$ 330.325,93**			
323	UN	1,00	1 día	$ 330.325,93	320	día 436,6875	día 437,75
324			**0 días**	**$ 0,00**	**323**	**día 437,75**	**día 437,75**
325			**14 días**	**$ 2.330.566.154,38**			
326	UN	2,00	2 días	$ 31.869.093,36	323	día 437,75	día 439,875
327	UN	2,00	2 días	$ 36.523.135,04	326	día 439,875	día 442
328	UN	1,00	1 día	$ 27.468.609,21	327	día 442	día 443,0625

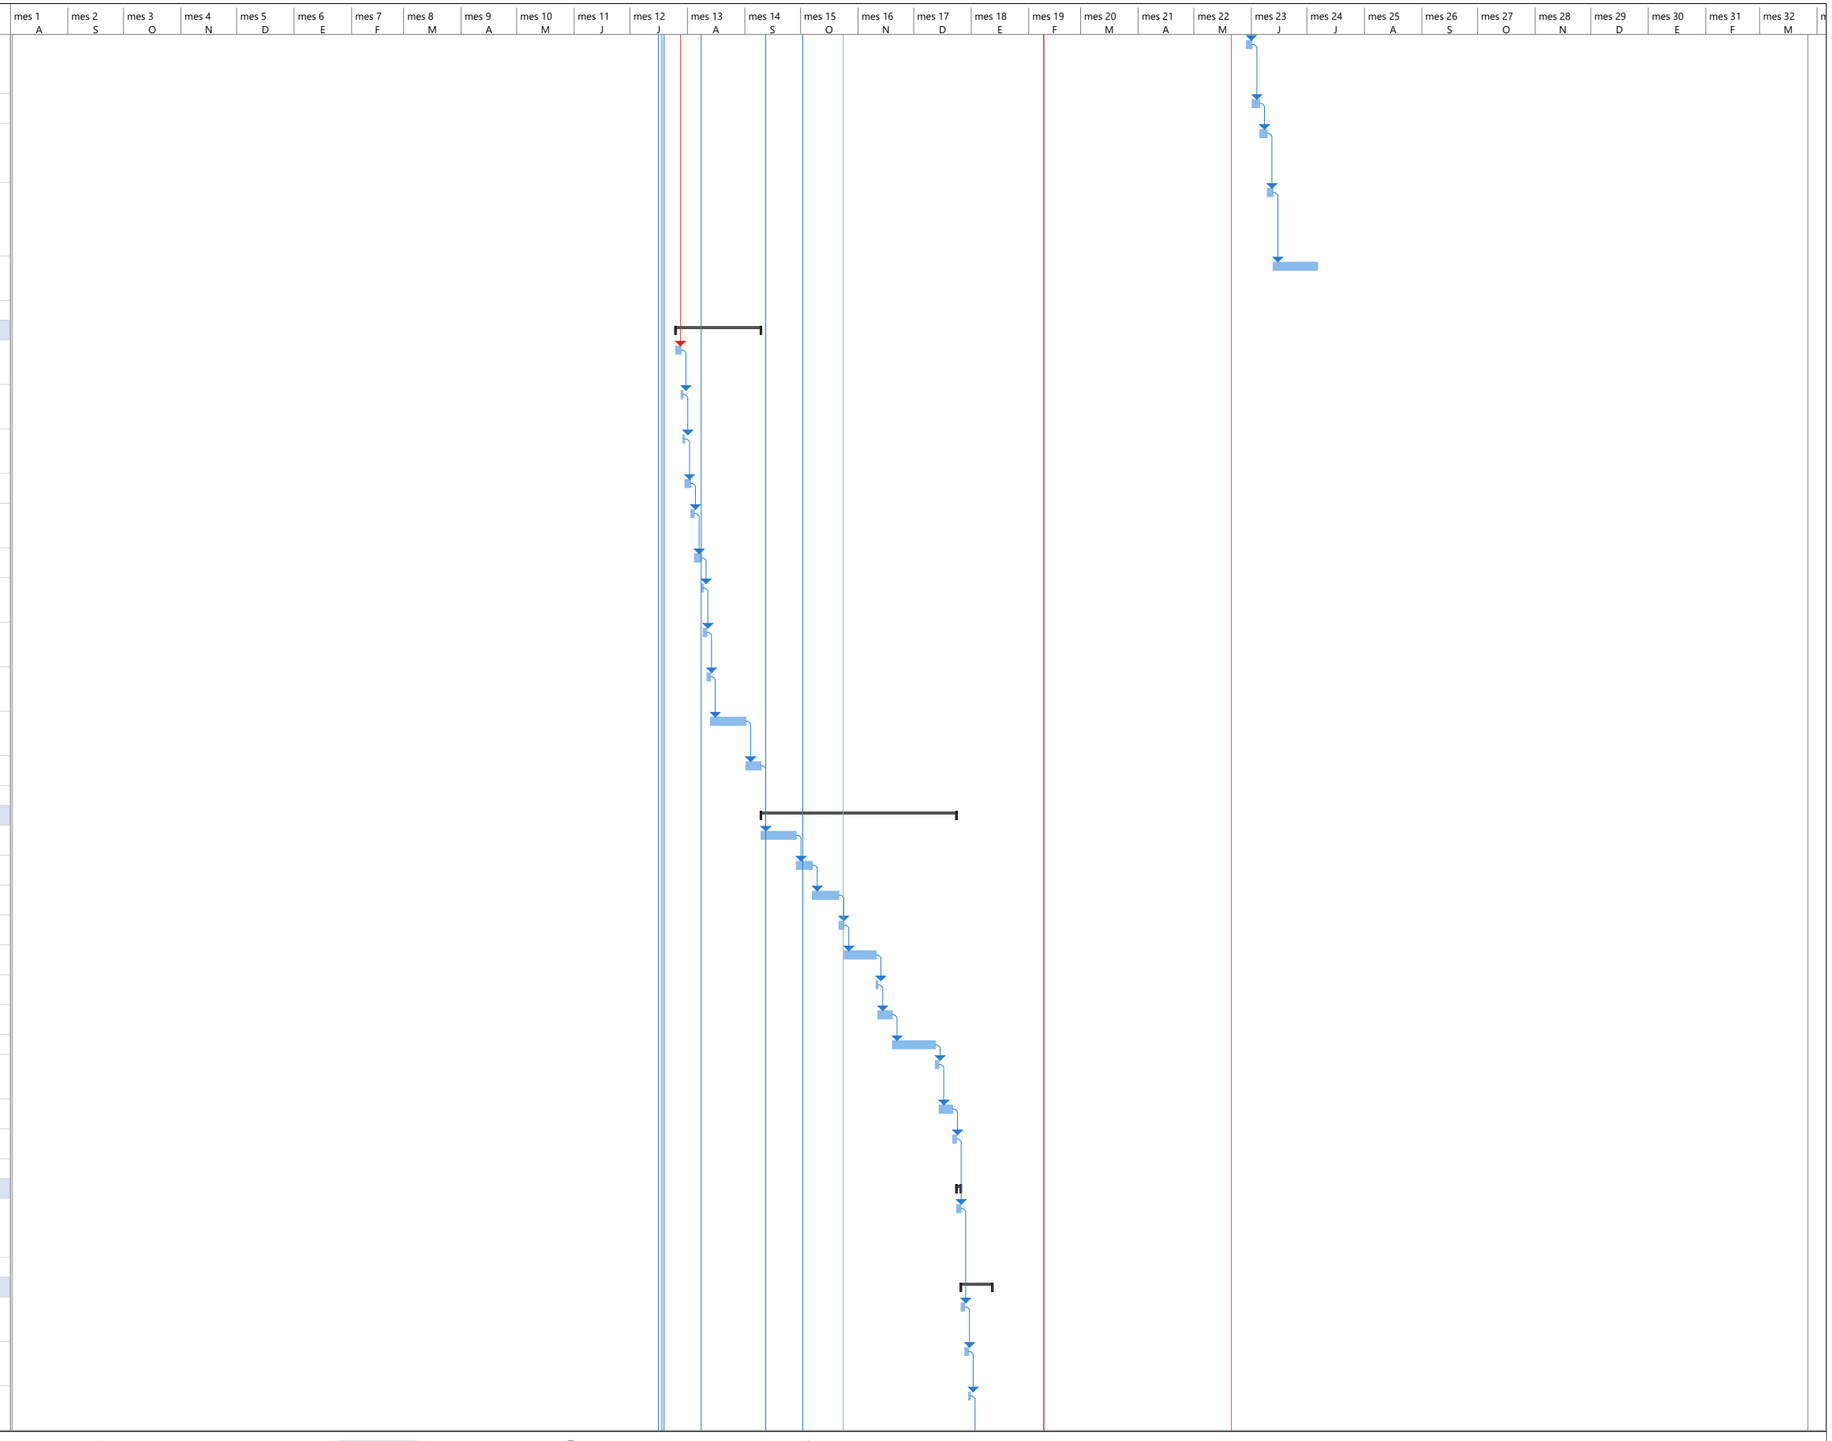

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
329	UN	1,00	1 día	$ 1.236.789.389,35	328	día 443,0625	día 444,125
330	UN	2,00	2 días	$ 764.783.919,86	329	día 444,125	día 446,25
331	UN	1,00	1 día	$ 133.164.642,48	330	día 446,25	día 447,3125
332	UN	1,00	1 día	$ 80.806.214,63	331	día 447,3125	día 448,375
333	UN	1,00	1 día	$ 6.458.833,74	332	día 448,375	día 449,4375
334	UN	1,00	1 día	$ 4.810.362,31	333	día 449,4375	día 450,5
335	UN	2,00	2 días	$ 7.891.954,40	334	día 450,5	día 452,625
336			**0 días**	**$ 0,00**	**335**	**día 452,625**	**día 452,625**
337			**156 días**	**$ 72.693.382,54**			
338	UN	6,00	3 días	$ 7.467.584,94	335	día 452,625	día 455,8125
339	UN	44,60	14 días	$ 7.730.951,51	338	día 455,8125	día 470,6875
340	ML	226,60	8 días	$ 17.980.204,68	339	día 470,6875	día 479,1875
341	ML	218,36	8 días	$ 9.629.189,06	340	día 479,1875	día 487,6875
342	UN	36,00	16 días	$ 1.424.887,92	341	día 487,6875	día 504,6875
343	UN	29,00	12 días	$ 1.450.512,43	342	día 504,6875	día 517,4375
344	UN	6,00	1 día	$ 586.040,34	343	día 517,4375	día 518,5
345	UN	29,00	12 días	$ 1.377.303,38	344	día 518,5	día 531,25
346	UN	7,00	1 día	$ 1.906.901,15	345	día 531,25	día 532,3125
347	UN	55,00	18 días	$ 693.315,70	346	día 532,3125	día 551,4375
348	ML	473,00	15 días	$ 4.050.403,06	347	día 551,4375	día 567,375
349	UN	430,00	20 días	$ 6.846.249,30	348	día 567,375	día 588,625
350	UN	8,00	1 día	$ 646.097,52	349	día 588,625	día 589,6875
351	ML	201,60	8 días	$ 4.459.631,90	350	día 589,6875	día 598,1875
352	UN	3,00	1 día	$ 1.280.654,85	351	día 598,1875	día 599,25
353	UN	60,00	18 días	$ 5.163.454,80	352	día 599,25	día 618,375
354			**0 días**	**$ 0,00**	**353**	**día 618,375**	**día 618,375**
355			**331 días**	**$ 57.930.501,00**			
356	UN	1,00	30 días	$ 6.654.179,17	225	día 298,5625	día 330,4375
357	UN	1,00	30 días	$ 6.654.179,17	356CC	día 298,5625	día 330,4375
358	UN	1,00	30 días	$ 7.828.446,09	353	día 618,375	día 650,25
359	UN	1,00	30 días	$ 7.828.446,09	358CC	día 618,375	día 650,25
360	UN	1,00	30 días	$ 6.262.756,86	359CC	día 618,375	día 650,25
361	UN	1,00	30 días	$ 6.262.756,86	360CC	día 618,375	día 650,25
362	UN	1,00	30 días	$ 1.957.111,52	361CC	día 618,375	día 650,25
363	UN	1,00	30 días	$ 1.957.111,52	362CC	día 618,375	día 650,25
364	UN	1,00	30 días	$ 6.262.756,86	363CC	día 618,375	día 650,25
365	UN	1,00	30 días	$ 6.262.756,86	364CC	día 618,375	día 650,25
366			**0 días**	**$ 0,00**	**365**	**día 650,25**	**día 650,25**
367			**274 días**	**$ 2.700.448.114,55**			
368			**83 días**	**$ 324.167.159,28**			

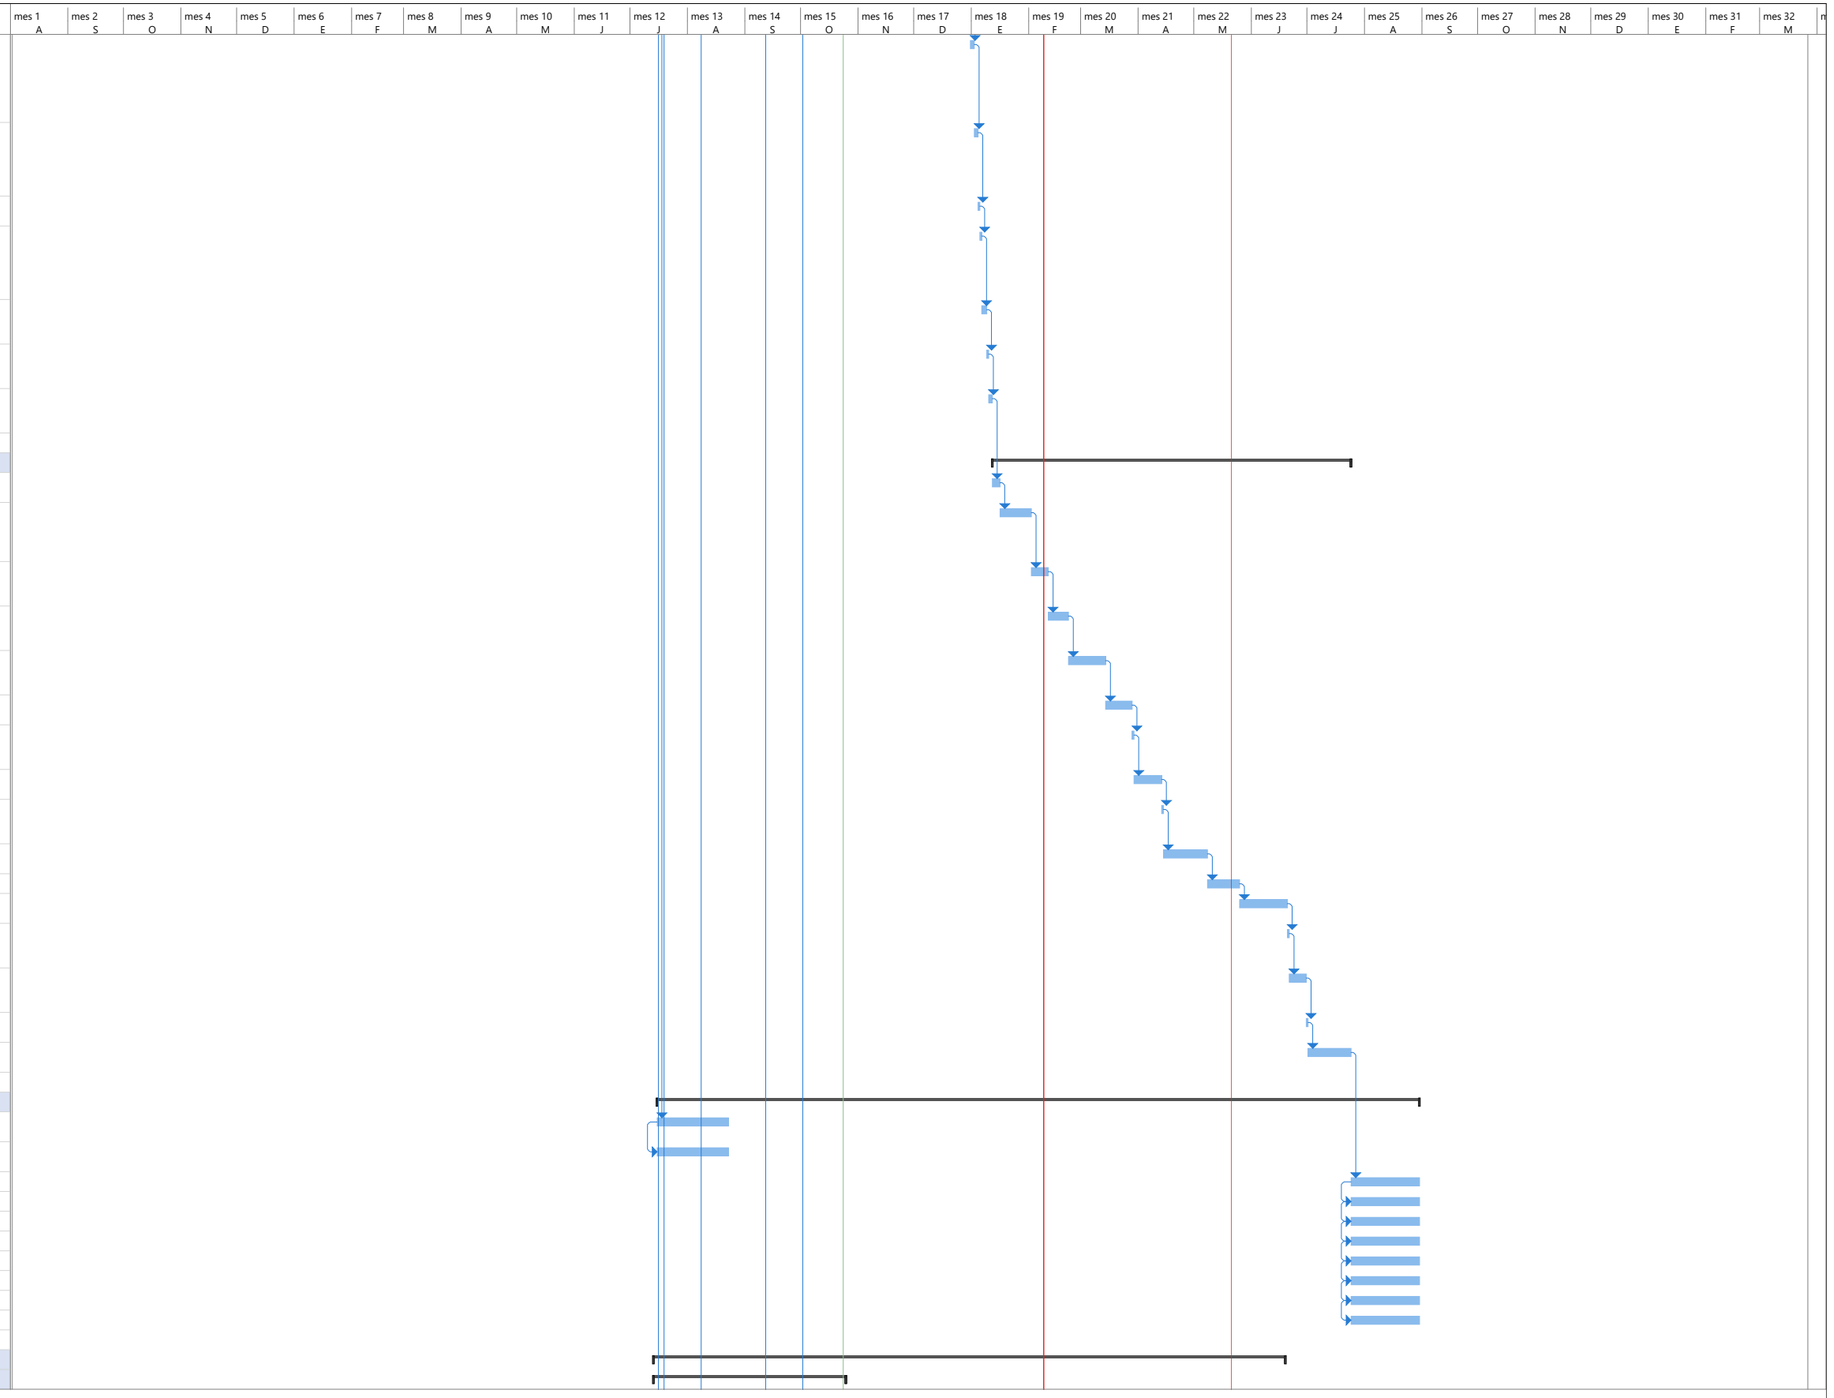

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
369	ML	525,30	15 días	$ 20.434.427,40	26	día 296,4375	día 312,375
370	ML	2.101,20	28 días	$ 295.273.378,28	369	día 312,375	día 342,125
371	UN	20,00	40 días	$ 8.459.353,60	370	día 342,125	día 384,625
372			**0 días**	**$ 0,00**	**371**	**día 384,625**	**día 384,625**
373			**78 días**	**$ 680.171.999,00**			
374	ML	706,39	18 días	$ 35.687.832,94	371	día 384,625	día 403,75
375	ML	87,55	10 días	$ 4.943.694,61	374	día 403,75	día 414,375
376	UN	6,00	6 días	$ 84.043.779,54	375	día 414,375	día 420,75
377	UN	3,00	3 días	$ 14.493.857,94	376	día 420,75	día 423,9375
378	UN	10,00	10 días	$ 54.628.889,90	377	día 423,9375	día 434,5625
379	UN	17,00	10 días	$ 86.185.664,83	378	día 434,5625	día 445,1875
380	UN	1,00	1 día	$ 182.797.096,79	379	día 445,1875	día 446,25
381	UN	1,00	1 día	$ 18.328.418,19	380	día 446,25	día 447,3125
382	UN	1,00	1 día	$ 7.589.154,20	381	día 447,3125	día 448,375
383	UN	2,00	2 días	$ 93.443.867,52	382	día 448,375	día 450,5
384	ML	180,55	8 días	$ 3.117.414,22	383	día 450,5	día 459
385	UN	1,00	1 día	$ 385.836,61	384	día 459	día 460,0625
386	UN	1,00	1 día	$ 25.919.101,20	385	día 460,0625	día 461,125
387	UN	3,00	3 días	$ 54.959.770,41	386	día 461,125	día 464,3125
388	UN	3,00	3 días	$ 13.647.620,10	387	día 464,3125	día 467,5
389			**0 días**	**$ 0,00**	**388**	**día 467,5**	**día 467,5**
390			**30 días**	**$ 598.816.752,02**			
391	UN	1,00	1 día	$ 39.738.859,95	388	día 467,5	día 468,5625

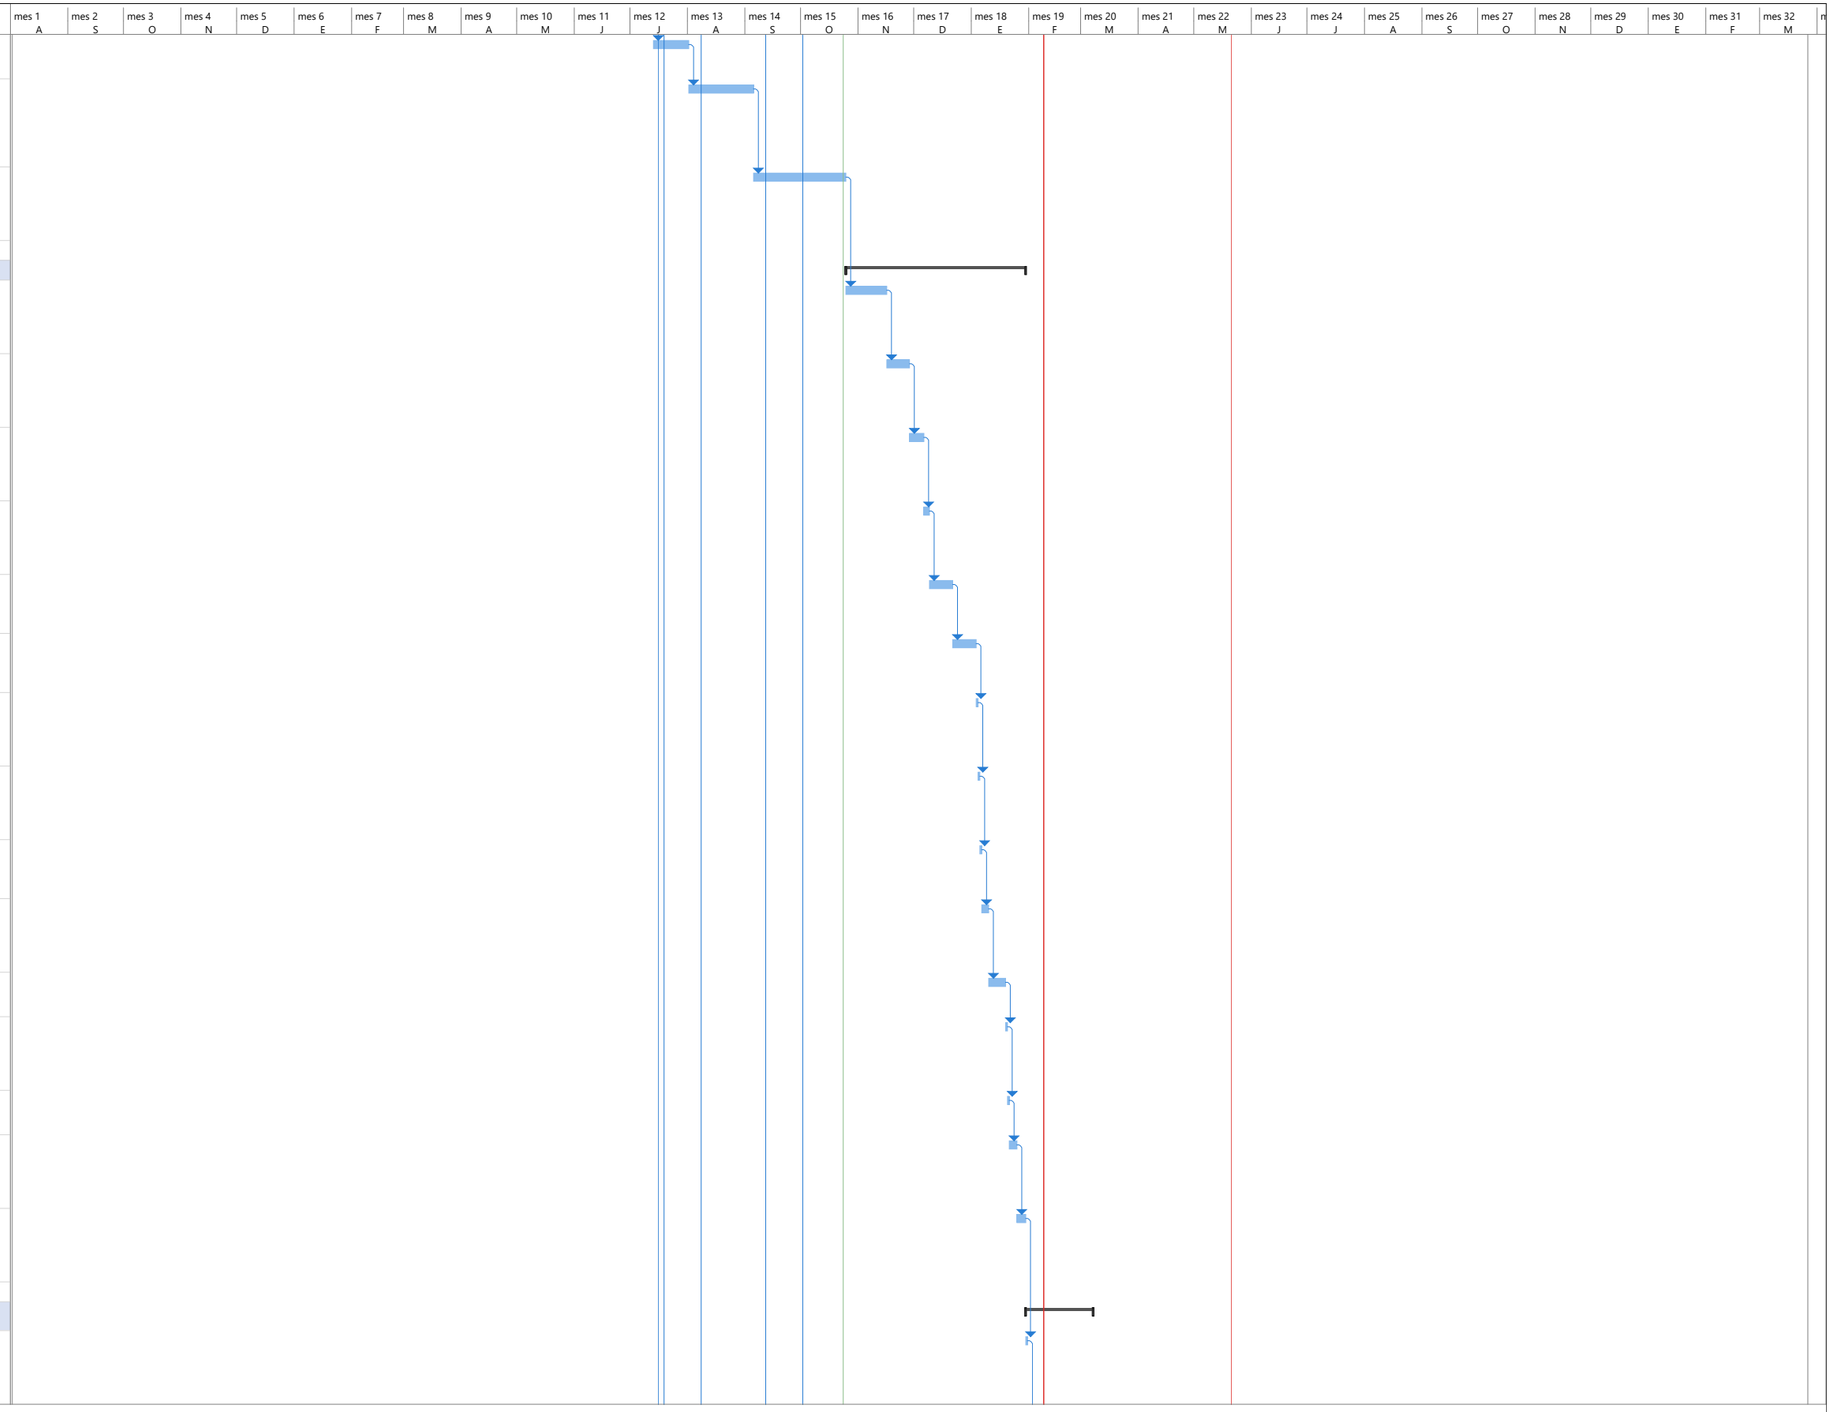

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
392	UN	1,00	1 día	$ 23.307.250,62	391	día 468,5625	día 469,625
393	UN	5,00	2 días	$ 64.771.788,45	392	día 469,625	día 471,75
394	UN	6,00	2 días	$ 129.732.865,02	393	día 471,75	día 473,875
395	UN	1,00	1 día	$ 705.514,56	394	día 473,875	día 474,9375
396	UN	6,00	2 días	$ 24.458.011,62	395	día 474,9375	día 477,0625
397	UN	1,00	1 día	$ 29.870.783,50	396	día 477,0625	día 478,125
398	UN	11,00	5 días	$ 33.824.672,20	397	día 478,125	día 483,4375
399	UN	30,00	15 días	$ 252.407.006,10	398	día 483,4375	día 499,375
400			**0 días**	**$ 0,00**	**399**	**día 499,375**	**día 499,375**
401			**50 días**	**$ 821.695.672,43**			
402	UN	1,00	1 día	$ 10.063.891,77	399	día 499,375	día 500,4375
403	UN	72,00	10 días	$ 573.084.179,28	402	día 500,4375	día 511,0625
404	UN	5,00	3 días	$ 39.797.512,45	403	día 511,0625	día 514,25
405	UN	5,00	3 días	$ 12.666.180,05	404	día 514,25	día 517,4375
406	UN	5,00	3 días	$ 43.115.202,55	405	día 517,4375	día 520,625
407	UN	14,00	7 días	$ 32.318.263,18	406	día 520,625	día 528,0625
408	ML	1.466,85	15 días	$ 78.763.918,93	407	día 528,0625	día 544
409	ML	682,89	8 días	$ 31.886.524,22	408	día 544	día 552,5
410			**0 días**	**$ 0,00**	**409**	**día 552,5**	**día 552,5**
411			**33 días**	**$ 275.596.531,82**			
412	UN	4,00	1 día	$ 86.812.530,24	409	día 552,5	día 553,5625
413	UN	4,00	1 día	$ 102.769.980,56	412	día 553,5625	día 554,625
414	UN	5,00	2 días	$ 3.253.923,30	413	día 554,625	día 556,75
415	UN	25,00	6 días	$ 7.315.309,75	414	día 556,75	día 563,125

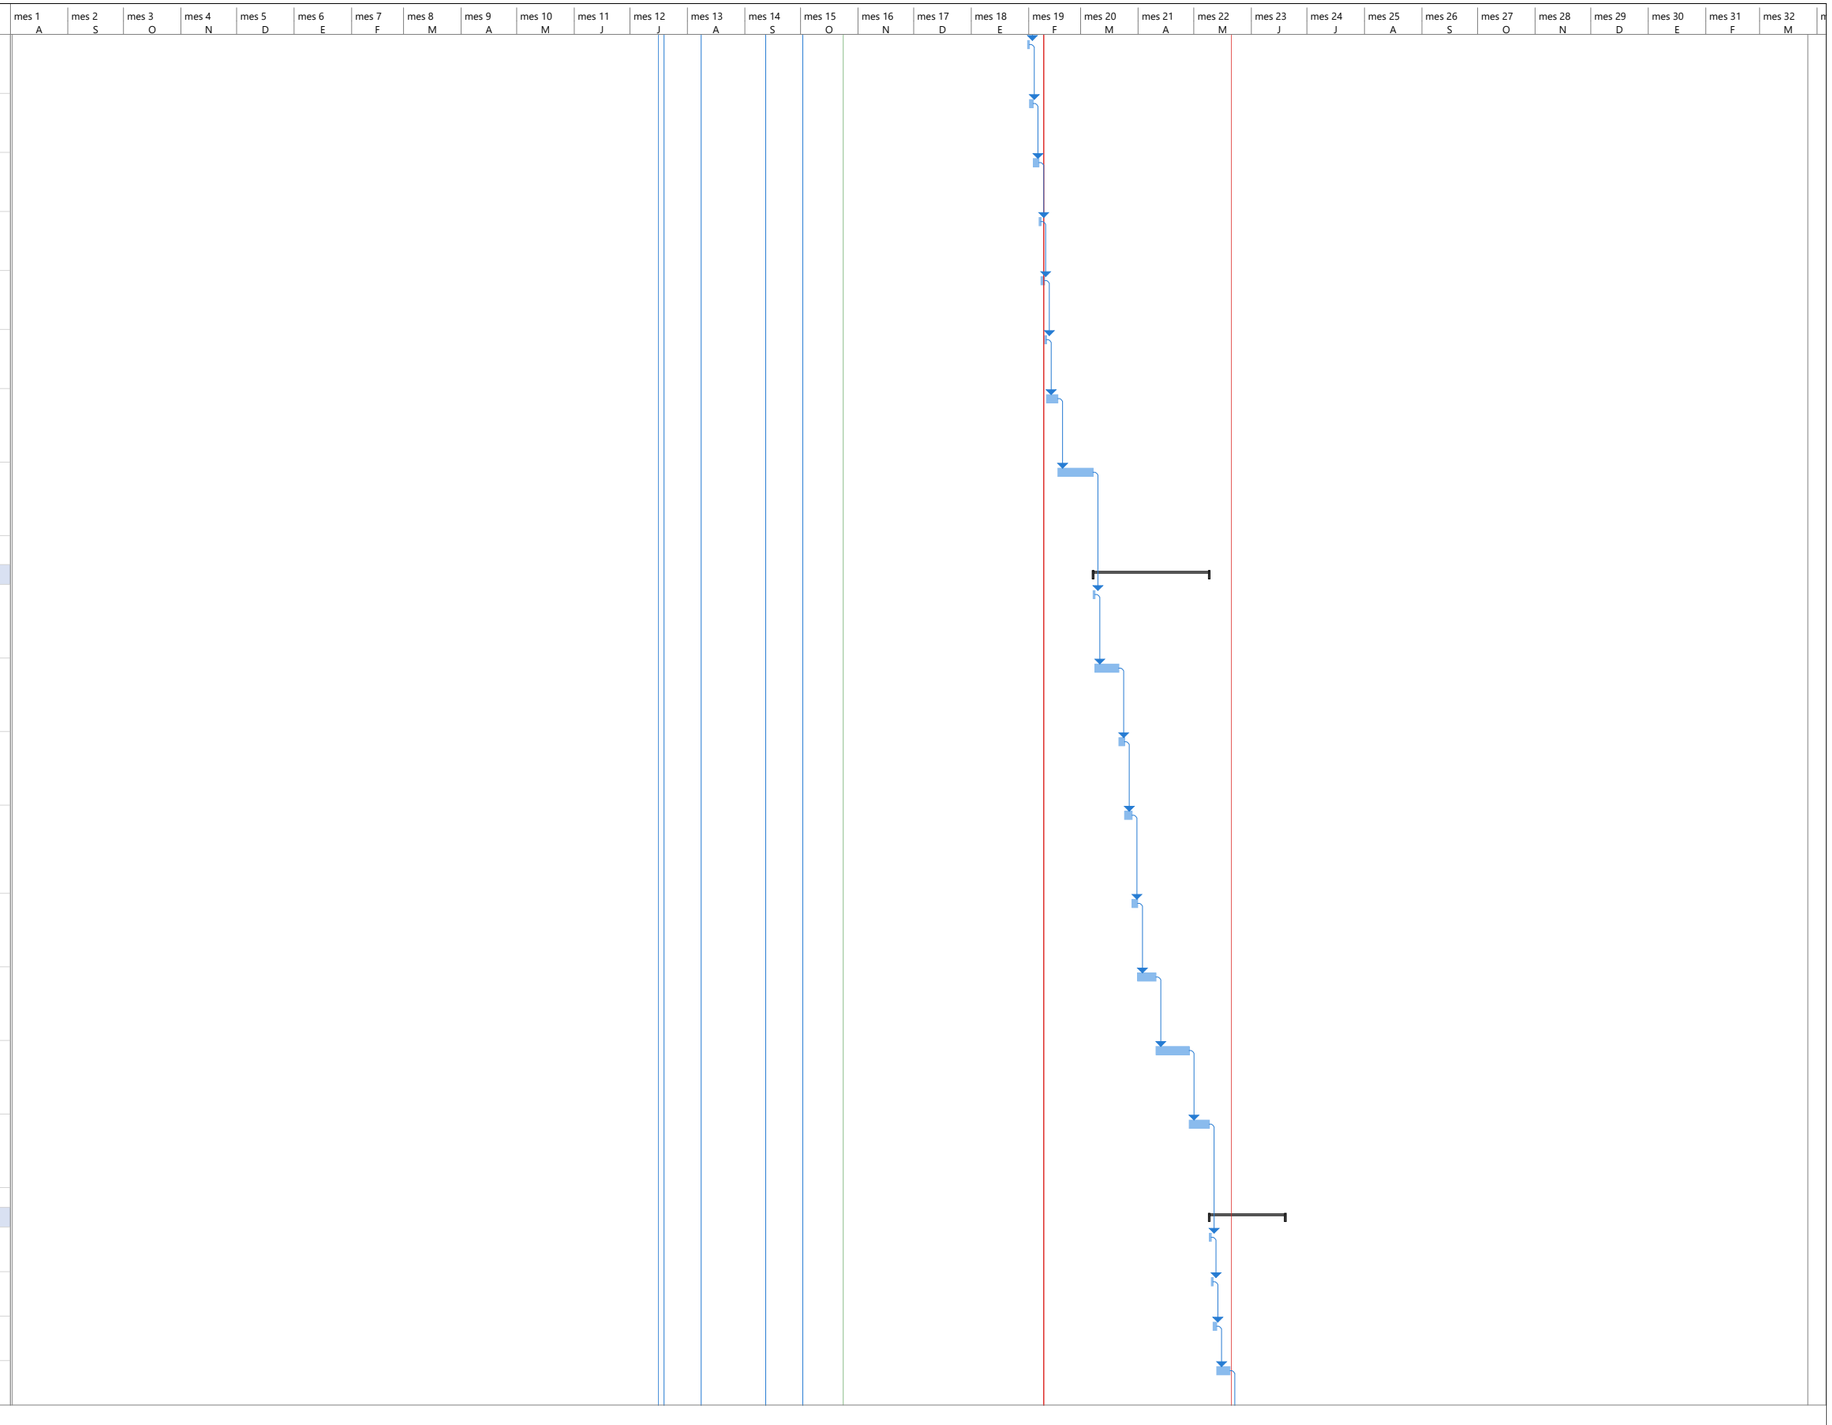

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
416	UN	3,00	1 día	$ 36.363.559,80	415	día 563,125	día 564,1875
417	UN	4,00	1 día	$ 1.052.310,88	416	día 564,1875	día 565,25
418	UN	1,00	1 día	$ 1.147.622,04	417	día 565,25	día 566,3125
419	ML	505,10	10 días	$ 13.932.946,10	418	día 566,3125	día 576,9375
420	ML	454,23	10 días	$ 22.948.349,15	419	día 576,9375	día 587,5625
421			**0 días**	**$ 0,00**	**420**	**día 587,5625**	**día 587,5625**
422			**36 días**	**$ 566.148.518,13**			
423			**3 días**	**$ 5.407.968,75**			
424	UN	2,00	2 días	$ 4.880.577,18	26FC+20 días	día 317,6875	día 319,8125
425	UN	1,00	1 día	$ 527.391,57	424	día 319,8125	día 320,875
426			**0 días**	**$ 0,00**	**425**	**día 320,875**	**día 320,875**
427			**2 días**	**$ 306.314,58**			
428	UN	2,00	2 días	$ 306.314,58	425	día 320,875	día 323
429			**0 días**	**$ 0,00**	**428**	**día 323**	**día 323**
430			**13 días**	**$ 336.771.268,36**			
431	UN	8,00	8 días	$ 19.522.308,72	428	día 323	día 331,5
432	UN	1,00	1 día	$ 179.905.949,04	431	día 331,5	día 332,5625
433	UN	1,00	1 día	$ 117.586.310,16	432	día 332,5625	día 333,625
434	UN	1,00	1 día	$ 10.965.078,98	433	día 333,625	día 334,6875
435	UN	1,00	1 día	$ 8.148.230,90	434	día 334,6875	día 335,75
436	UN	1,00	1 día	$ 643.390,56	435	día 335,75	día 336,8125
437			**0 días**	**$ 0,00**	**436**	**día 336,8125**	**día 336,8125**
438			**18 días**	**$ 223.662.966,44**			
439			**3 días**	**$ 2.779.364,49**			
440	UN	2,00	2 días	$ 1.938.959,88	436	día 336,8125	día 338,9375
441	UN	1,00	1 día	$ 840.404,61	440	día 338,9375	día 340
442			**0 días**	**$ 0,00**	**441**	**día 340**	**día 340**
443			**2 días**	**$ 1.432.824,82**			

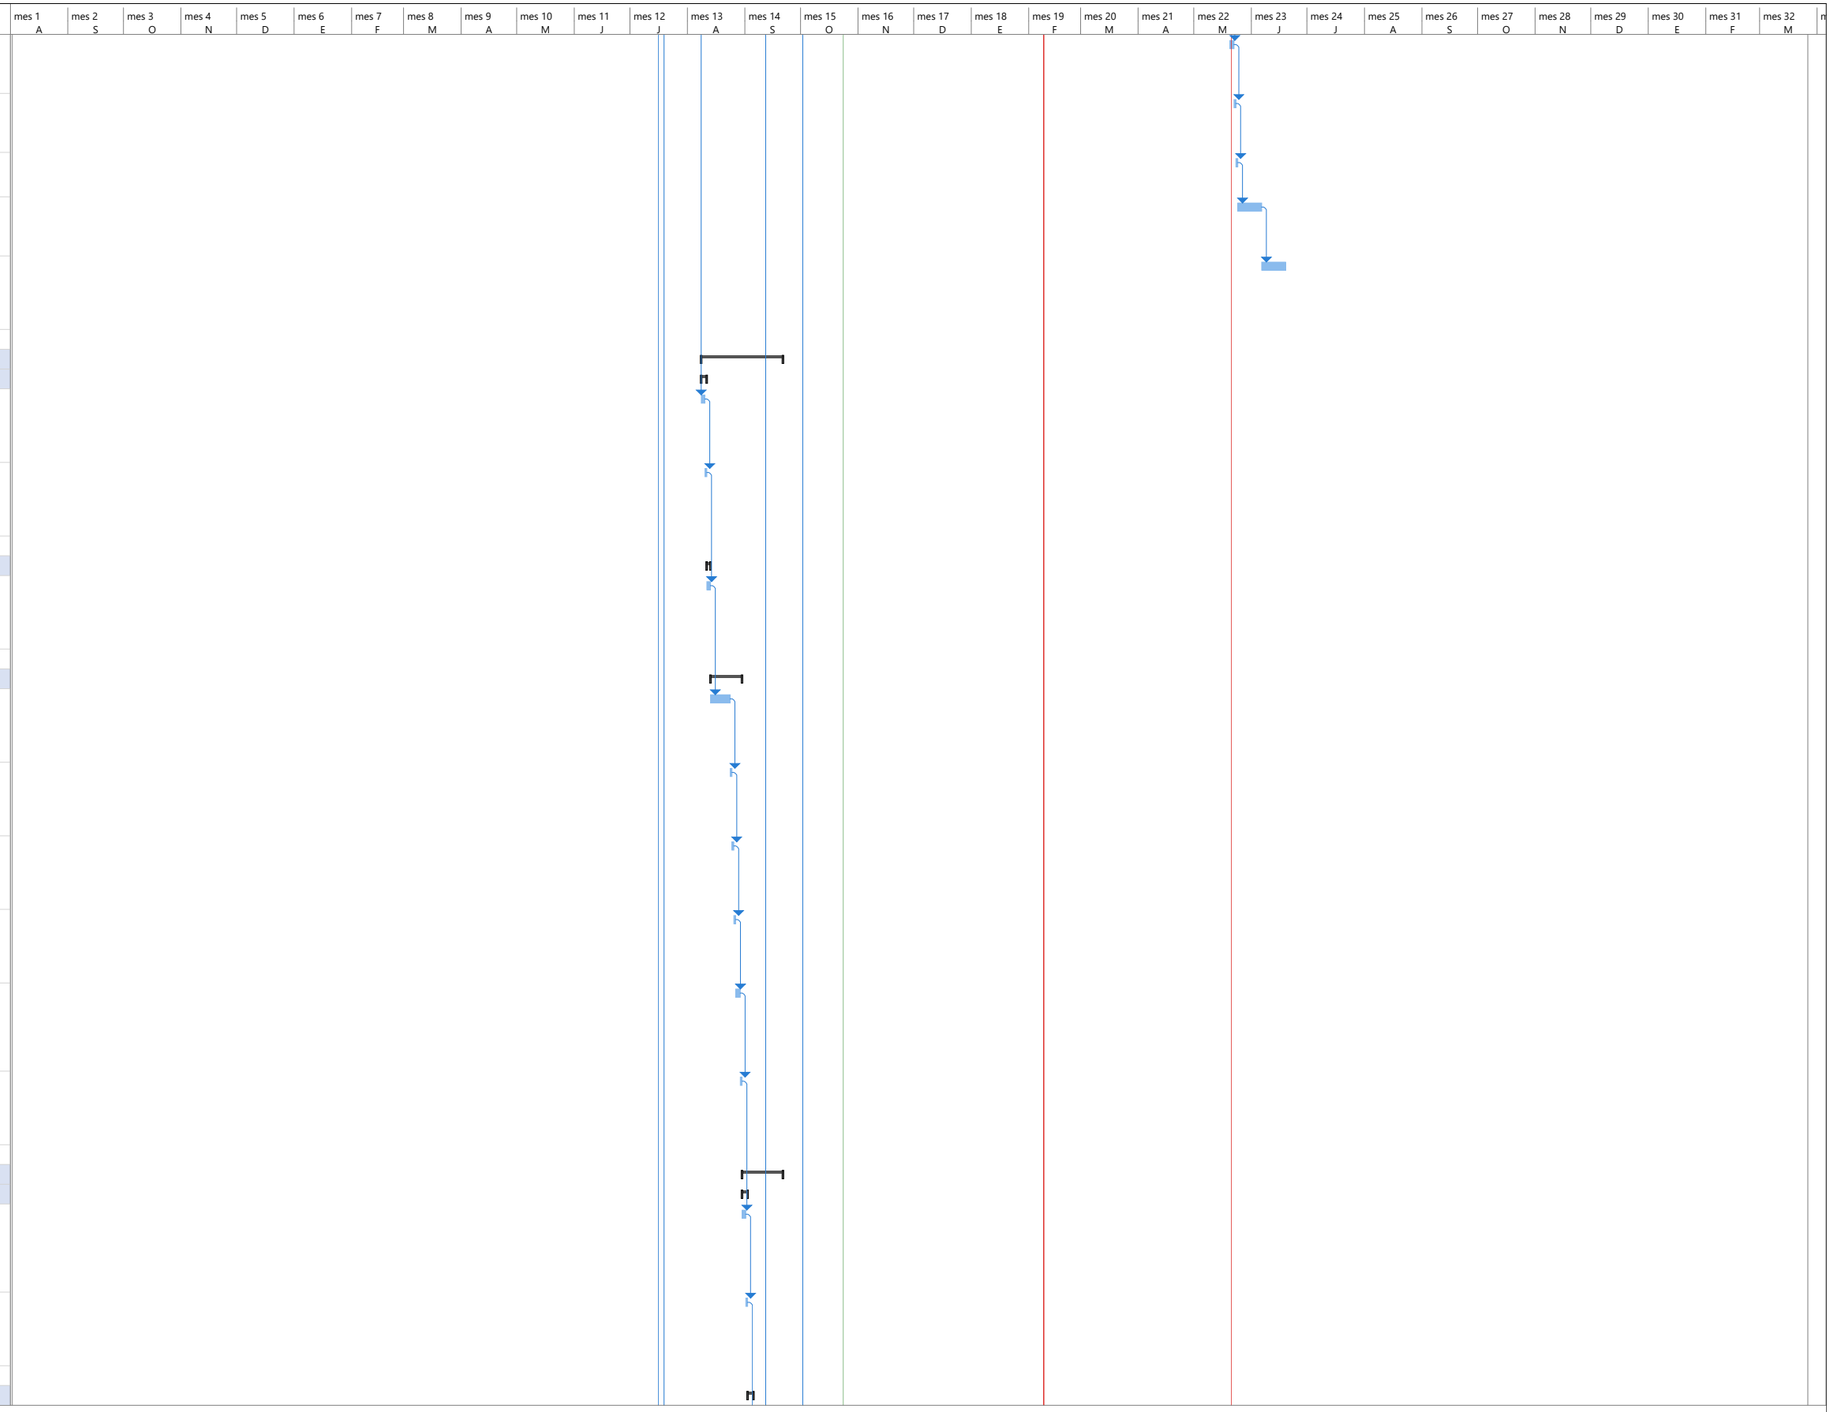

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
444	UN	2,00	2 días	$ 1.432.824,82	441	día 340	día 342,125
445			**0 días**	**$ 0,00**	**444**	**día 342,125**	**día 342,125**
446			**13 días**	**$ 219.450.777,13**			
447	UN	8,00	8 días	$ 7.755.839,52	444	día 342,125	día 350,625
448	UN	1,00	1 día	$ 113.662.767,23	447	día 350,625	día 351,6875
449	UN	1,00	1 día	$ 77.337.027,21	448	día 351,6875	día 352,75
450	UN	1,00	1 día	$ 10.965.078,98	449	día 352,75	día 353,8125
451	UN	1,00	1 día	$ 8.148.230,90	450	día 353,8125	día 354,875
452	UN	1,00	1 día	$ 1.581.833,29	451	día 354,875	día 355,9375
453			**0 días**	**$ 0,00**	**452**	**día 355,9375**	**día 355,9375**
454			**91 días**	**$ 521.499.177,53**			
455			**89 días**	**$ 475.457.717,69**			
456	ML	50,40	5 días	$ 533.229,48	26	día 296,4375	día 301,75
457	ML	129,44	8 días	$ 1.134.334,50	456	día 301,75	día 310,25
458	UN	4,00	1 día	$ 7.296.852,76	457	día 310,25	día 311,3125
459	UN	2,00	1 día	$ 2.214.675,12	458	día 311,3125	día 312,375
460	UN	3,00	1 día	$ 1.705.197,99	459	día 312,375	día 313,4375
461	UN	12,03	3 días	$ 482.287,99	460	día 313,4375	día 316,625
462	UN	20,15	4 días	$ 355.752,08	461	día 316,625	día 320,875
463	ML	976,70	18 días	$ 13.378.748,70	462	día 320,875	día 340
464	UN	26,21	4 días	$ 776.111,91	463	día 340	día 344,25
465	UN	12,03	3 días	$ 538.021,66	464	día 344,25	día 347,4375
466	UN	12,00	3 días	$ 1.252.728,00	465	día 347,4375	día 350,625
467	UN	12,00	3 días	$ 1.252.728,00	466	día 350,625	día 353,8125
468	UN	22,00	4 días	$ 1.799.538,40	467	día 353,8125	día 358,0625

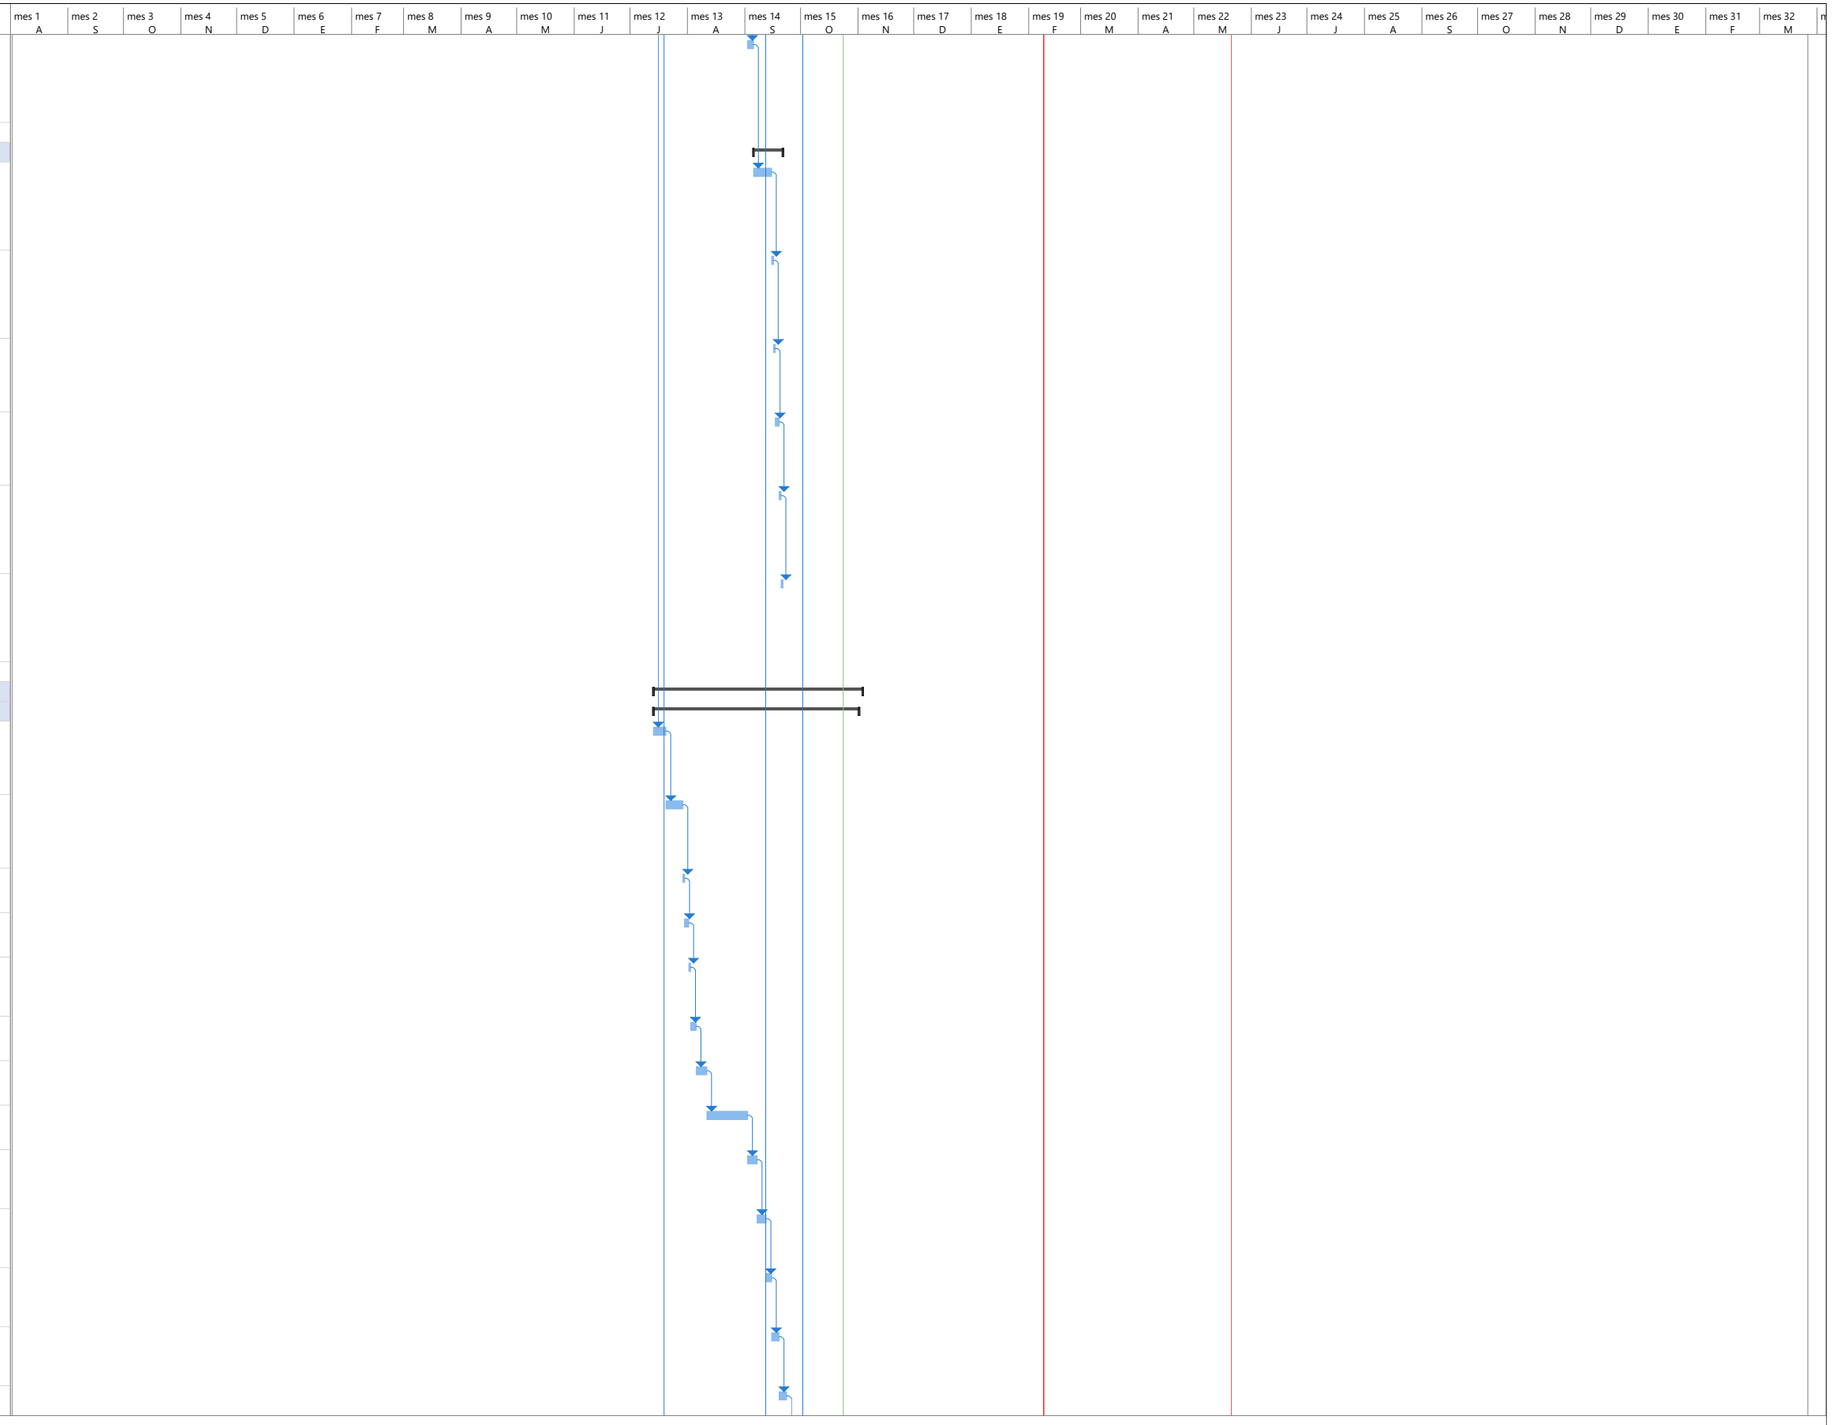

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
469	UN	12,00	3 días	$ 969.303,60	468	día 358,0625	día 361,25
470	UN	35,00	6 días	$ 1.568.120,05	469	día 361,25	día 367,625
471	UN	4,00	1 día	$ 186.980.044,24	470	día 367,625	día 368,6875
472	UN	1,00	1 día	$ 51.458.677,46	471	día 368,6875	día 369,75
473	ML	4,03	1 día	$ 12.354.557,21	472	día 369,75	día 370,8125
474	ML	16,48	3 días	$ 781.263,90	473	día 370,8125	día 374
475	ML	1.795,50	15 días	$ 172.464.202,89	474	día 374	día 389,9375
476	UN	5,00	1 día	$ 16.161.341,75	475	día 389,9375	día 391
477			**0 días**	**$ 0,00**	**476**	**día 391**	**día 391**
478			**2 días**	**$ 46.041.459,84**			
479	UN	4,00	2 días	$ 46.041.459,84	476	día 391	día 393,125
480			**0 días**	**$ 0,00**	**479**	**día 393,125**	**día 393,125**
481			**213 días**	**$ 3.778.840.586,93**			
482			**89 días**	**$ 1.957.117.741,03**			
483	M2	143,18	7 días	$ 227.759.438,51	77	día 561	día 568,4375
484	M2	307,22	14 días	$ 450.233.251,02	483	día 568,4375	día 583,3125
485	M2	641,05	16 días	$ 1.102.142.238,79	484	día 583,3125	día 600,3125
486	M2	133,25	7 días	$ 157.064.172,17	485	día 600,3125	día 607,75
487	UN	3,00	36 días	$ 3.367.557,45	486	día 607,75	día 646
488	UN	1,00	2 días	$ 1.107.940,97	487	día 646	día 648,125
489	UN	1,00	2 días	$ 1.103.081,58	488	día 648,125	día 650,25
490	UN	12,00	3 días	$ 13.236.978,96	489	día 650,25	día 653,4375
491	UN	1,00	2 días	$ 1.103.081,58	490	día 653,4375	día 655,5625
492			**0 días**	**$ 0,00**	**491**	**día 655,5625**	**día 655,5625**
493			**64 días**	**$ 1.217.308.298,17**			

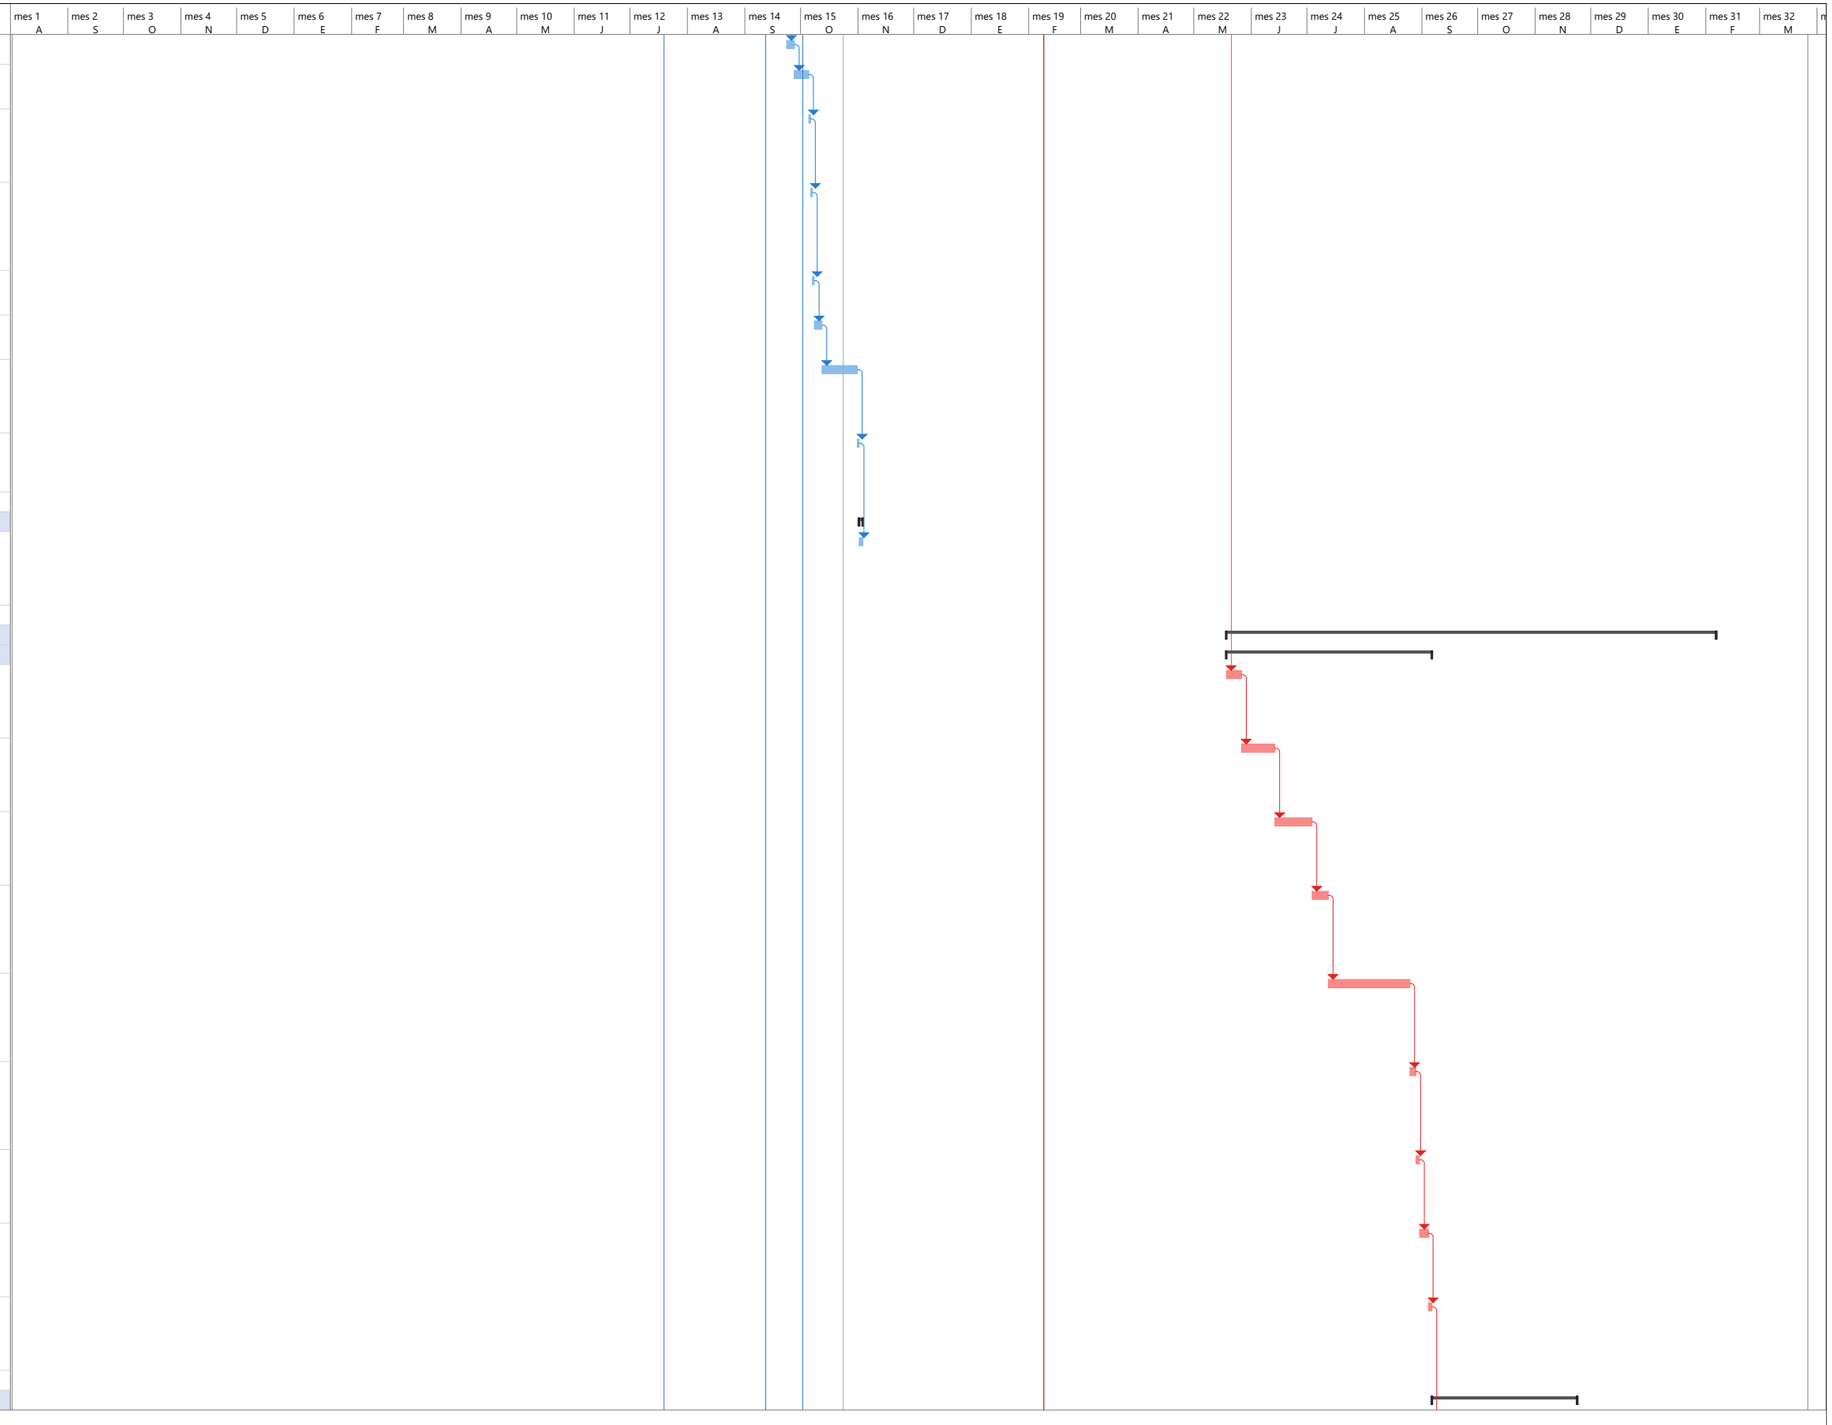

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
494	UN	12,00	7 días	$ 17.143.928,76	491	día 655,5625	día 663
495	UN	19,00	10 días	$ 29.175.779,08	494	día 663	día 673,625
496	UN	4,00	3 días	$ 7.036.397,08	495	día 673,625	día 676,8125
497	UN	3,00	2 días	$ 7.223.483,58	496	día 676,8125	día 678,9375
498	UN	7,00	7 días	$ 18.079.361,37	497	día 678,9375	día 686,375
499	UN	10,00	6 días	$ 20.555.220,70	498	día 686,375	día 692,75
500	UN	4,00	3 días	$ 11.194.891,72	499	día 692,75	día 695,9375
501	UN	11,00	7 días	$ 8.017.993,94	500	día 695,9375	día 703,375
502	M2	1.626,29	19 días	$ 1.098.881.241,94	501	día 703,375	día 723,5625
503			**0 días**	**$ 0,00**	**502**	**día 723,5625**	**día 723,5625**
504			**28 días**	**$ 179.029.156,48**			
505	ML	179,58	15 días	$ 125.260.627,23	502	día 723,5625	día 739,5
506	ML	158,86	13 días	$ 53.768.529,25	505	día 739,5	día 753,3125
507			**0 días**	**$ 0,00**	**506**	**día 753,3125**	**día 753,3125**
508			**14 días**	**$ 14.867.547,65**			
509	UN	10,00	8 días	$ 7.228.073,50	506	día 753,3125	día 761,8125
510	M2	68,20	6 días	$ 7.639.474,15	509	día 761,8125	día 768,1875
511			**0 días**	**$ 0,00**	**510**	**día 768,1875**	**día 768,1875**
512			**18 días**	**$ 410.517.843,60**			
513			**18 días**	**$ 410.517.843,60**			
514	M2	310,89	18 días	$ 410.517.843,60	510	día 768,1875	día 787,3125
515			**0 días**	**$ 0,00**	**514**	**día 787,3125**	**día 787,3125**
516			**55 días**	**$ 31.376.956,31**			
517	UN	45,00	12 días	$ 11.675.199,15	502	día 723,5625	día 736,3125
518	UN	45,00	12 días	$ 8.248.786,65	517	día 736,3125	día 749,0625
519	UN	7,00	4 días	$ 981.586,20	518	día 749,0625	día 753,3125
520	UN	43,00	12 días	$ 9.097.986,44	519	día 753,3125	día 766,0625
521	UN	59,00	15 días	$ 1.373.397,87	520	día 766,0625	día 782
522			**0 días**	**$ 0,00**	**521**	**día 782**	**día 782**
523			**103 días**	**$ 525.924.008,71**			
524	M2	176,14	8 días	$ 4.858.450,24	65	día 473,875	día 482,375
525	M2	6.248,74	30 días	$ 109.877.969,13	524	día 482,375	día 514,25
526	M2	910,92	18 días	$ 194.409.147,61	525	día 514,25	día 533,375
527	ML	636,39	14 días	$ 8.743.069,47	526	día 533,375	día 548,25



MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
528	M2	699,35	14 días	$ 37.100.755,28	527	día 548,25	día 563,125
529	ML	69,06	6 días	$ 6.074.047,30	528	día 563,125	día 569,5
530	M2	532,74	13 días	$ 164.860.569,68	529	día 569,5	día 583,3125
531			**0 días**	**$ 0,00**	**530**	**día 583,3125**	**día 583,3125**
532			**30 días**	**$ 282.348.567,97**			
533	M2	1.311,91	15 días	$ 246.996.273,74	534	día 372,9375	día 388,875
534	M2	1.030,83	15 días	$ 35.352.294,23	537	día 357	día 372,9375
535			**0 días**	**$ 0,00**	**533**	**día 388,875**	**día 388,875**
536			**52 días**	**$ 1.371.009.648,01**			
537	M2	593,96	10 días	$ 304.938.149,30	48	día 346,375	día 357
538	UN	15,00	3 días	$ 488.613,45	537	día 357	día 360,1875
539	M2	1.030,83	15 días	$ 54.217.483,14	538	día 360,1875	día 376,125
540	M2	807,46	12 días	$ 961.003.250,72	539	día 376,125	día 388,875
541	ML	530,78	10 días	$ 37.711.579,30	540	día 388,875	día 399,5
542	M2	6,74	2 días	$ 12.650.572,10	541	día 399,5	día 401,625
543			**0 días**	**$ 0,00**	**542**	**día 401,625**	**día 401,625**
544			**35 días**	**$ 47.220.514,14**			
545			**20 días**	**$ 38.185.461,46**			
546	UN	7,00	3 días	$ 12.095.398,49	530	día 583,3125	día 586,5
547	UN	4,00	2 días	$ 4.766.659,20	546	día 586,5	día 588,625
548	UN	7,00	3 días	$ 6.948.577,93	547	día 588,625	día 591,8125
549	UN	7,00	3 días	$ 4.891.409,74	548	día 591,8125	día 595
550	ML	9,95	2 días	$ 2.109.053,64	549	día 595	día 597,125
551	UN	14,00	6 días	$ 5.905.750,62	550	día 597,125	día 603,5
552	UN	2,00	1 día	$ 1.468.611,84	551	día 603,5	día 604,5625
553			**0 días**	**$ 0,00**	**552**	**día 604,5625**	**día 604,5625**
554			**15 días**	**$ 9.035.052,68**			
555	UN	21,00	7 días	$ 4.243.340,22	552	día 604,5625	día 612
556	UN	8,00	3 días	$ 1.051.089,84	555	día 612	día 615,1875
557	UN	7,00	3 días	$ 3.532.594,94	556	día 615,1875	día 618,375
558	UN	8,00	2 días	$ 208.027,68	557	día 618,375	día 620,5
559			**0 días**	**$ 0,00**	**558**	**día 620,5**	**día 620,5**
560			**24 días**	**$ 41.160.332,19**			
561			**18 días**	**$ 32.643.863,49**			
562	UN	7,00	3 días	$ 4.745.048,49	514	día 787,3125	día 790,5
563	UN	7,00	3 días	$ 1.158.688,37	562	día 790,5	día 793,6875
564	UN	11,00	4 días	$ 1.840.271,84	563	día 793,6875	día 797,9375
565	UN	13,00	3 días	$ 2.317.280,03	564	día 797,9375	día 801,125

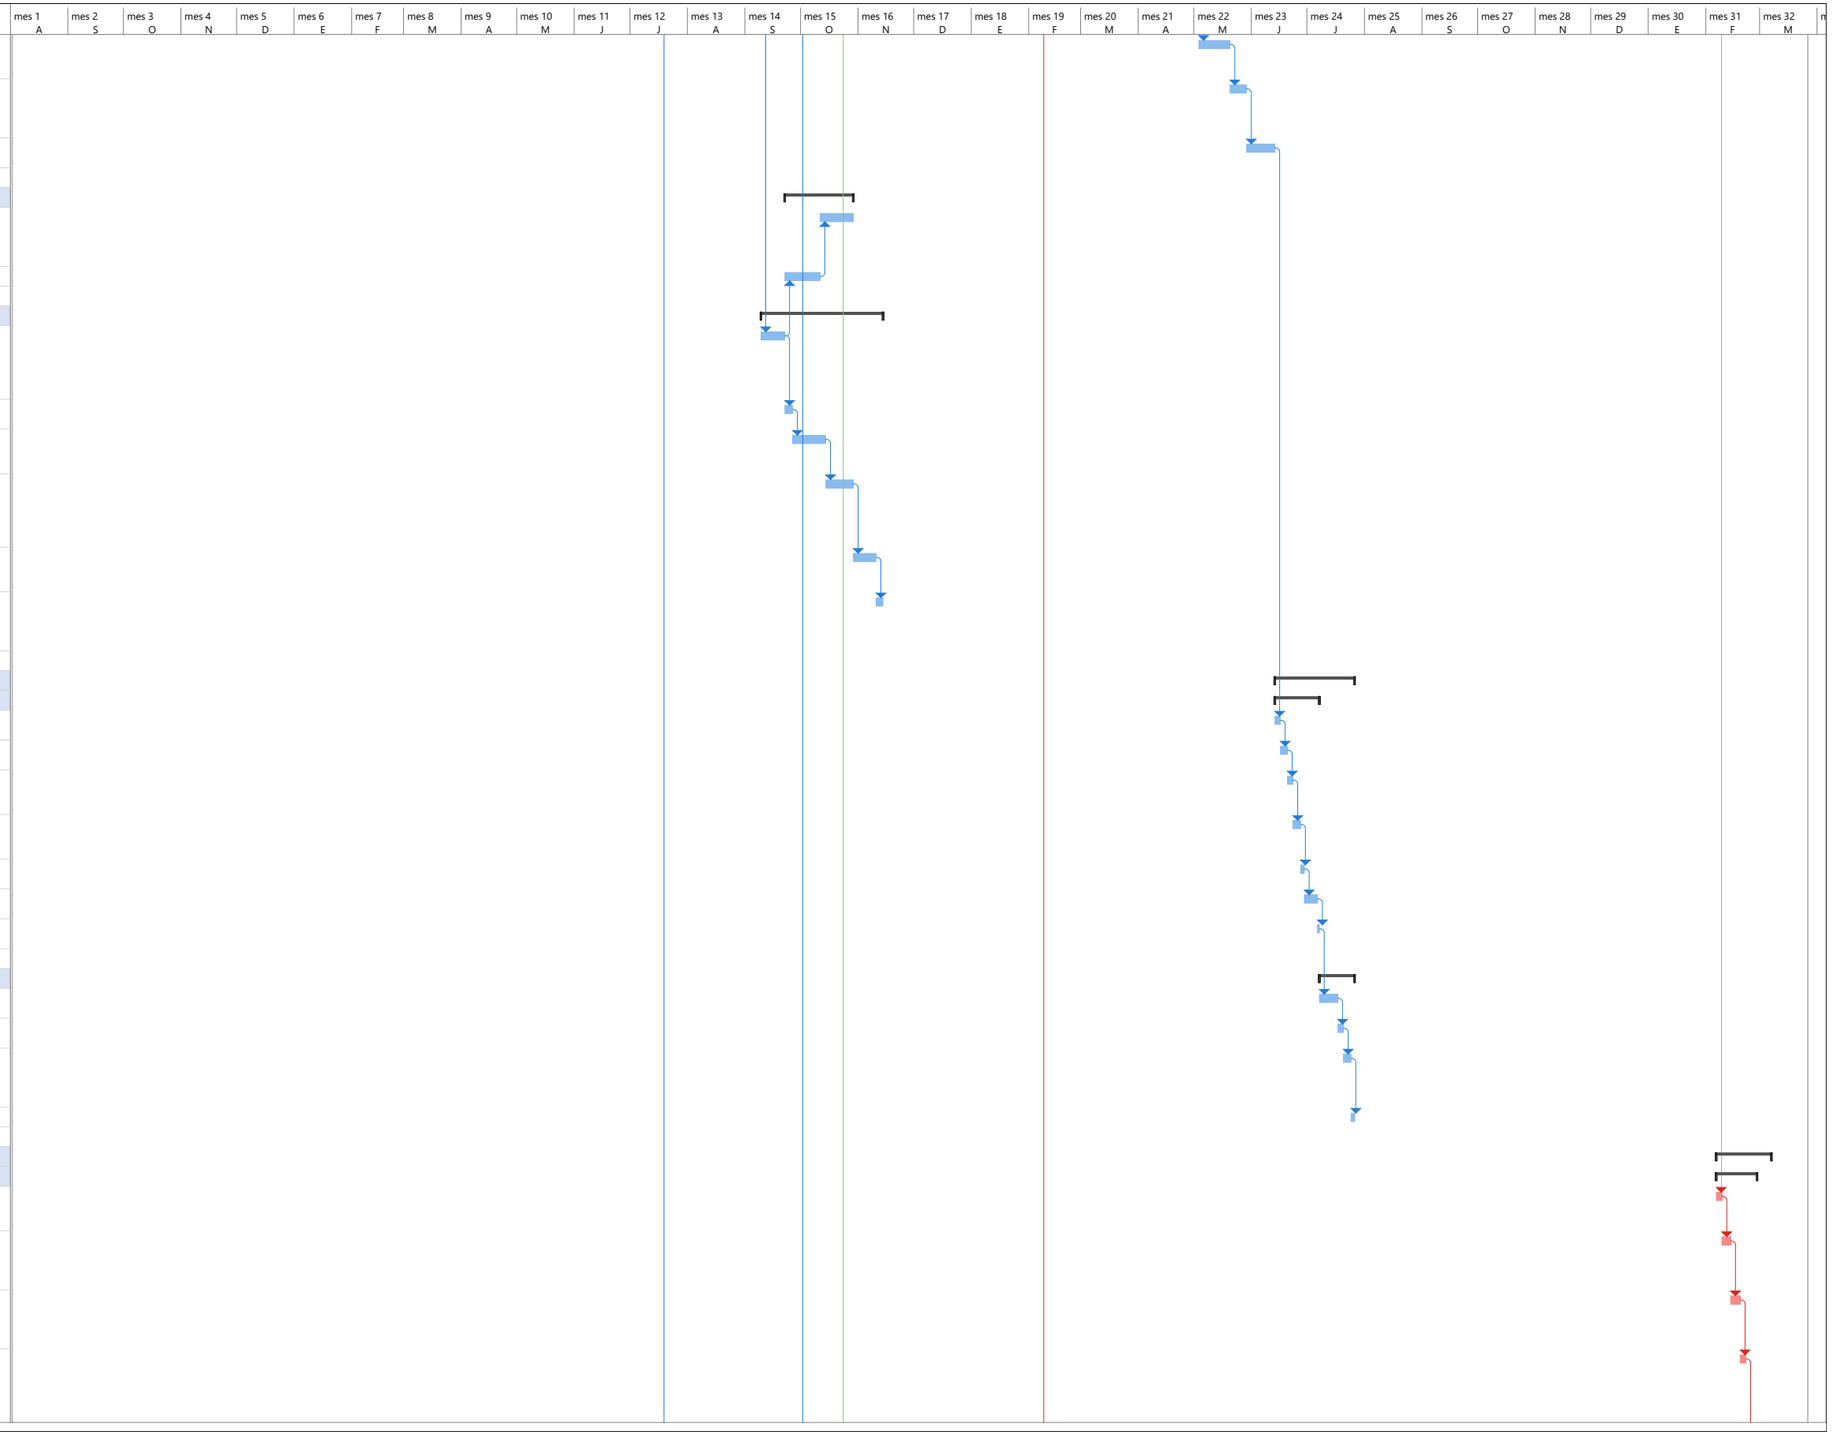

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
566	UN	13,00	3 días	$ 18.732.317,24	565	día 801,125	día 804,3125
567	ML	1,00	1 día	$ 1.519.203,68	566	día 804,3125	día 805,375
568	UN	4,00	1 día	$ 2.331.053,84	567	día 805,375	día 806,4375
569			**0 días**	**$ 0,00**	**568**	**día 806,4375**	**día 806,4375**
570			**6 días**	**$ 8.516.468,70**			
571	M2	10,30	3 días	$ 1.034.227,22	568	día 806,4375	día 809,625
572	UN	7,00	3 días	$ 7.482.241,48	571	día 809,625	día 812,8125
573			**0 días**	**$ 0,00**	**572**	**día 812,8125**	**día 812,8125**
574			**242 días**	**$ 2.233.260.890,45**			
575			**121 días**	**$ 701.155.600,96**			
576	M2	991,90	18 días	$ 290.881.608,38	65	día 473,875	día 493
577	M2	2.896,78	28 días	$ 141.728.553,51	576CC	día 473,875	día 503,625
578	UN	61,45	2 días	$ 725.424,62	577	día 503,625	día 505,75
579	UN	140,40	6 días	$ 1.608.706,01	578	día 505,75	día 512,125
580	UN	265,95	6 días	$ 3.400.213,30	579	día 512,125	día 518,5
581	UN	185,05	6 días	$ 2.188.316,18	580	día 518,5	día 524,875
582	UN	1.080,00	20 días	$ 19.430.982,00	581	día 524,875	día 546,125
583	UN	6.304,00	30 días	$ 74.805.596,48	581	día 524,875	día 556,75
584	UN	10,00	1 día	$ 4.166.823,30	583	día 556,75	día 557,8125
585	UN	25,00	2 días	$ 9.171.584,25	583	día 556,75	día 558,875
586	UN	67,00	2 días	$ 23.759.057,60	585	día 558,875	día 561
587	UN	25,00	2 días	$ 9.084.809,50	586	día 561	día 563,125
588	UN	20,00	2 días	$ 7.010.585,60	587	día 563,125	día 565,25
589	UN	20,00	2 días	$ 7.500.608,20	588	día 565,25	día 567,375
590	UN	20,00	2 días	$ 7.035.086,80	589	día 567,375	día 569,5
591	UN	20,00	2 días	$ 6.924.831,80	590	día 569,5	día 571,625
592	UN	20,00	2 días	$ 7.198.427,60	591	día 571,625	día 573,75
593	UN	20,00	2 días	$ 6.969.750,40	592	día 573,75	día 575,875
594	M2	310,03	25 días	$ 77.564.635,43	593	día 575,875	día 602,4375
595			**0 días**	**$ 0,00**	**594**	**día 602,4375**	**día 602,4375**
596			**121 días**	**$ 1.532.105.289,49**			
597	ML	392,54	15 días	$ 25.243.682,14	594	día 602,4375	día 618,375
598	M2	27,81	3 días	$ 4.274.703,19	597	día 618,375	día 621,5625
599	M2	143,17	10 días	$ 22.299.858,54	598	día 621,5625	día 632,1875
600	M2	69,31	5 días	$ 11.353.357,13	599	día 632,1875	día 637,5

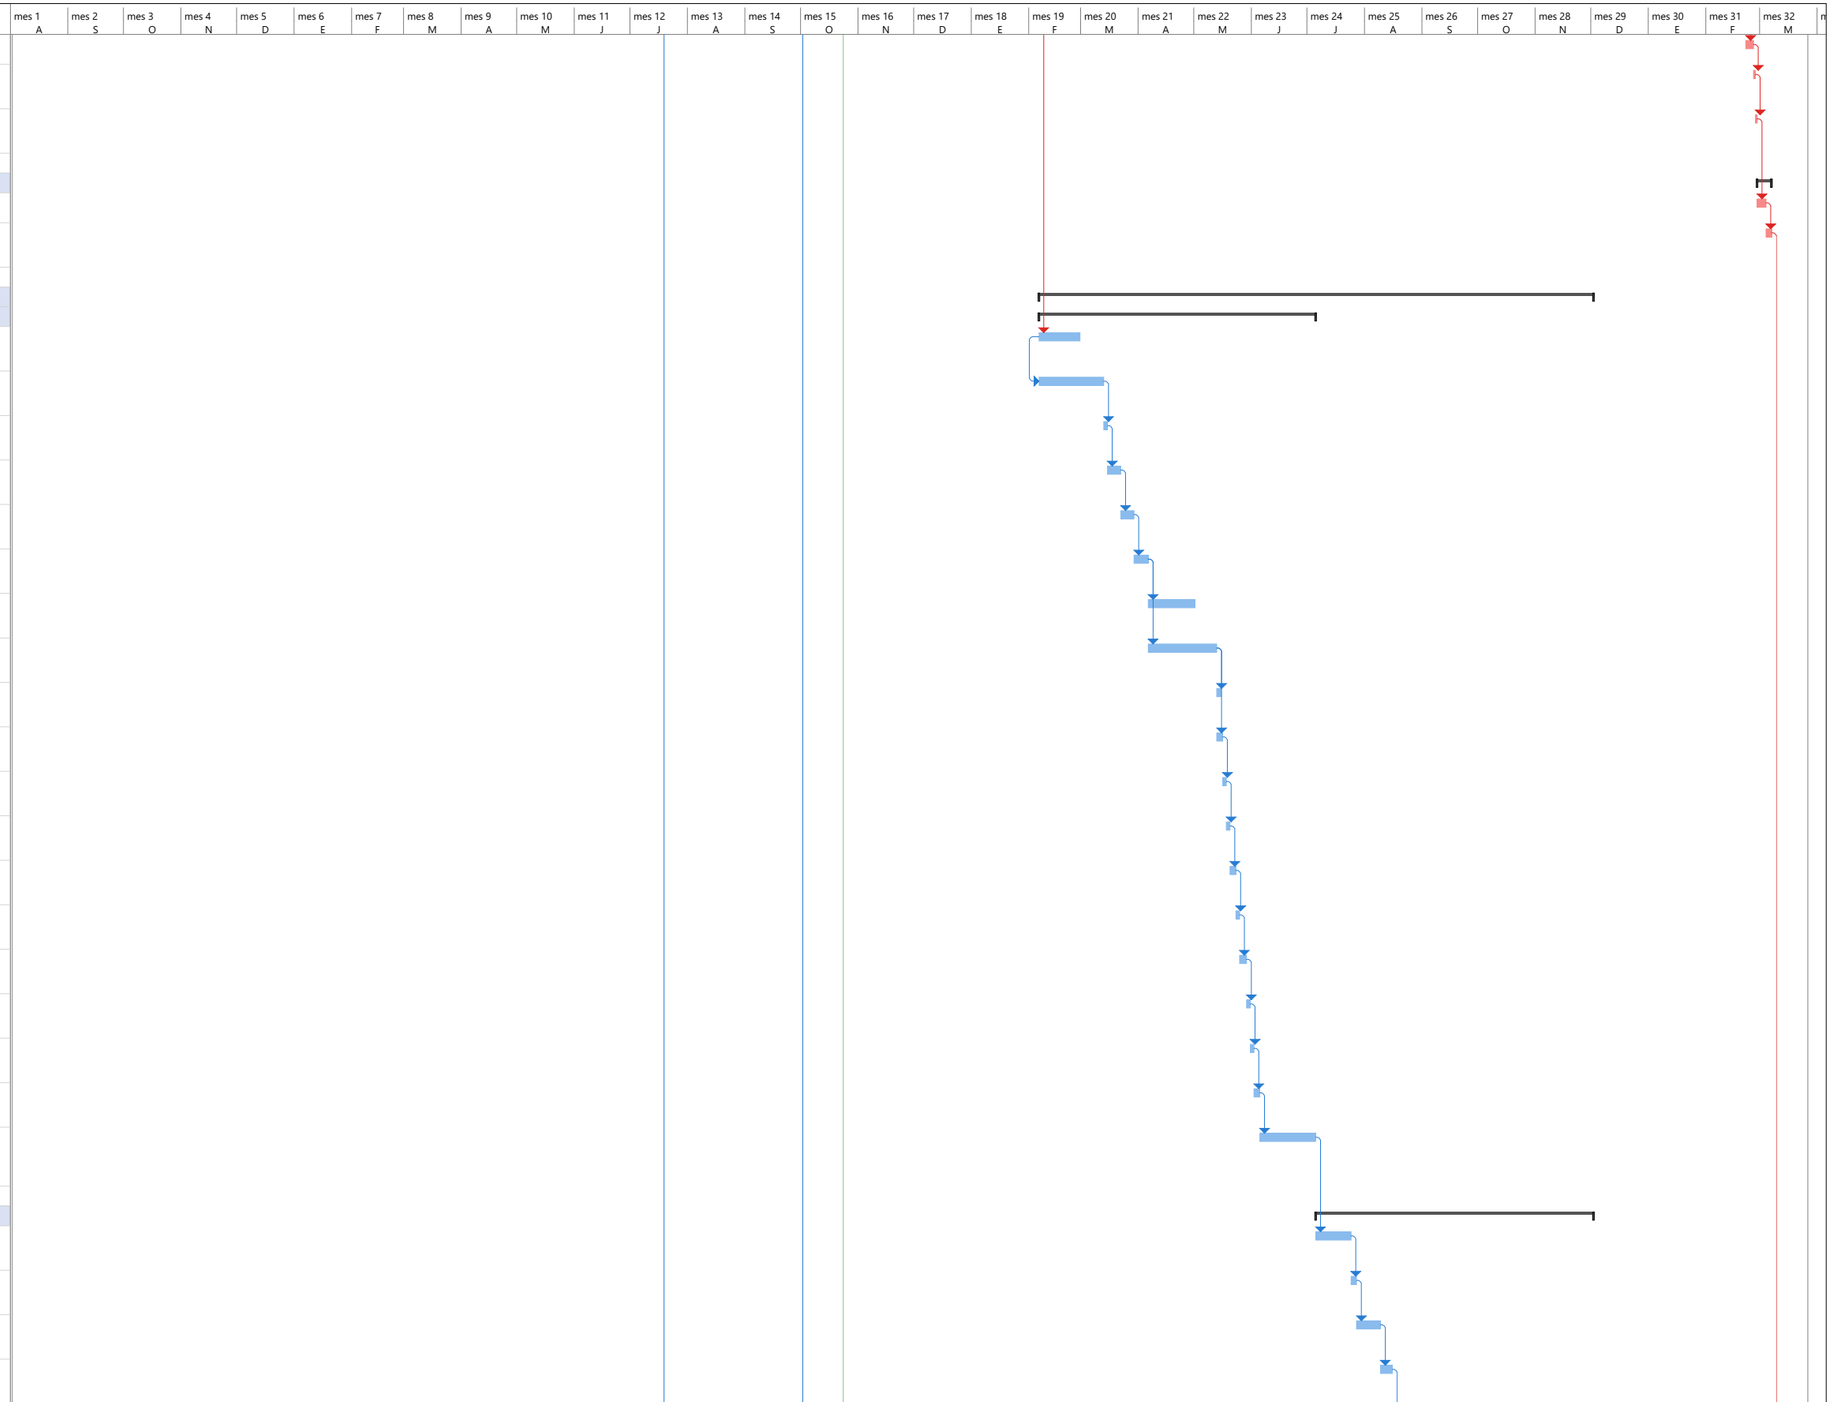

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
601	M2	4.851,30	28 días	$ 431.509.454,33	600	día 637,5	día 667,25
602	M2	3.028,20	25 días	$ 562.045.396,88	601	día 667,25	día 693,8125
603	ML	2.565,28	20 días	$ 430.049.285,43	602	día 693,8125	día 715,0625
604	UN	7,00	1 día	$ 7.615.547,10	603	día 715,0625	día 716,125
605	UN	9,00	1 día	$ 10.010.825,28	604	día 716,125	día 717,1875
606	UN	24,00	5 días	$ 15.654.687,60	603	día 715,0625	día 720,375
607	ML	162,83	10 días	$ 12.048.491,87	606	día 720,375	día 731
608			**0 días**	**$ 0,00**	**607**	**día 731**	**día 731**
609			**458 días**	**$ 388.693.262,03**			
610			**59 días**	**$ 193.871.038,01**			
611	M3	90,65	20 días	$ 74.210.061,38	15FC+30 días	día 300,6875	día 321,9375
612	ML	164,80	10 días	$ 34.818.957,18	611	día 321,9375	día 332,5625
613	UN	4,00	1 día	$ 1.260.188,48	614	día 362,3125	día 363,375
614	UN	5,00	1 día	$ 1.575.235,60	615	día 361,25	día 362,3125
615	UN	3,00	1 día	$ 945.141,36	622	día 360,1875	día 361,25
616	ML	334,95	4 días	$ 5.913.341,28	611	día 321,9375	día 326,1875
617	ML	1.016,93	6 días	$ 16.552.122,16	616	día 326,1875	día 332,5625
618	ML	78,75	1 día	$ 916.496,44	617	día 332,5625	día 333,625
619	M2	907,80	3 días	$ 45.625.882,75	618	día 333,625	día 336,8125
620	UN	130,00	10 días	$ 1.486.972,50	619	día 336,8125	día 347,4375
621	UN	28,00	2 días	$ 1.976.412,48	620	día 347,4375	día 349,5625
622	UN	126,00	10 días	$ 8.590.226,40	621	día 349,5625	día 360,1875
623			**0 días**	**$ 0,00**	**613**	**día 363,375**	**día 363,375**
624			**63 días**	**$ 194.822.224,02**			
625	UN	10,00	5 días	$ 4.320.365,40	606	día 720,375	día 725,6875
626	UN	4,00	2 días	$ 36.395.607,84	625	día 725,6875	día 727,8125
627	UN	14,00	5 días	$ 49.908.796,28	626	día 727,8125	día 733,125
628	UN	290,00	18 días	$ 26.858.135,40	627	día 733,125	día 752,25
629	UN	32,00	10 días	$ 4.005.117,76	628	día 752,25	día 762,875
630	UN	6,00	3 días	$ 3.065.581,02	629	día 762,875	día 766,0625
631	UN	150,00	15 días	$ 10.771.308,00	630	día 766,0625	día 782
632	UN	18,00	5 días	$ 59.497.312,32	631	día 782	día 787,3125
633			**0 días**	**$ 0,00**	**632**	**día 787,3125**	**día 787,3125**
634			**15 días**	**$ 100.030.203,81**			
635	M2	19.491,58	15 días	$ 100.030.203,81	572	día 812,8125	día 828,75
636			**0 días**	**$ 0,00**	**635**	**día 828,75**	**día 828,75**
637			**18 días**	**$ 323.089.962,31**			

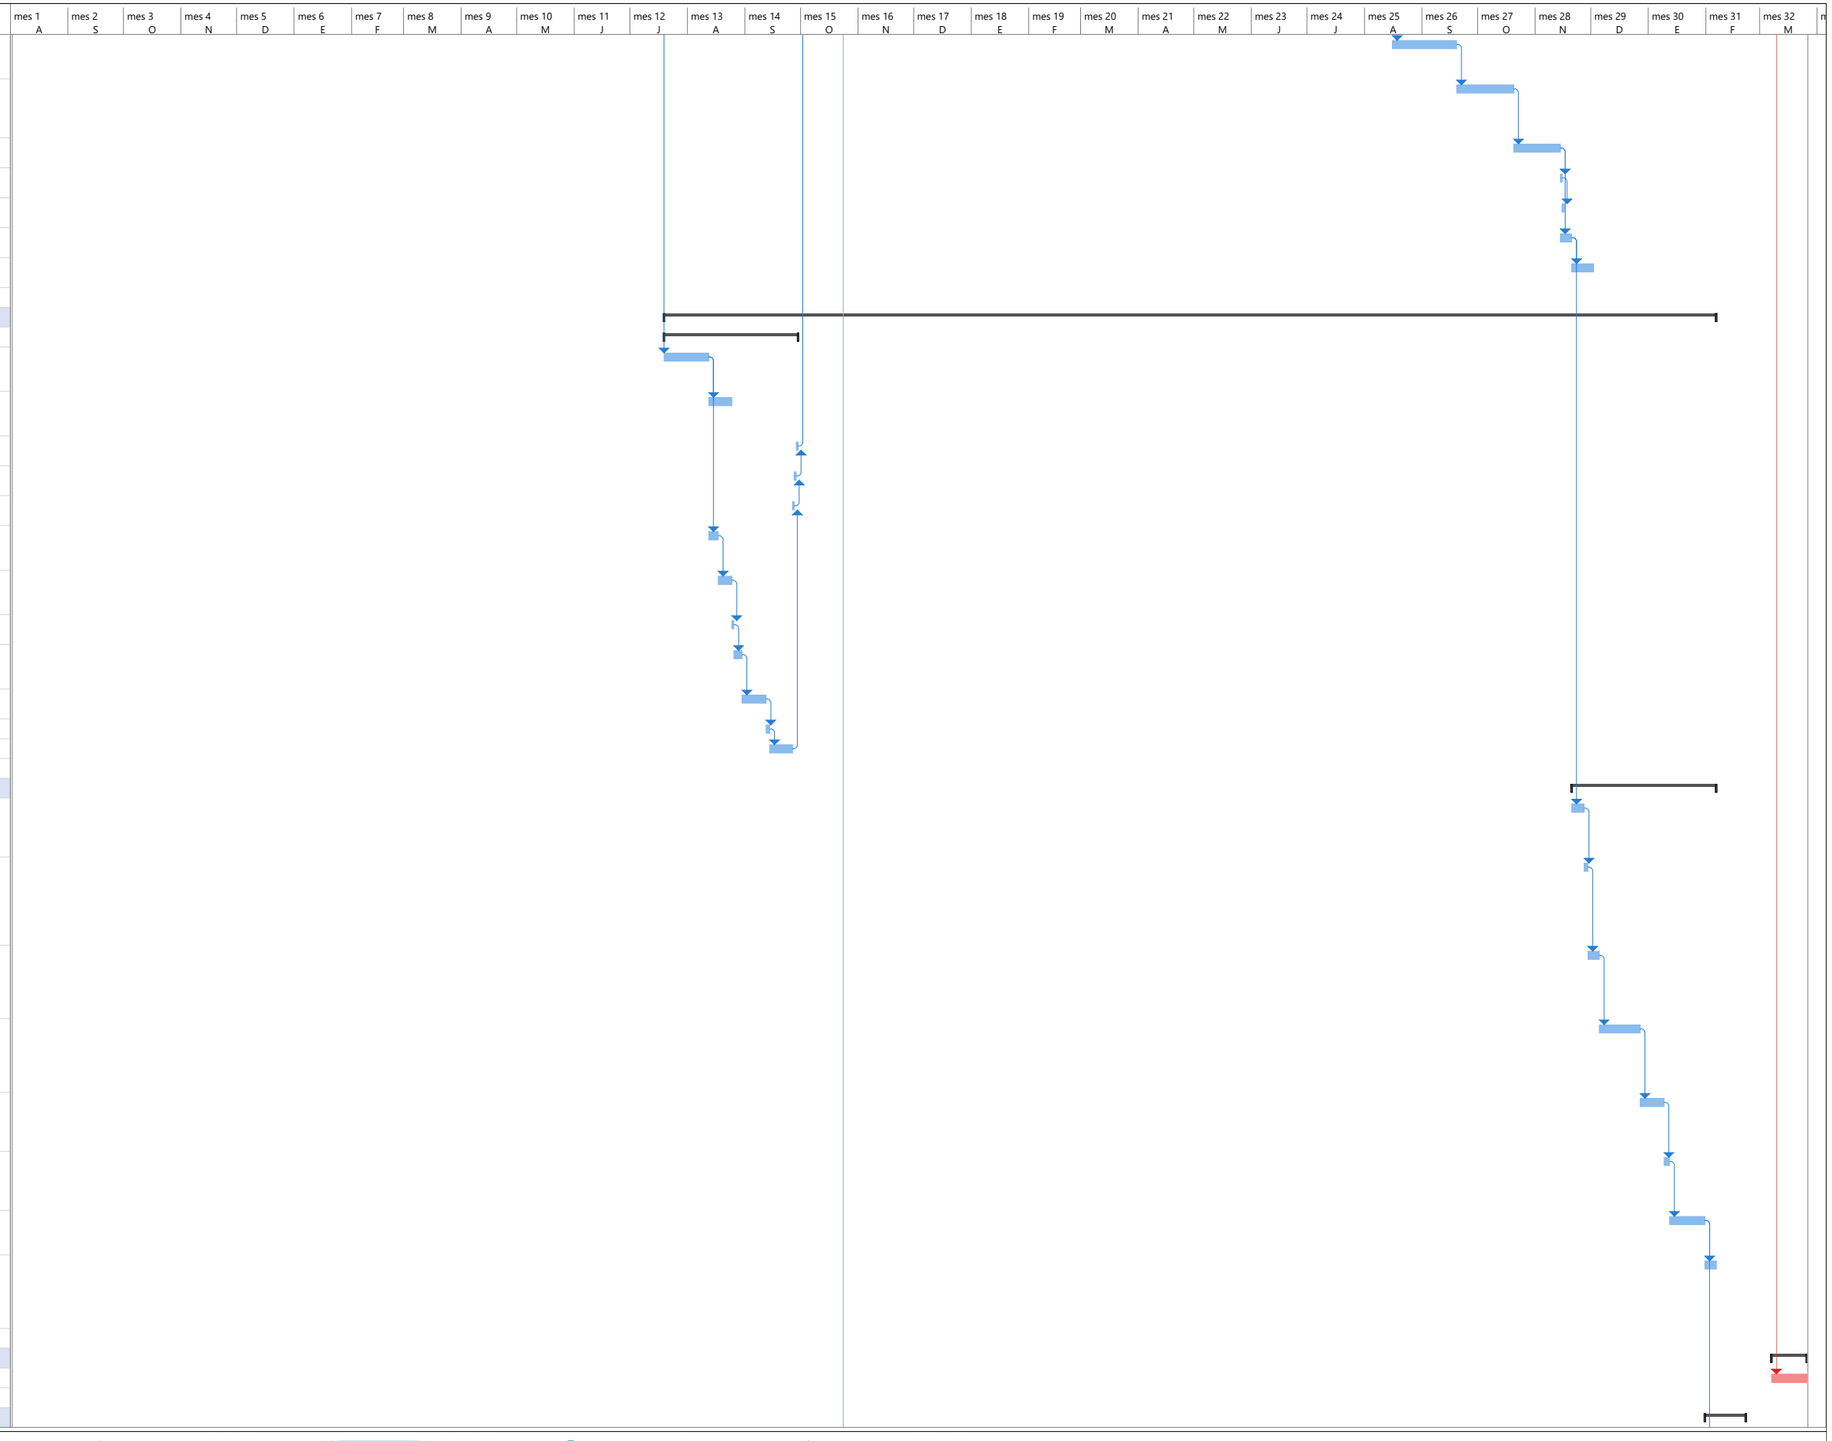

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Und	Cant	Duración	Costo	Predecesor	Comienzo de tarea	Fin de Tarea
638	UN	1,00	3 días	$ 109.091.221,95	631	día 782	día 785,1875
639	ML	83,67	2 días	$ 21.625.817,59	638	día 785,1875	día 787,3125
640	UN	1,00	1 día	$ 6.039.756,55	639	día 787,3125	día 788,375
641	UN	2,00	1 día	$ 80.930.980,17	640	día 788,375	día 789,4375
642	UN	1,00	1 día	$ 626.179,81	641	día 789,4375	día 790,5
643	UN	15,00	1 día	$ 6.131.891,85	642	día 790,5	día 791,5625
644	UN	29,00	1 día	$ 5.075.983,97	643	día 791,5625	día 792,625
645	UN	16,00	1 día	$ 7.395.338,40	644	día 792,625	día 793,6875
646	UN	115,00	2 días	$ 50.833.721,40	645	día 793,6875	día 795,8125
647	UN	3,00	1 día	$ 4.011.423,81	646	día 795,8125	día 796,875
648	UN	8,00	1 día	$ 5.354.929,20	647	día 796,875	día 797,9375
649	UN	1,00	1 día	$ 14.887,38	648	día 797,9375	día 799
650	UN	16,00	1 día	$ 18.145.268,48	649	día 799	día 800,0625
651	UN	5,00	1 día	$ 7.812.561,75	650	día 800,0625	día 801,125
652			**0 días**	**$ 0,00**	**651**	**día 801,125**	**día 801,125**

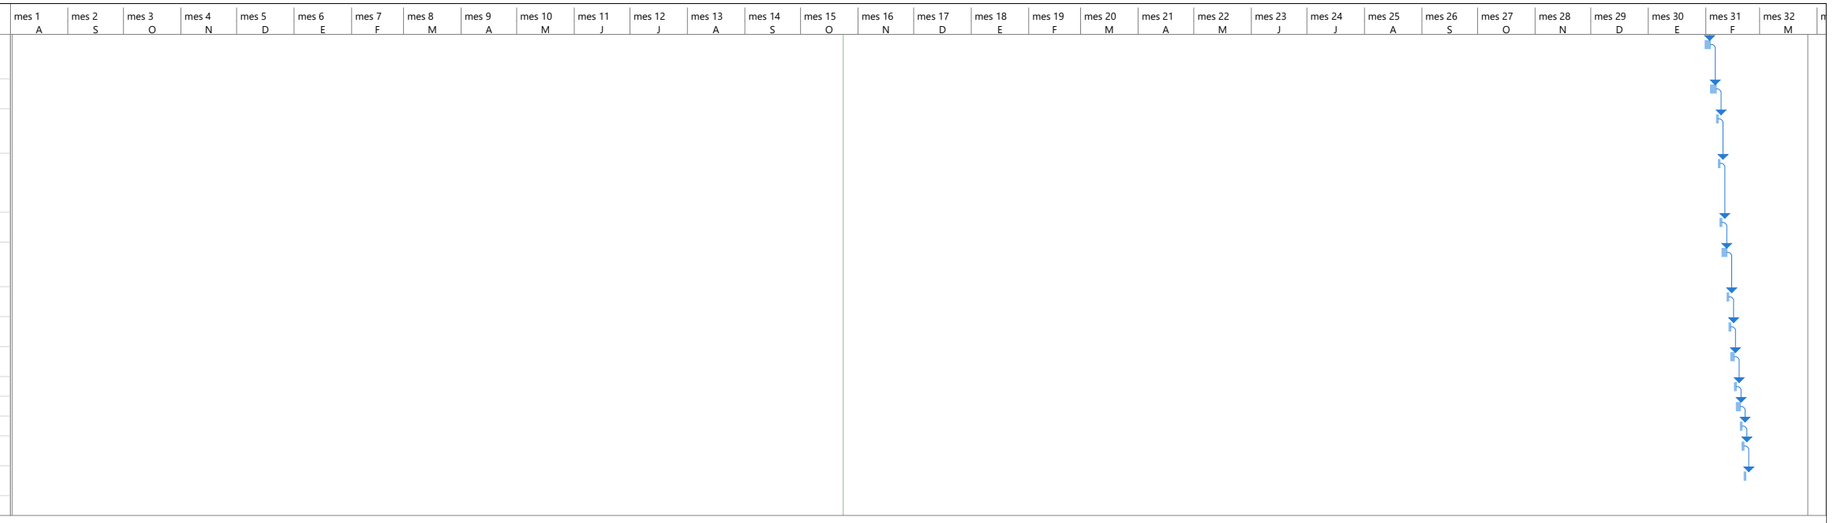

MONSERRATE
CENTRO DE BIENVENIDA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
