ACTA No. 015 de 2022
REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICONES PARA MODIFICACIÓN No. 3 CONTRATO 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022

PROCESO DE SELECCIÓN No.	027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022	FECHA	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRESUPUESTO OFICIAL ADICIONADO:	$ 359.826.083,42	HORA	14:30
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CANTIDAD	LUGAR	PLATAFORMA TEAMS – EPFAC

OBJETO: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC.

En la ciudad de Bogotá D.C, a los quince (15) días del mes de octubre de 2022 siendo las 14:30 horas, se reúne por medio de la aplicación TEAMS, los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional de la Fuerza Aérea Colombiana, que se relacionan a continuación, en sus cualidades de Subdirector General y Ordenador del Gasto EPFAC, Gerente de Proyecto, Jefe Departamento Financiero, Jefe Departamento de Compras Públicas, con el fin de llevar a cabo comité de adquisiciones para modificación contrato selección abreviada menor cuantía del proceso No. 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022.

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	COMITE
MY	JAMES JOSÉ ROSERO RODRÍGUEZ	Gerente de Proyecto	Adquisiciones EPFAC
TE	JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA	Jefe Departamento Financiero	Adquisiciones EPFAC
MY	JESÚS MARÍA ARIAS GOMEZ	Supervisor Principal	
TE	LAURA CATALINA MOSQUERA MOSQUERA	Jefe Departamento de Compras Públicas	Adquisiciones EPFAC

ASISTENTES CON VOZ Y SIN VOTO

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	COMITE
TC.	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ACOSTA	Subdirector y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto EPFAC	Adquisiciones EPFAC
MY.	GINA MARCELA ZABALETA GARCES	Jefe Oficina Regional Inspección y Control Interna	Jefe Oficina Regional Inspección y Control Interna

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Presentación Ponencia de modificación
3. Consideraciones del Supervisor del Contrato
4. Deliberaciones y Recomendación del Comité de Adquisiciones de Contratación
5. Aprobación

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
   A las 14:30 horas, se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes todos los miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

La señora TE. LAURA CATALINA MOSQUERA MOSQUERA en su condición de Jefe del DECOP, explica el objeto y alcance de la presente reunión, que teniendo en cuenta la solicitud por parte del contratista mediante oficio CV-FAC-008-2022 con fecha noviembre 11 de 2022, que según las condiciones climáticas (lluvias) presentadas en los últimos 15 días, ha afectado notablemente las actividades programadas en fachada del edificio de postgrado de la sede EPFAC, ya que se han podido adelantar de manera intermitente las actividades por esta condición climática y esto ha generado retrasos en las terminaciones de las actividades del ítem 12.1 FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO REF. STAC BOND COLOR NEGRO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS y el ítem NP3 SIPS DE CUNETA PREFABRICADA (100 CM X 46CM) (INCLUYE RESANES) ya que esta actividad también se realiza en espacio exterior y no ha sido posible culminarla.

Así mismo, es pertinente señalar que con la presente modificación al contrato para lograr la ejecución total y el correcto funcionamiento de la obra realizadas y programadas solicita la ampliación de tiempo de ejecución de contrato No. 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 hasta el 23 de noviembre de 2022, Para lo anterior, es necesario modificar las cláusulas del contrato principal.

FORMA DE PAGO – CONTRATO:

El Ministerio pagará al Contratista el valor de los servicios prestados después de recibir a satisfacción, mediante pagos parciales así:

No. PAGOS	FECHA DE CORTE DE FACTURACIÓN	VALOR DE PAGO	PAC DEL MES	ESTADO
1	29 DE AGOSTO 2022	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE 2022	Tramitado y pagado $120.777.755,23
2	31 OCTUBRE 2022	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	NOVIEMBRE 2022	Tramitado $ 195.318.751,56
3	23 NOVIEMBRE 2022	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN HASTA EL SALDO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	Pendiente

3. CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR

El señor MY. ARIAS, informa que es necesario ampliar el plazo de ejecución, con el fin cumplir con la calidad del servicio, por lo cual manifiesta estar de acuerdo con la necesidad de suscribir la modificación para realizar lo anteriormente descrito en la ponencia.

4. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIÓN DEL DEL COMITÉ DE ADQUISIONES DE CONTRATACIÓN

El señor MY. JAMES JOSÉ ROSERO RODRÍGUEZ Gerente de Proyecto, informa que teniendo en cuenta los antecedes encuentra pertinente modificar el contrato, con el fin de buscar que la entrega cumpla con los estándares de calidad y garantía del servicio e indica que su **voto es FAVORABLE** para el ajuste de fecha de ejecución hasta el día: 23 de noviembre de 2022 y forma de pago.

Interviene la señora Teniente BOLAÑOS Jefe DEFIN, informa que teniendo en cuenta los documentos soporte presentados para la modificación No. 3 del Contrato No. 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 y dado que cambia la forma de pago se hace necesario que el supervisor radique los documentos de pago a más tardar el 23-NOV-2022 para cuentas por pagar pagadero en el primer trimestre de 2023, así las cosas, indica que su voto es **FAVORABLE**.

Una vez terminado el análisis de los puntos anteriores, el Comité de Adquisiciones EPFAC la señora TE. MOSQUERA da su concepto que teniendo en cuenta las solicitudes, antecedentes y argumentos allegados por el supervisor y dando cumplimiento a ley es pertinente y viable realizar la modificación. Por ende,


recomienda al señor Teniente Coronel RODRÍGUEZ Subdirector y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto EPFAC **MODIFICAR CONTRATO No. 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022**, en el sentido de modificar el plazo de ejecución hasta el: 23 **de noviembre de 2022 y forma de pago.**


5. **APROBACIÓN**

El señor Teniente Coronel RODRIGUEZ Subdirector y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto EPFAC, informa que teniendo en cuenta los conceptos y por parte de las dependencias de ORICO, DEFIN, DECOP y GRUAL y tramites los adelantos por parte de la supervisión del contrato y estando cumpliendo con toda la normatividad, procedimientos y contado con todos los documentos soportes que ayudan a evidenciar la necesidad de la modificación de plazo de ejecución (23-NOV-2022) contrato con el fin de culminar la obra, el señor TC. RODRÍGUEZ acoge la recomendación del Comité de Adquisiciones y aprueba el presente modificatorio, indicando al Departamento de Compras Públicas continuar con los trámites respectivos para llevar a feliz término lo aprobado.

Siendo las 15:00 horas y no siendo otro el objeto de la presente, se agota el orden del día y se da por concluida la sesión, en constancia, se firma por quienes intervinieron.

ASISTENCIA:

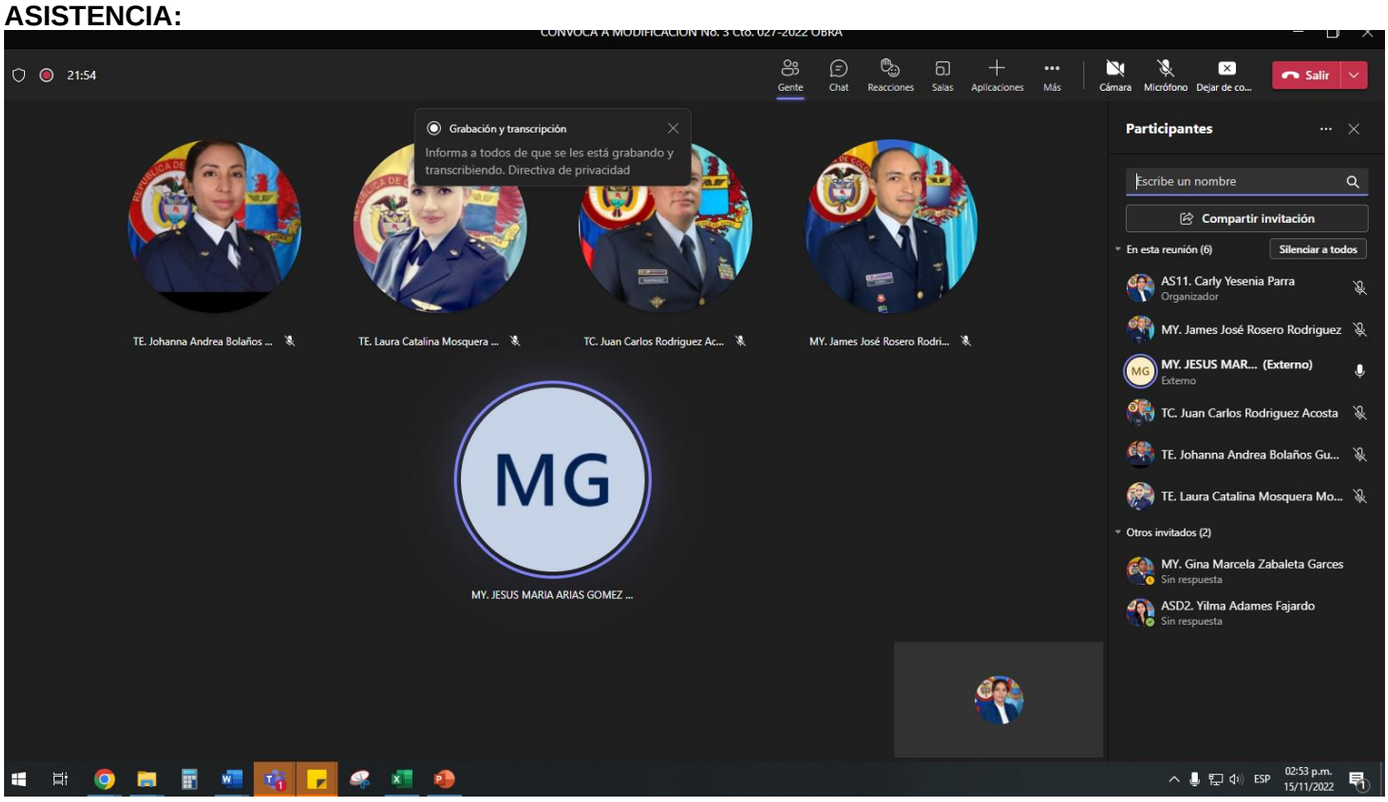

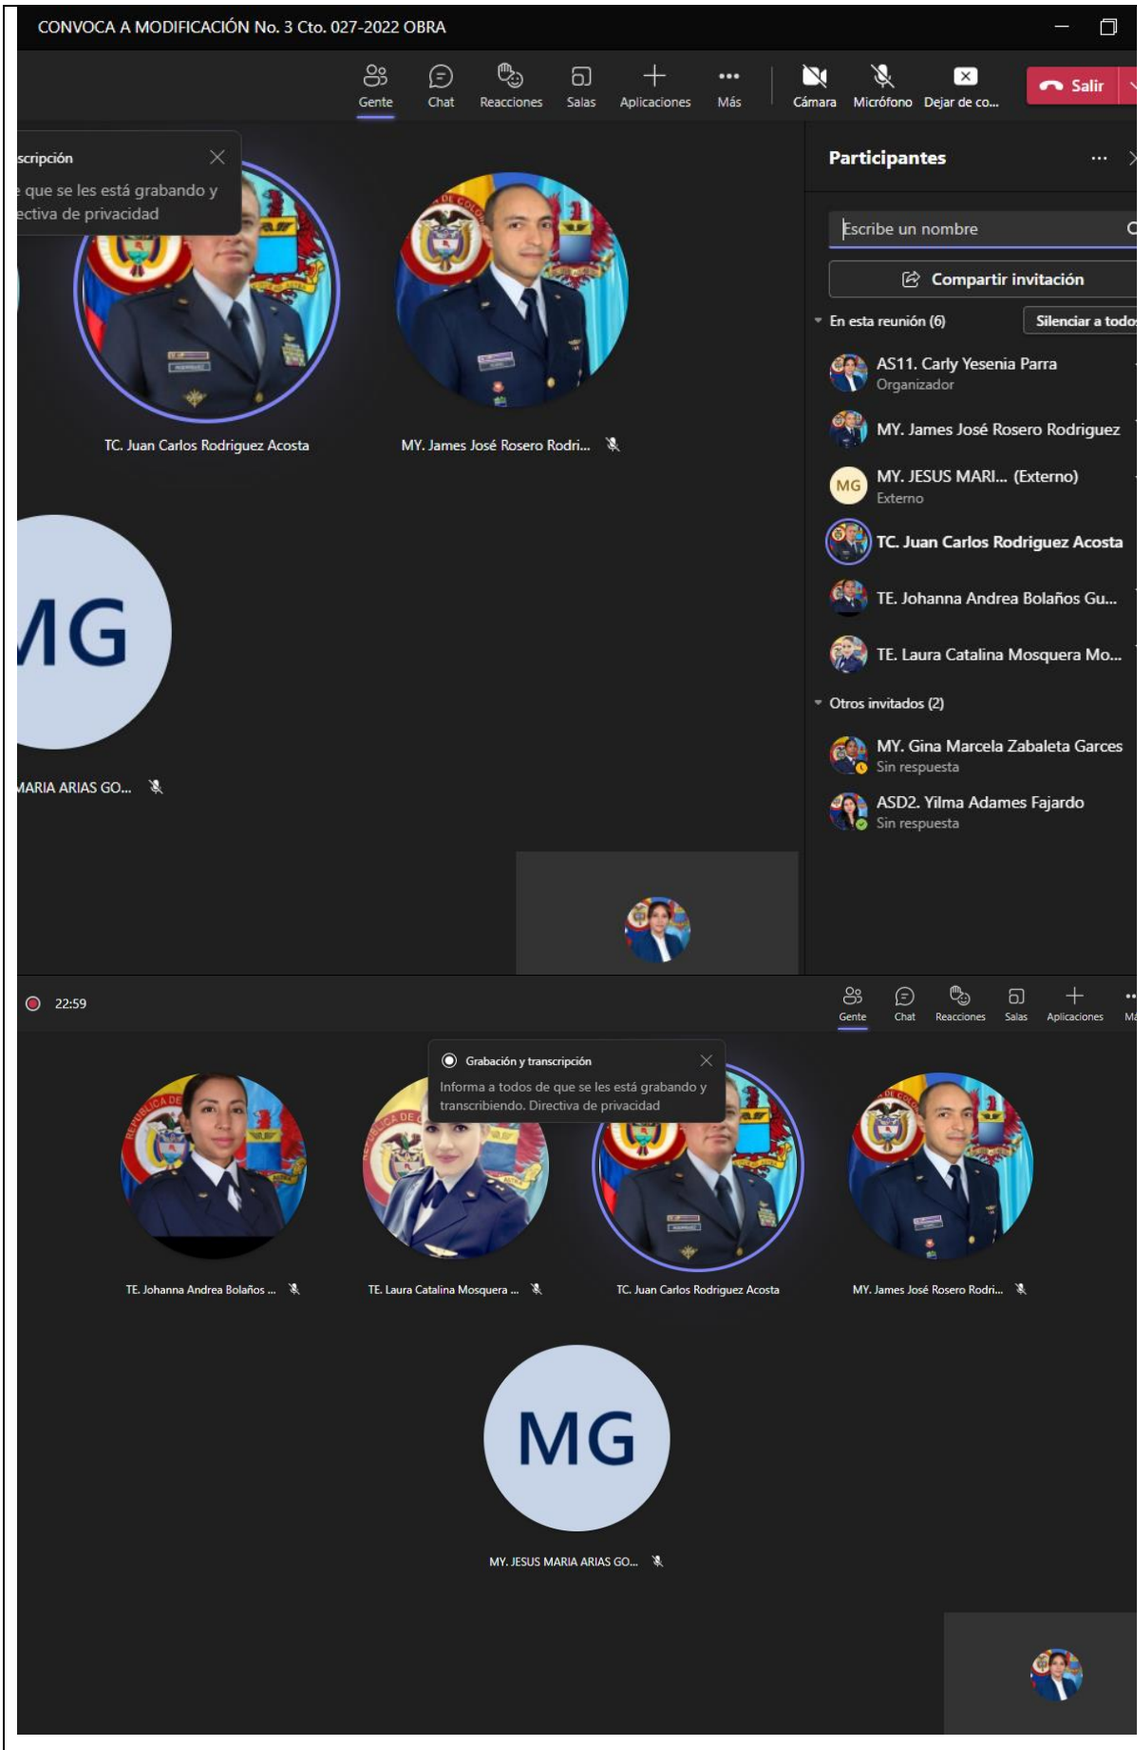

FIRMAS	
TC. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ACOSTA Subdirector y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto EPFAC	MY. JAMES JOSÉ ROSERO RODRÍGUEZ Gerente de Proyecto

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA Jefe Departamento Financiero	TE. LAURA CATALINA MOSQUERA MOSQUERA Jefe Departamento de Compras Públicas
MY. JESÚS MARÍA ARIAS GÓMEZ Supervisor Principal	

Elaboró: AS11. Carly Parra
Secretaria Departamento de Compras Públicas -DECOP
