
210922SEGUIMIENTOProyectoSNR CSA 1402_2022V2.mpp

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1	**1**	**PROYECTO CPS1402_2022_SNR_CSA**	**120 días**	**mar 16/08/22**	**sáb 7/01/23**	**10%**
2	1.1	Formalizacion del contrato	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22	100%
3	1.2	Acta de inicio del contrato	0 días	jue 25/08/22	jue 25/08/22	100%
4	**1.3**	**100. Diagnóstico**	**21 días**	**mar 16/08/22**	**vie 9/09/22**	**100%**
5	1.3.1	101. Reconocimiento documentacion en estanteria	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22	100%
6	1.3.2	105. Informe de diagnostico	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	100%
7	1.4	120. Solicitud de Formatos e Instrumentos	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	100%
8	1.5	130. Fumigacion	1 día	sáb 3/09/22	lun 5/09/22	100%
9	1.6	131. Informe de Fumigacion	1 día	lun 12/09/22	mar 13/09/22	100%
10	**1.7**	**140. Entrega de Hojas de Vida Profesionales y Tecnic**	**1 día**	**vie 9/09/22**	**sáb 10/09/22**	**100%**
11	1.7.1	141. Aprobacion Hojas de Vida Profesionales	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	100%
12	1.8	150. Entrega de Planes	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	100%
13	1.9	Ajustes y aprobacion de planes	1 día	lun 12/09/22	mar 13/09/22	100%
14	**1.10**	**Reunión comité semanal**	**105 días**	**mié 31/08/22**	**mié 4/01/23**	**17%**
15	**1.10.1**	**Reunión comité semanal**	**105 días**	**mié 31/08/22**	**mié 4/01/23**	**21%**
16	1.10.1.1	Reunión comité semanal 1	1 día	mié 31/08/22	mié 31/08/22	100%
17	1.10.1.2	Reunión comité semanal 2	1 día	mié 7/09/22	mié 7/09/22	100%
18	1.10.1.3	Reunión comité semanal 3	1 día	mié 14/09/22	mié 14/09/22	100%
19	1.10.1.4	Reunión comité semanal 4	1 día	mié 21/09/22	mié 21/09/22	100%
20	1.10.1.5	Reunión comité semanal 5	1 día	mié 28/09/22	mié 28/09/22	0%
21	1.10.1.6	Reunión comité semanal 6	1 día	mié 5/10/22	mié 5/10/22	0%




Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
22	1.10.1.7	Reunión comité semanal 7	1 día	mié 12/10/22	mié 12/10/22	0%
23	1.10.1.8	Reunión comité semanal 8	1 día	mié 19/10/22	mié 19/10/22	0%
24	1.10.1.9	Reunión comité semanal 9	1 día	mié 26/10/22	mié 26/10/22	0%
25	1.10.1.10	Reunión comité semanal 10	1 día	mié 2/11/22	mié 2/11/22	0%
26	1.10.1.11	Reunión comité semanal 11	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	0%
27	1.10.1.12	Reunión comité semanal 12	1 día	mié 16/11/22	mié 16/11/22	0%
28	1.10.1.13	Reunión comité semanal 13	1 día	mié 23/11/22	mié 23/11/22	0%
29	1.10.1.14	Reunión comité semanal 14	1 día	mié 30/11/22	mié 30/11/22	0%
30	1.10.1.15	Reunión comité semanal 15	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22	0%
31	1.10.1.16	Reunión comité semanal 16	1 día	mié 14/12/22	mié 14/12/22	0%
32	1.10.1.17	Reunión comité semanal 17	1 día	mié 21/12/22	mié 21/12/22	0%
33	1.10.1.18	Reunión comité semanal 18	1 día	mié 28/12/22	mié 28/12/22	0%
34	1.10.1.19	Reunión comité semanal 19	1 día	mié 4/01/23	mié 4/01/23	0%
35	**1.10.2**	**Informe Mensual**	**75 días**	**vie 30/09/22**	**vie 30/12/22**	**0%**
36	1.10.2.1	Informe Mensual 1	1 día	vie 30/09/22	vie 30/09/22	0%
37	1.10.2.2	Informe Mensual 2	1 día	lun 31/10/22	lun 31/10/22	0%
38	1.10.2.3	Informe Mensual 3	1 día	mié 30/11/22	mié 30/11/22	0%
39	1.10.2.4	Informe Mensual 4	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%
40	**1.11**	**220. Inicio de punteo**	**30 días**	**lun 12/09/22**	**mar 18/10/22**	**28%**
41	1.11.1	221.Inicio de rotulacion codigo de barras	30 días	lun 12/09/22	lun 17/10/22	28%
42	1.11.2	223.Control de calidad de insercion y rotulacion	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%




Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
43	1.11.3	224.Implementacion del aplicativo	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
44	1.11.4	225.Inicio de grabacion para punteo	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
45	1.11.5	226.Limpieza Superficial con aspiradora	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
46	1.11.6	227.Conteo de folios	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
47	1.11.7	228.Punteo validacion expedientes y captura de foli	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
48	1.11.8	229.Control de calidad datos capturados en el aplic	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
49	**1.12**	**230. Inicio de Embalaje**	**30 días**	**lun 12/09/22**	**mar 18/10/22**	**28%**
50	1.12.1	231.Embalaje de las carpetas	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
51	1.12.2	232.Asignacion numero de paquete	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
52	1.12.3	233.Cierre de paquete con Sticker adhesivo y/o pre	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
53	1.12.4	234.Ubicacion unidades de almacemaniento en sitio	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
54	1.12.5	235.Validacion informacion por parte de la supervis	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
55	1.12.6	236.Toma de registro fotografico	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
56	1.12.7	237.Generacion de acta	30 días	lun 12/09/22	mar 18/10/22	28%
57	1.12.8	Desmonte puestos de trabajo	2 días	vie 14/10/22	lun 17/10/22	0%
58	1.12.9	Acta de devolucion espacios de trabajo a satisfacior	0 días	mar 18/10/22	mar 18/10/22	0%
59	**1.13**	**250. Cargue**	**3,38 días**	**mié 12/10/22**	**lun 17/10/22**	**0%**
60	1.13.1	251. Envio protocolo de cargue y descargue	1 día	mié 12/10/22	jue 13/10/22	0%
61	1.13.2	252. Aprobacion protocolo cargue y descargue	0 días	mié 12/10/22	mié 12/10/22	0%
62	1.13.3	253. Inicio de grabacion cargue	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
63	1.13.4	254. Inicio grabacion interior del camio	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
64	1.13.5	255. Registro fotografico del cargue y al interior del	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
65	1.13.6	256. Cargue de cajas al camion	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
66	1.13.7	257. Toma de registro fotografico finalizacion del ca	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
67	1.13.8	258. Cierre de camion con presinto	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
68	1.13.9	259.Toma de registro fotografico con escoltas y con	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
69	1.14	260. Seguimiento ruta de camion por GPS	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
70	**1.15**	**280. Llegada y descargue camion bogota**	**25,38 días**	**mié 12/10/22**	**lun 14/11/22**	**0%**
71	1.15.1	281. Inicio grabacion interior del camion	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
72	1.15.2	282. Registro fotografico	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
73	1.15.3	283. Apertura del presinto	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
74	1.15.4	284. Registro fotografico al interior del camion	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
75	1.15.5	285. Descargue unidades de conservacion en estiba	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
76	1.15.6	286. Verificacion por parte de la interventoria	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
77	1.15.7	287. Generacion de acta de llegada	4 días	mié 12/10/22	lun 17/10/22	0%
78	**1.16**	**Ubicacion**	**25,38 días**	**mié 12/10/22**	**lun 14/11/22**	**0%**
79	1.16.1	Ubicacion en estanteria unidades de conservacion	4 días	mar 18/10/22	vie 21/10/22	0%
80	1.17	Entrega de diagnóstico en conservación preventiva.	0 días	lun 10/10/22	lun 10/10/22	0%
81	**1.18**	**Entrega de Plan de intervención en conservación.**	**1 día**	**lun 3/10/22**	**mar 4/10/22**	**0%**
82	1.18.1	Capacitacion en conservacion preventiva	1 día	lun 3/10/22	mar 4/10/22	0%
83	**1.19**	**Procesamiento de Archivos Misionales**	**83 días**	**lun 26/09/22**	**jue 5/01/23**	**0%**
84	1.19.1	Insercion Documentacion	41 días	jue 13/10/22	sáb 3/12/22	0%



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
85	1.19.2	Solicitud mesa de trabajo interventoria definicion d	1,38 días	lun 26/09/22	mar 27/09/22	0%
86	1.19.3	Firma de acta definicion de parametros organizació	1 día	lun 26/09/22	mar 27/09/22	0%
87	1.19.4	Capacitacion grupo de trabajo parametros de organ	1 día	jue 13/10/22	vie 14/10/22	0%
88	1.19.5	Clasificación Documental	65 días	mar 18/10/22	jue 5/01/23	0%
89	1.19.6	Ordenación Documental	65 días	mar 18/10/22	jue 5/01/23	0%
90	1.19.7	Depuración Documental	65 días	mar 18/10/22	jue 5/01/23	0%
91	1.19.8	Primeros Auxilios	65 días	mar 18/10/22	jue 5/01/23	0%
92	1.19.9	Foliación	65 días	mar 18/10/22	jue 5/01/23	0%
93	**1.20**	**Control de calidad procesos de organización y Foliaci**	**69 días**	**vie 14/10/22**	**vie 6/01/23**	**0%**
94	1.20.1	Control de calidad procesos de organización 1	1 día	vie 14/10/22	vie 14/10/22	0%
95	1.20.2	Control de calidad procesos de organización 2	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	0%
96	1.20.3	Control de calidad procesos de organización 3	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%
97	1.20.4	Control de calidad procesos de organización 4	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	0%
98	1.20.5	Control de calidad procesos de organización 5	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	0%
99	1.20.6	Control de calidad procesos de organización 6	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	0%
100	1.20.7	Control de calidad procesos de organización 7	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	0%
101	1.20.8	Control de calidad procesos de organización 8	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%
102	1.20.9	Control de calidad procesos de organización 9	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%
103	1.20.10	Control de calidad procesos de organización 10	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0%
104	1.20.11	Control de calidad procesos de organización 11	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	0%
105	1.20.12	Control de calidad procesos de organización 12	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%




Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
106	1.20.13	Control de calidad procesos de organización 13	1 día	vie 6/01/23	vie 6/01/23	0%
107	1.21	Digitalización	60 días	vie 14/10/22	mar 27/12/22	0%
108	**1.22**	**Indexacion**	**69 días**	**vie 14/10/22**	**vie 6/01/23**	**0%**
109	**1.22.1**	**Control calidad digitalizacion e indexacion**	**69 días**	**vie 14/10/22**	**vie 6/01/23**	**0%**
110	1.22.1.1	Control calidad digitalizacion e indexacion 1	1 día	vie 14/10/22	vie 14/10/22	0%
111	1.22.1.2	Control calidad digitalizacion e indexacion 2	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	0%
112	1.22.1.3	Control calidad digitalizacion e indexacion 3	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%
113	1.22.1.4	Control calidad digitalizacion e indexacion 4	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	0%
114	1.22.1.5	Control calidad digitalizacion e indexacion 5	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	0%
115	1.22.1.6	Control calidad digitalizacion e indexacion 6	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	0%
116	1.22.1.7	Control calidad digitalizacion e indexacion 7	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	0%
117	1.22.1.8	Control calidad digitalizacion e indexacion 8	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%
118	1.22.1.9	Control calidad digitalizacion e indexacion 9	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%
119	1.22.1.10	Control calidad digitalizacion e indexacion 10	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0%
120	1.22.1.11	Control calidad digitalizacion e indexacion 11	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	0%
121	1.22.1.12	Control calidad digitalizacion e indexacion 12	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%
122	1.22.1.13	Control calidad digitalizacion e indexacion 13	1 día	vie 6/01/23	vie 6/01/23	0%
123	1.23	Descripción Documental	60 días	lun 17/10/22	jue 29/12/22	0%
124	1.24	Generacion hojas de control	60 días	mar 18/10/22	jue 29/12/22	0%
125	1.25	Encarpetado	60 días	mar 18/10/22	jue 29/12/22	0%
126	1.26	Almacenamiento en unidades de conservacion	60 días	mar 18/10/22	jue 29/12/22	0%

ago '22 | 21 a
L M X J V S D

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
127	1.27	Rotulación de Cajas y Carpetas	60 días	mar 18/10/22	jue 29/12/22	0%
128	**1.28**	**Revision final Validación de FUID realmacenamiento**	**58 días**	**vie 21/10/22**	**vie 30/12/22**	**0%**
129	**1.28.1**	**Control de calidad Final FUID y embalaje**	**58 días**	**vie 21/10/22**	**vie 30/12/22**	**0%**
130	1.28.1.1	Control de calidad Final FUID y embalaje 1	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	0%
131	1.28.1.2	Control de calidad Final FUID y embalaje 2	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%
132	1.28.1.3	Control de calidad Final FUID y embalaje 3	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	0%
133	1.28.1.4	Control de calidad Final FUID y embalaje 4	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	0%
134	1.28.1.5	Control de calidad Final FUID y embalaje 5	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	0%
135	1.28.1.6	Control de calidad Final FUID y embalaje 6	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	0%
136	1.28.1.7	Control de calidad Final FUID y embalaje 7	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%
137	1.28.1.8	Control de calidad Final FUID y embalaje 8	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%
138	1.28.1.9	Control de calidad Final FUID y embalaje 9	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0%
139	1.28.1.10	Control de calidad Final FUID y embalaje 10	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	0%
140	1.28.1.11	Control de calidad Final FUID y embalaje 11	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%
141	1.29	Entrega para aprobación de la interventoria de 100 M	0 días	lun 24/10/22	lun 24/10/22	0%
142	1.30	Corrección y Ajustes 100 Metros Lineales	3 días	mar 25/10/22	jue 27/10/22	0%
143	1.31	Informe entrega de 100 Metros Lineales	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%
144	1.32	Entrega para aprobación de la interventoria de 1600 M	0 días	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%
145	1.33	Corrección y Ajustes 1600 Metros Lineales	3 días	sáb 3/12/22	mar 6/12/22	0%
146	1.34	Informe entrega de 1600 Metros Lineales	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%
147	1.35	Entrega para aprobación de la interventoria de 2941 M	0 días	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%


ago '22 | 21 a
L M X J V S D




Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
148	1.36	Corrección y Ajustes 2941 Metros Lineales	3 días	vie 30/12/22	lun 2/01/23	0%
149	1.37	Informe entrega de 2941 Metros Lineales	0 días	mar 3/01/23	mar 3/01/23	0%
150	1.38	Custodia de la documentacion por seis meses	69 días	mié 12/10/22	jue 5/01/23	0%
151	**1.39**	**cierre del proyecto**	**0 días**	**sáb 7/01/23**	**sáb 7/01/23**	**0%**
152	1.39.1	Firma de cierre del proyecto	0 días	sáb 7/01/23	sáb 7/01/23	0%


ago '22 | 21 a
L M X J V S D



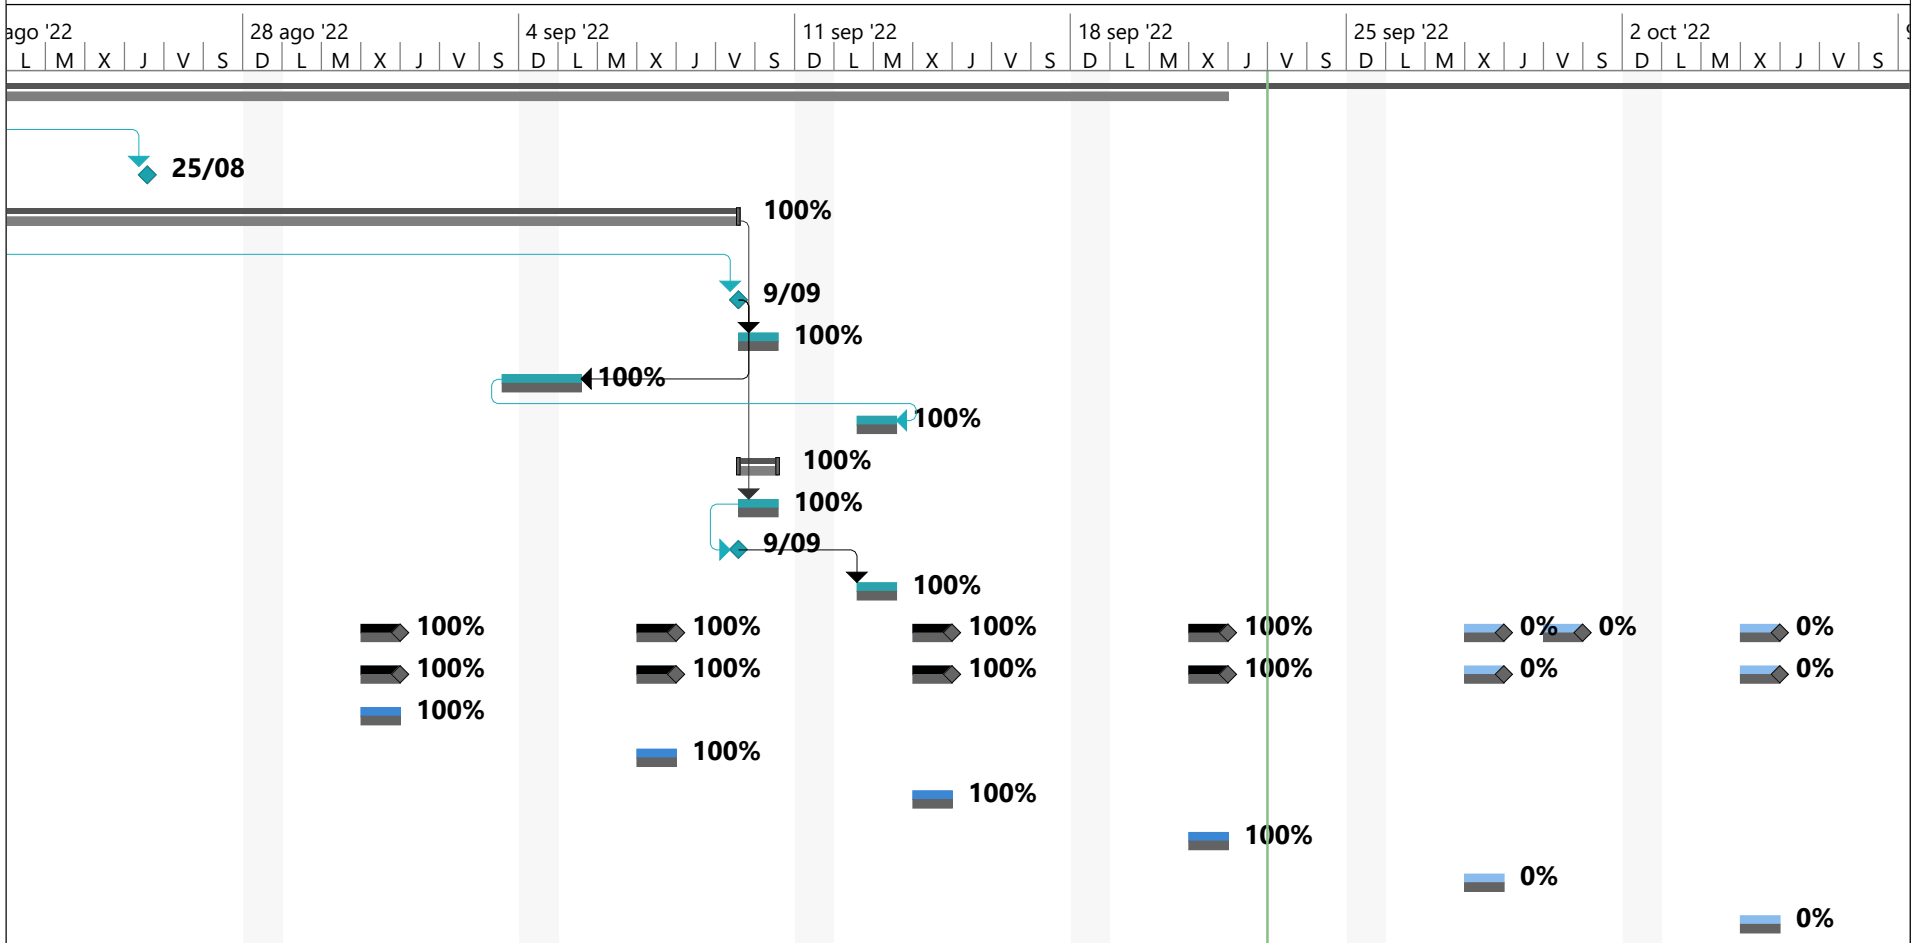


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

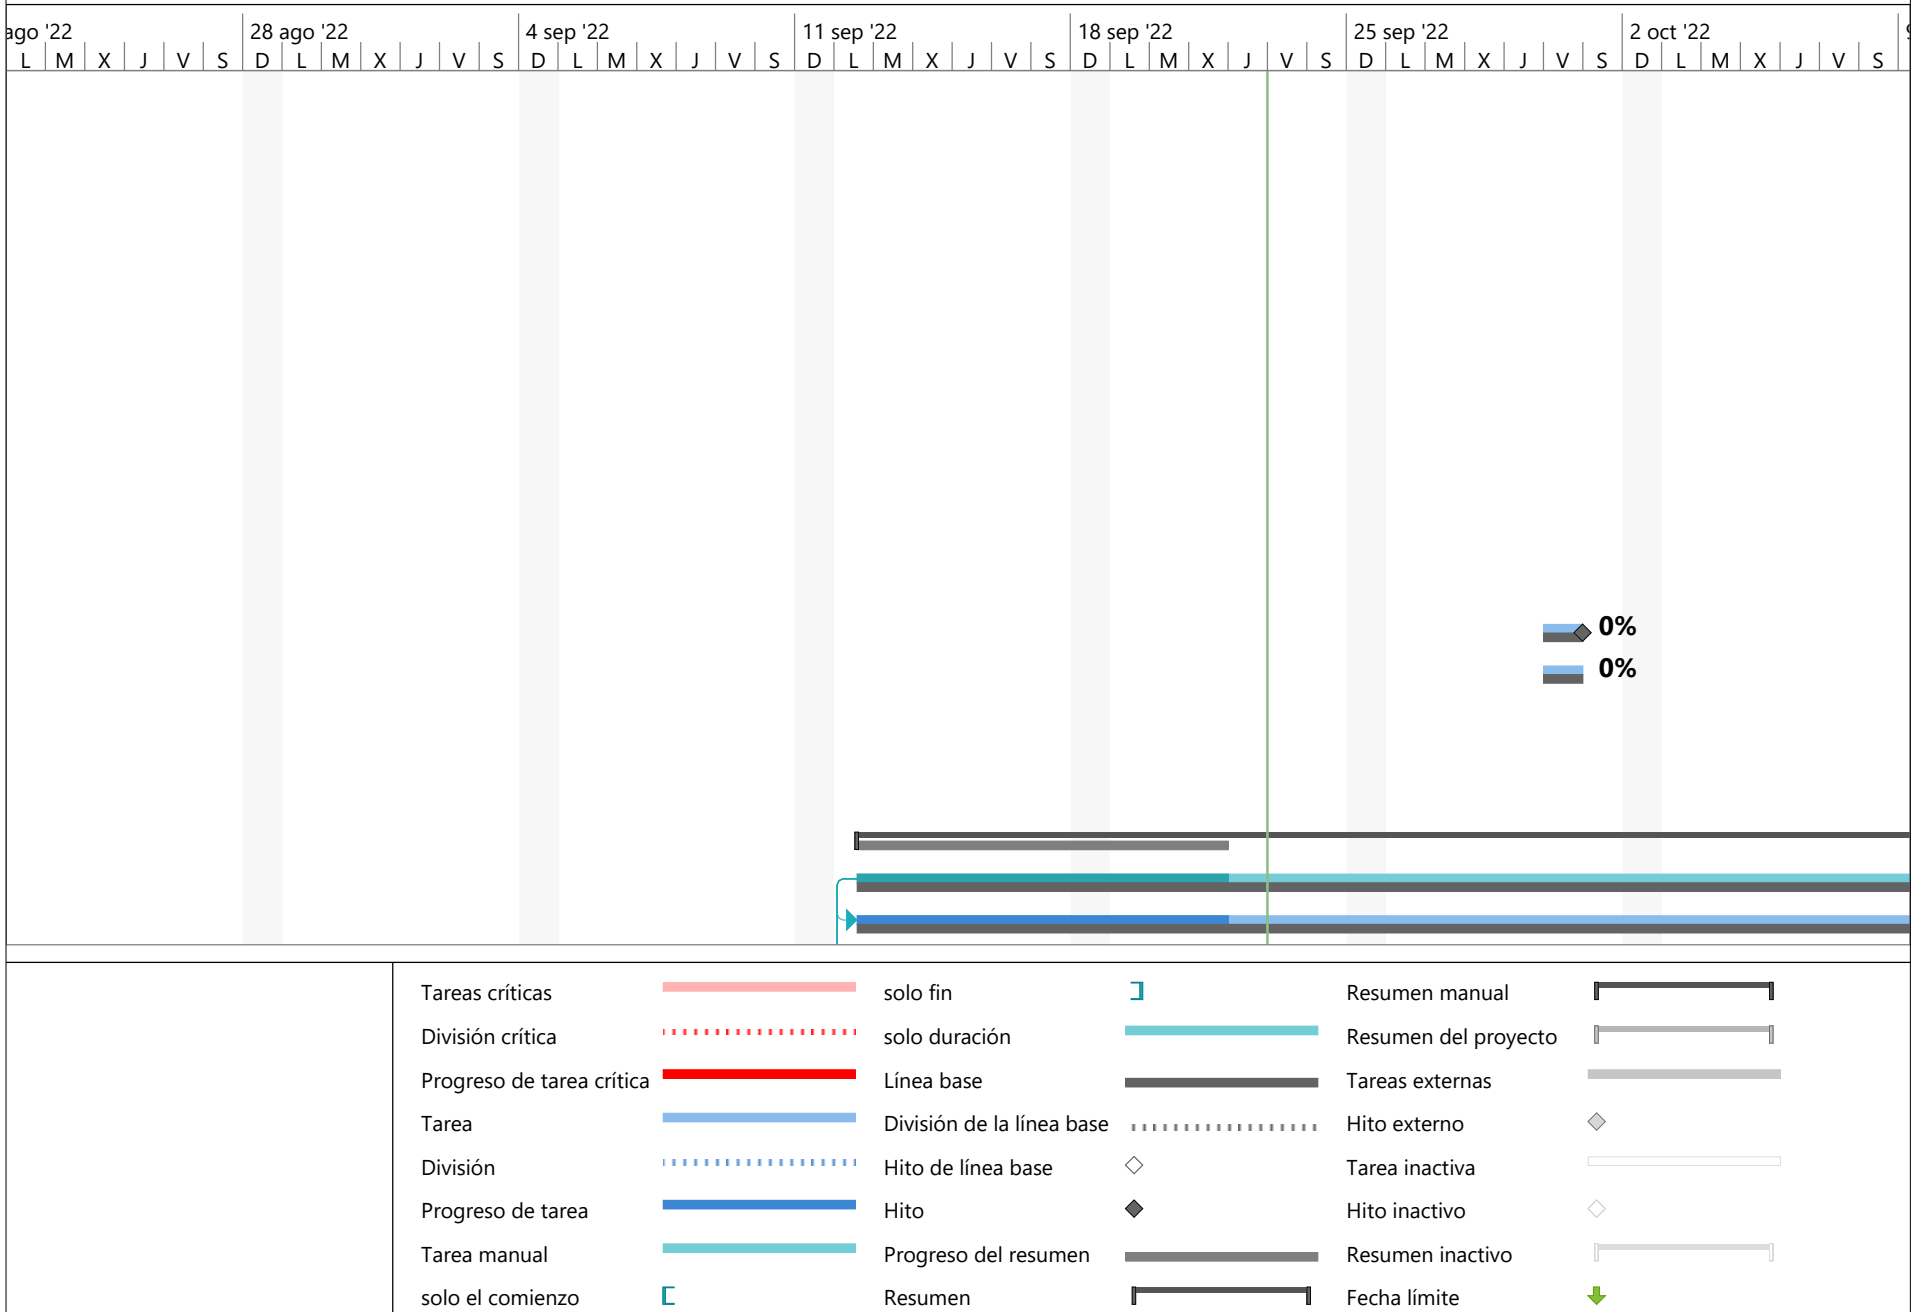

ago '22
28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

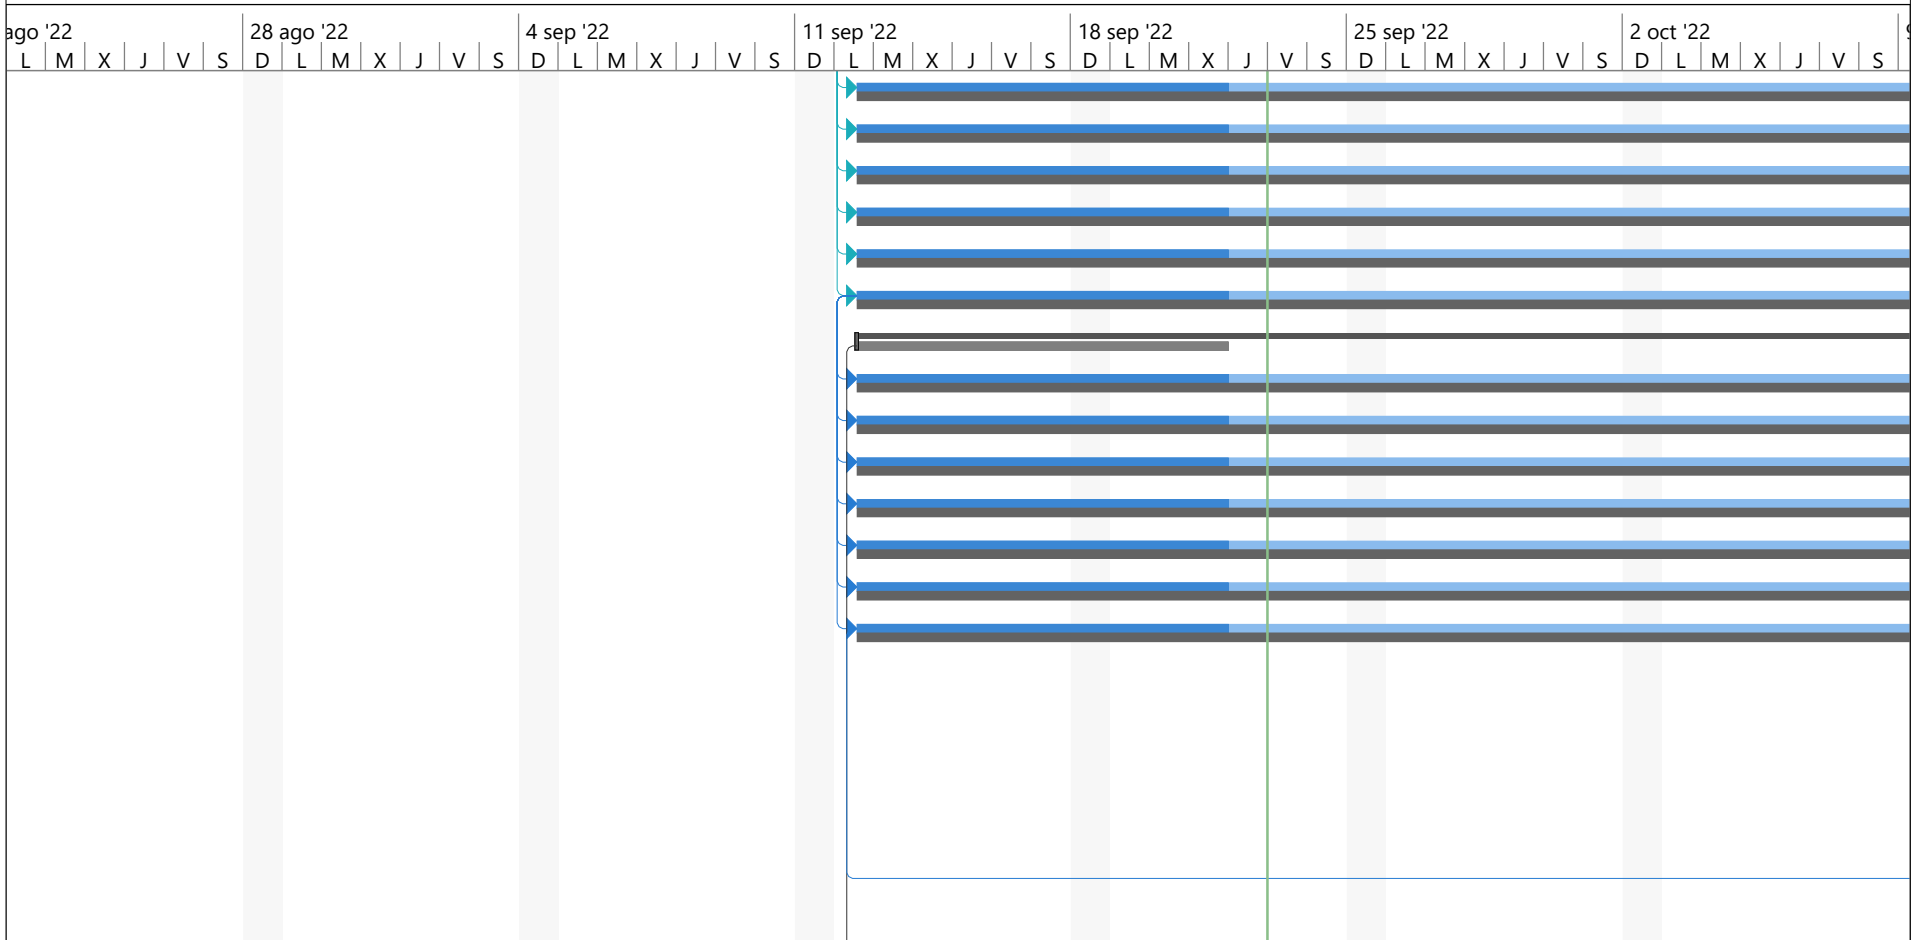



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

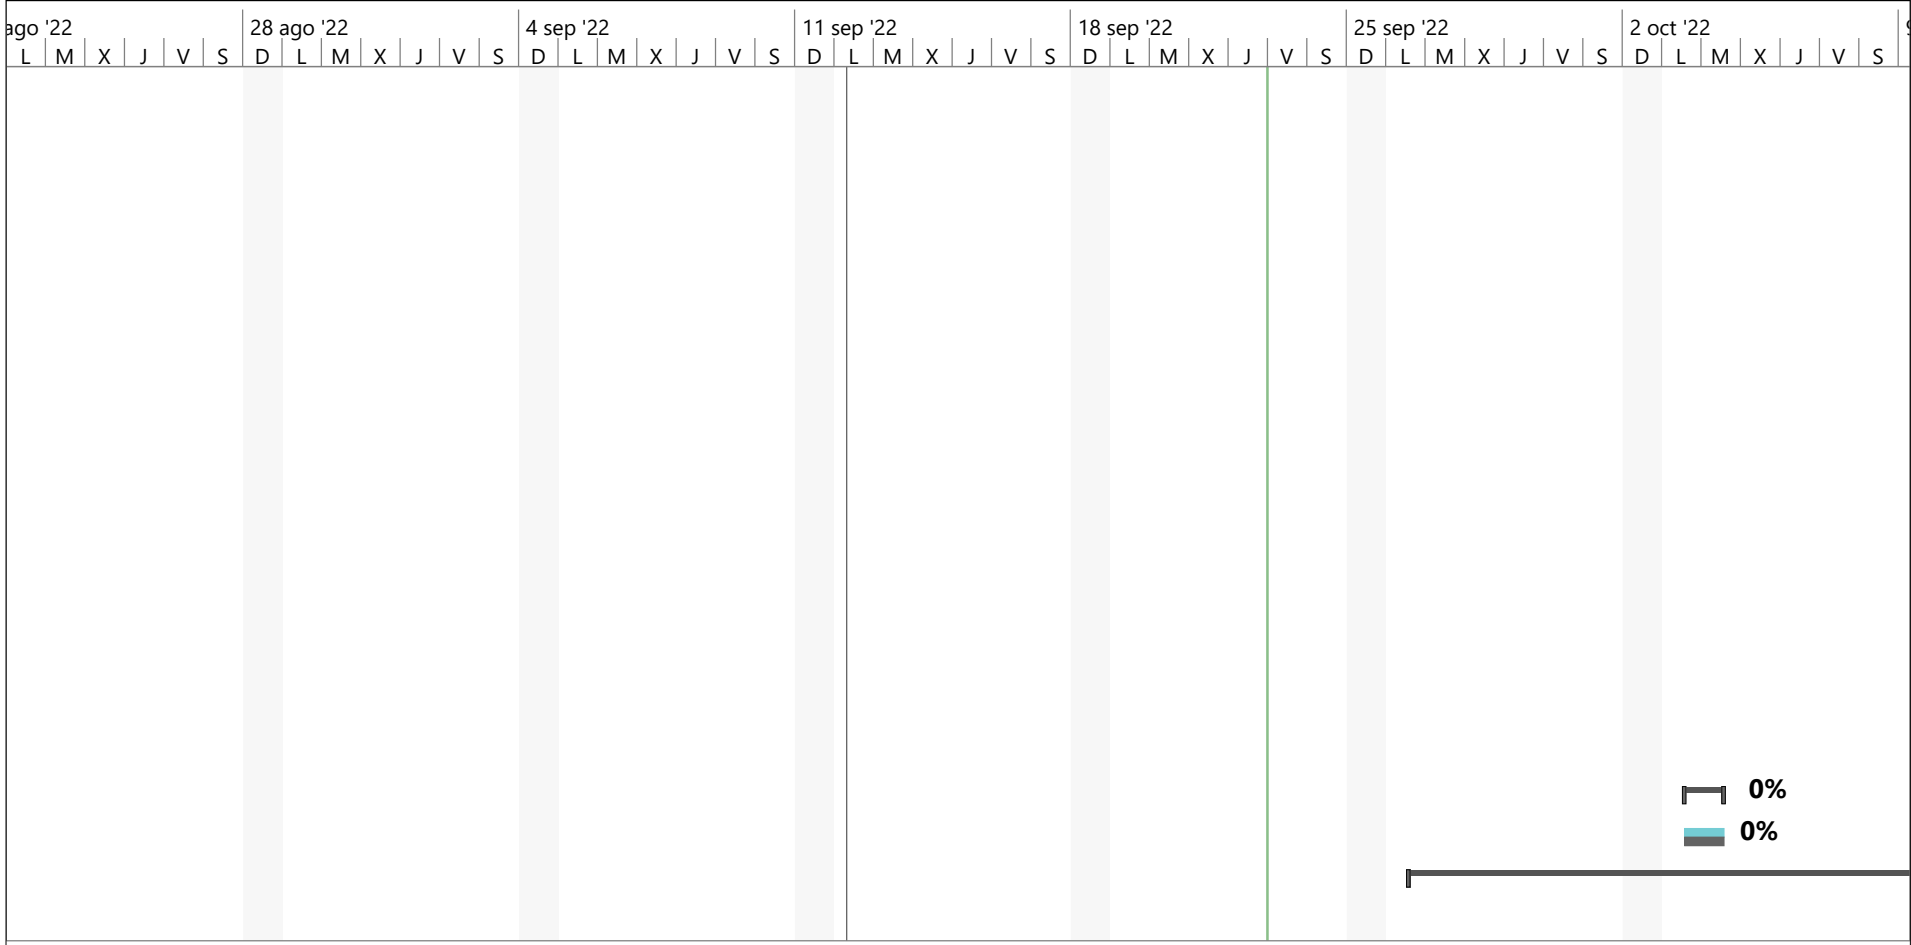


Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite

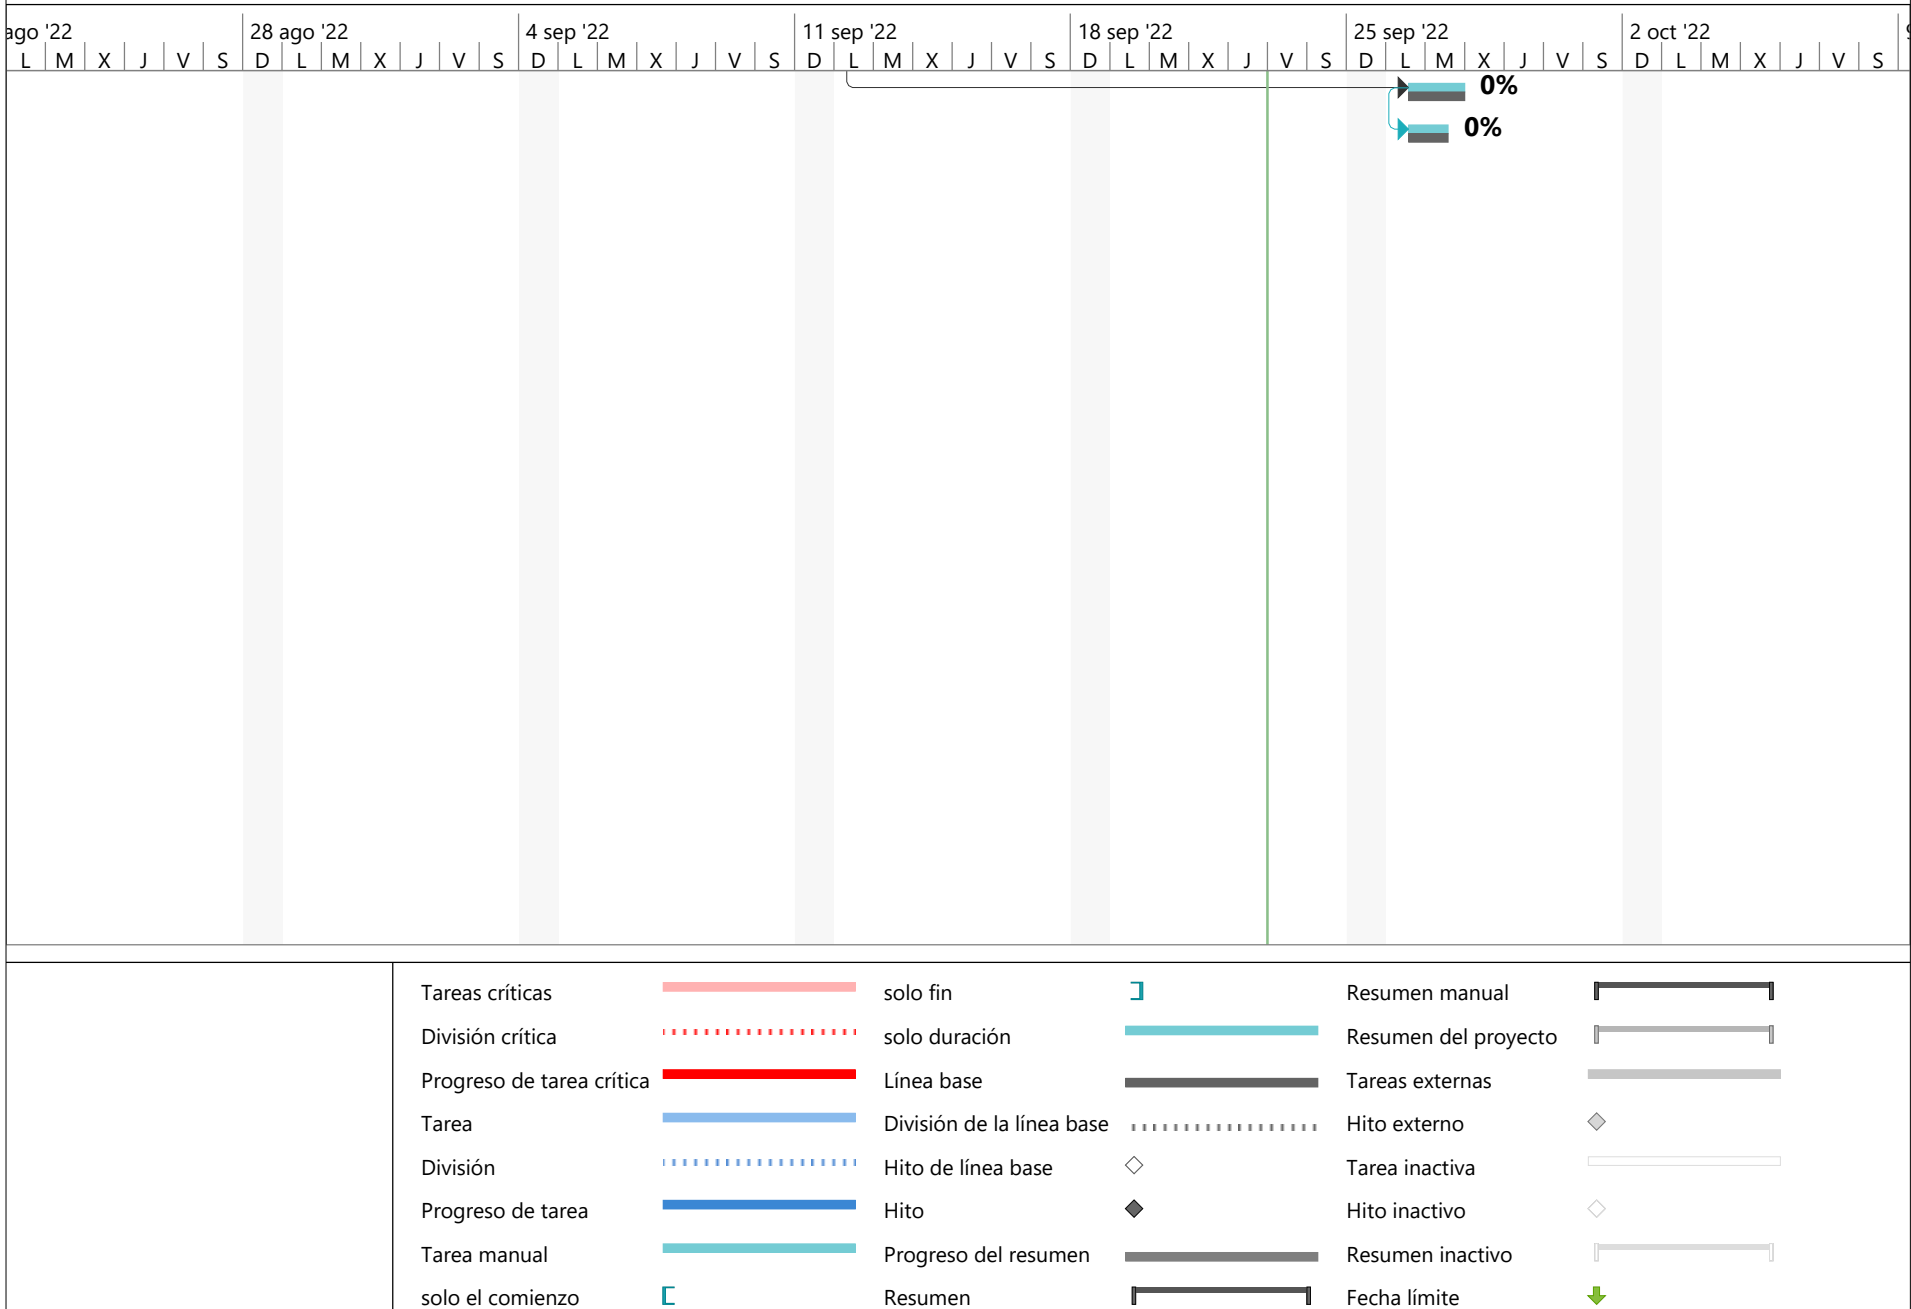

ago '22
28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

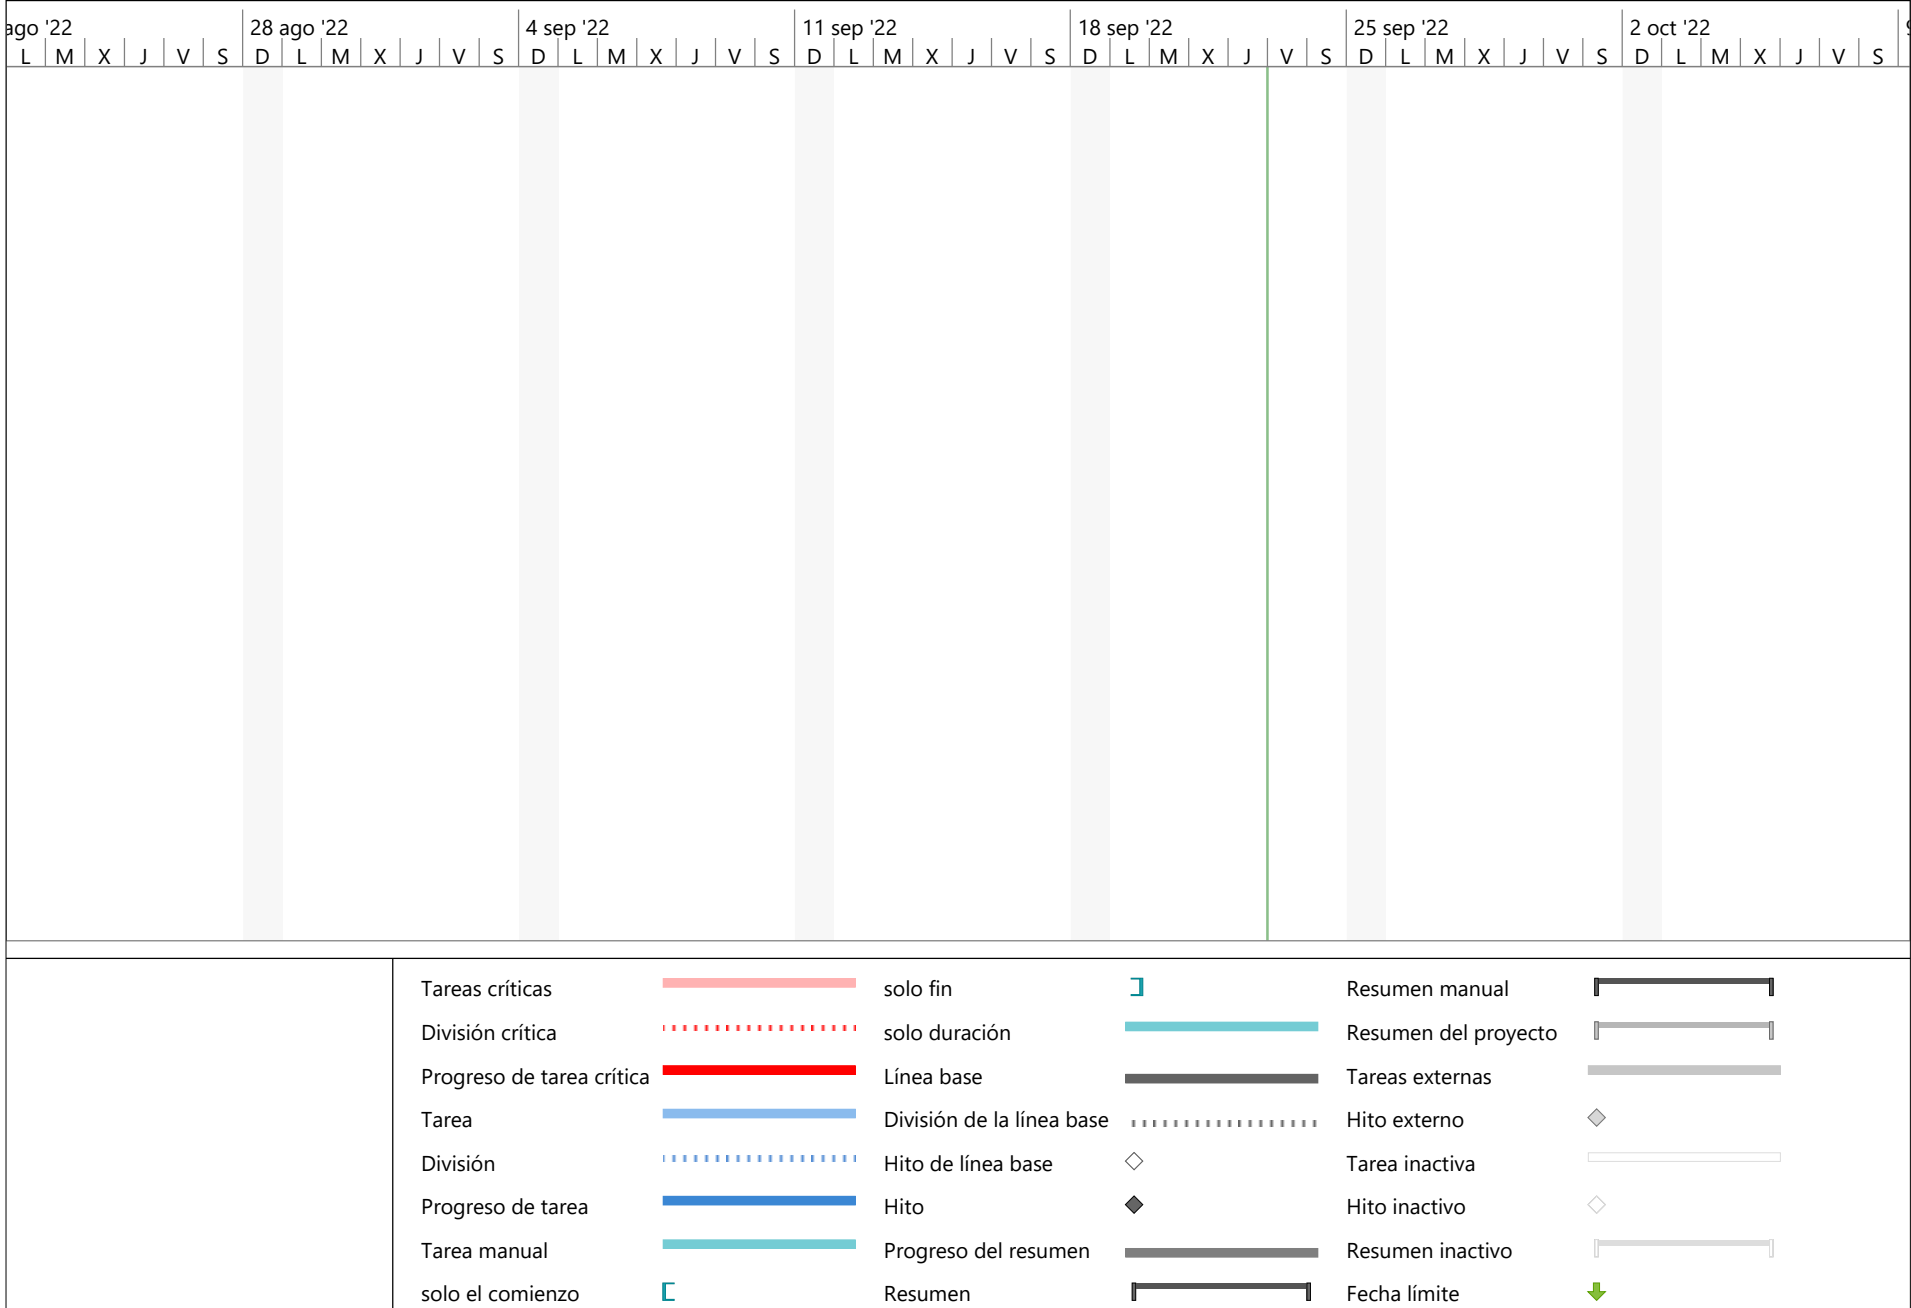

ago '22
28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

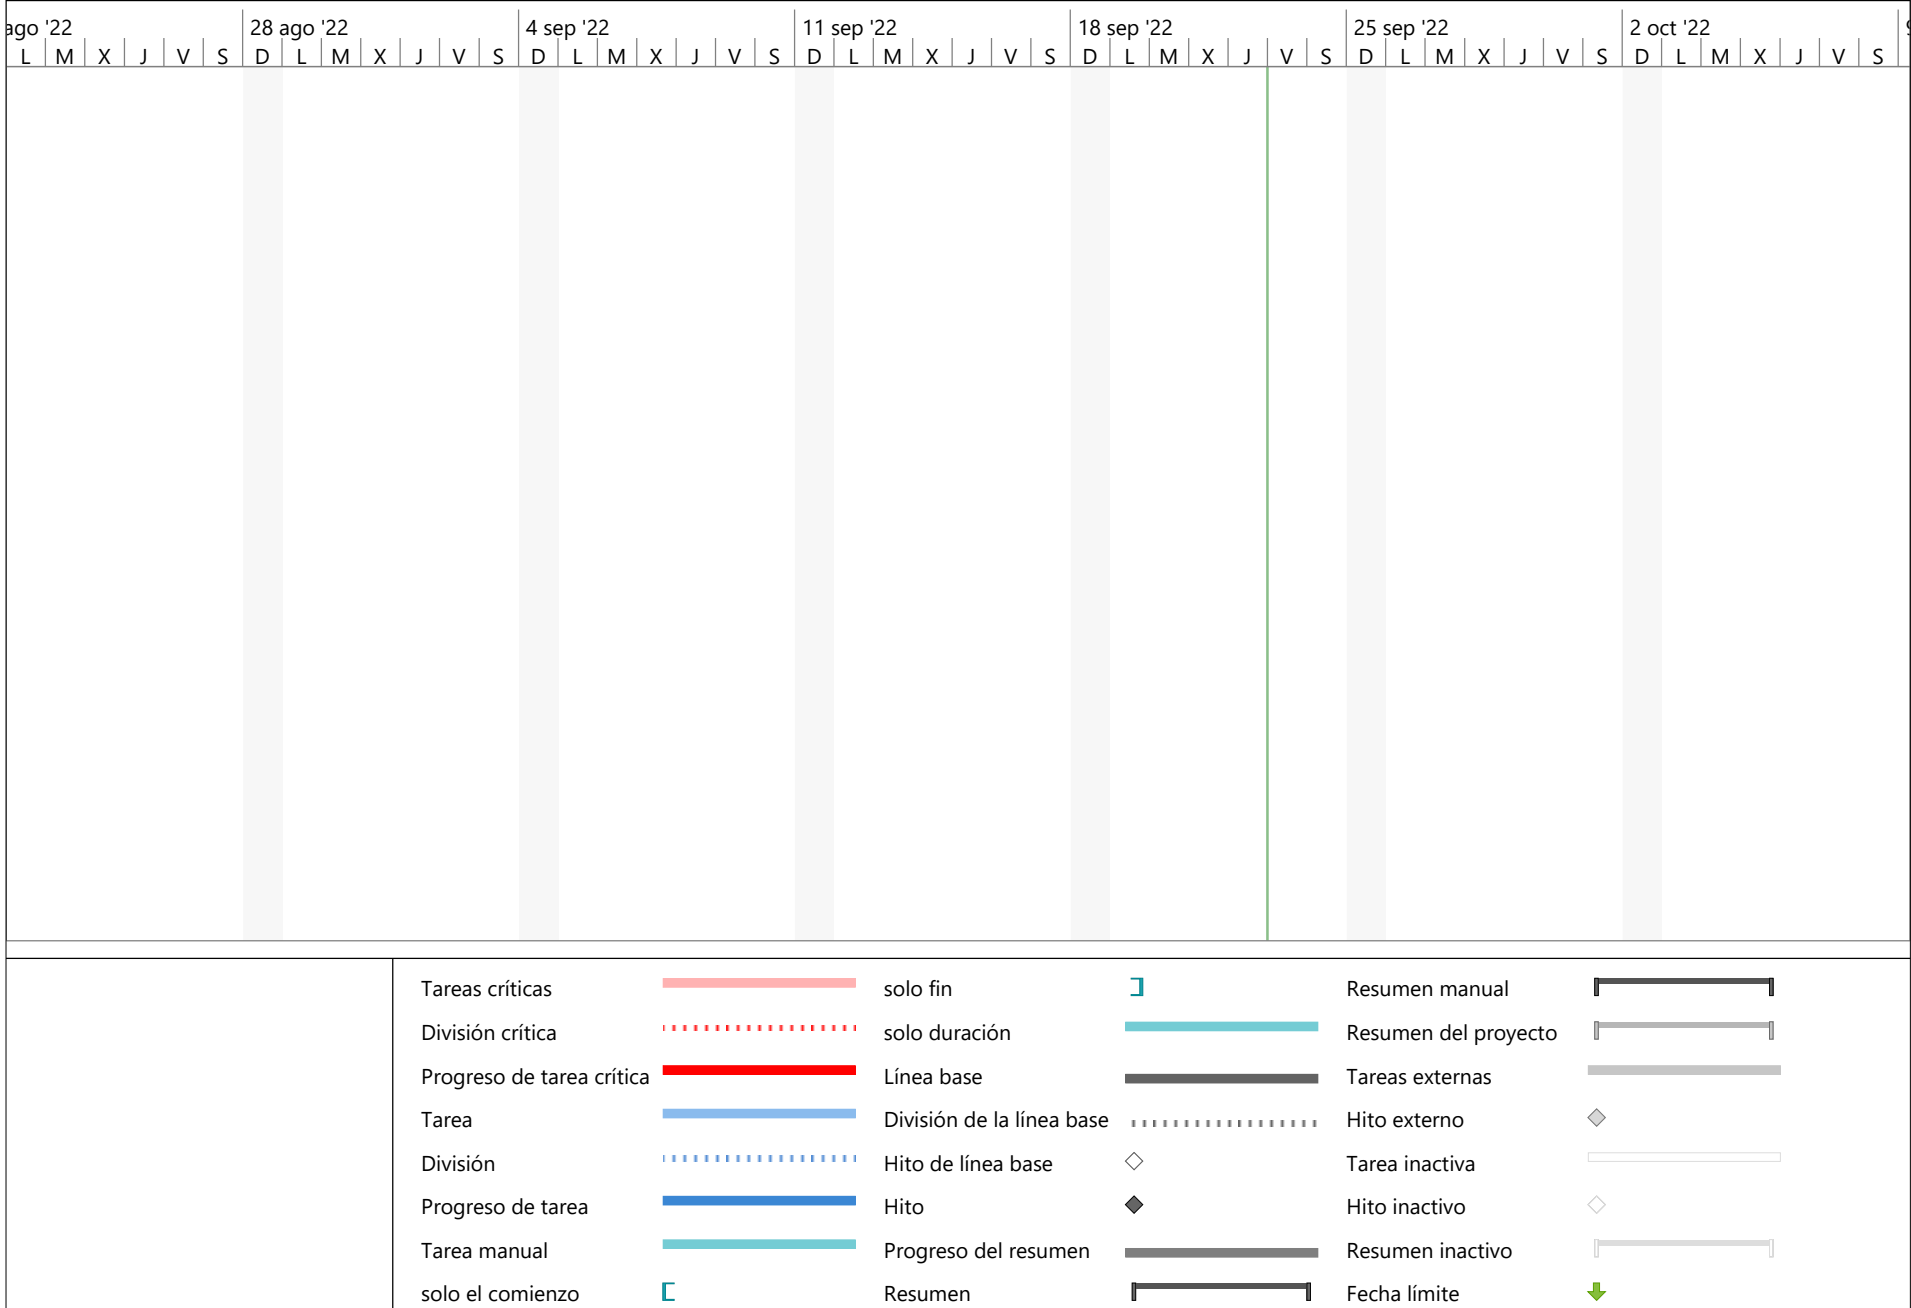

ago '22
28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

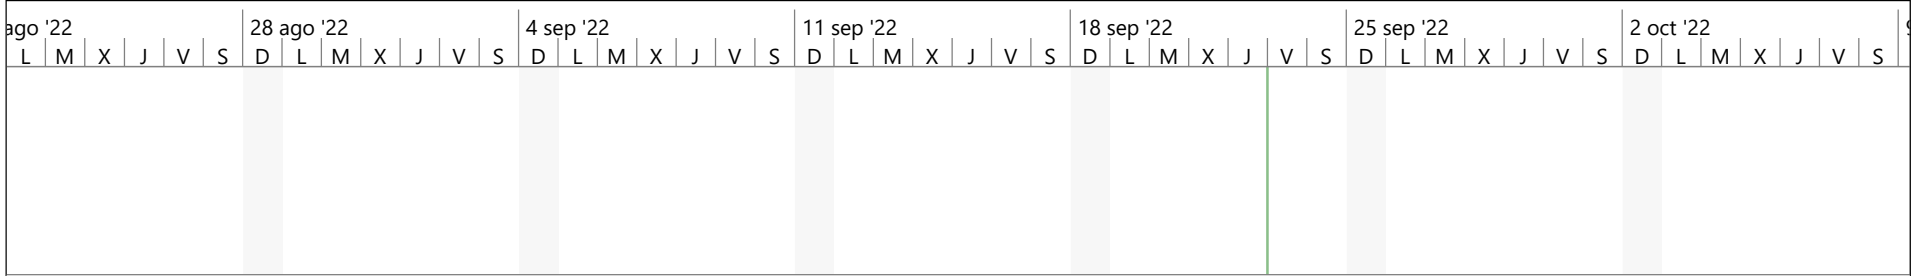


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

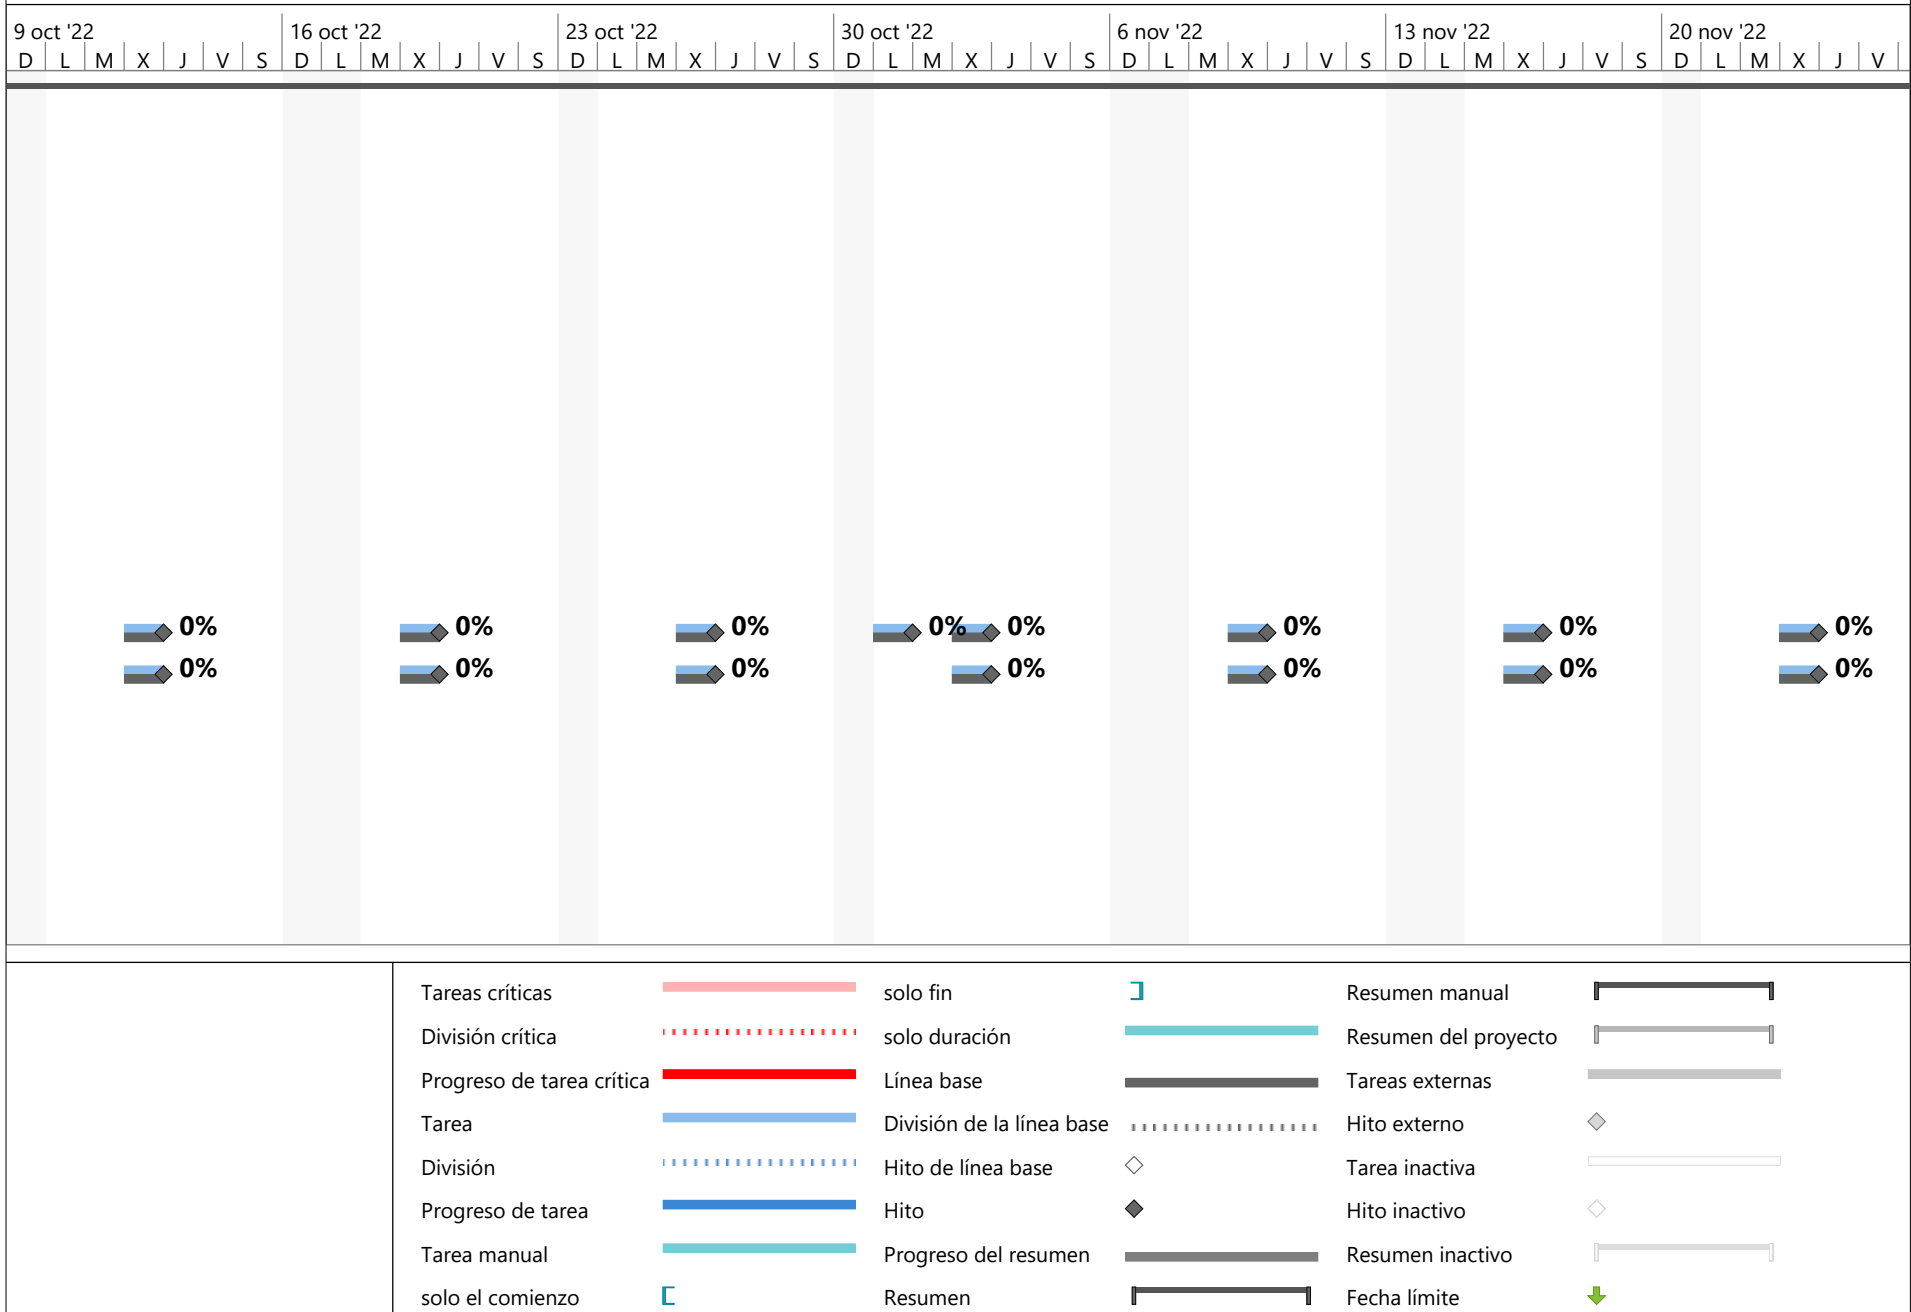
9 oct '22
D L M X J V S
16 oct '22
D L M X J V S
23 oct '22
D L M X J V S
30 oct '22
D L M X J V S
6 nov '22
D L M X J V S
13 nov '22
D L M X J V S
20 nov '22
D L M X J V
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

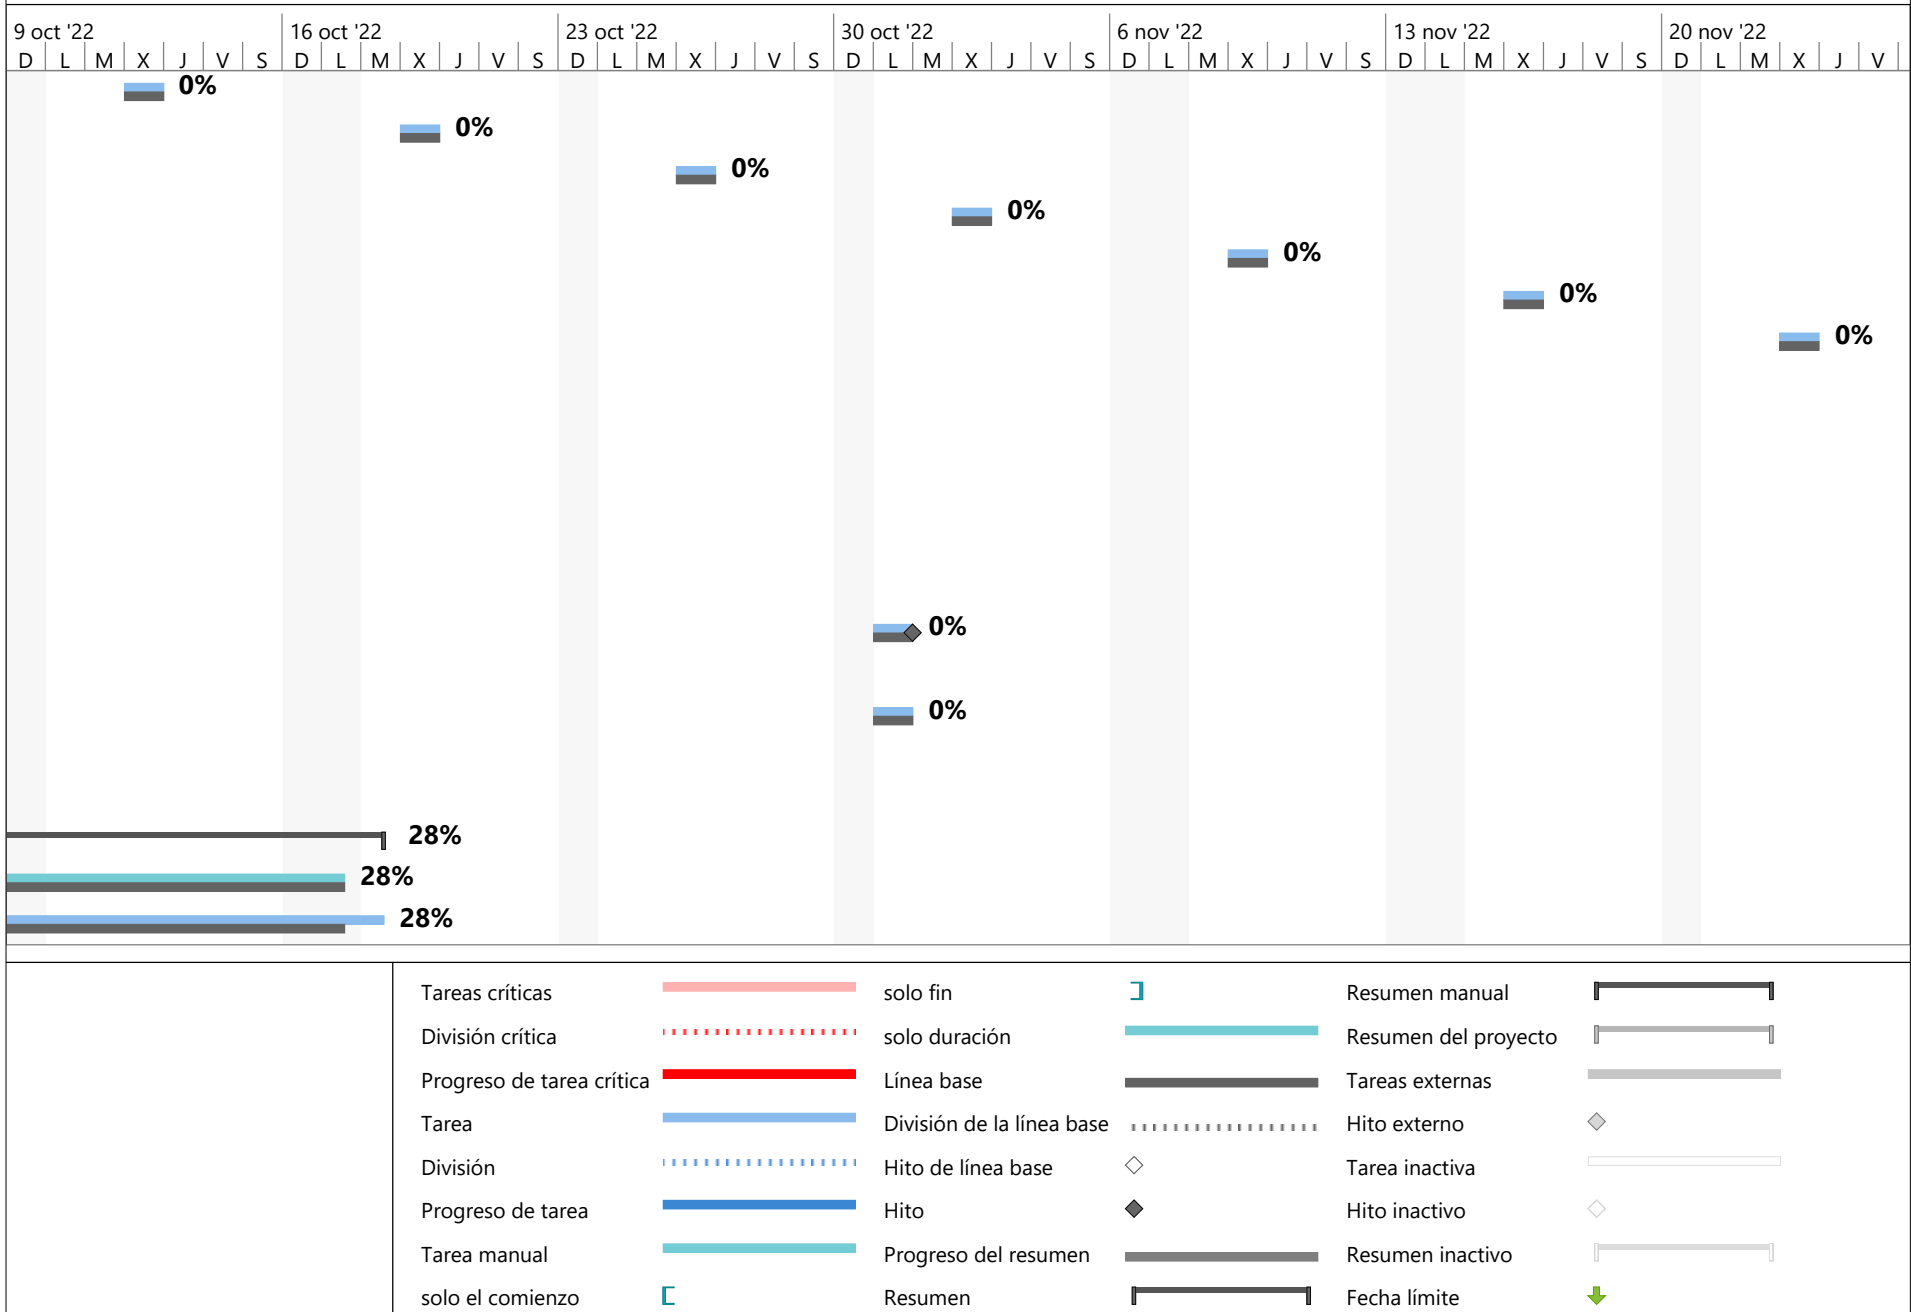

9 oct '22
16 oct '22
23 oct '22
30 oct '22
6 nov '22
13 nov '22
20 nov '22
D L M X J V S
0%
28%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

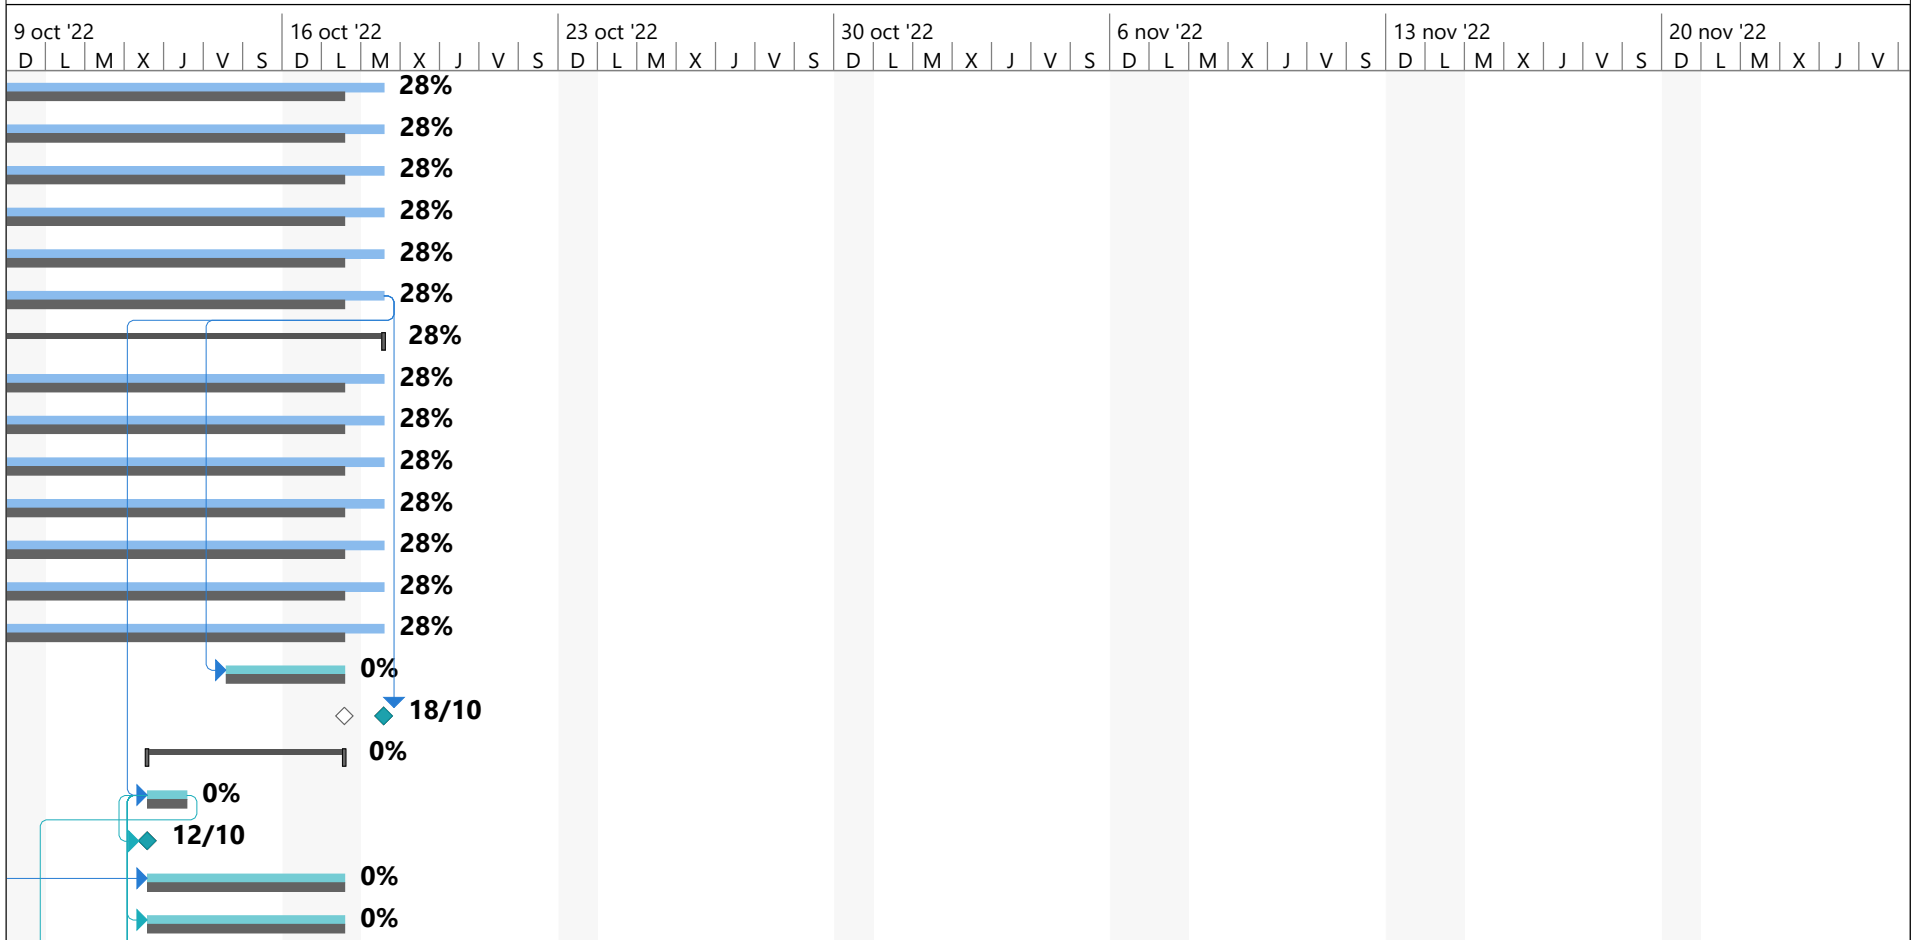


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

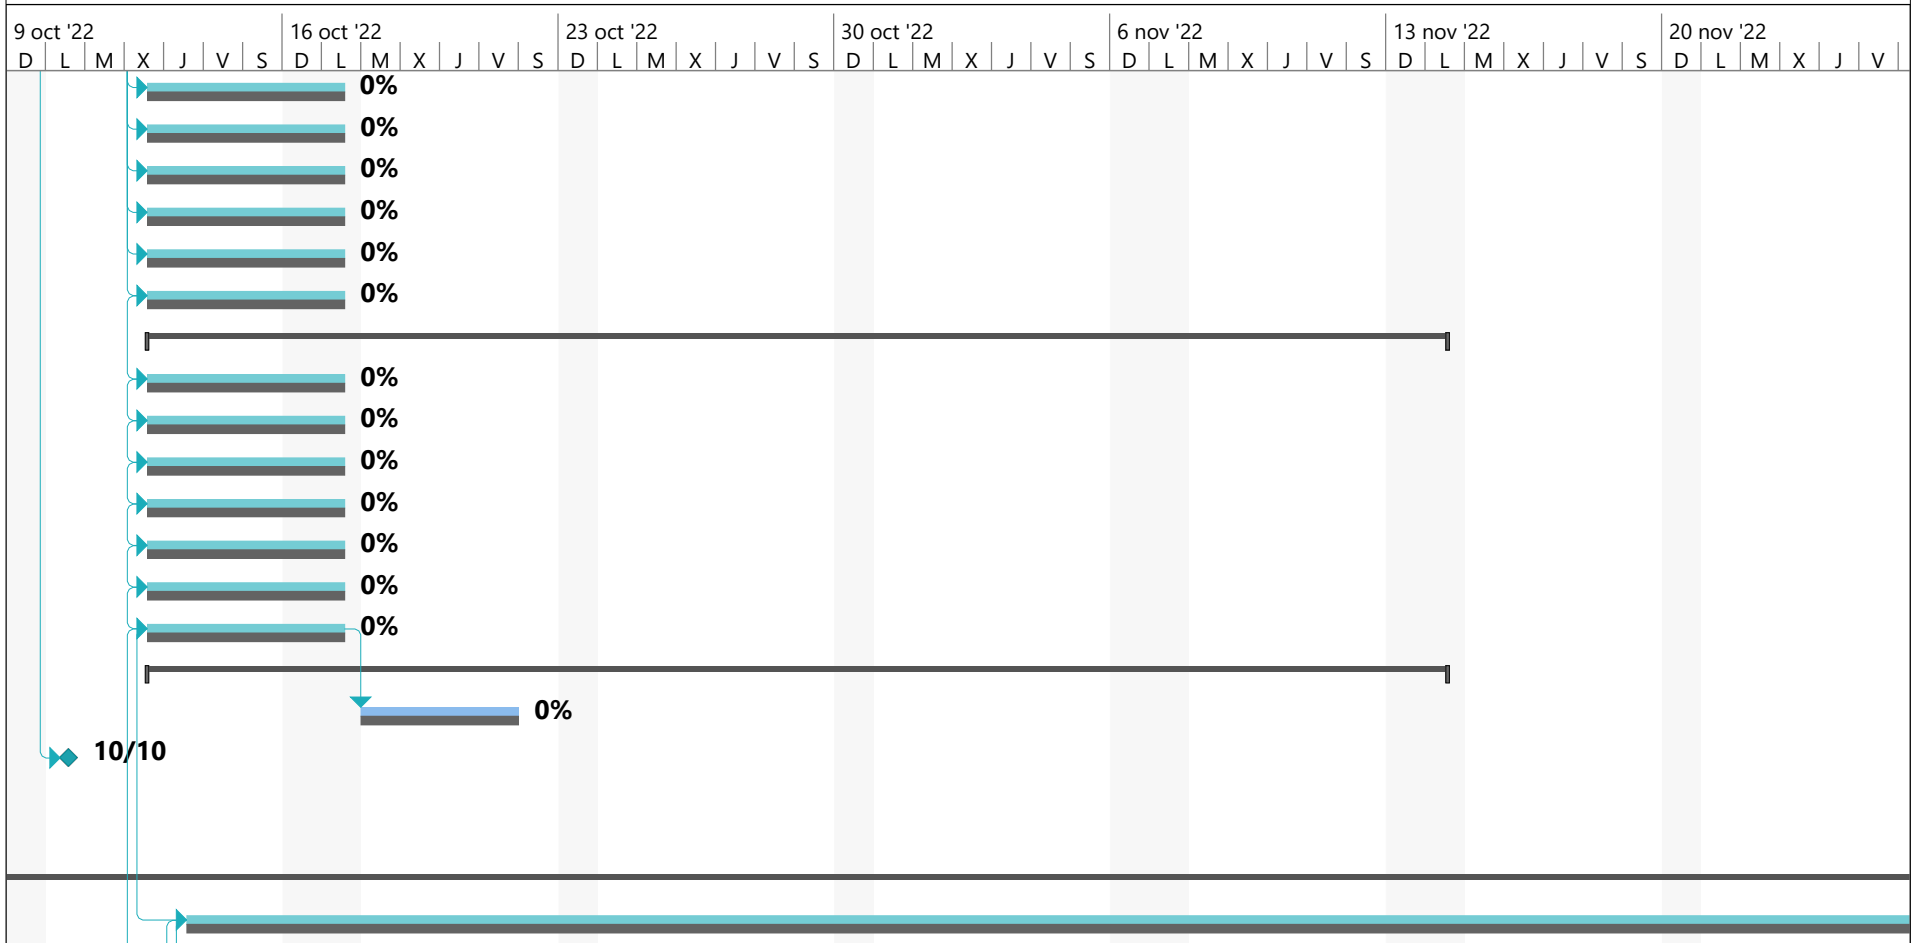


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

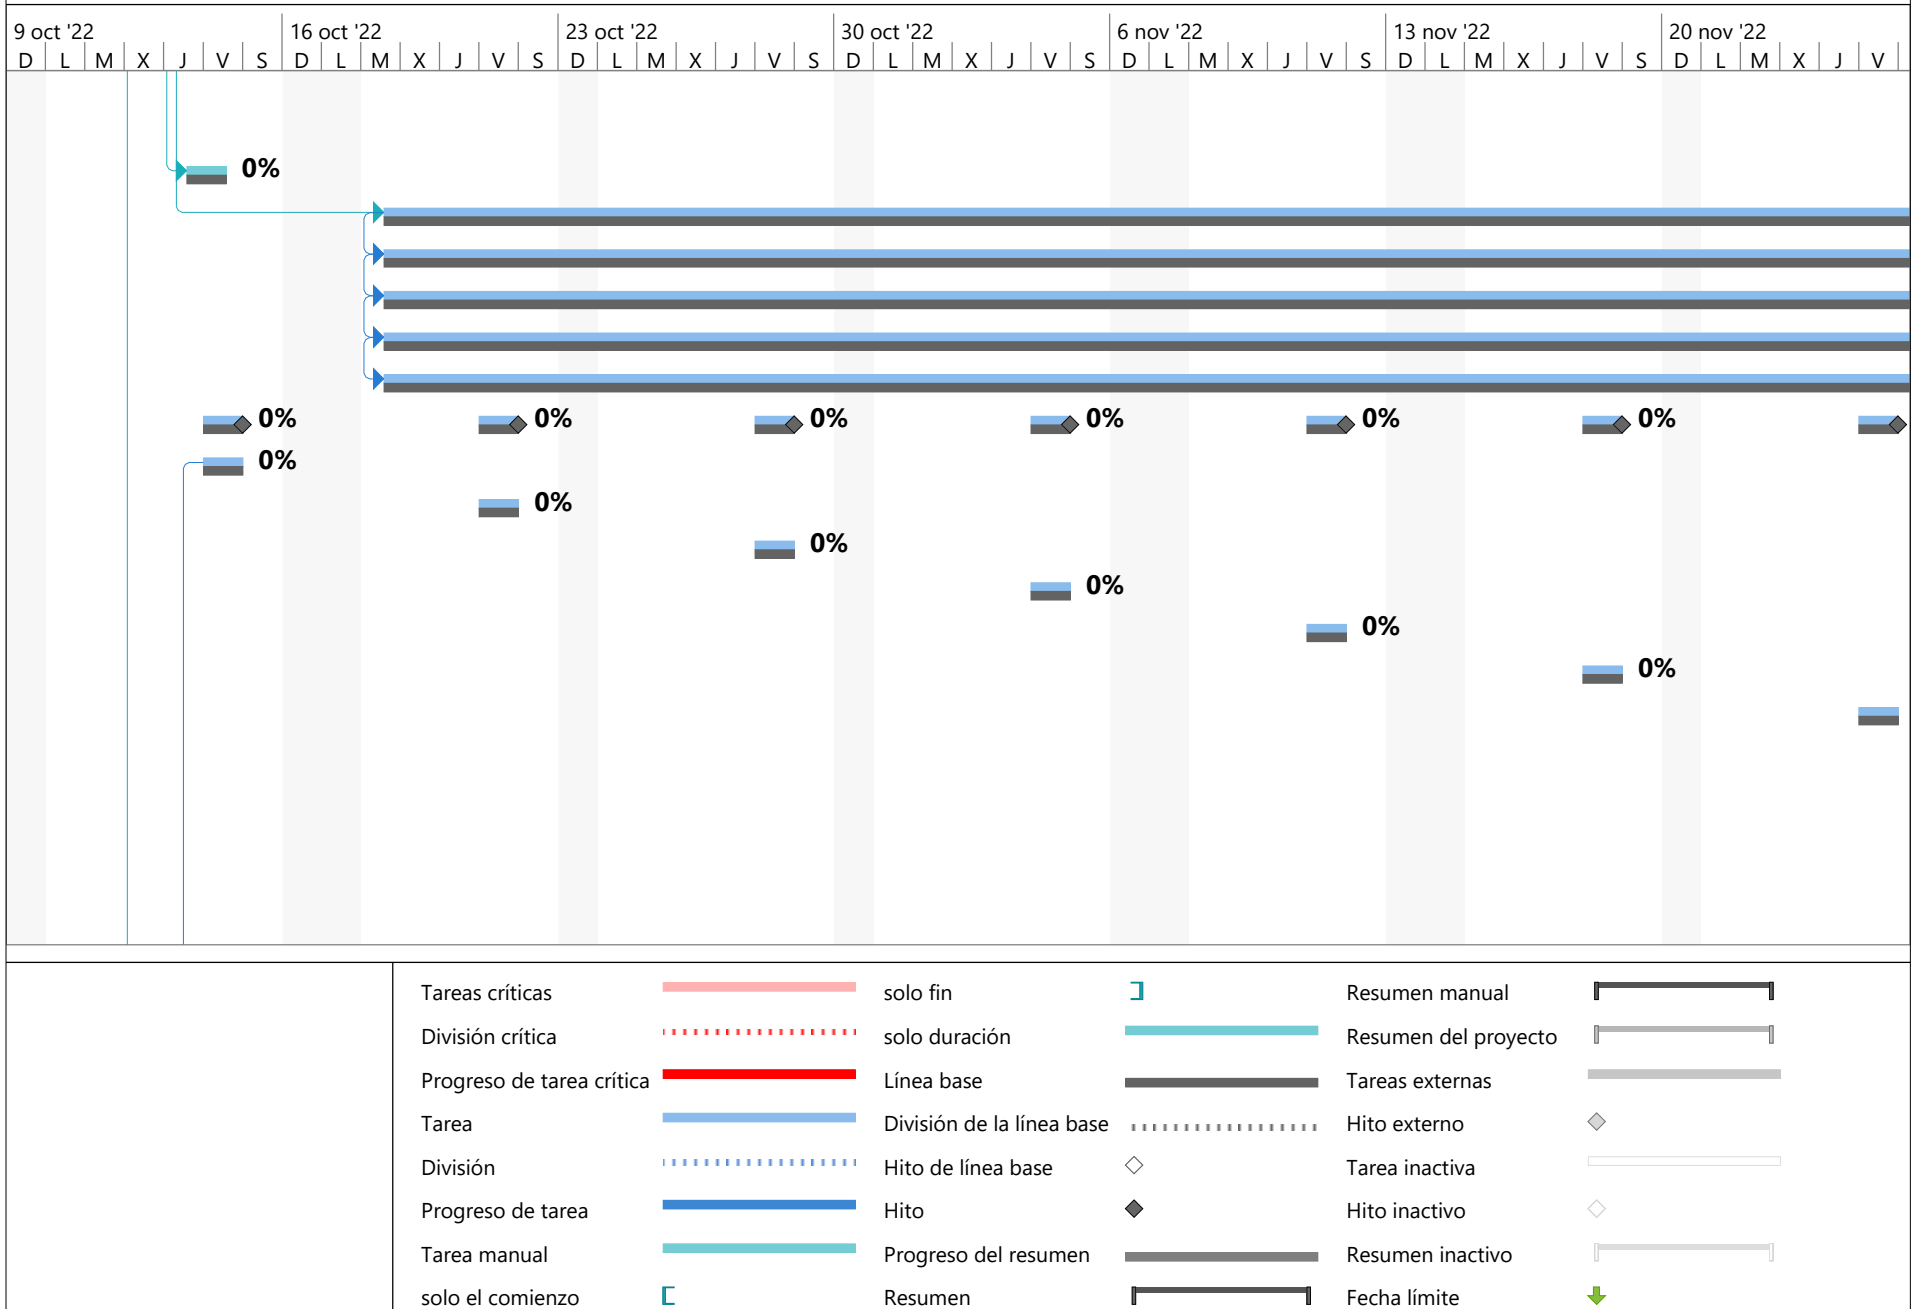

9 oct '22
16 oct '22
23 oct '22
30 oct '22
6 nov '22
13 nov '22
20 nov '22
D L M X J V S
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

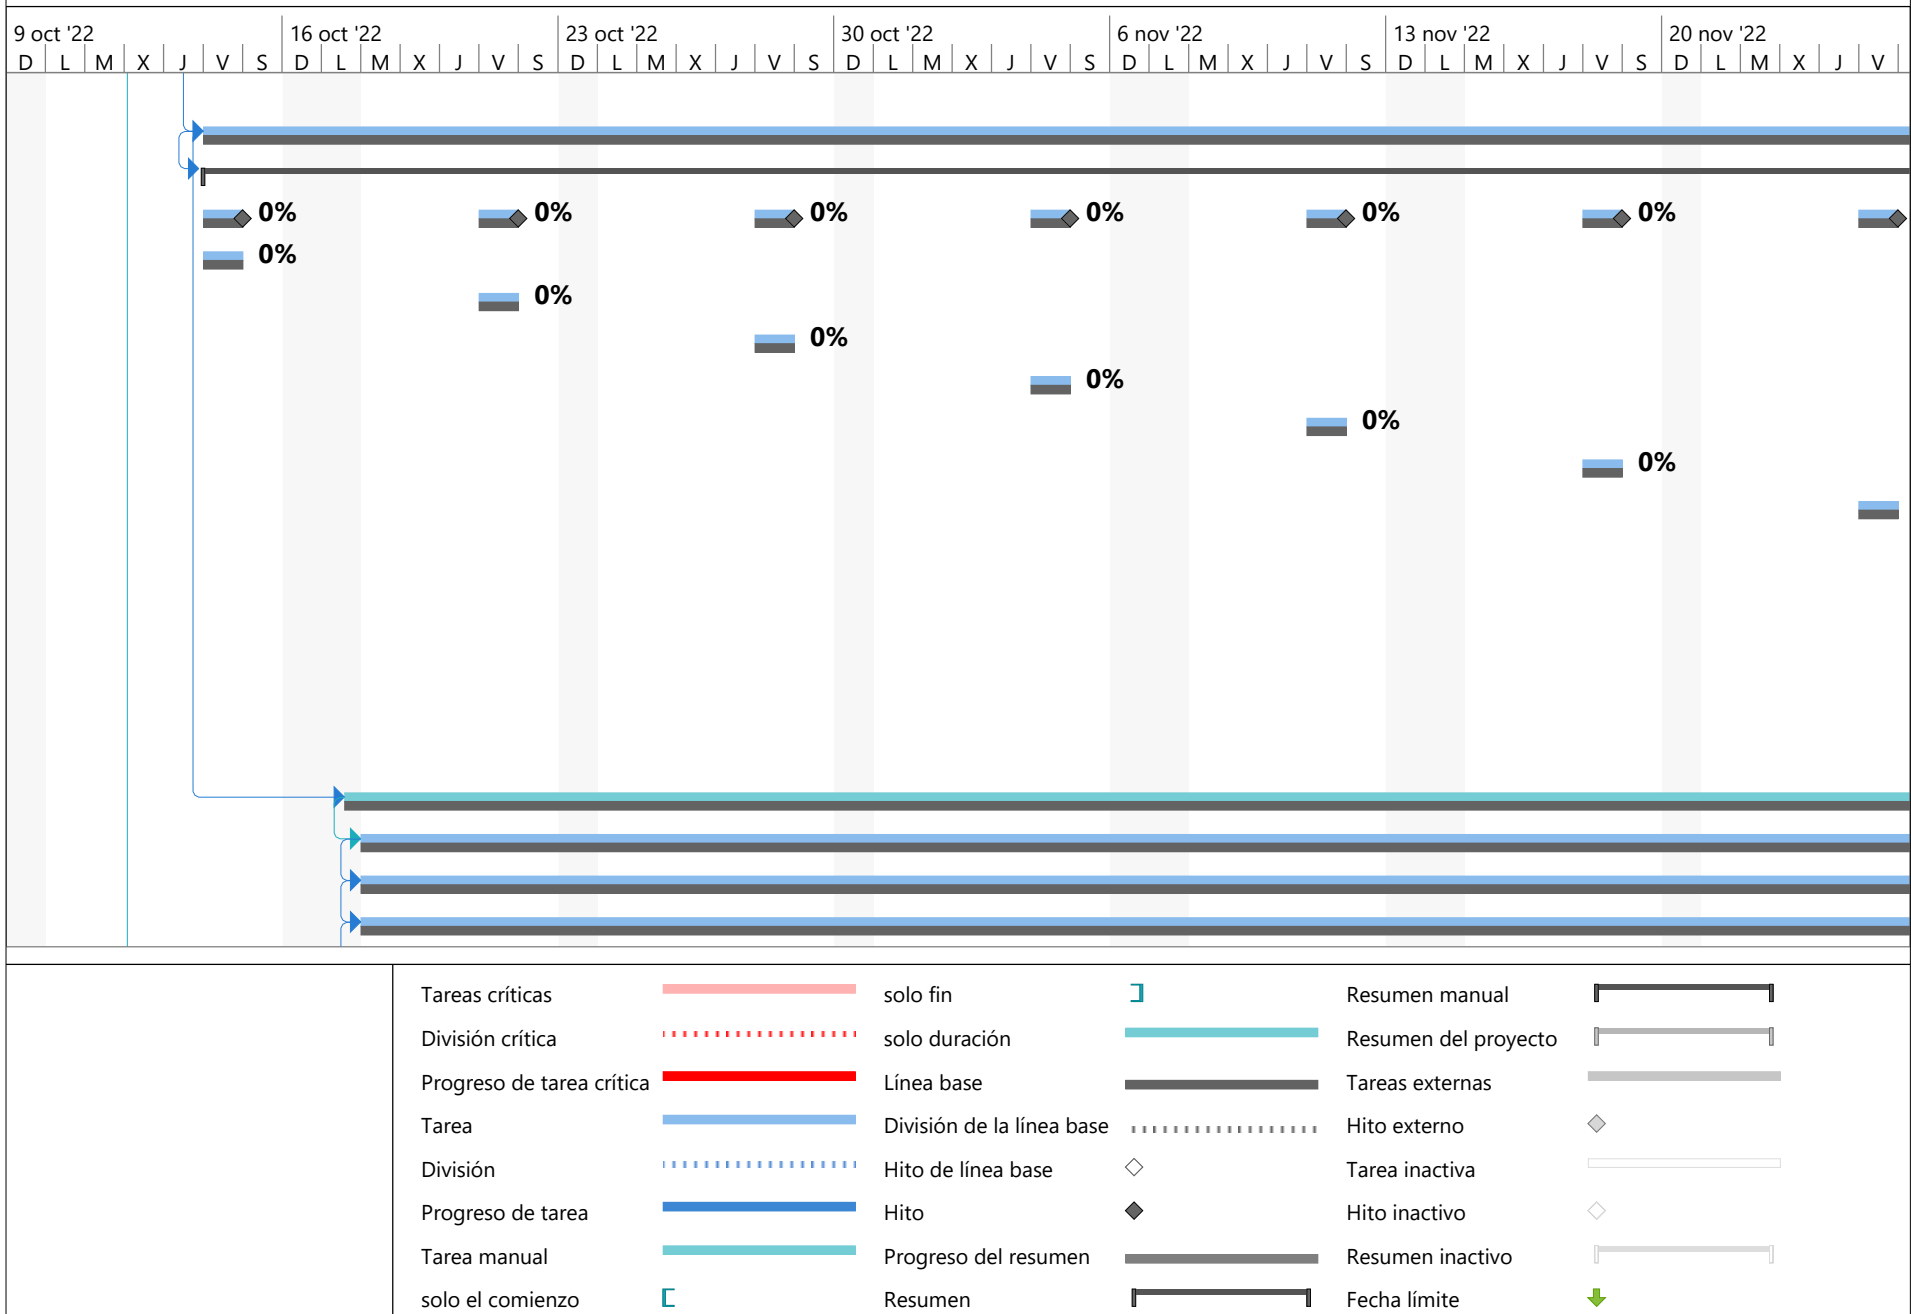
9 oct '22
16 oct '22
23 oct '22
30 oct '22
6 nov '22
13 nov '22
20 nov '22
D L M X J V S
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite



9 oct '22
16 oct '22
23 oct '22
30 oct '22
6 nov '22
13 nov '22
20 nov '22
D L M X J V S
0%
24/10
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

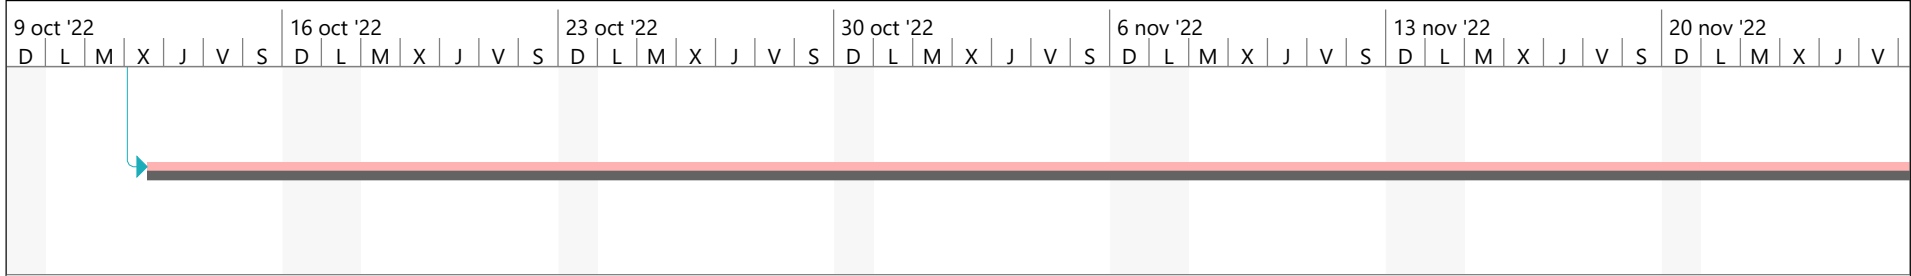


Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite

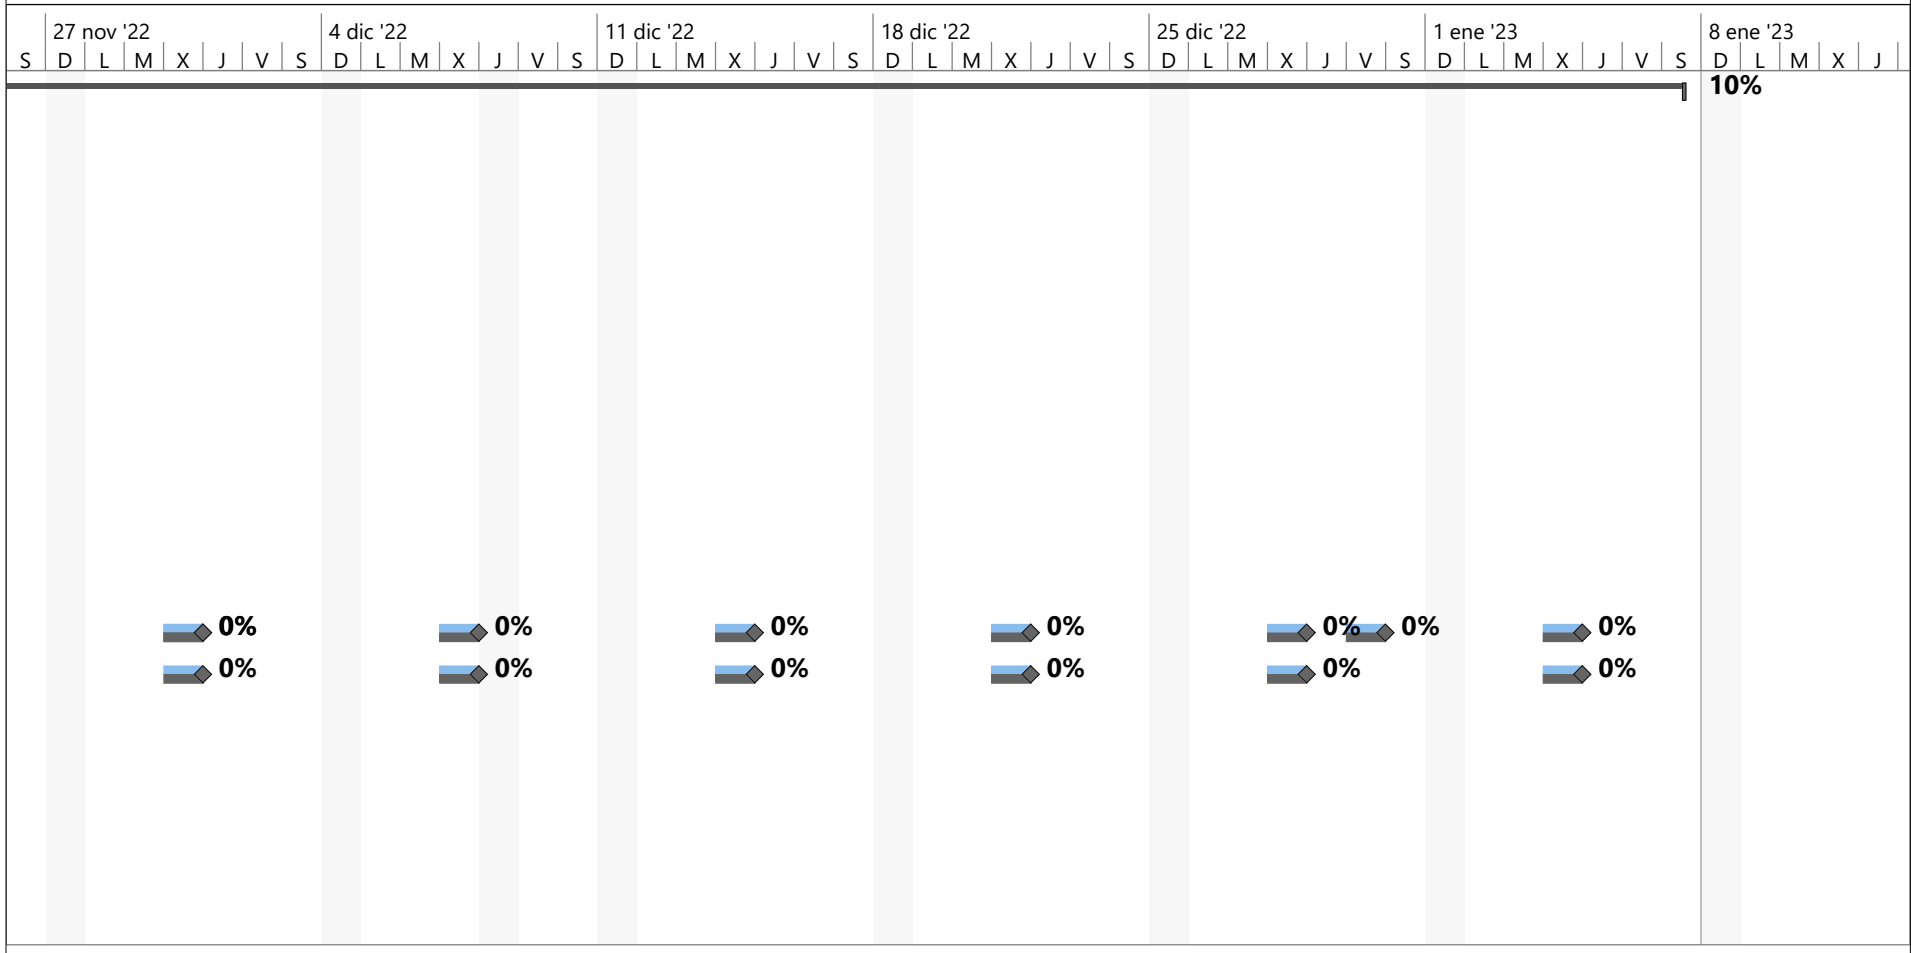



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

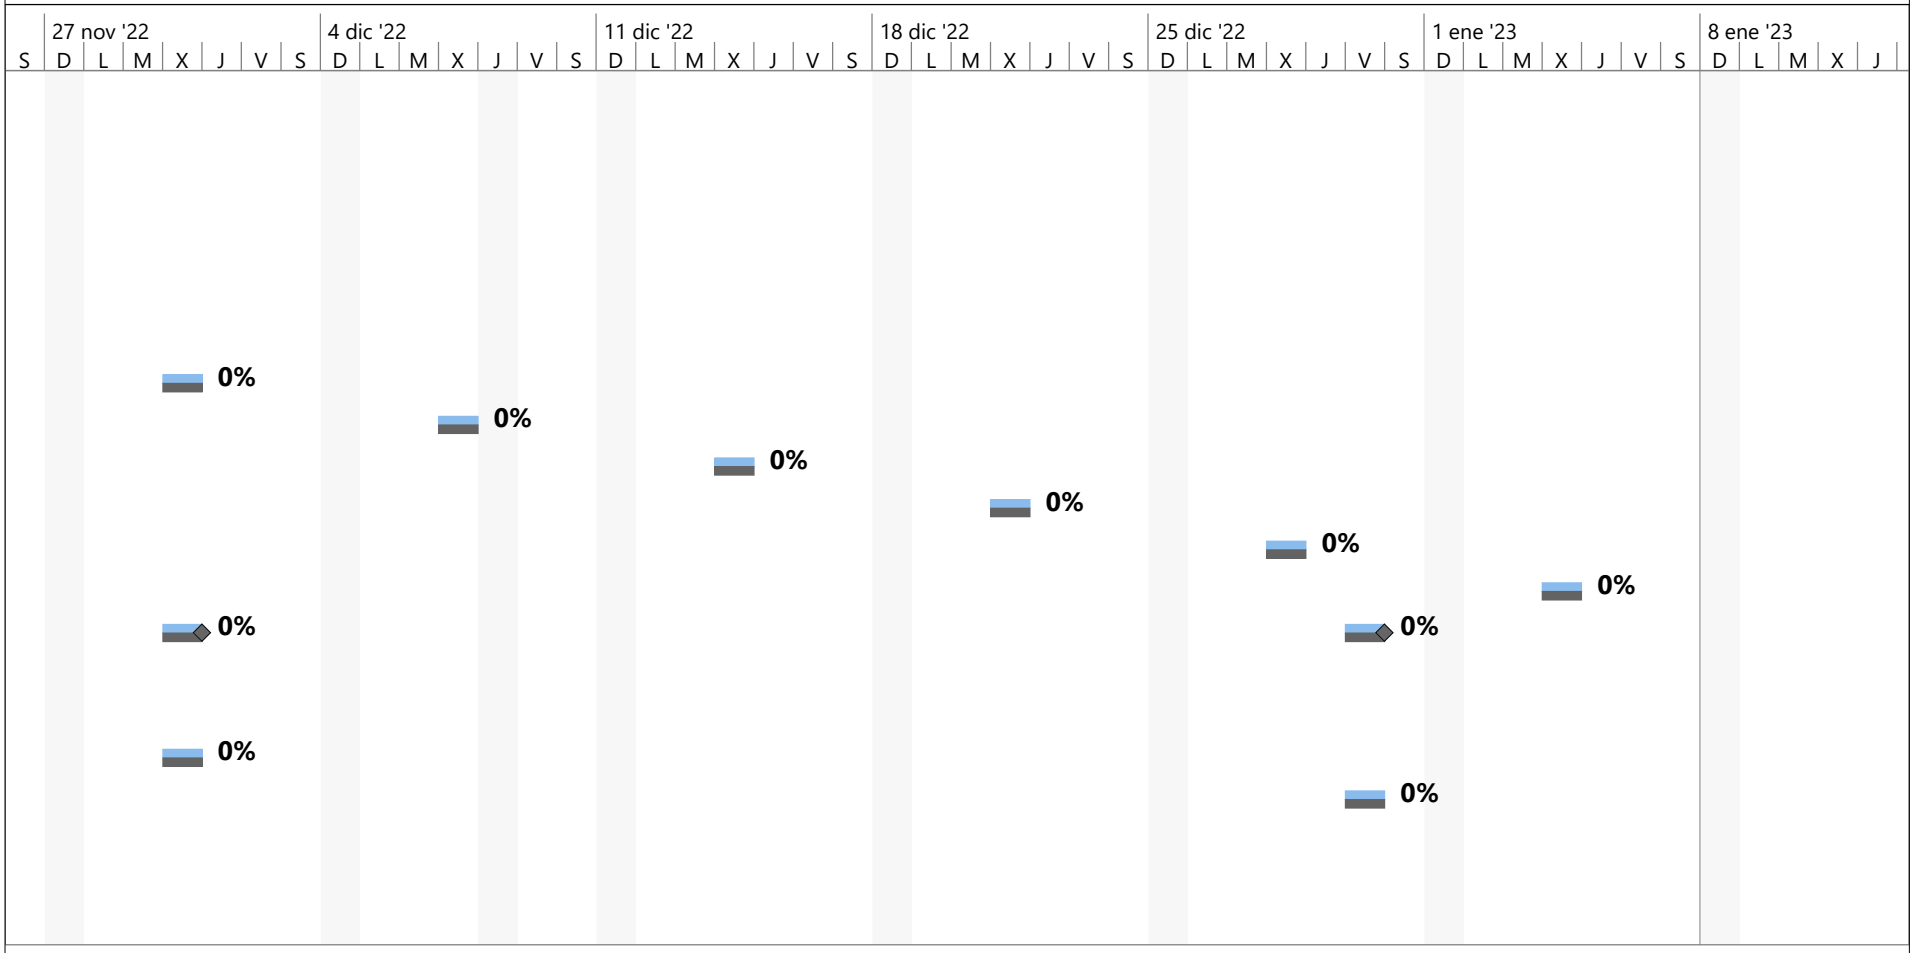


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

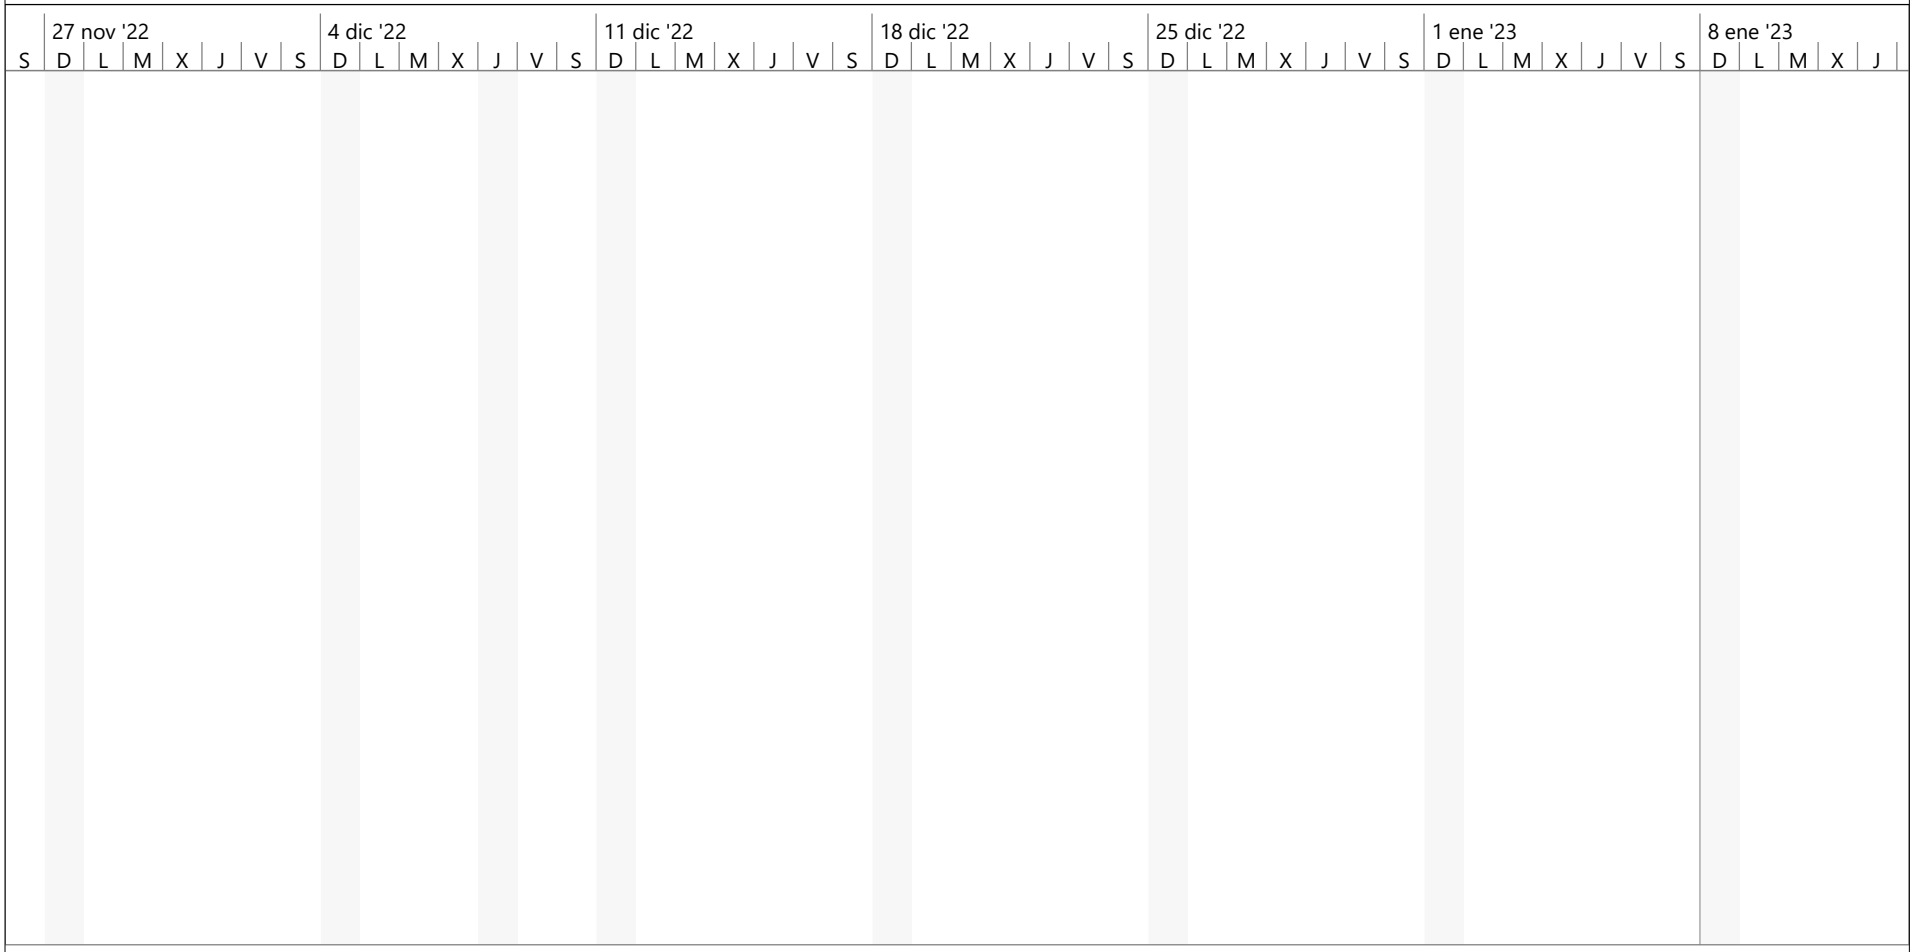

27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

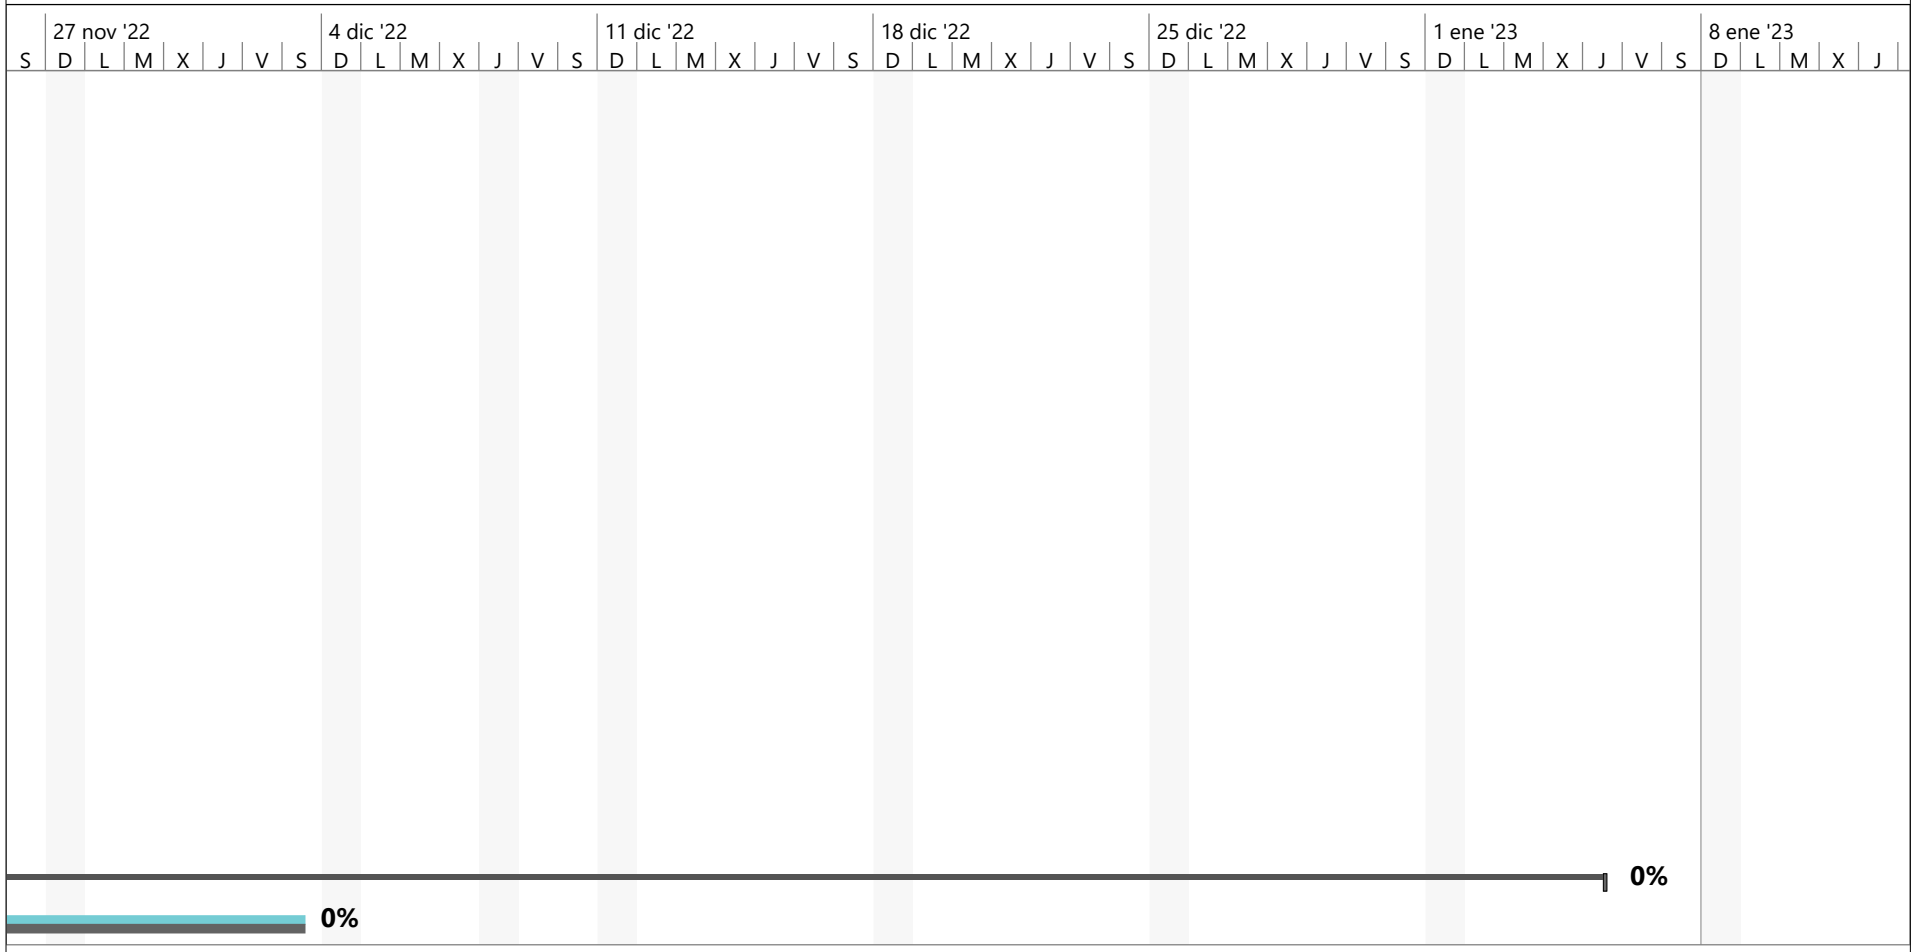


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

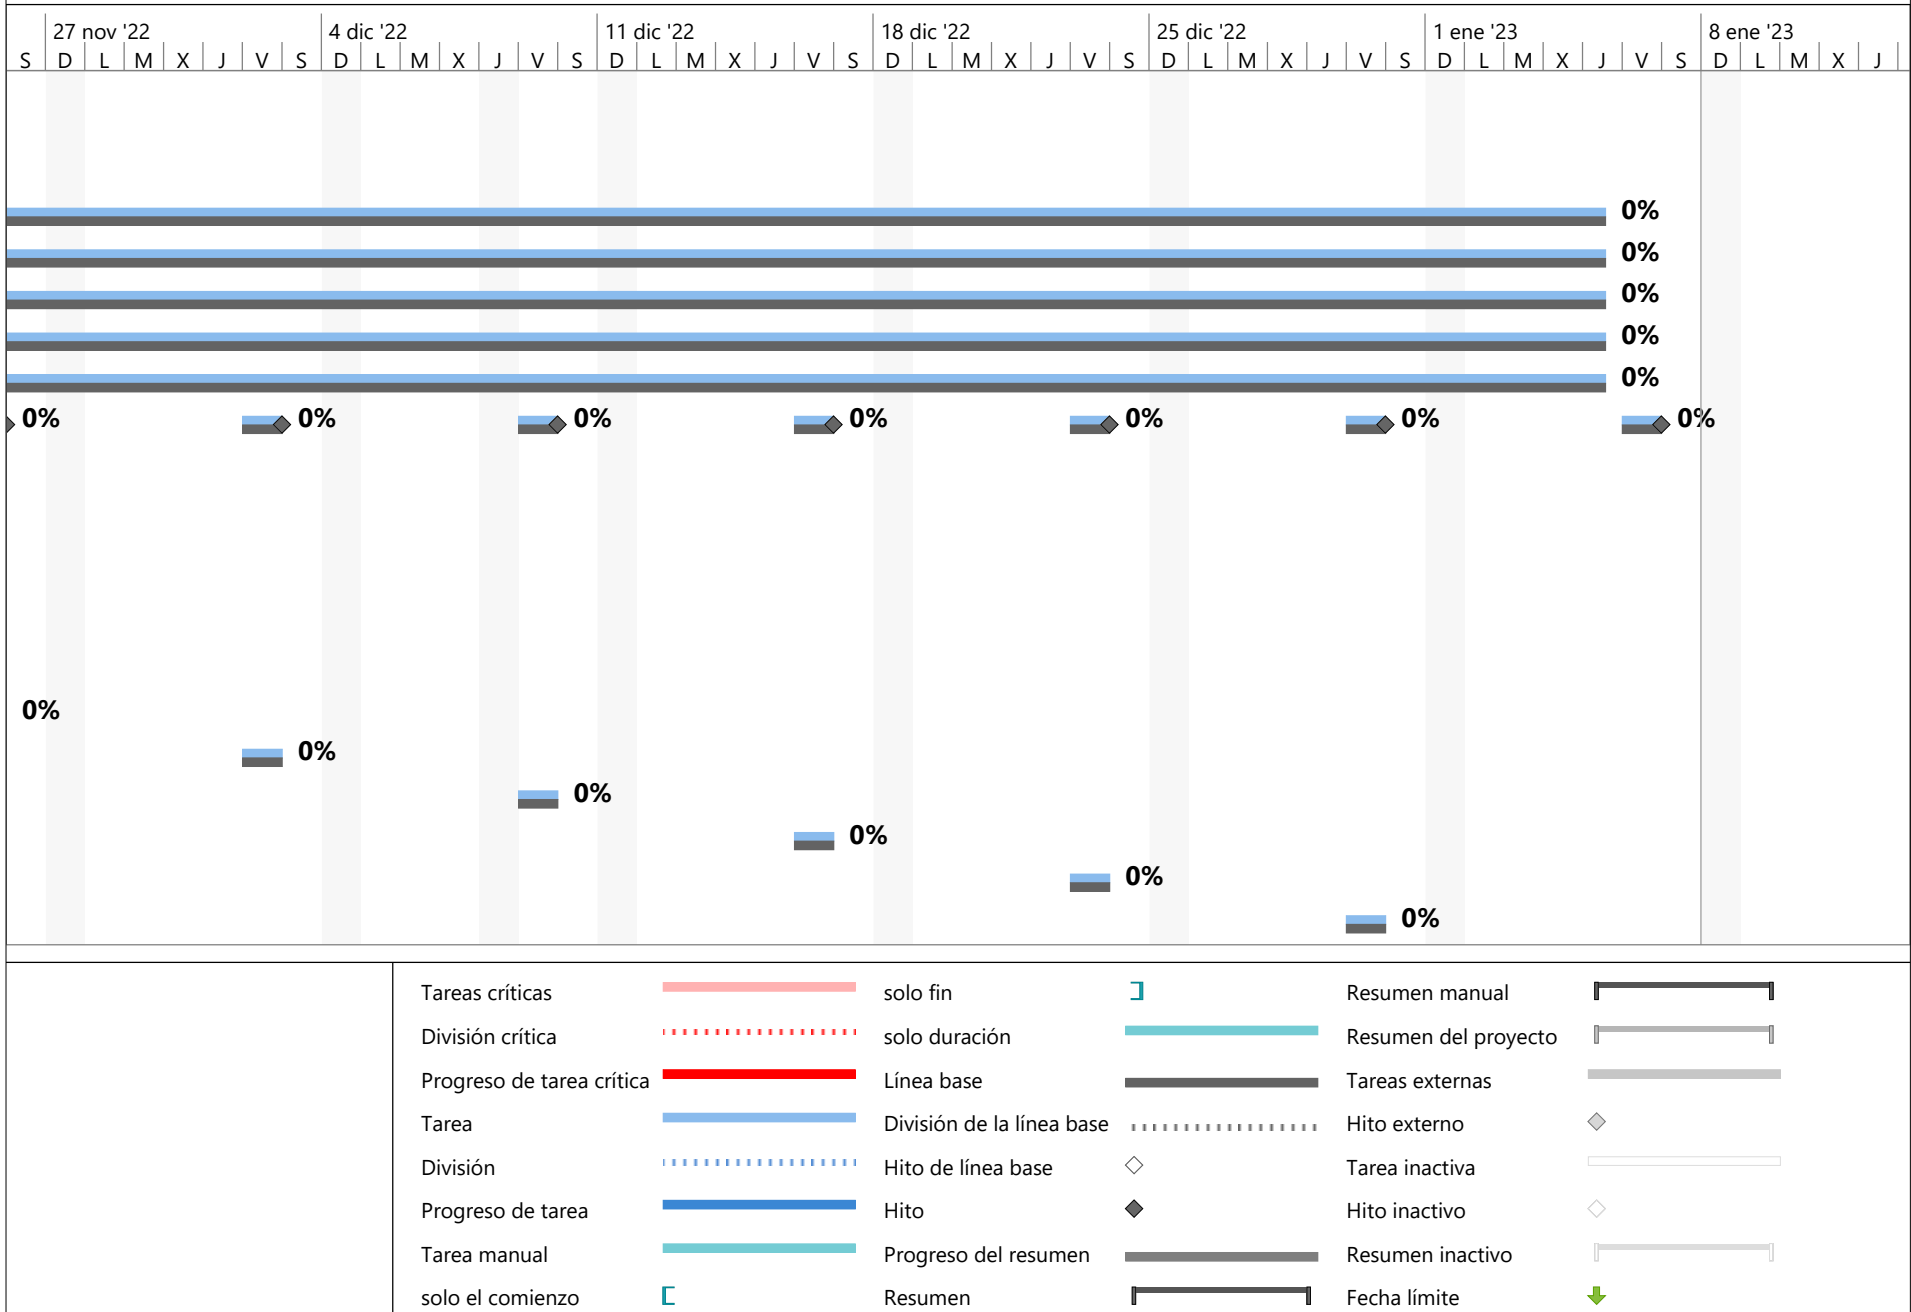
27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

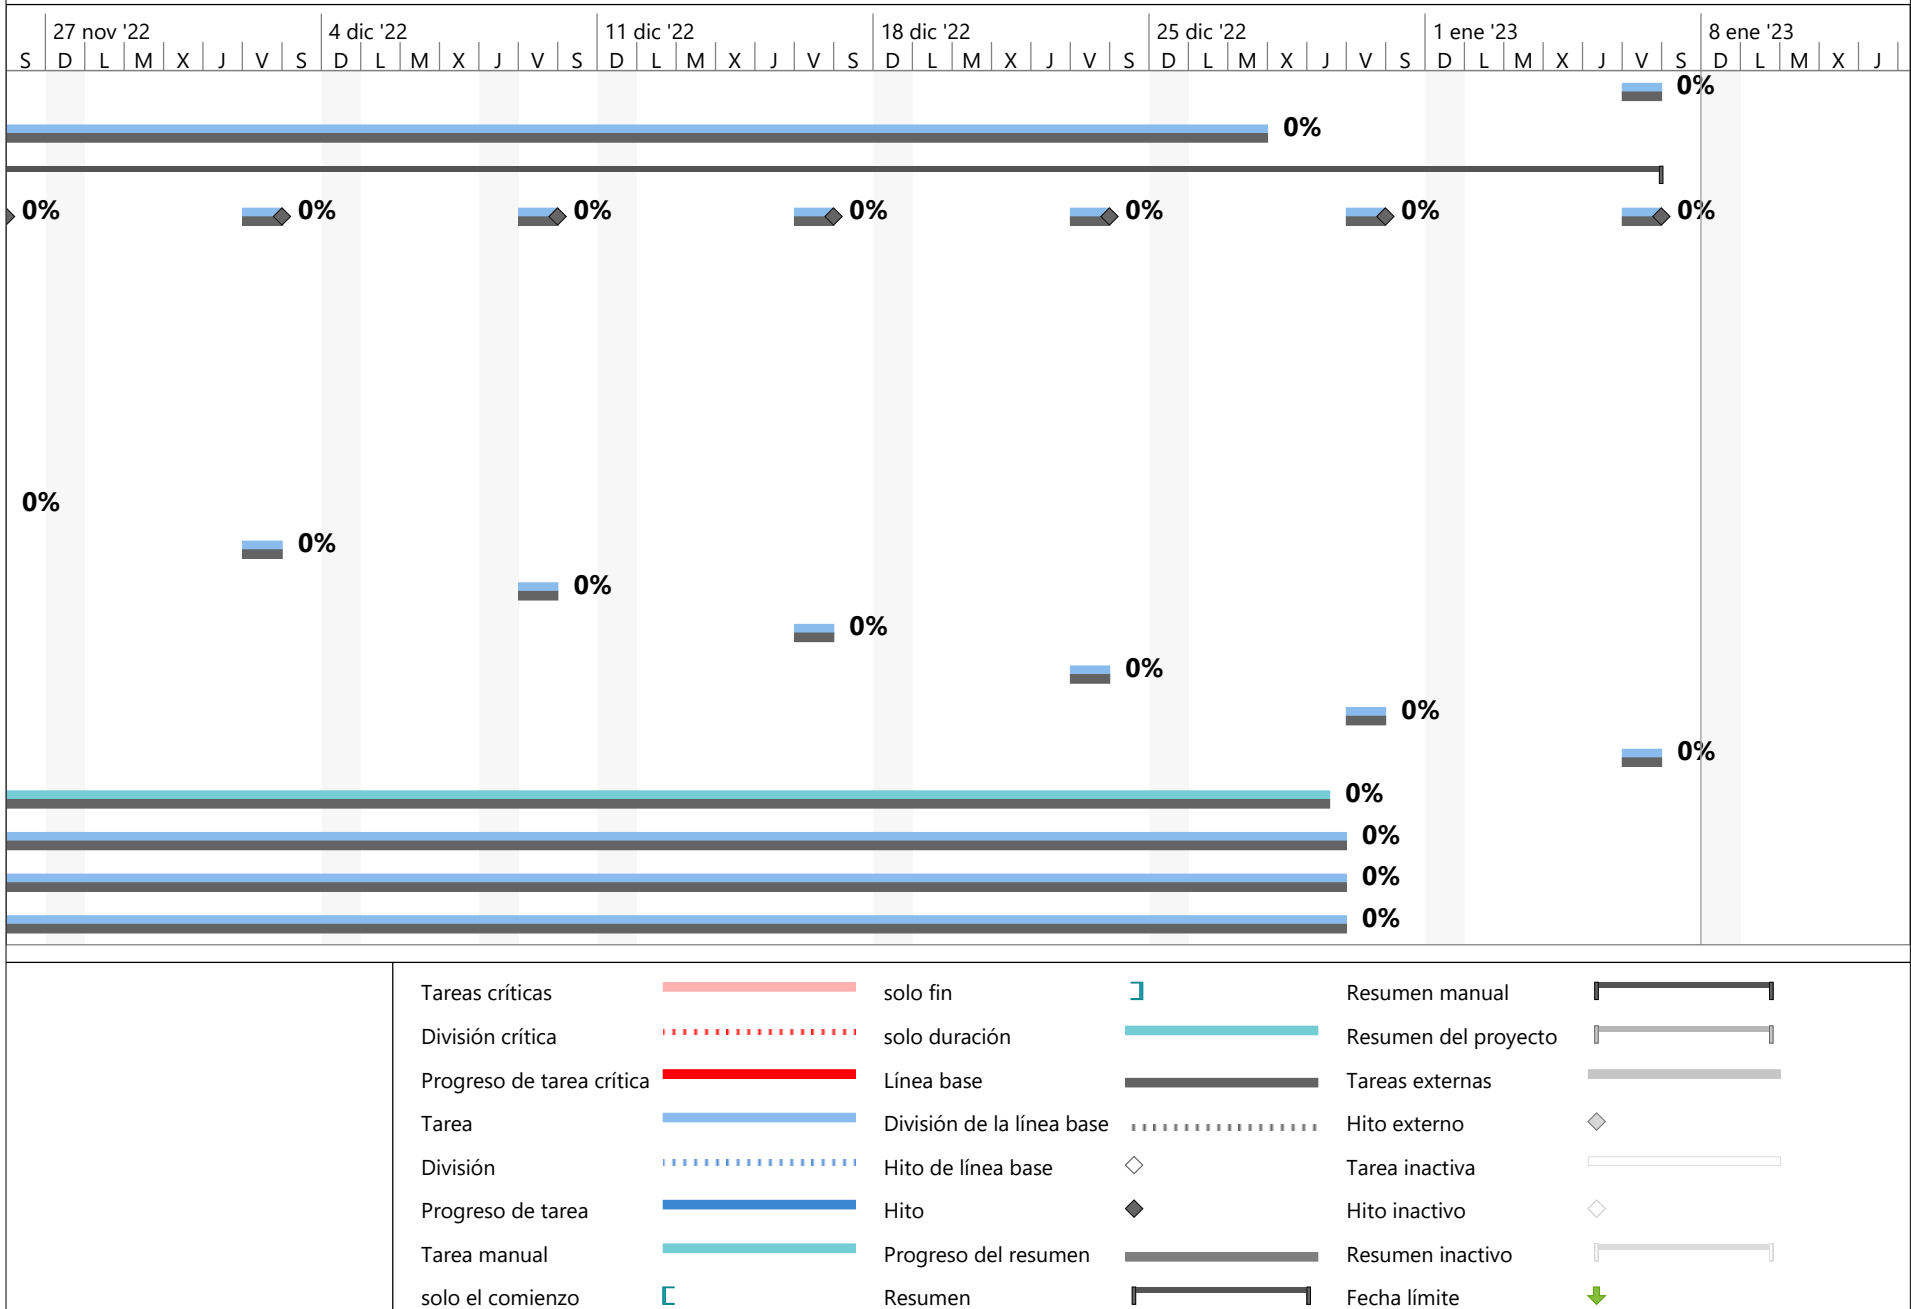
27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

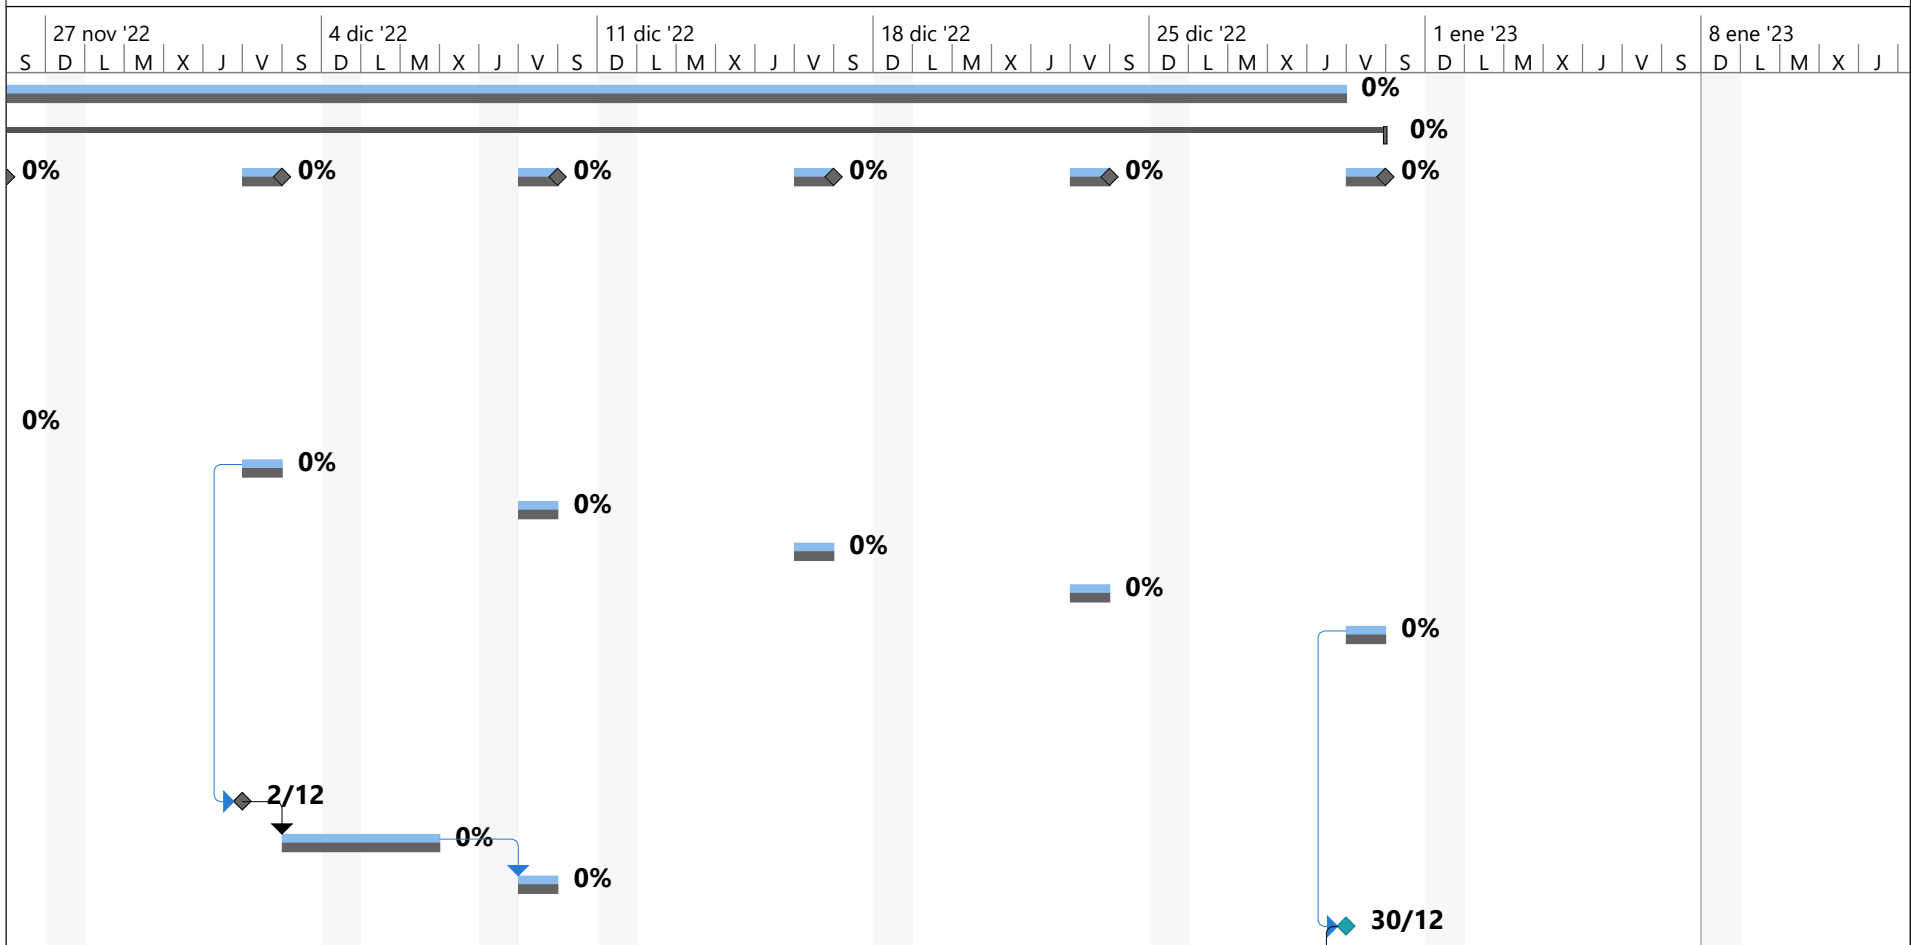

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

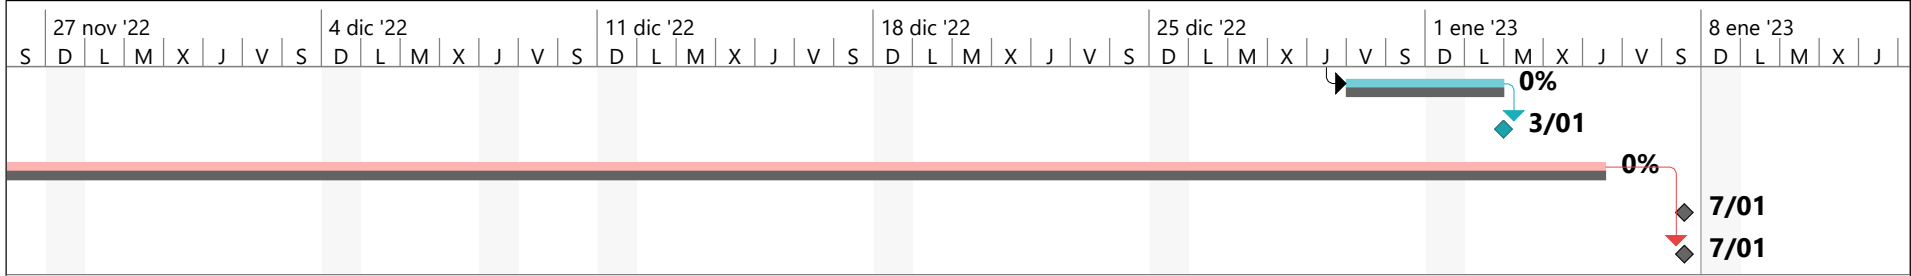

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
