

| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **1** | **PROYECTO CPS1402_2022_SNR_CSA** | **127 días** | **mar 16/08/22** | **mié 11/01/23** | |
| 2 | 1.1 | **Formalizacion del contrato** | 1 día | mar 16/08/22 | mié 17/08/22 | |
| 3 | 1.2 | **Acta de inicio del contrato** | 0 días | jue 25/08/22 | jue 25/08/22 | |
| 4 | **1.3** | **100. Diagnóstico** | **21 días** | **mar 16/08/22** | **vie 9/09/22** | |
| 5 | 1.3.1 | 101. Reconocimiento documentacion en estanteria bodeg | 1 día | mar 16/08/22 | mié 17/08/22 | |
| 6 | 1.3.2 | 105. Informe de diagnostico | 0 días | vie 9/09/22 | vie 9/09/22 | |
| 7 | 1.4 | **120. Solicitud de Formatos e Instrumentos** | 1 día | vie 9/09/22 | sáb 10/09/22 | |
| 8 | 1.5 | 130. Fumigacion | 1 día | sáb 3/09/22 | lun 5/09/22 | |
| 9 | 1.6 | 131. Informe de Fumigacion | 1 día | lun 12/09/22 | mar 13/09/22 | |
| 10 | **1.7** | **140. Entrega de Hojas de Vida Profesionales y Tecnicos** | **1 día** | **vie 9/09/22** | **sáb 10/09/22** | |
| 11 | 1.7.1 | 141. Aprobacion Hojas de Vida Profesionales | 1 día | vie 9/09/22 | sáb 10/09/22 | |
| 12 | 1.8 | **150. Entrega de Planes** | 0 días | vie 9/09/22 | vie 9/09/22 | |
| 13 | 1.9 | **Ajustes y aprobacion de planes** | 1 día | lun 12/09/22 | mar 13/09/22 | |
| 14 | **1.10** | **Reunión comité semanal** | **105 días** | **mié 31/08/22** | **mié 4/01/23** | |
| 15 | **1.10.1** | **Reunión comité semanal** | **105 días** | **mié 31/08/22** | **mié 4/01/23** | |
| 16 | 1.10.1.1 | Reunión comité semanal 1 | 1 día | mié 31/08/22 | mié 31/08/22 | |
| 17 | 1.10.1.2 | Reunión comité semanal 2 | 1 día | mié 7/09/22 | mié 7/09/22 | |
| 18 | 1.10.1.3 | Reunión comité semanal 3 | 1 día | mié 14/09/22 | mié 14/09/22 | |
| 19 | 1.10.1.4 | Reunión comité semanal 4 | 1 día | mié 21/09/22 | mié 21/09/22 | |
| 20 | 1.10.1.5 | Reunión comité semanal 5 | 1 día | mié 28/09/22 | mié 28/09/22 | |
| 21 | 1.10.1.6 | Reunión comité semanal 6 | 1 día | mié 5/10/22 | mié 5/10/22 | |
| 22 | 1.10.1.7 | Reunión comité semanal 7 | 1 día | mié 12/10/22 | mié 12/10/22 | |
| 23 | 1.10.1.8 | Reunión comité semanal 8 | 1 día | mié 19/10/22 | mié 19/10/22 | |




Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1.10.1.9 | Reunión comité semanal 9 | 1 día | mié 26/10/22 | mié 26/10/22 | |
| 25 | 1.10.1.10 | Reunión comité semanal 10 | 1 día | mié 2/11/22 | mié 2/11/22 | |
| 26 | 1.10.1.11 | Reunión comité semanal 11 | 1 día | mié 9/11/22 | mié 9/11/22 | |
| 27 | 1.10.1.12 | Reunión comité semanal 12 | 1 día | mié 16/11/22 | mié 16/11/22 | |
| 28 | 1.10.1.13 | Reunión comité semanal 13 | 1 día | mié 23/11/22 | mié 23/11/22 | |
| 29 | 1.10.1.14 | Reunión comité semanal 14 | 1 día | mié 30/11/22 | mié 30/11/22 | |
| 30 | 1.10.1.15 | Reunión comité semanal 15 | 1 día | mié 7/12/22 | mié 7/12/22 | |
| 31 | 1.10.1.16 | Reunión comité semanal 16 | 1 día | mié 14/12/22 | mié 14/12/22 | |
| 32 | 1.10.1.17 | Reunión comité semanal 17 | 1 día | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | |
| 33 | 1.10.1.18 | Reunión comité semanal 18 | 1 día | mié 28/12/22 | mié 28/12/22 | |
| 34 | 1.10.1.19 | Reunión comité semanal 19 | 1 día | mié 4/01/23 | mié 4/01/23 | |
| 35 | **1.10.2** | **Informe Mensual** | **79 días** | **vie 30/09/22** | **vie 30/12/22** | |
| 36 | 1.10.2.1 | Informe Mensual 1 | 1 día | vie 30/09/22 | vie 30/09/22 | |
| 37 | 1.10.2.2 | Informe Mensual 2 | 1 día | lun 31/10/22 | lun 31/10/22 | |
| 38 | 1.10.2.3 | Informe Mensual 3 | 1 día | mié 30/11/22 | mié 30/11/22 | |
| 39 | 1.10.2.4 | Informe Mensual 4 | 1 día | vie 30/12/22 | vie 30/12/22 | |
| 40 | **1.11** | **220. Inicio de punteo** | **29 días** | **lun 12/09/22** | **sáb 15/10/22** | |
| 41 | 1.11.1 | 221.Inicio de rotulacion codigo de barras | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 42 | 1.11.2 | 223.Control de calidad de insercion y rotulacion | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 43 | 1.11.3 | 224.Implementacion del aplicativo | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 44 | 1.11.4 | 225.Inicio de grabacion para punteo | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 45 | 1.11.5 | 226.Limpieza Superficial con aspiradora | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 46 | 1.11.6 | 227.Conteo de folios | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |




Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22


| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1.11.7 | 228.Punteo validacion expedientes y captura de folios | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 48 | 1.11.8 | 229.Control de calidad datos capturados en el aplicativo | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 49 | **1.12** | **230. Inicio de Embalaje** | **29 días** | **lun 12/09/22** | **sáb 15/10/22** | |
| 50 | 1.12.1 | 231.Embalaje de las carpetas | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 51 | 1.12.2 | 232.Asignacion numero de paquete | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 52 | 1.12.3 | 233.Cierre de paquete con Sticker adhesivo y/o presinto | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 53 | 1.12.4 | 234.Ubicacion unidades de almacemaniento en sitio de c | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 54 | 1.12.5 | 235.Validacion informacion por parte de la supervision | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 55 | 1.12.6 | 236.Toma de registro fotografico | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 56 | 1.12.7 | 237.Generacion de acta | 29 días | lun 12/09/22 | sáb 15/10/22 | |
| 57 | 1.12.8 | Desmonte puestos de trabajo | 2 días | jue 13/10/22 | sáb 15/10/22 | |
| 58 | 1.12.9 | Acta de devolucion espacios de trabajo a satisfacion | 0 días | sáb 15/10/22 | sáb 15/10/22 | |
| 59 | **1.13** | **250. Cargue** | **12 días** | **sáb 1/10/22** | **sáb 15/10/22** | |
| 60 | 1.13.1 | 251. Envio protocolo de cargue y descargue | 1 día | sáb 1/10/22 | lun 3/10/22 | |
| 61 | 1.13.2 | 252. Aprobacion protocolo cargue y descargue | 0 días | lun 10/10/22 | lun 10/10/22 | |
| 62 | 1.13.3 | 253. Inicio de grabacion cargue | 5 días | lun 10/10/22 | sáb 15/10/22 | |
| 63 | 1.13.4 | 254. Inicio grabacion interior del camio | 5 días | lun 10/10/22 | sáb 15/10/22 | |
| 64 | 1.13.5 | 255. Registro fotografico del cargue y al interior del camic | 5 días | lun 10/10/22 | sáb 15/10/22 | |
| 65 | 1.13.6 | 256. Cargue de cajas al camion | 5 días | lun 10/10/22 | sáb 15/10/22 | |
| 66 | 1.13.7 | 257. Toma de registro fotografico finalizacion del cargue | 5 días | lun 10/10/22 | sáb 15/10/22 | |
| 67 | 1.13.8 | 258. Cierre de camion con presinto | 5 días | lun 10/10/22 | sáb 15/10/22 | |
| 68 | 1.13.9 | 259.Toma de registro fotografico con escoltas y conducto | 5 días | lun 10/10/22 | sáb 15/10/22 | |
| 69 | 1.14 | **260. Seguimiento ruta de camion por GPS** | 5 días | lun 10/10/22 | sáb 15/10/22 | |



Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **1.15** | **280. Llegada y descargue camion bogota** | **4,38 días** | **lun 17/10/22** | **vie 21/10/22** | |
| 71 | 1.15.1 | 281. Inicio grabacion interior del camion | 4 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 72 | 1.15.2 | 282. Registro fotografico | 4 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 73 | 1.15.3 | 283. Apertura del presinto | 4 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 74 | 1.15.4 | 284. Registro fotografico al interior del camion | 4 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 75 | 1.15.5 | 285. Descargue unidades de conservacion en estibas | 4 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 76 | 1.15.6 | 286. Verificacion por parte de la interventoria | 4,38 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 77 | 1.15.7 | 287. Generacion de acta de llegada | 4 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 78 | **1.16** | **Ubicacion** | **5 días** | **mié 19/10/22** | **mar 25/10/22** | |
| 79 | 1.16.1 | Ubicacion en estanteria unidades de conservacion | 5 días | mié 19/10/22 | mar 25/10/22 | |
| 80 | 1.17 | **Entrega de diagnóstico en conservación preventiva.** | 0 días | mar 18/10/22 | mar 18/10/22 | |
| 81 | **1.18** | **Entrega de Plan de intervención en conservación.** | **1 día** | **lun 3/10/22** | **mar 4/10/22** | |
| 82 | 1.18.1 | Capacitacion en conservacion preventiva | 1 día | lun 3/10/22 | mar 4/10/22 | |
| 83 | **1.19** | **Procesamiento de Archivos Misionales** | **103 días** | **mar 13/09/22** | **mié 11/01/23** | |
| 84 | 1.19.1 | Insercion Documentacion | 85 días | mar 13/09/22 | mié 21/12/22 | |
| 85 | 1.19.2 | Solicitud mesa de trabajo interventoria definicion de parametros organización,digitalizacion e indexacion | 1,38 días | sáb 1/10/22 | lun 3/10/22 | |
| 86 | 1.19.3 | Firma de acta definicion de parametros organización,digitalizacion e indexacion | 1 día | mar 10/01/23 | mié 11/01/23 | |
| 87 | 1.19.4 | Capacitacion grupo de trabajo parametros de organización,digitalizacion e indexacion | 1 día | jue 13/10/22 | vie 14/10/22 | |
| 88 | 1.19.5 | Clasificación Documental | 53 días | sáb 22/10/22 | vie 23/12/22 | |
| 89 | 1.19.6 | Ordenación Documental | 53 días | sáb 22/10/22 | vie 23/12/22 | |
| 90 | 1.19.7 | Depuración Documental | 53 días | sáb 22/10/22 | vie 23/12/22 | |





Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22


| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1.19.8 | Primeros Auxilios | 53 días | sáb 22/10/22 | vie 23/12/22 | |
| 92 | 1.19.9 | Foliación | 52 días | lun 24/10/22 | vie 23/12/22 | |
| 93 | **1.20** | **Control de calidad procesos de organización y Foliación** | **61 días** | **vie 14/10/22** | **vie 23/12/22** | |
| 94 | 1.20.1 | Control de calidad procesos de organización 1 | 1 día | vie 14/10/22 | vie 14/10/22 | |
| 95 | 1.20.2 | Control de calidad procesos de organización 2 | 1 día | vie 21/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 96 | 1.20.3 | Control de calidad procesos de organización 3 | 1 día | vie 28/10/22 | vie 28/10/22 | |
| 97 | 1.20.4 | Control de calidad procesos de organización 4 | 1 día | vie 4/11/22 | vie 4/11/22 | |
| 98 | 1.20.5 | Control de calidad procesos de organización 5 | 1 día | vie 11/11/22 | vie 11/11/22 | |
| 99 | 1.20.6 | Control de calidad procesos de organización 6 | 1 día | vie 18/11/22 | vie 18/11/22 | |
| 100 | 1.20.7 | Control de calidad procesos de organización 7 | 1 día | vie 25/11/22 | vie 25/11/22 | |
| 101 | 1.20.8 | Control de calidad procesos de organización 8 | 1 día | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 | |
| 102 | 1.20.9 | Control de calidad procesos de organización 9 | 1 día | vie 9/12/22 | vie 9/12/22 | |
| 103 | 1.20.10 | Control de calidad procesos de organización 10 | 1 día | vie 16/12/22 | vie 16/12/22 | |
| 104 | 1.20.11 | Control de calidad procesos de organización 11 | 1 día | vie 23/12/22 | vie 23/12/22 | |
| 105 | 1.21 | Digitalización | 63 días | vie 14/10/22 | lun 26/12/22 | |
| 106 | **1.22** | Indexacion | **73 días** | **vie 14/10/22** | **vie 6/01/23** | |
| 107 | **1.22.1** | **Control calidad digitalizacion e indexacion** | **61 días** | **vie 14/10/22** | **vie 23/12/22** | |
| 108 | 1.22.1.1 | Control calidad digitalizacion e indexacion 1 | 1 día | vie 14/10/22 | vie 14/10/22 | |
| 109 | 1.22.1.2 | Control calidad digitalizacion e indexacion 2 | 1 día | vie 21/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 110 | 1.22.1.3 | Control calidad digitalizacion e indexacion 3 | 1 día | vie 28/10/22 | vie 28/10/22 | |
| 111 | 1.22.1.4 | Control calidad digitalizacion e indexacion 4 | 1 día | vie 4/11/22 | vie 4/11/22 | |
| 112 | 1.22.1.5 | Control calidad digitalizacion e indexacion 5 | 1 día | vie 11/11/22 | vie 11/11/22 | |
| 113 | 1.22.1.6 | Control calidad digitalizacion e indexacion 6 | 1 día | vie 18/11/22 | vie 18/11/22 | |




Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22




| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1.22.1.7 | Control calidad digitalizacion e indexacion 7 | 1 día | vie 25/11/22 | vie 25/11/22 | |
| 115 | 1.22.1.8 | Control calidad digitalizacion e indexacion 8 | 1 día | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 | |
| 116 | 1.22.1.9 | Control calidad digitalizacion e indexacion 9 | 1 día | vie 9/12/22 | vie 9/12/22 | |
| 117 | 1.22.1.10 | Control calidad digitalizacion e indexacion 10 | 1 día | vie 16/12/22 | vie 16/12/22 | |
| 118 | 1.22.1.11 | Control calidad digitalizacion e indexacion 11 | 1 día | vie 23/12/22 | vie 23/12/22 | |
| 119 | 1.23 | **Descripción Documental** | 60 días | lun 17/10/22 | lun 26/12/22 | |
| 120 | 1.24 | Generacion hojas de control | 59 días | lun 17/10/22 | sáb 24/12/22 | |
| 121 | 1.25 | Encarpetado | 59 días | lun 17/10/22 | sáb 24/12/22 | |
| 122 | 1.26 | Almacenamiento en unidades de conservacion | 59 días | lun 17/10/22 | sáb 24/12/22 | |
| 123 | 1.27 | Rotulación de Cajas y Carpetas | 59 días | lun 17/10/22 | sáb 24/12/22 | |
| 124 | **1.28** | **Revision final Validación de FUID realmacenamiento y rotulación** | **55 días** | **vie 21/10/22** | **vie 23/12/22** | |
| 125 | **1.28.1** | **Control de calidad Final FUID y embalaje** | **55 días** | **vie 21/10/22** | **vie 23/12/22** | |
| 126 | 1.28.1.1 | Control de calidad Final FUID y embalaje 1 | 1 día | vie 21/10/22 | vie 21/10/22 | |
| 127 | 1.28.1.2 | Control de calidad Final FUID y embalaje 2 | 1 día | vie 28/10/22 | vie 28/10/22 | |
| 128 | 1.28.1.3 | Control de calidad Final FUID y embalaje 3 | 1 día | vie 4/11/22 | vie 4/11/22 | |
| 129 | 1.28.1.4 | Control de calidad Final FUID y embalaje 4 | 1 día | vie 11/11/22 | vie 11/11/22 | |
| 130 | 1.28.1.5 | Control de calidad Final FUID y embalaje 5 | 1 día | vie 18/11/22 | vie 18/11/22 | |
| 131 | 1.28.1.6 | Control de calidad Final FUID y embalaje 6 | 1 día | vie 25/11/22 | vie 25/11/22 | |
| 132 | 1.28.1.7 | Control de calidad Final FUID y embalaje 7 | 1 día | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 | |
| 133 | 1.28.1.8 | Control de calidad Final FUID y embalaje 8 | 1 día | vie 9/12/22 | vie 9/12/22 | |
| 134 | 1.28.1.9 | Control de calidad Final FUID y embalaje 9 | 1 día | vie 16/12/22 | vie 16/12/22 | |
| 135 | 1.28.1.10 | Control de calidad Final FUID y embalaje 10 | 1 día | vie 23/12/22 | vie 23/12/22 | |



| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1.29 | Entrega para aprobación de la interventoria de 100 Metros Lineales | 0 días | sáb 29/10/22 | sáb 29/10/22 | |
| 137 | 1.30 | Corrección y Ajustes 100 Metros Lineales | 3 días | lun 31/10/22 | mié 2/11/22 | |
| 138 | 1.31 | Informe entrega de 100 Metros Lineales | 1 día | jue 3/11/22 | jue 3/11/22 | |
| 139 | 1.32 | Entrega para aprobación de la interventoria de 2361 Metros Lineales | 0 días | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 | |
| 140 | 1.33 | Corrección y Ajustes 2361 Metros Lineales | 3 días | sáb 3/12/22 | mar 6/12/22 | |
| 141 | 1.34 | Informe entrega de 2361 Metros Lineales | 1 día | jue 8/12/22 | jue 8/12/22 | |
| 142 | 1.35 | Entrega para aprobación de la interventoria de 2360 Metros Lineales | 0 días | vie 30/12/22 | vie 30/12/22 | |
| 143 | 1.36 | Corrección y Ajustes 2360 Metros Lineales | 3 días | vie 30/12/22 | lun 2/01/23 | |
| 144 | 1.37 | Informe entrega de 2360 Metros Lineales | 0 días | mar 3/01/23 | mar 3/01/23 | |
| 145 | 1.38 | Custodia de la documentacion por seis meses | 65 días | lun 17/10/22 | sáb 31/12/22 | |
| 146 | **1.39** | **cierre del proyecto** | **0 días** | **jue 5/01/23** | **jue 5/01/23** | |
| 147 | 1.39.1 | Firma de cierre del proyecto | 0 días | jue 5/01/23 | jue 5/01/23 | |





Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

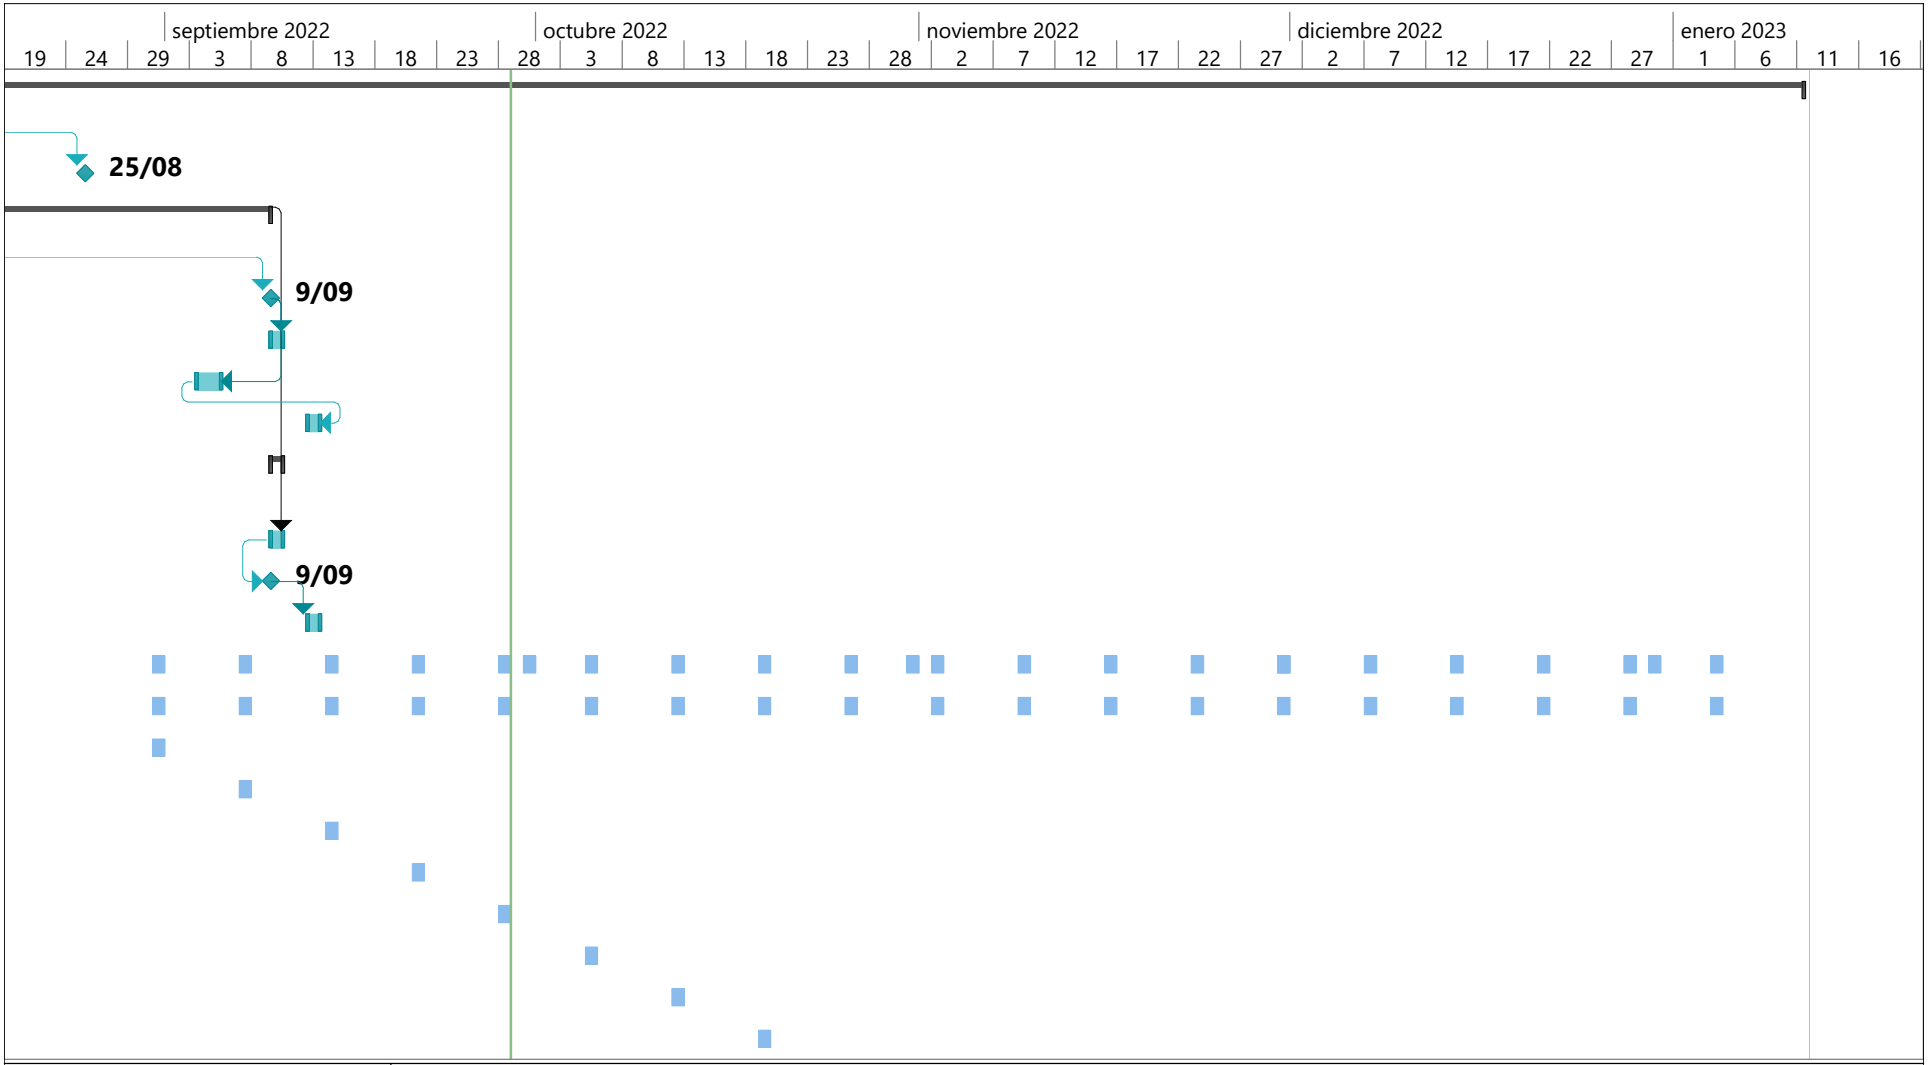



Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

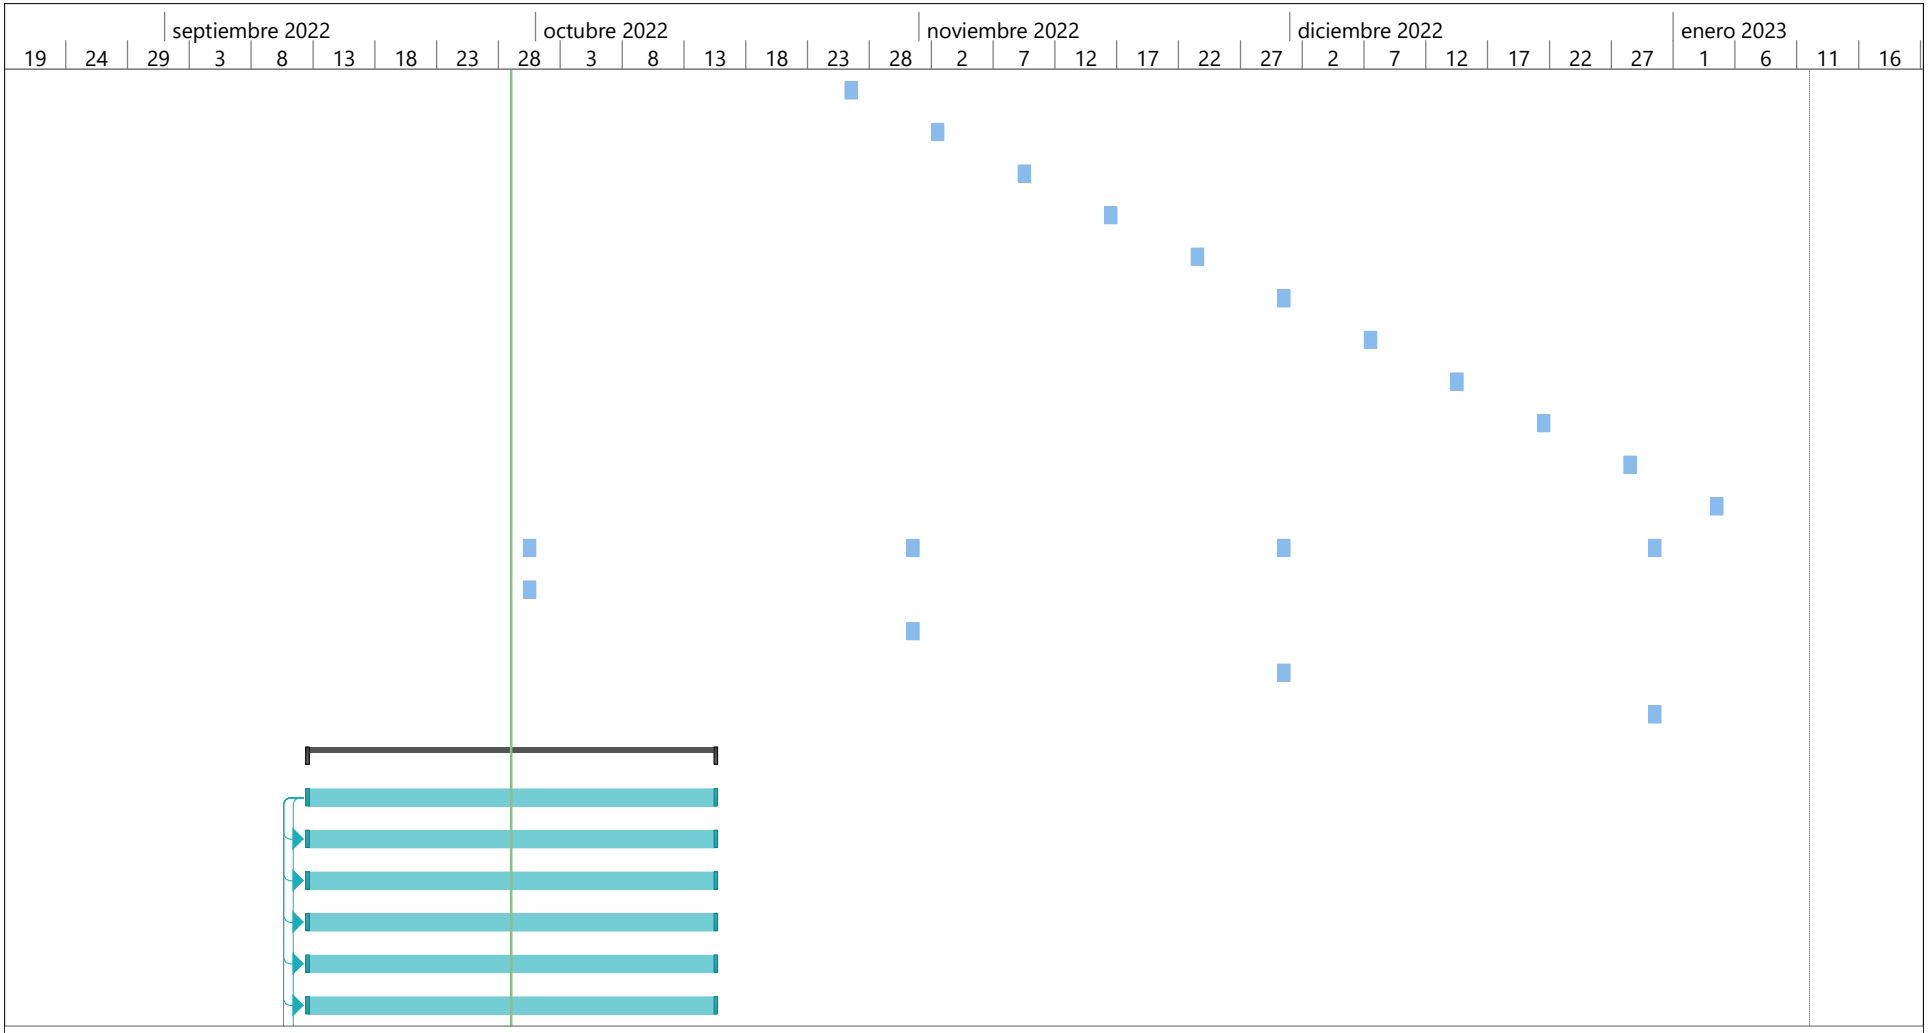



Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

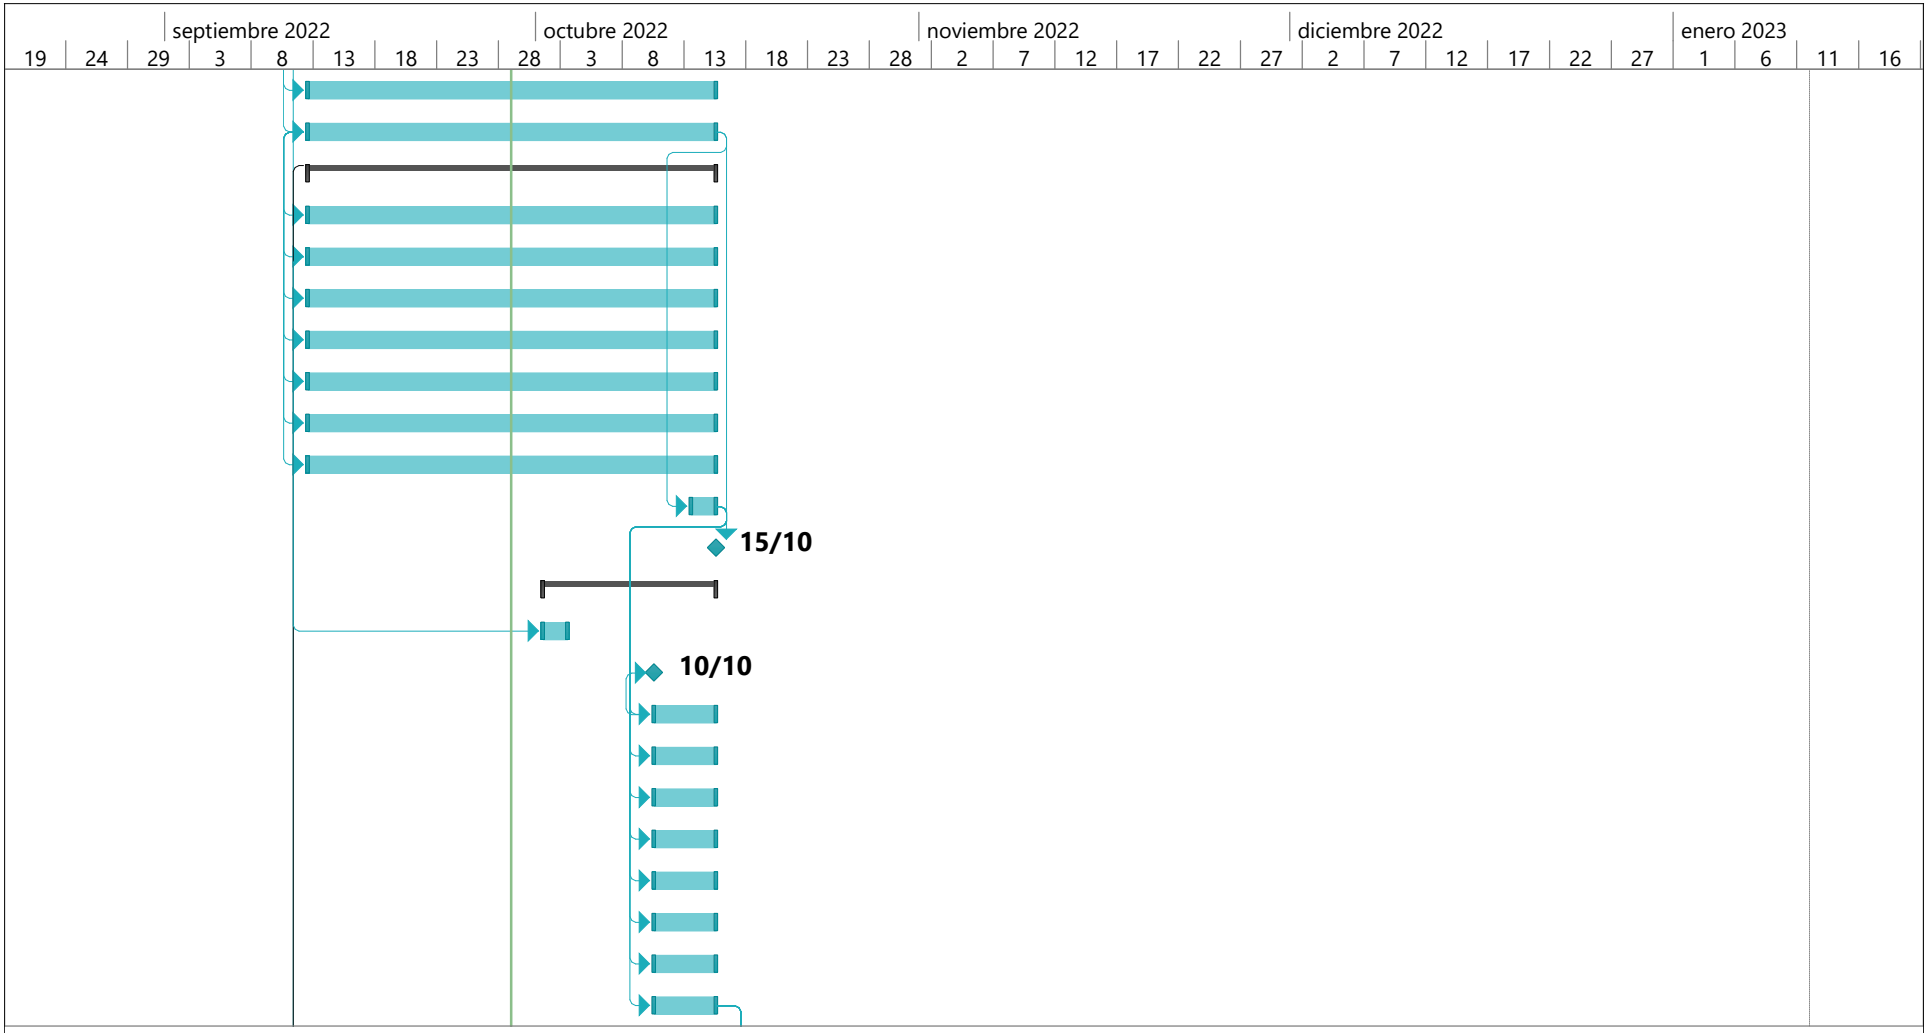



Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

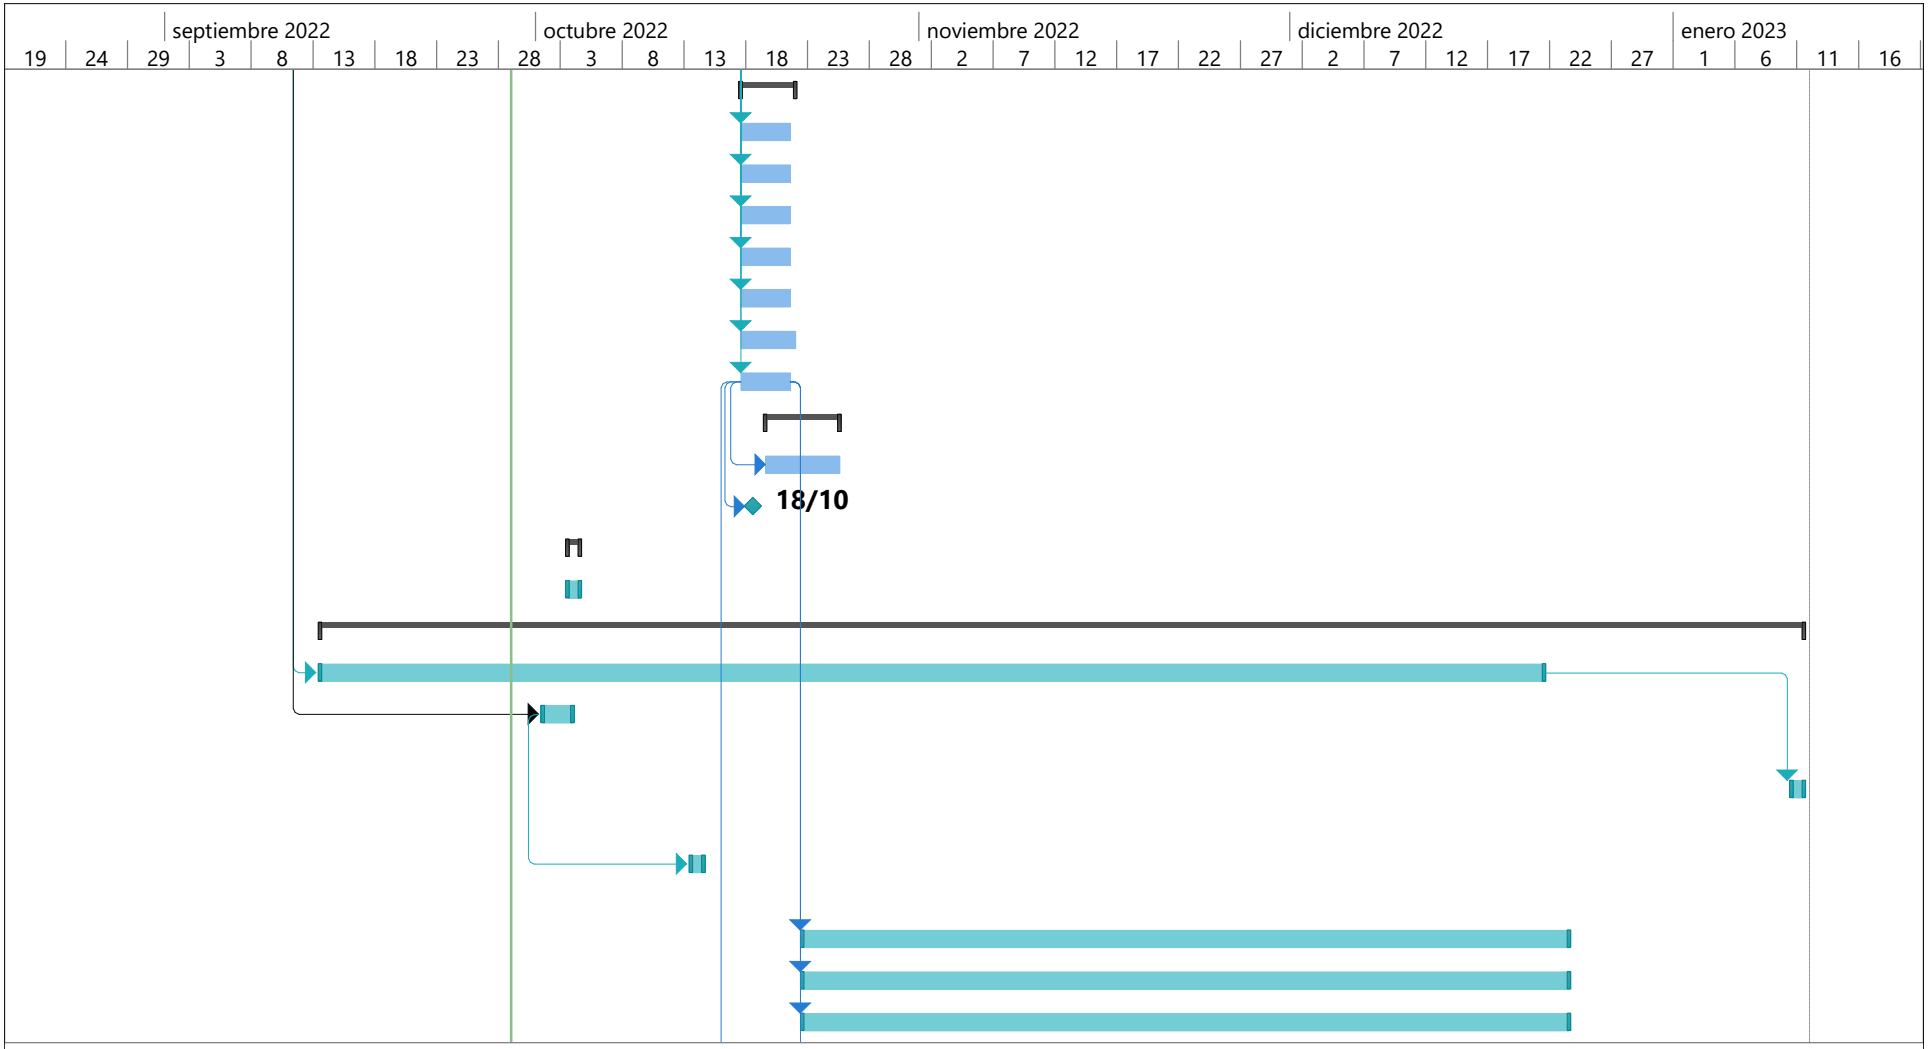



Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

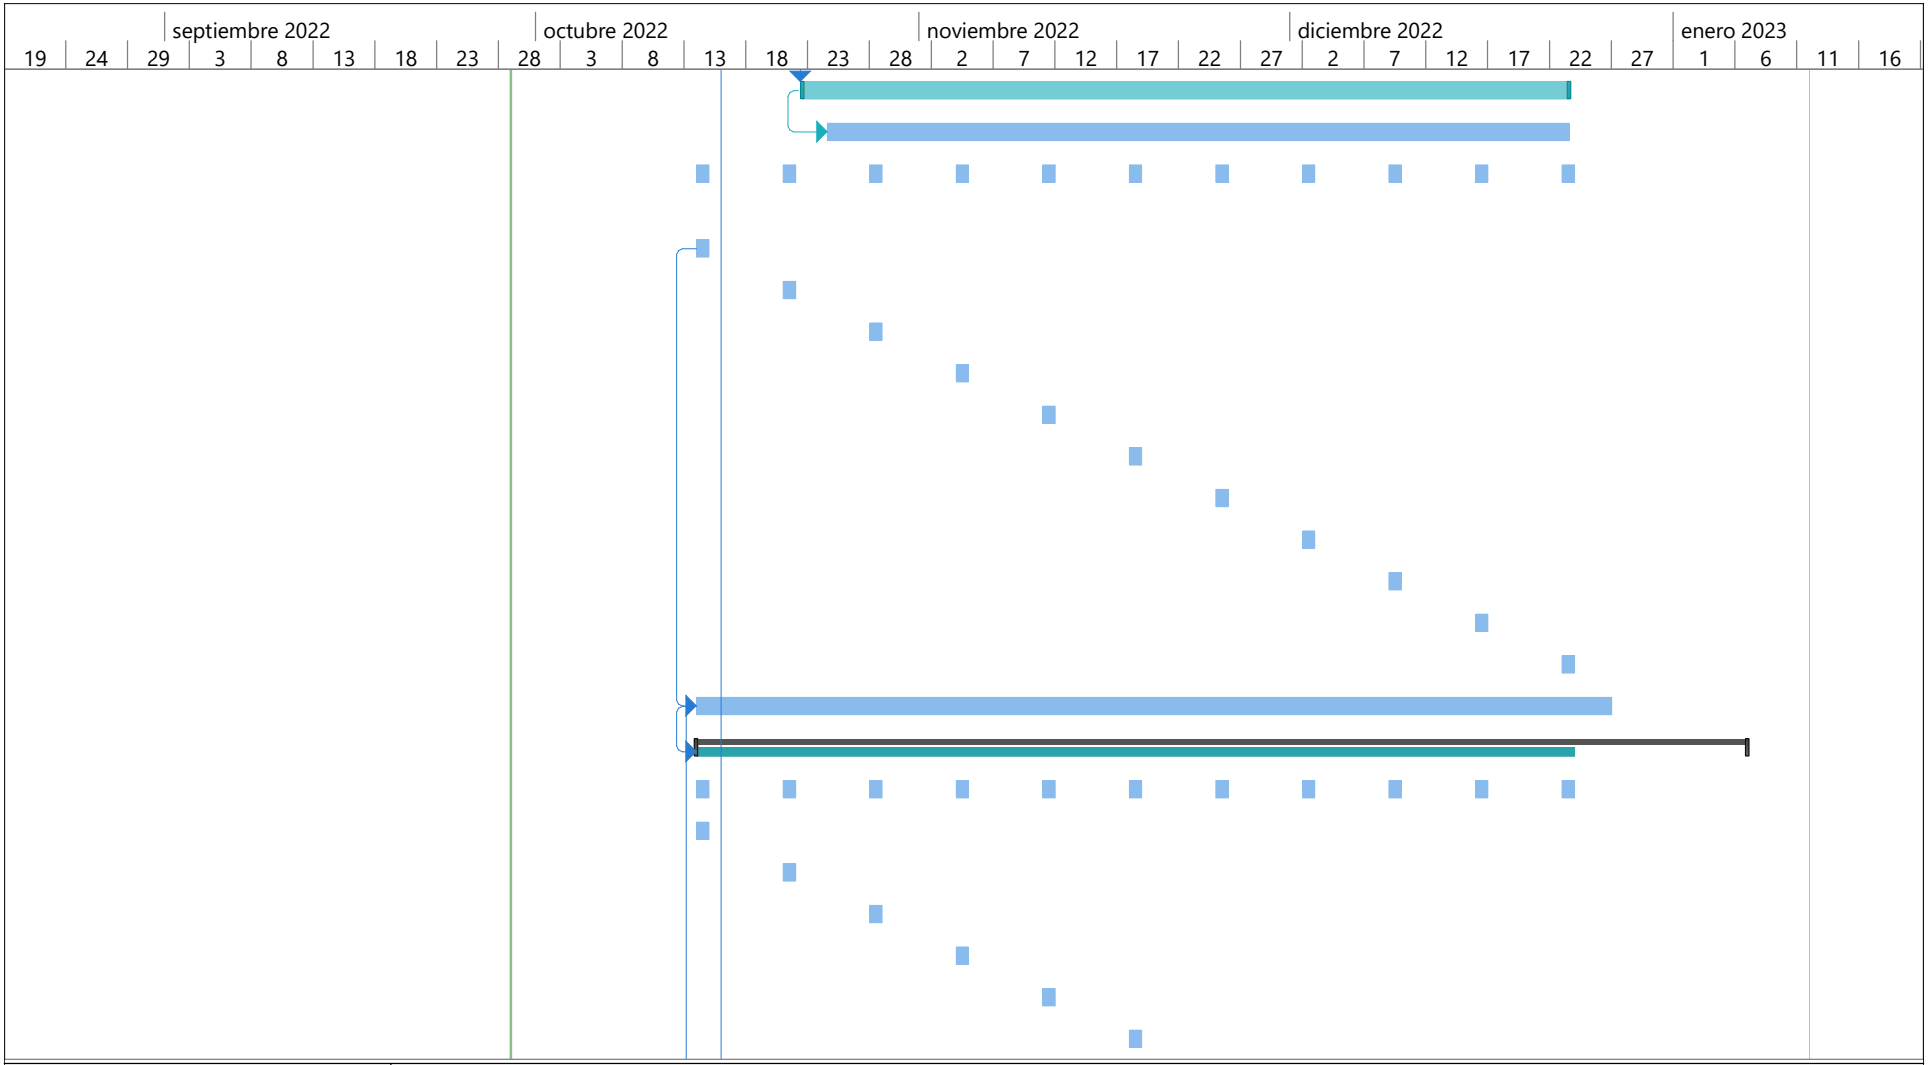



Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

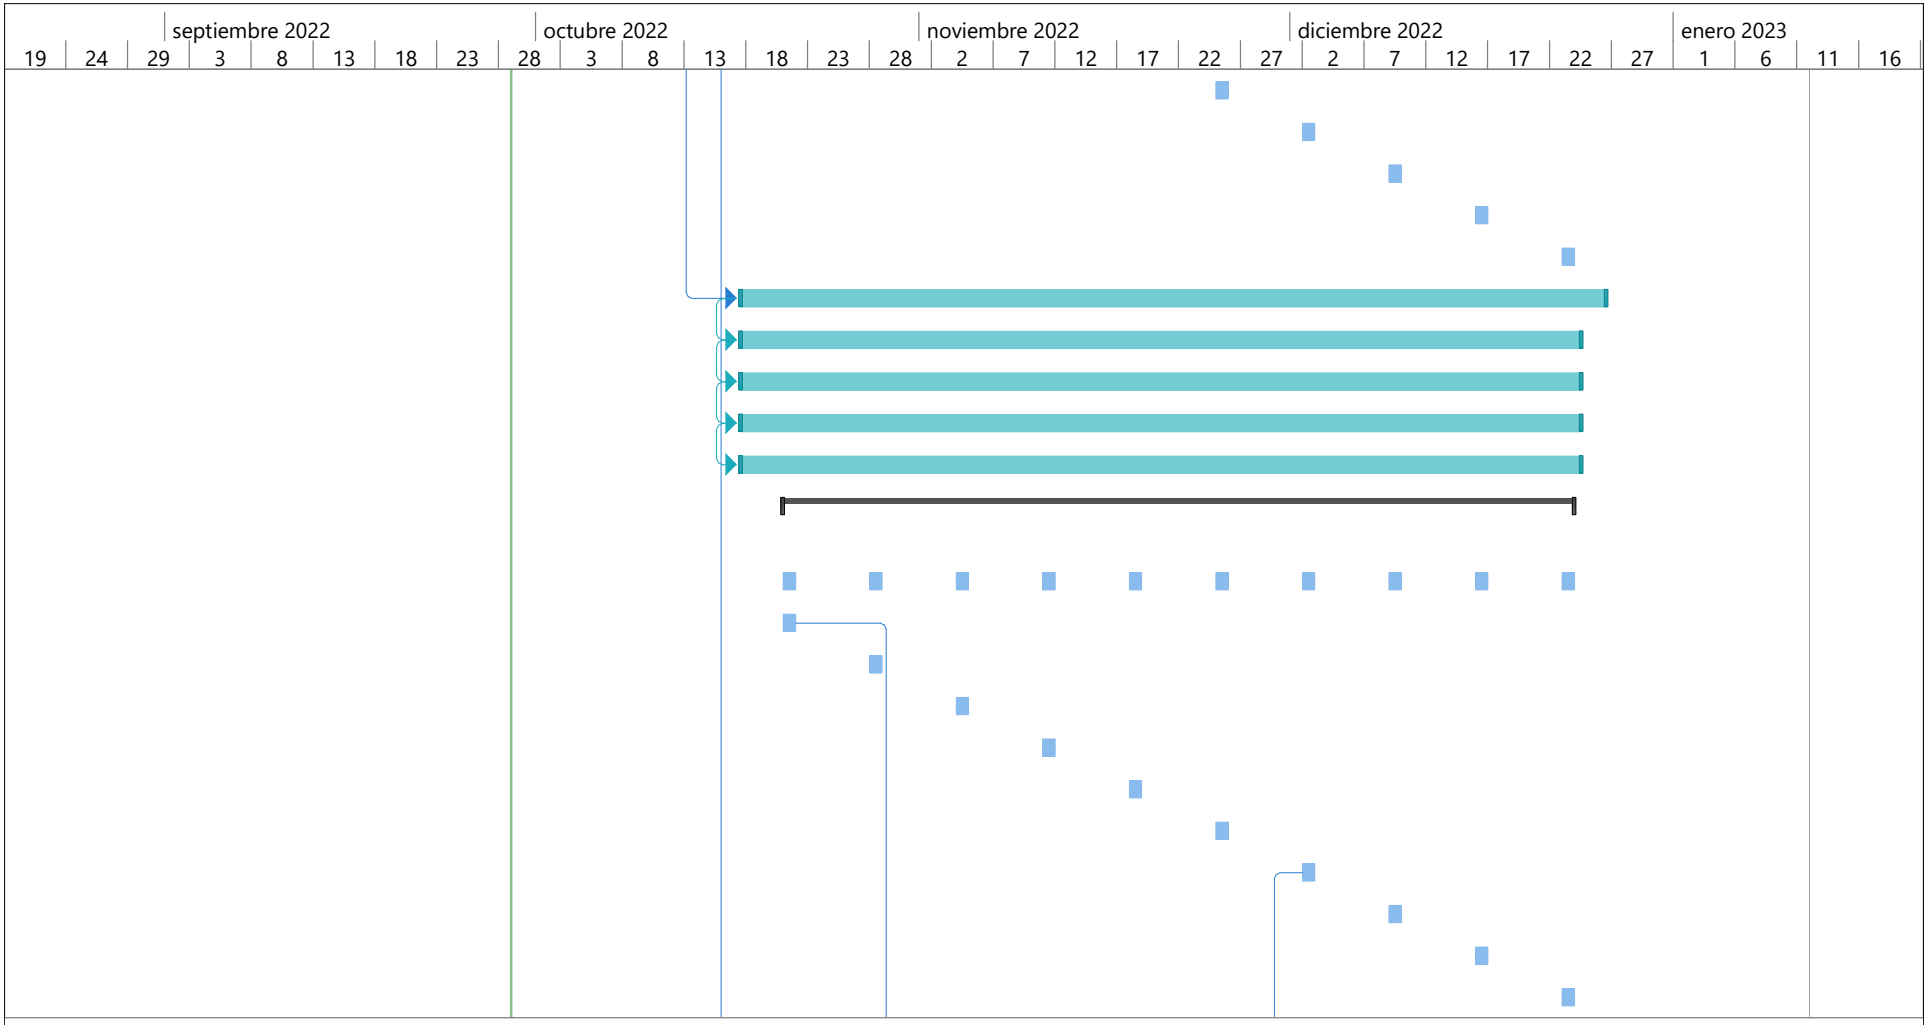


Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

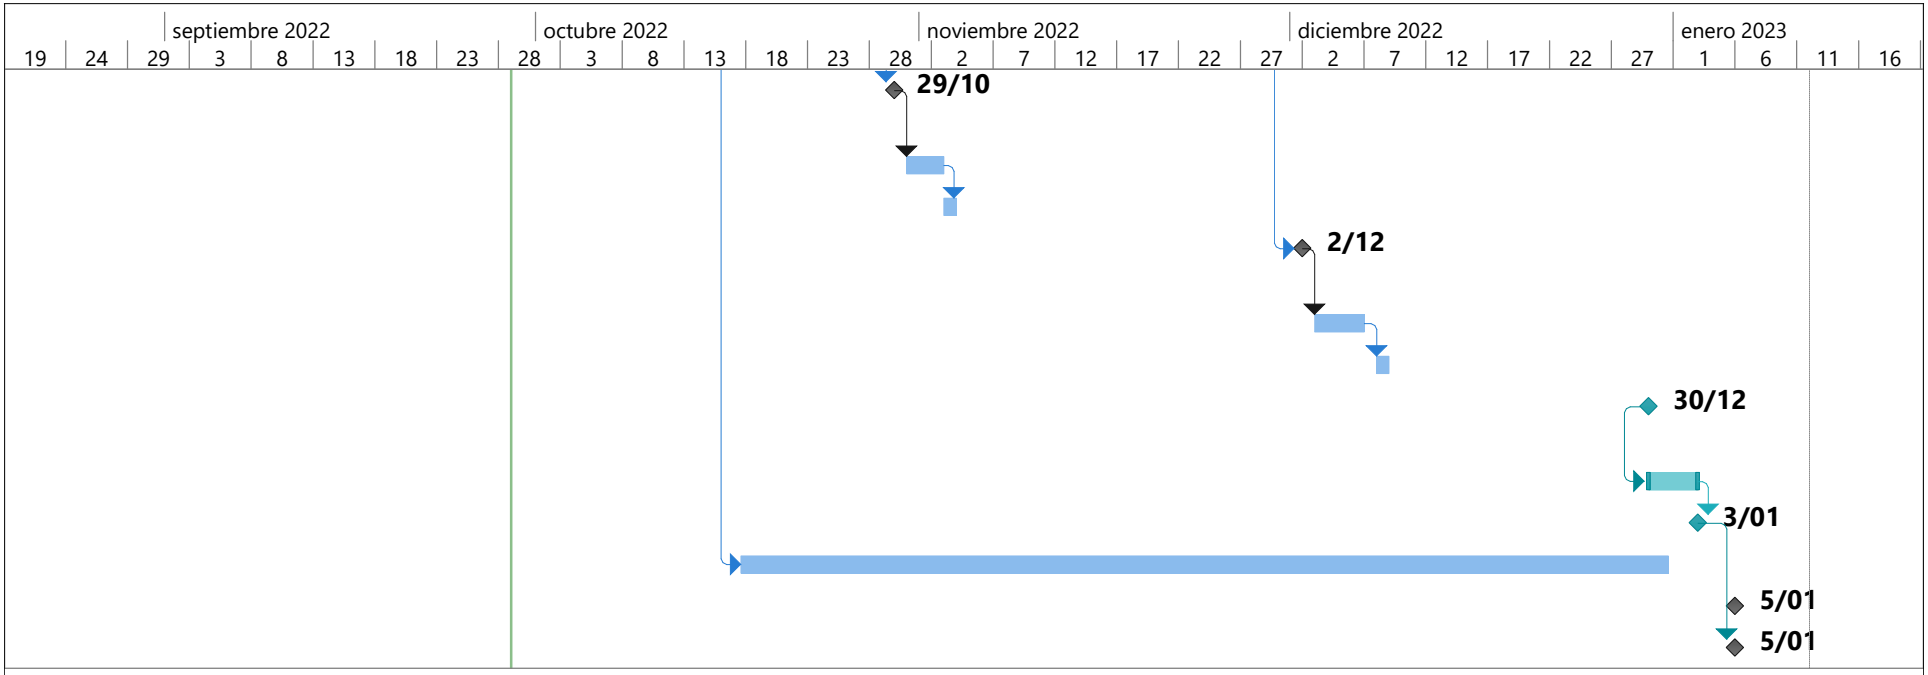


Proyecto: 290922SEGUIMIENTO
Fecha: jue 29/09/22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |
