
19102022SEGUIMIENTOProyectoSNR CSA 1402_2022V3.mpp


Id	EDT	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin	% completac	%PLANEAD
1	**1**	**PROYECTO CPS1402_2022_SNR_CSA**	**123,**	**mar 16/08/22**	**vie 6/01/23**	**18%**	**42%**
2	1.1	Formalizacion del contrato	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22	100%	100%
3	1.2	Acta de inicio del contrato	0 día	jue 25/08/22	jue 25/08/22	100%	100%
4	**1.3**	**100. Diagnóstico**	**21 d**	**mar 16/08/22**	**vie 9/09/22**	**100%**	**100%**
5	1.3.1	101. Reconocimiento documentacion en estanteria	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22	100%	100%
6	1.3.2	105. Informe de diagnostico	0 día	vie 9/09/22	vie 9/09/22	100%	100%
7	1.4	120. Solicitud de Formatos e Instrumentos	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	100%	100%
8	1.5	130. Fumigacion	1 día	sáb 3/09/22	lun 5/09/22	100%	100%
9	1.6	131. Informe de Fumigacion	1 día	lun 12/09/22	mar 13/09/22	100%	100%
10	**1.7**	**140. Entrega de Hojas de Vida Profesionales y Tecnicos**	**1 día**	**vie 9/09/22**	**sáb 10/09/22**	**100%**	**100%**
11	1.7.1	141. Aprobacion Hojas de Vida Profesionales	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	100%	100%
12	1.8	150. Entrega de Planes	0 día	vie 9/09/22	vie 9/09/22	100%	100%
13	1.9	Ajustes y aprobacion de planes	1 día	lun 12/09/22	mar 13/09/22	100%	100%
14	**1.10**	**Reunión comité semanal**	**105**	**mié 31/08/22**	**mié 4/01/23**	**39%**	**39%**
15	**1.10.1**	**Reunión comité semanal**	**105**	**mié 31/08/22**	**mié 4/01/23**	**42%**	**42%**
16	1.10.1.1	Reunión comité semanal 1	1 día	mié 31/08/22	mié 31/08/22	100%	100%
17	1.10.1.2	Reunión comité semanal 2	1 día	mié 7/09/22	mié 7/09/22	100%	100%
18	1.10.1.3	Reunión comité semanal 3	1 día	mié 14/09/22	mié 14/09/22	100%	100%
19	1.10.1.4	Reunión comité semanal 4	1 día	mié 21/09/22	mié 21/09/22	100%	100%

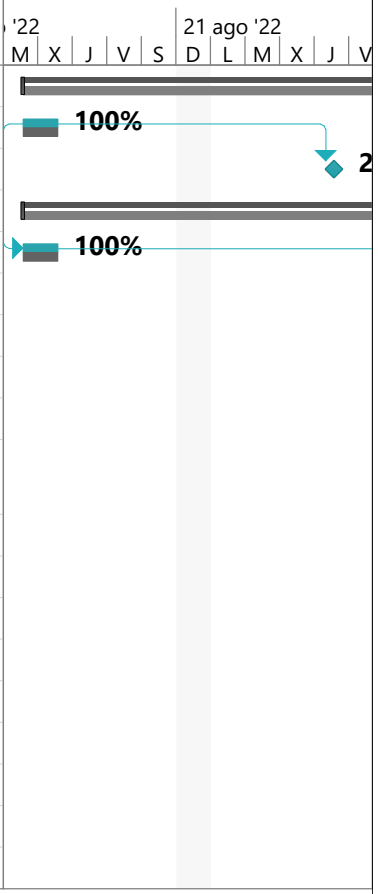

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite


19102022SEGUIMIENTOProyectoSNR CSA 1402_2022V3.mpp

Id	EDT	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin	% completac	%PLANEAD
20	1.10.1.5	Reunión comité semanal 5	1 día	mié 28/09/22	mié 28/09/22	100%	100%
21	1.10.1.6	Reunión comité semanal 6	1 día	mié 5/10/22	mié 5/10/22	100%	100%
22	1.10.1.7	Reunión comité semanal 7	1 día	mié 12/10/22	mié 12/10/22	100%	100%
23	1.10.1.8	Reunión comité semanal 8	1 día	mié 19/10/22	mié 19/10/22	100%	100%
24	1.10.1.9	Reunión comité semanal 9	1 día	mié 26/10/22	mié 26/10/22	0%	0%
25	1.10.1.10	Reunión comité semanal 10	1 día	mié 2/11/22	mié 2/11/22	0%	0%
26	1.10.1.11	Reunión comité semanal 11	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	0%	0%
27	1.10.1.12	Reunión comité semanal 12	1 día	mié 16/11/22	mié 16/11/22	0%	0%
28	1.10.1.13	Reunión comité semanal 13	1 día	mié 23/11/22	mié 23/11/22	0%	0%
29	1.10.1.14	Reunión comité semanal 14	1 día	mié 30/11/22	mié 30/11/22	0%	0%
30	1.10.1.15	Reunión comité semanal 15	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22	0%	0%
31	1.10.1.16	Reunión comité semanal 16	1 día	mié 14/12/22	mié 14/12/22	0%	0%
32	1.10.1.17	Reunión comité semanal 17	1 día	mié 21/12/22	mié 21/12/22	0%	0%
33	1.10.1.18	Reunión comité semanal 18	1 día	mié 28/12/22	mié 28/12/22	0%	0%
34	1.10.1.19	Reunión comité semanal 19	1 día	mié 4/01/23	mié 4/01/23	0%	0%
35	**1.10.2**	**Informe Mensual**	**79 d**	**vie 30/09/22**	**vie 30/12/22**	**25%**	**25%**
36	1.10.2.1	Informe Mensual 1	1 día	vie 30/09/22	vie 30/09/22	100%	100%
37	1.10.2.2	Informe Mensual 2	1 día	lun 31/10/22	lun 31/10/22	0%	0%
38	1.10.2.3	Informe Mensual 3	1 día	mié 30/11/22	mié 30/11/22	0%	0%
39	1.10.2.4	Informe Mensual 4	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%	0%

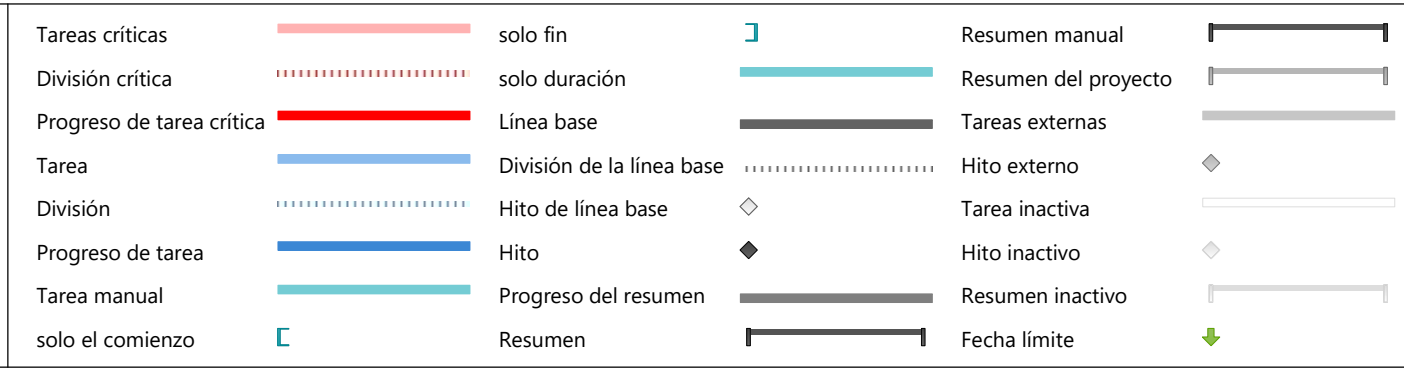


19102022SEGUIMIENTOProyectoSNR CSA 1402_2022V3.mpp


Id	EDT	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin	% completac	%PLANEAD
40	**1.11**	**220. Inicio de punteo**	**29 d**	**lun 12/09/22**	**sáb 15/10/22**	**51%**	**100%**
41	1.11.1	221.Inicio de rotulacion codigo de barras	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	51%	100%
42	1.11.2	223.Control de calidad de insercion y rotulacion	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	51%	100%
43	1.11.3	224.Implementacion del aplicativo	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	51%	100%
44	1.11.4	225.Inicio de grabacion para punteo	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	51%	100%
45	1.11.5	226.Limpieza Superficial con aspiradora	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	51%	100%
46	1.11.6	227.Conteo de folios	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	51%	100%
47	1.11.7	228.Punteo validacion expedientes y captura de fol	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	51%	100%
48	1.11.8	229.Control de calidad datos capturados en el aplic	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	51%	100%
49	**1.12**	**230. Inicio de Embalaje**	**29 d**	**lun 12/09/22**	**sáb 15/10/22**	**50%**	**100%**
50	1.12.1	231.Embalaje de las carpetas	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	50%	100%
51	1.12.2	232.Asignacion numero de paquete	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	50%	100%
52	1.12.3	233.Cierre de paquete con Sticker adhesivo y/o pre	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	50%	100%
53	1.12.4	234.Ubicacion unidades de almacemaniento en sitio	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	50%	100%
54	1.12.5	235.Validacion informacion por parte de la supervis	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	50%	100%
55	1.12.6	236.Toma de registro fotografico	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	50%	100%
56	1.12.7	237.Generacion de acta	29 d	lun 12/09/22	sáb 15/10/22	50%	100%
57	1.12.8	Desmonte puestos de trabajo	2 día	jue 13/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
58	1.12.9	Acta de devolucion espacios de trabajo a satisfacior	0 día	sáb 15/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
59	**1.13**	**250. Cargue**	**12 d**	**sáb 1/10/22**	**sáb 15/10/22**	**3%**	**100%**




Id	EDT	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin	% completac	%PLANEAD
60	1.13.1	251. Envio protocolo de cargue y descargue	1 día	sáb 1/10/22	lun 3/10/22	100%	100%
61	1.13.2	252. Aprobacion protocolo cargue y descargue	0 día	lun 10/10/22	lun 10/10/22	100%	100%
62	1.13.3	253. Inicio de grabacion cargue	5 día	lun 10/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
63	1.13.4	254. Inicio grabacion interior del camio	5 día	lun 10/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
64	1.13.5	255. Registro fotografico del cargue y al interior del	5 día	lun 10/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
65	1.13.6	256. Cargue de cajas al camion	5 día	lun 10/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
66	1.13.7	257. Toma de registro fotografico finalizacion del ca	5 día	lun 10/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
67	1.13.8	258. Cierre de camion con presinto	5 día	lun 10/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
68	1.13.9	259.Toma de registro fotografico con escoltas y cor	5 día	lun 10/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
69	1.14	260. Seguimiento ruta de camion por GPS	5 día	lun 10/10/22	sáb 15/10/22	0%	100%
70	**1.15**	**280. Llegada y descargue camion bogota**	**4,38**	**lun 17/10/22**	**vie 21/10/22**	**0%**	**59%**
71	1.15.1	281. Inicio grabacion interior del camion	4 día	lun 17/10/22	vie 21/10/22	0%	59%
72	1.15.2	282. Registro fotografico	4 día	lun 17/10/22	vie 21/10/22	0%	59%
73	1.15.3	283. Apertura del presinto	4 día	lun 17/10/22	vie 21/10/22	0%	59%
74	1.15.4	284. Registro fotografico al interior del camion	4 día	lun 17/10/22	vie 21/10/22	0%	59%
75	1.15.5	285. Descargue unidades de conservacion en estiba	4 día	lun 17/10/22	vie 21/10/22	0%	59%
76	1.15.6	286. Verificacion por parte de la interventoria	4,38	lun 17/10/22	vie 21/10/22	0%	54%
77	1.15.7	287. Generacion de acta de llegada	4 día	lun 17/10/22	vie 21/10/22	0%	59%
78	**1.16**	**Ubicacion**	**5 día**	**mié 19/10/22**	**mar 25/10/22**	**0%**	**8%**
79	1.16.1	Ubicacion en estanteria unidades de conservacion	5 día	mié 19/10/22	mar 25/10/22	0%	8%

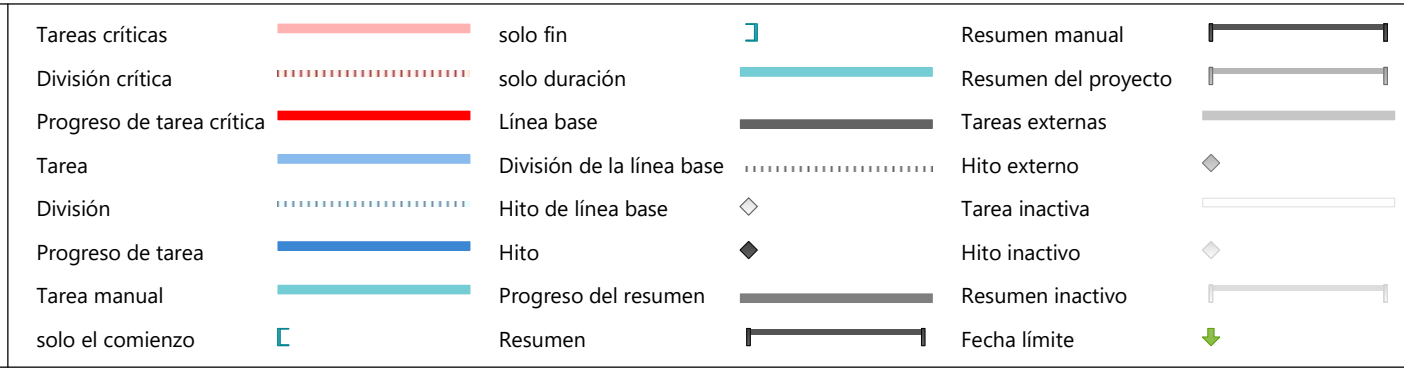


Id	EDT	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin	% completac	%PLANEAD
80	1.17	Entrega de diagnóstico en conservación preventiva.	0 día	mar 18/10/22	mar 18/10/22	100%	100%
81	**1.18**	**Entrega de Plan de intervención en conservación.**	**1 día**	**lun 3/10/22**	**mar 4/10/22**	**100%**	**100%**
82	1.18.1	Capacitacion en conservacion preventiva	1 día	lun 3/10/22	mar 4/10/22	100%	100%
83	**1.19**	**Procesamiento de Archivos Misionales**	**87 d**	**mar 13/09/22**	**vie 23/12/22**	**0%**	**10%**
84	1.19.1	Insercion Documentacion	85 d	mar 13/09/22	mié 21/12/22	0%	37%
85	1.19.2	Solicitud mesa de trabajo interventoria definicion d	1,38	sáb 1/10/22	lun 3/10/22	0%	100%
86	1.19.3	Firma de acta definicion de parametros organizació	1 día	jue 6/10/22	jue 6/10/22	0%	0%
87	1.19.4	Capacitacion grupo de trabajo parametros de organ	1 día	jue 13/10/22	vie 14/10/22	0%	100%
88	1.19.5	Clasificación Documental	53 d	sáb 22/10/22	vie 23/12/22	0%	0%
89	1.19.6	Ordenación Documental	53 d	sáb 22/10/22	vie 23/12/22	0%	100%
90	1.19.7	Depuración Documental	53 d	sáb 22/10/22	vie 23/12/22	0%	0%
91	1.19.8	Primeros Auxilios	53 d	sáb 22/10/22	vie 23/12/22	0%	0%
92	1.19.9	Foliación	52 d	lun 24/10/22	vie 23/12/22	0%	0%
93	**1.20**	**Control de calidad procesos de organización y Foliación**	**61 días**	**vie 14/10/22**	**vie 23/12/22**	**0%**	**9%**
94	1.20.1	Control de calidad procesos de organización 1	1 día	vie 14/10/22	vie 14/10/22	0%	100%
95	1.20.2	Control de calidad procesos de organización 2	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	0%	0%
96	1.20.3	Control de calidad procesos de organización 3	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%	0%
97	1.20.4	Control de calidad procesos de organización 4	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	0%	0%
98	1.20.5	Control de calidad procesos de organización 5	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	0%	0%

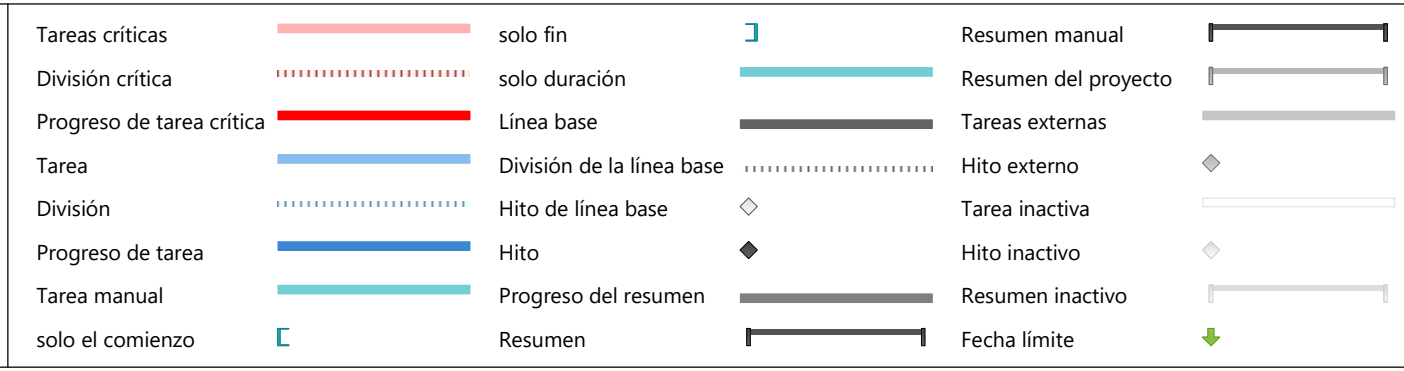


Id	EDT	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin	% completac	%PLANEAD
99	1.20.6	Control de calidad procesos de organización 6	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	0%	0%
100	1.20.7	Control de calidad procesos de organización 7	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	0%	0%
101	1.20.8	Control de calidad procesos de organización 8	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%	0%
102	1.20.9	Control de calidad procesos de organización 9	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%	0%
103	1.20.10	Control de calidad procesos de organización 10	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0%	0%
104	1.20.11	Control de calidad procesos de organización 11	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	0%	0%
105	1.21	Digitalización	60 d	vie 14/10/22	jue 22/12/22	0%	8%
106	**1.22**	**Indexacion**	**73 d**	**vie 14/10/22**	**vie 6/01/23**	**0%**	**9%**
107	**1.22.1**	**Control calidad digitalizacion e indexacion**	**61 d**	**vie 14/10/22**	**vie 23/12/22**	**0%**	**9%**
108	1.22.1.1	Control calidad digitalizacion e indexacion 1	1 día	vie 14/10/22	vie 14/10/22	0%	100%
109	1.22.1.2	Control calidad digitalizacion e indexacion 2	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	0%	0%
110	1.22.1.3	Control calidad digitalizacion e indexacion 3	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%	0%
111	1.22.1.4	Control calidad digitalizacion e indexacion 4	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	0%	0%
112	1.22.1.5	Control calidad digitalizacion e indexacion 5	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	0%	0%
113	1.22.1.6	Control calidad digitalizacion e indexacion 6	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	0%	0%
114	1.22.1.7	Control calidad digitalizacion e indexacion 7	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	0%	0%
115	1.22.1.8	Control calidad digitalizacion e indexacion 8	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%	0%
116	1.22.1.9	Control calidad digitalizacion e indexacion 9	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%	0%
117	1.22.1.10	Control calidad digitalizacion e indexacion 10	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0%	0%
118	1.22.1.11	Control calidad digitalizacion e indexacion 11	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	0%	0%





Id	EDT	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin	% completac	%PLANEAD
119	1.23	Descripción Documental	60 d	lun 17/10/22	lun 26/12/22	0%	4%
120	1.24	Generacion hojas de control	59 d	lun 17/10/22	sáb 24/12/22	0%	4%
121	1.25	Encarpetado	59 d	lun 17/10/22	sáb 24/12/22	0%	4%
122	1.26	Almacenamiento en unidades de conservacion	59 d	lun 17/10/22	sáb 24/12/22	0%	4%
123	1.27	Rotulación de Cajas y Carpetas	59 d	lun 17/10/22	sáb 24/12/22	0%	4%
124	**1.28**	**Revision final Validación de FUID realmacenamiento**	**55 d**	**vie 21/10/22**	**vie 23/12/22**	**0%**	**0%**
125	**1.28.1**	**Control de calidad Final FUID y embalaje**	**55 d**	**vie 21/10/22**	**vie 23/12/22**	**0%**	**0%**
126	1.28.1.1	Control de calidad Final FUID y embalaje 1	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	0%	0%
127	1.28.1.2	Control de calidad Final FUID y embalaje 2	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%	0%
128	1.28.1.3	Control de calidad Final FUID y embalaje 3	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	0%	0%
129	1.28.1.4	Control de calidad Final FUID y embalaje 4	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	0%	0%
130	1.28.1.5	Control de calidad Final FUID y embalaje 5	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	0%	0%
131	1.28.1.6	Control de calidad Final FUID y embalaje 6	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	0%	0%
132	1.28.1.7	Control de calidad Final FUID y embalaje 7	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%	0%
133	1.28.1.8	Control de calidad Final FUID y embalaje 8	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%	0%
134	1.28.1.9	Control de calidad Final FUID y embalaje 9	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0%	0%
135	1.28.1.10	Control de calidad Final FUID y embalaje 10	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	0%	0%
136	1.29	Entrega para aprobación de la interventoria de 100 M	0 día	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	0%	0%
137	1.30	Corrección y Ajustes 100 Metros Lineales	3 día	lun 31/10/22	mié 2/11/22	0%	0%
138	1.31	Informe entrega de 100 Metros Lineales	1 día	jue 3/11/22	jue 3/11/22	0%	0%




Id	EDT	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin	% completac	%PLANEAD
139	1.32	Entrega para aprobación de la interventoria de 2361 M	0 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%	0%
140	1.33	Corrección y Ajustes 2361 Metros Lineales	3 día	sáb 3/12/22	mar 6/12/22	0%	0%
141	1.34	Informe entrega de 2361 Metros Lineales	1 día	jue 8/12/22	jue 8/12/22	0%	0%
142	1.35	Entrega para aprobación de la interventoria de 2360 M	0 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%	0%
143	1.36	Corrección y Ajustes 2360 Metros Lineales	3 día	vie 30/12/22	lun 2/01/23	0%	0%
144	1.37	Informe entrega de 2360 Metros Lineales	0 día	mar 3/01/23	mar 3/01/23	0%	0%
145	1.38	Custodia de la documentacion por seis meses	65 d	lun 17/10/22	sáb 31/12/22	0%	4%
146	**1.39**	**cierre del proyecto**	**0 día**	**jue 5/01/23**	**jue 5/01/23**	**0%**	**0%**
147	1.39.1	Firma de cierre del proyecto	0 día	jue 5/01/23	jue 5/01/23	0%	0%

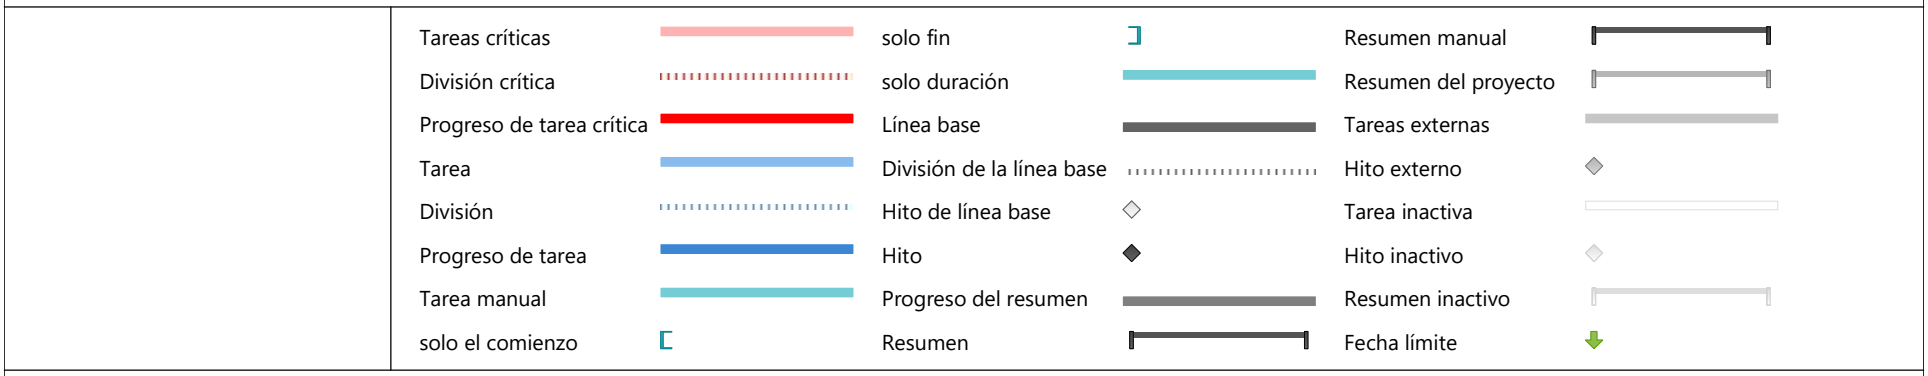

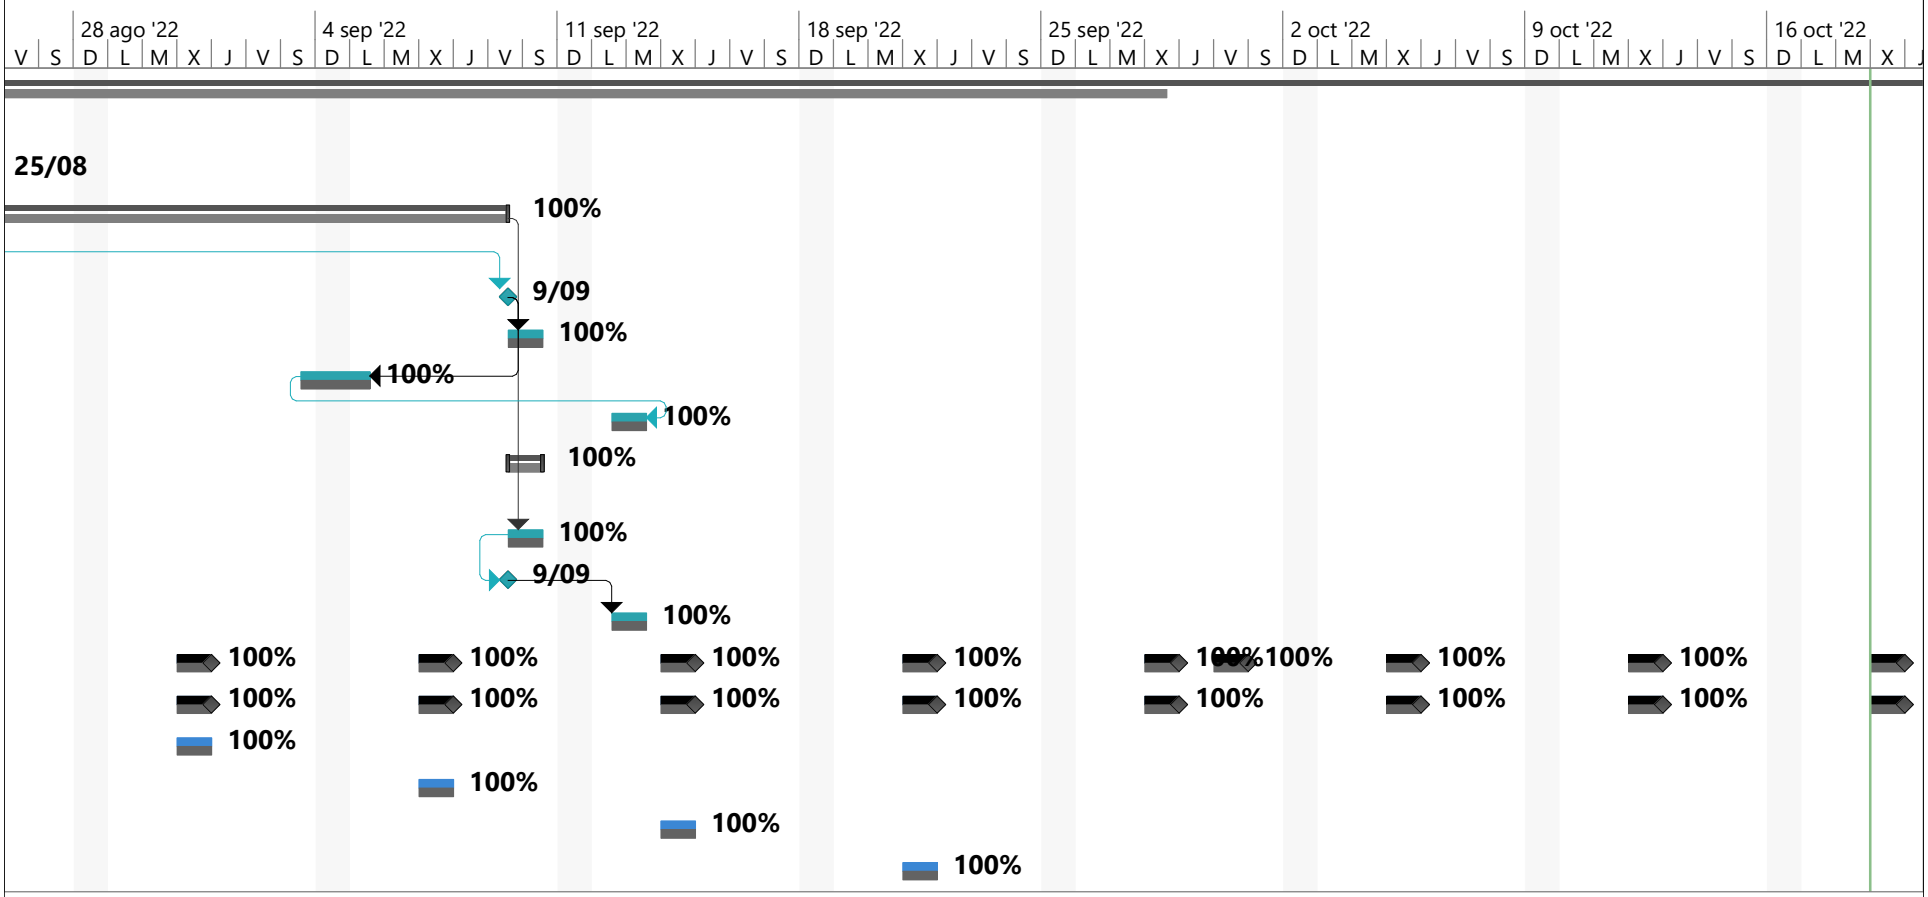

28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
9 oct '22
16 oct '22
25/08
100%
9/09
100%
100%
100%
100%
100%
9/09
100%
100%
100%
100%
100%

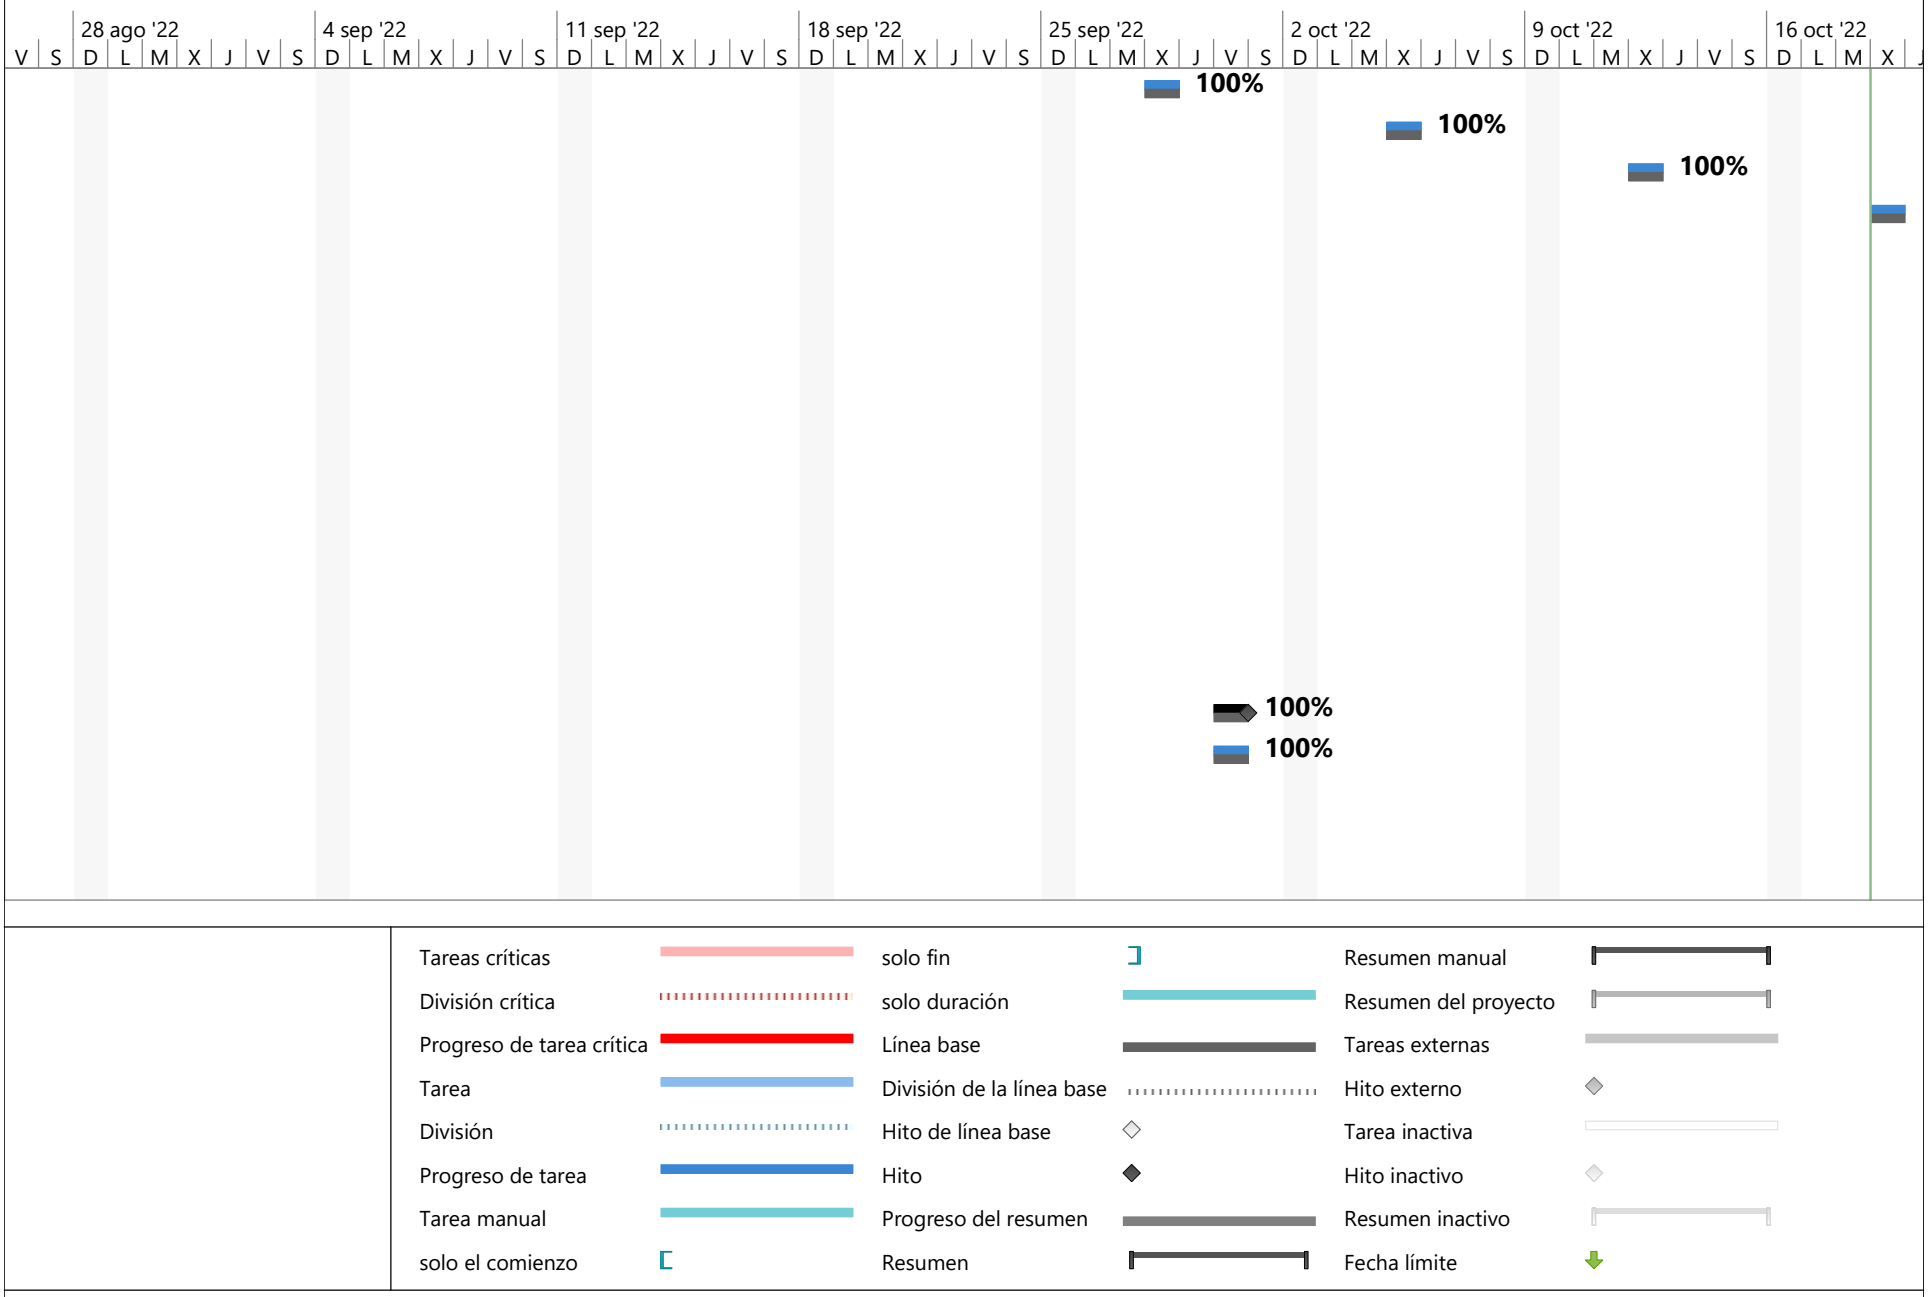


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

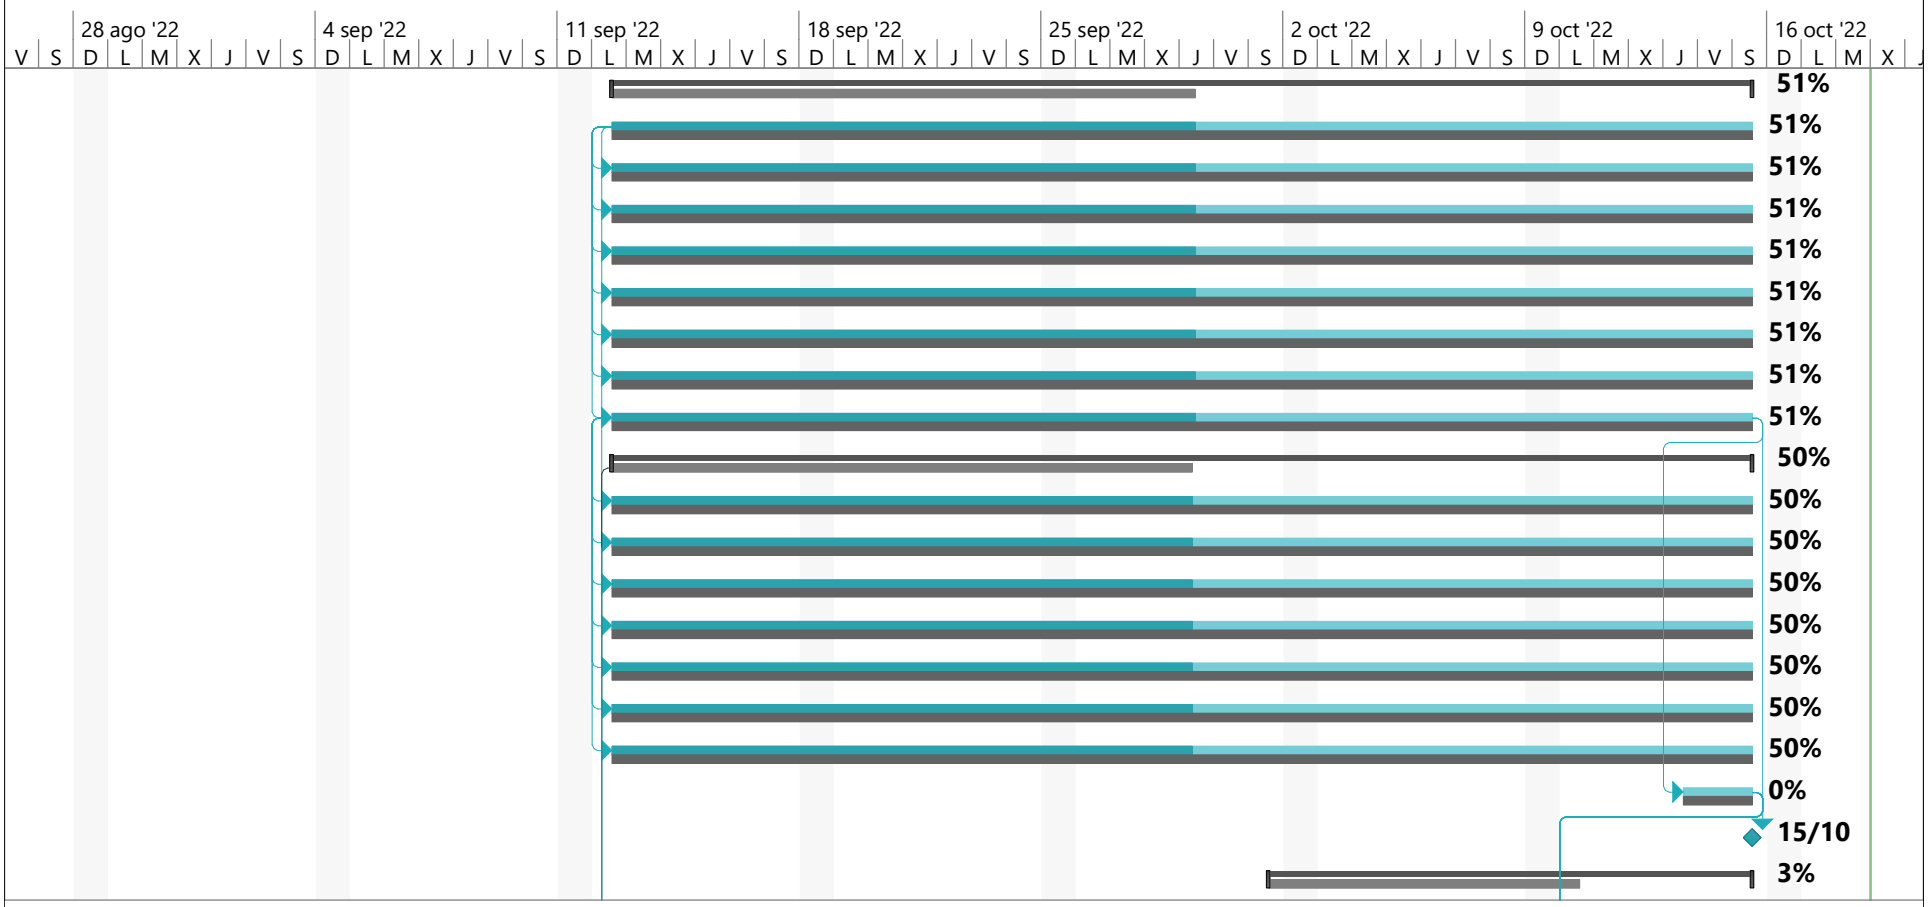


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

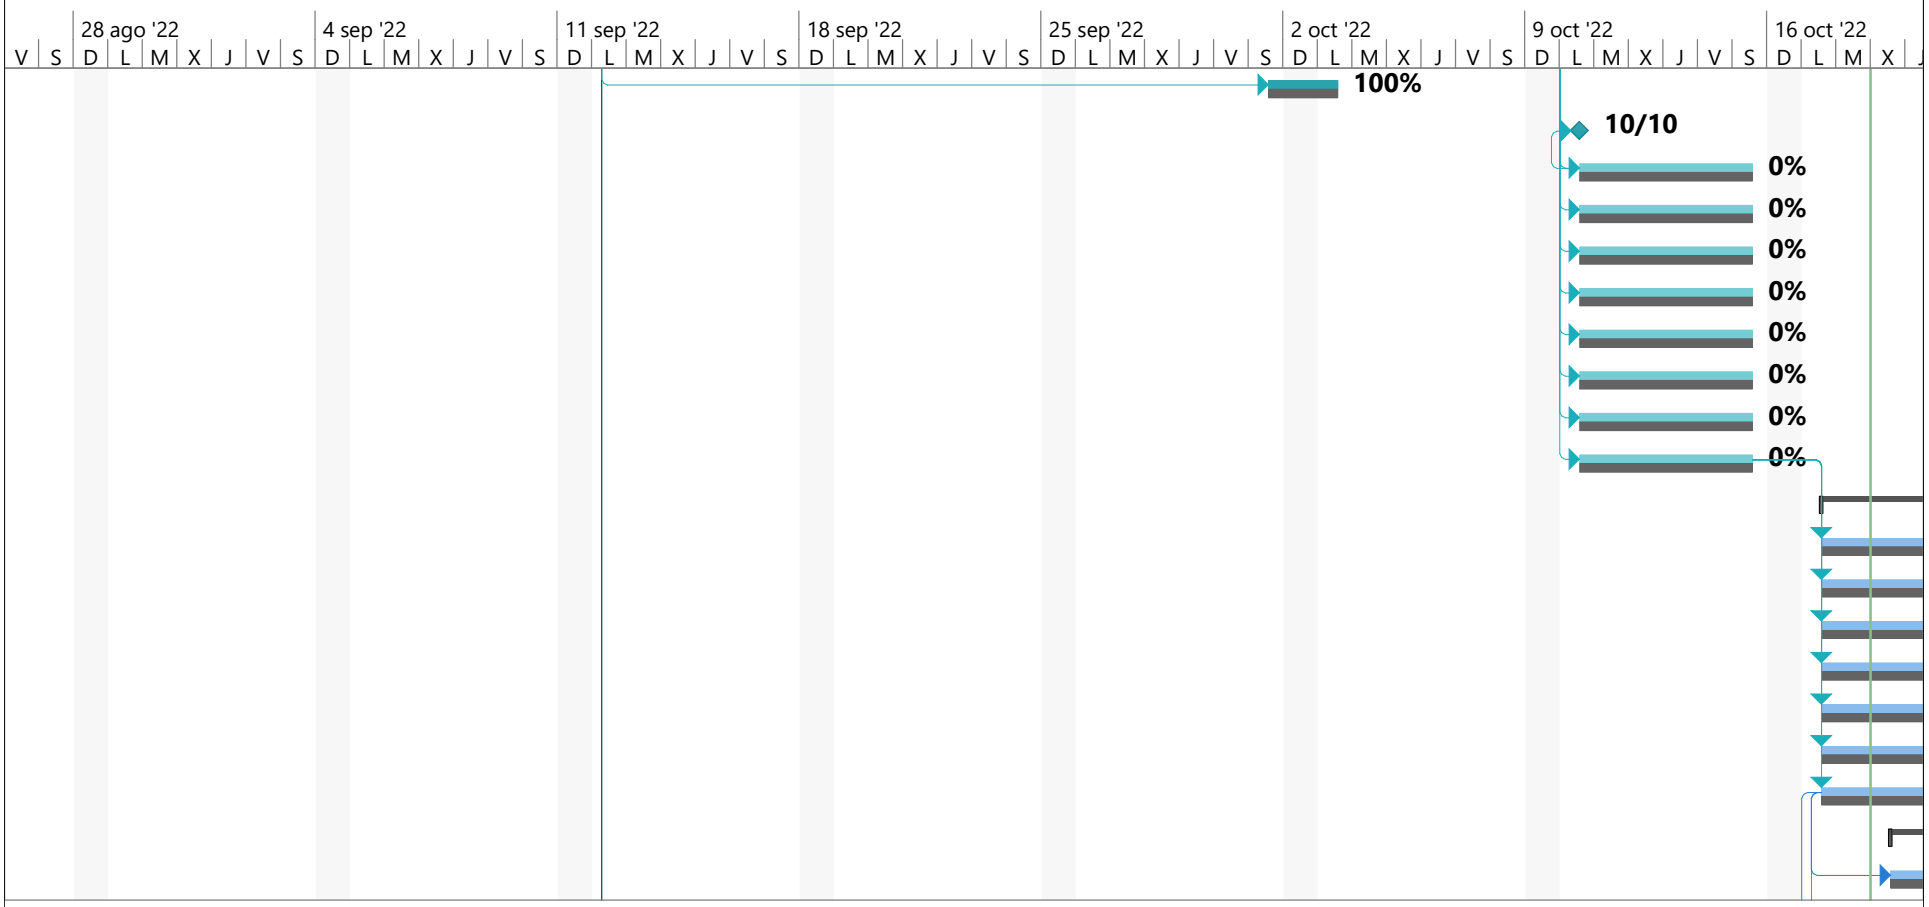


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

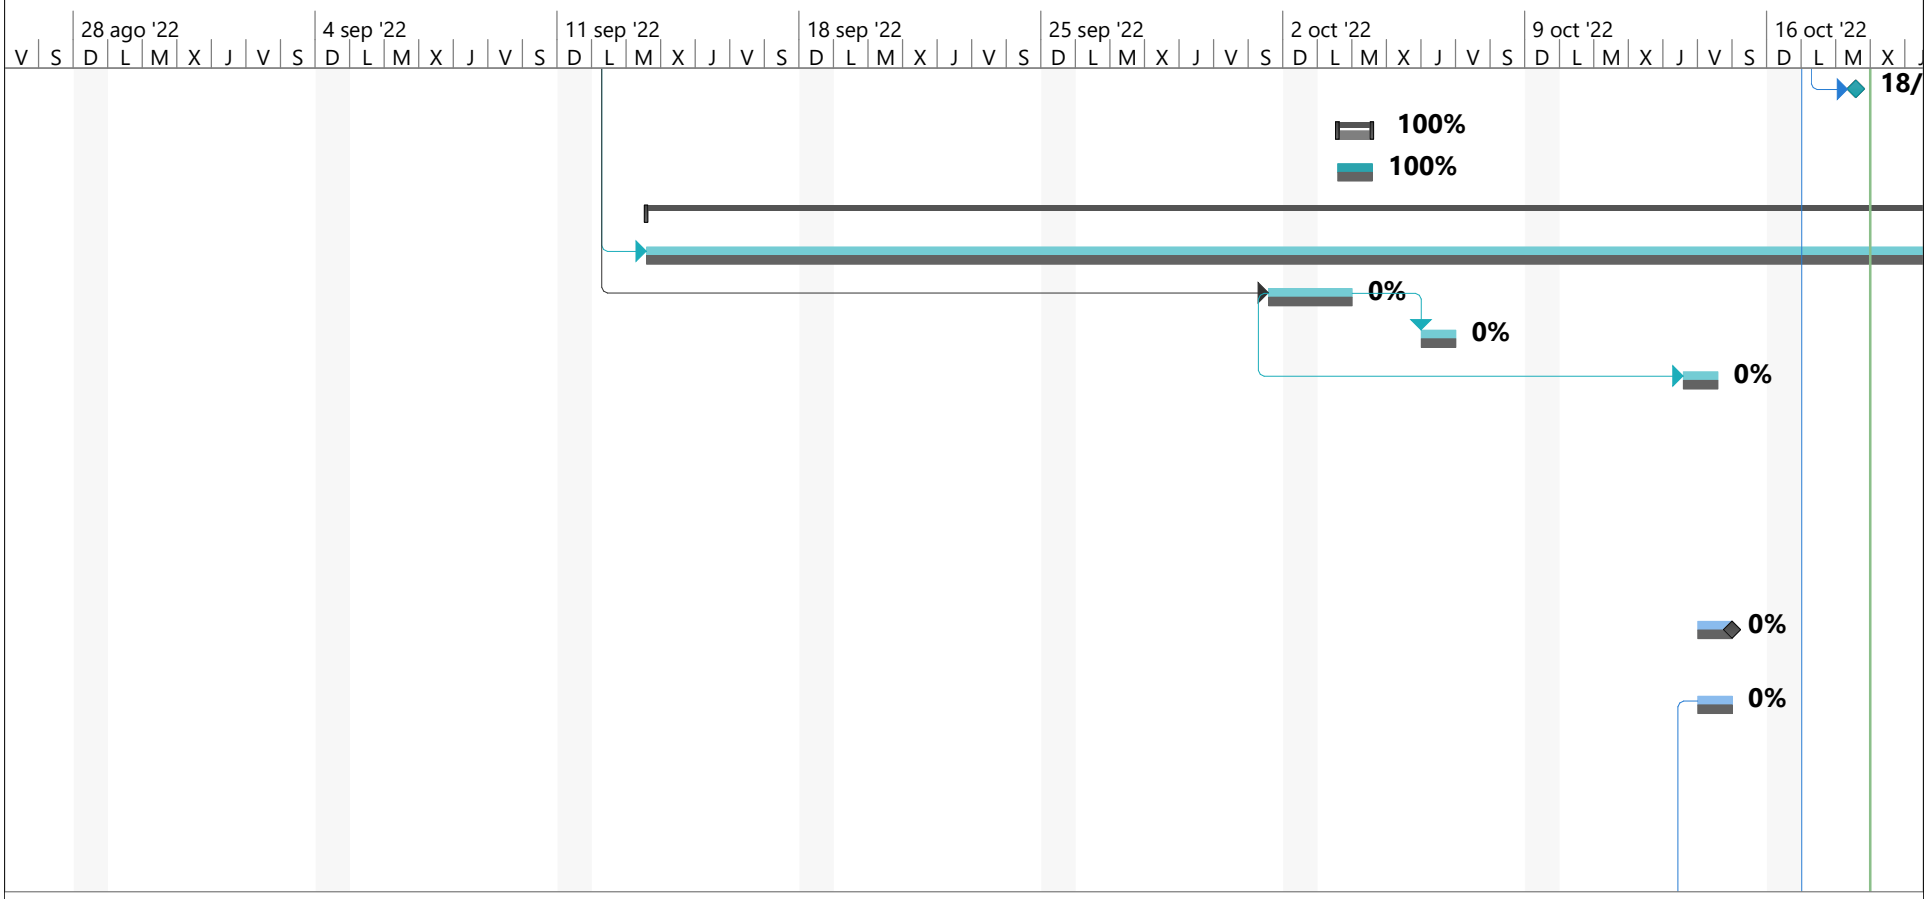


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

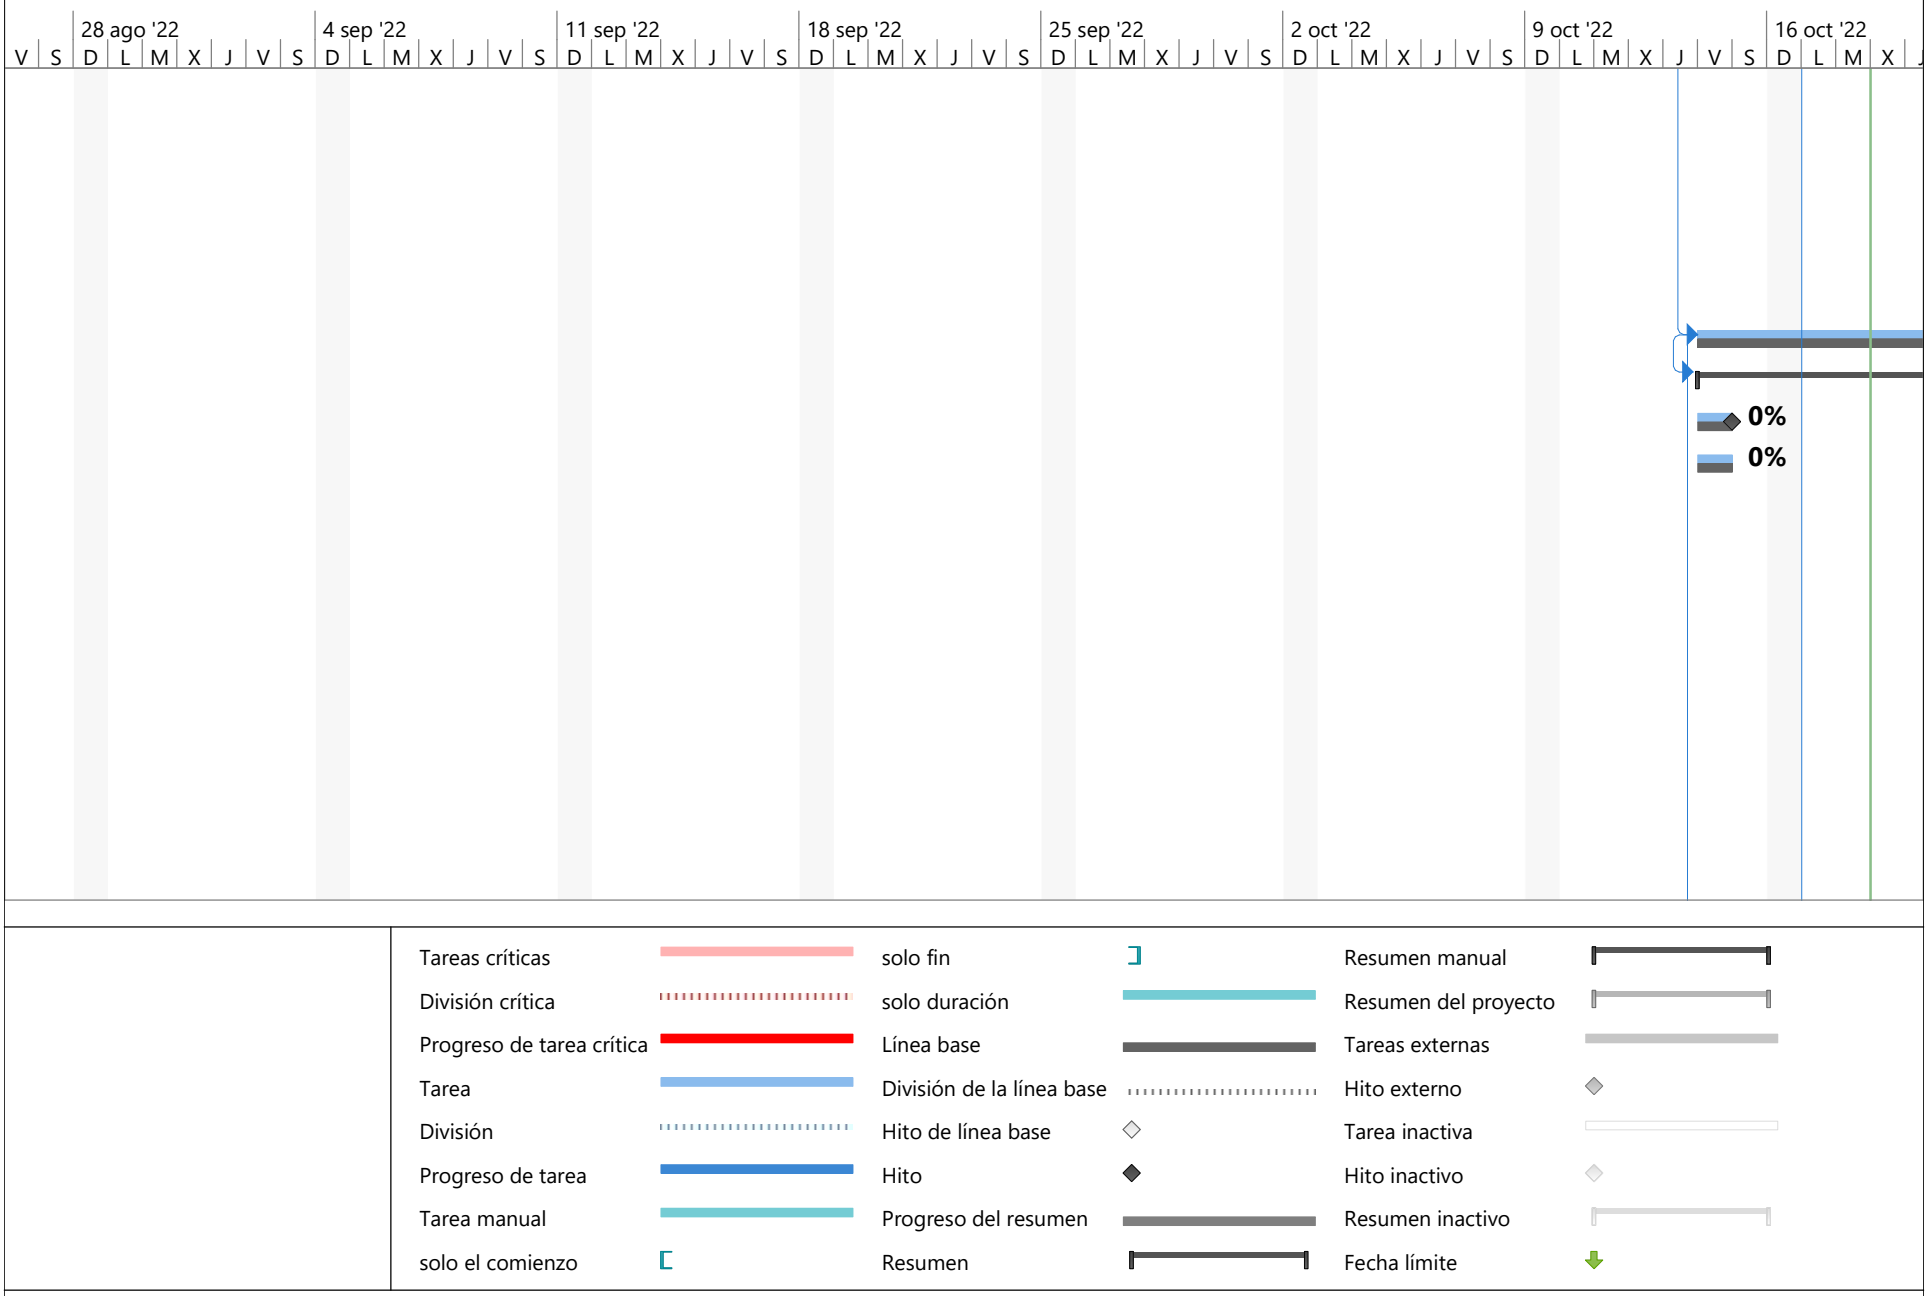
28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
9 oct '22
16 oct '22
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

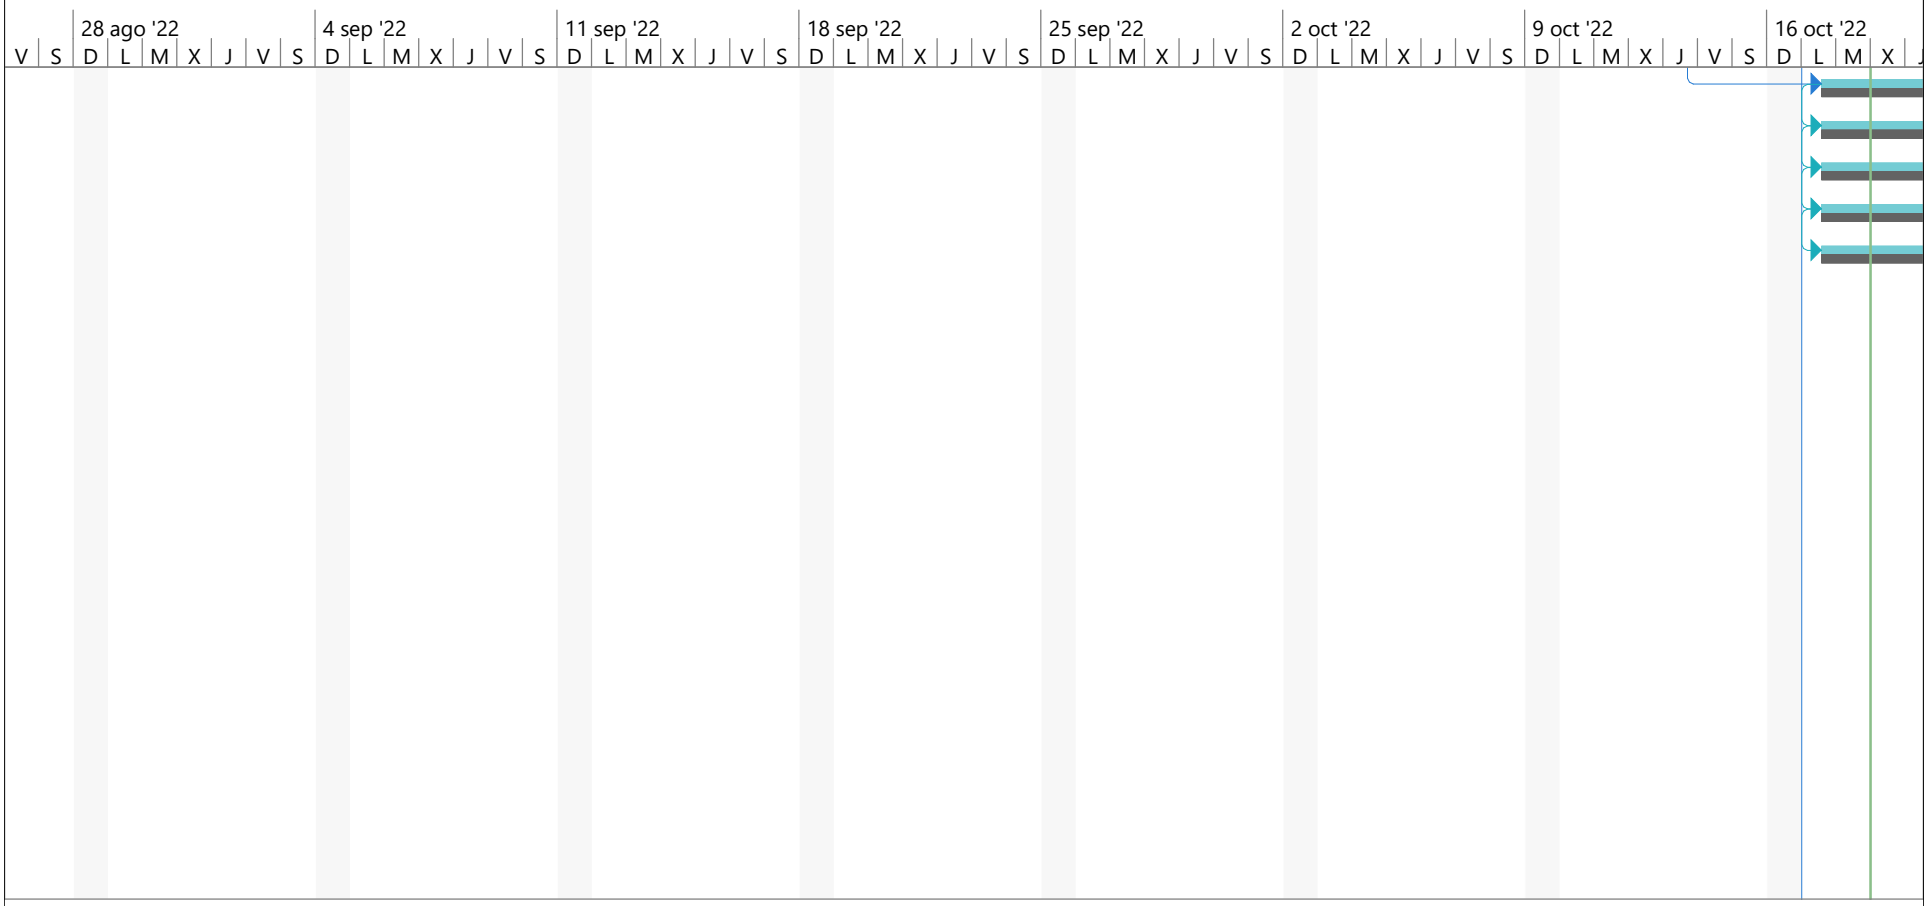

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

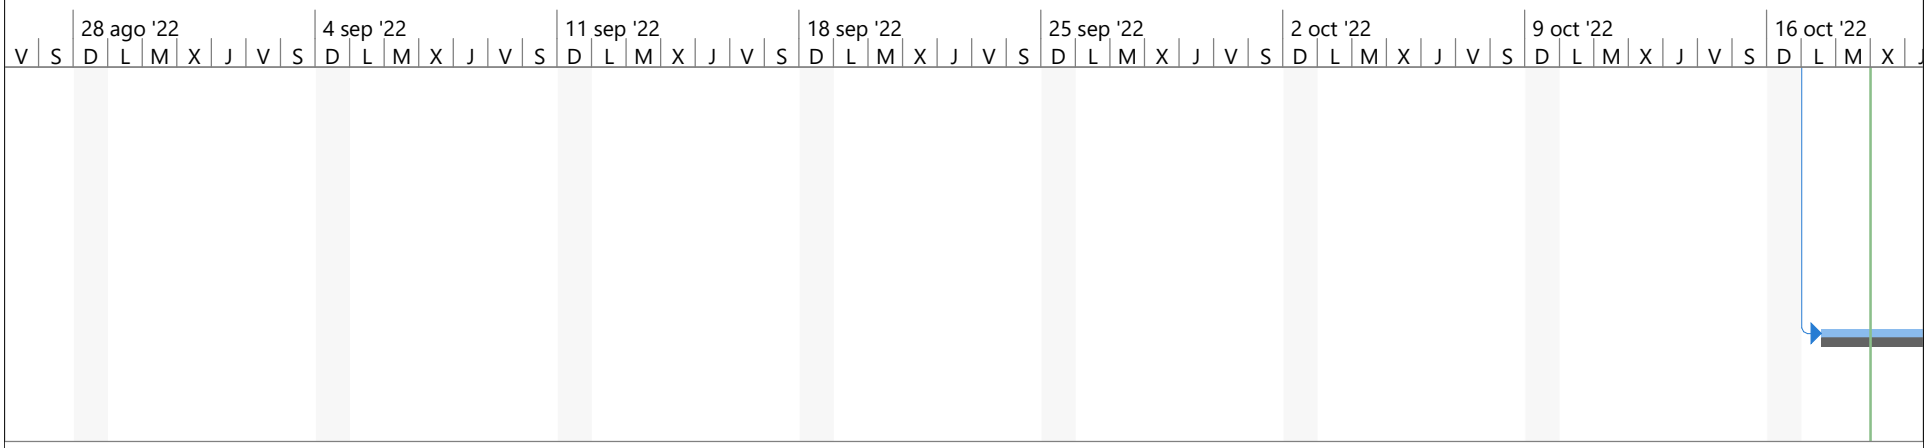

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
