

21092022SeguiMProyectoSNR CSA 1402_2022V2.mpp

Id	EDT	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	% completado
1	**1**	**PROYECTO CPS1402_2022_SNR_CSA**	**123,3**	**mar 16/08/22**	**vie 6/01/23**	**2%**
2	1.1	Formalizacion del contrato	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22	100%
3	1.2	Acta de inicio del contrato	0 días	jue 25/08/22	jue 25/08/22	100%
4	**1.3**	**100. Diagnóstico**	**21 día**	**mar 16/08/22**	**vie 9/09/22**	**100%**
5	1.3.1	101. Reconocimiento documentacion en estanteria	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22	100%
6	1.3.2	105. Informe de diagnostico	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	100%
7	1.4	120. Solicitud de Formatos e Instrumentos	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	100%
8	1.5	130. Fumigacion	1 día	sáb 3/09/22	lun 5/09/22	100%
9	1.6	131. Informe de Fumigacion	1 día	lun 12/09/22	mar 13/09/22	100%
10	**1.7**	**140. Entrega de Hojas de Vida Profesionales y Tecnicos**	**1 día**	**vie 9/09/22**	**sáb 10/09/22**	**100%**
11	1.7.1	141. Aprobacion Hojas de Vida Profesionales	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	100%
12	1.8	150. Entrega de Planes	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22	100%
13	1.9	Ajustes y aprobacion de planes	1 día	lun 12/09/22	mar 13/09/22	100%
14	**1.10**	**Reunión comité semanal**	**105 d**	**mié 31/08/22**	**mié 4/01/23**	**21%**
15	**1.10.1**	**Reunión comité semanal**	**105 d**	**mié 31/08/22**	**mié 4/01/23**	**21%**
16	1.10.1.1	Reunión comité semanal 1	1 día	mié 31/08/22	mié 31/08/22	100%
17	1.10.1.2	Reunión comité semanal 2	1 día	mié 7/09/22	mié 7/09/22	100%
18	1.10.1.3	Reunión comité semanal 3	1 día	mié 14/09/22	mié 14/09/22	100%
19	1.10.1.4	Reunión comité semanal 4	1 día	mié 21/09/22	mié 21/09/22	100%
20	1.10.1.5	Reunión comité semanal 5	1 día	mié 28/09/22	mié 28/09/22	0%

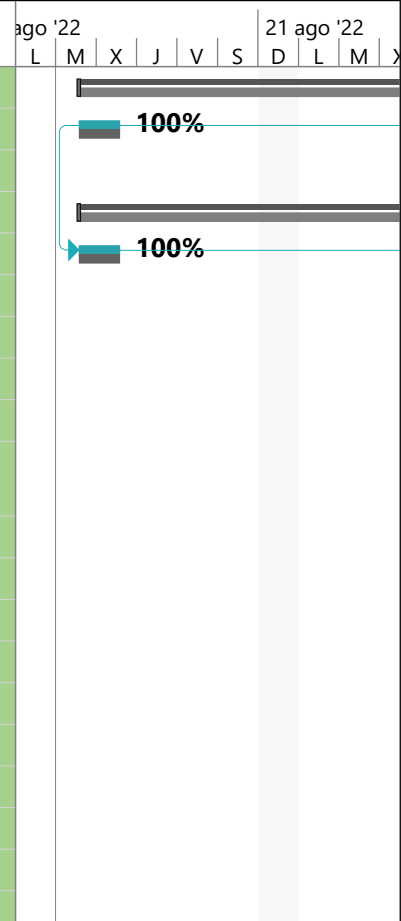

Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	% completado
21	1.10.1.6	Reunión comité semanal 6	1 día	mié 5/10/22	mié 5/10/22	0%
22	1.10.1.7	Reunión comité semanal 7	1 día	mié 12/10/22	mié 12/10/22	0%
23	1.10.1.8	Reunión comité semanal 8	1 día	mié 19/10/22	mié 19/10/22	0%
24	1.10.1.9	Reunión comité semanal 9	1 día	mié 26/10/22	mié 26/10/22	0%
25	1.10.1.10	Reunión comité semanal 10	1 día	mié 2/11/22	mié 2/11/22	0%
26	1.10.1.11	Reunión comité semanal 11	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	0%
27	1.10.1.12	Reunión comité semanal 12	1 día	mié 16/11/22	mié 16/11/22	0%
28	1.10.1.13	Reunión comité semanal 13	1 día	mié 23/11/22	mié 23/11/22	0%
29	1.10.1.14	Reunión comité semanal 14	1 día	mié 30/11/22	mié 30/11/22	0%
30	1.10.1.15	Reunión comité semanal 15	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22	0%
31	1.10.1.16	Reunión comité semanal 16	1 día	mié 14/12/22	mié 14/12/22	0%
32	1.10.1.17	Reunión comité semanal 17	1 día	mié 21/12/22	mié 21/12/22	0%
33	1.10.1.18	Reunión comité semanal 18	1 día	mié 28/12/22	mié 28/12/22	0%
34	1.10.1.19	Reunión comité semanal 19	1 día	mié 4/01/23	mié 4/01/23	0%
35	**1.11**	**210. Montaje Puestos de Trabajo**	**2 días**	**mié 7/09/22**	**vie 9/09/22**	**100%**
36	1.11.1	211.Montaje de mesas y sillas	2 días	mié 7/09/22	vie 9/09/22	100%
37	1.11.2	212.Montaje de equipos de computo	2 días	mié 7/09/22	vie 9/09/22	100%
38	1.11.3	212.Montaje de camaras	2 días	mié 7/09/22	vie 9/09/22	100%
39	**1.12**	**220. Inicio de punteo**	**30 día**	**lun 12/09/22**	**lun 17/10/22**	**7%**
48	**1.13**	**230. Inicio de Embalaje**	**32 día**	**vie 23/09/22**	**lun 31/10/22**	**0%**
49	1.13.1	231.Embalaje de las carpetas	30 día	vie 23/09/22	vie 28/10/22	0%

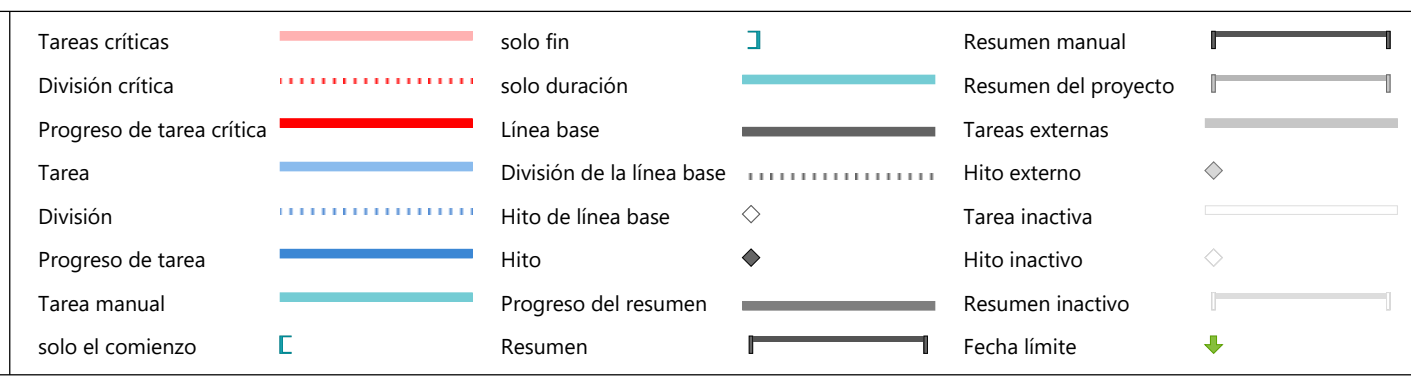


21092022SeguiMProyectoSNR CSA 1402_2022V2.mpp

Id	EDT	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	% completado
50	1.13.2	232.Asignacion numero de paquete	30 día	vie 23/09/22	vie 28/10/22	0%
51	1.13.3	233.Cierre de paquete con Sticker adhesivo y/o pre	30 día	vie 23/09/22	vie 28/10/22	0%
52	1.13.4	234.Ubicacion unidades de almacemaniento en sitio	30 día	vie 23/09/22	vie 28/10/22	0%
53	1.13.5	235.Validacion informacion por parte de la supervis	30 día	vie 23/09/22	vie 28/10/22	0%
54	1.13.6	236.Toma de registro fotografico	30 día	vie 23/09/22	vie 28/10/22	0%
55	1.13.7	237.Generacion de acta	30 día	vie 23/09/22	vie 28/10/22	0%
56	1.13.8	Desmonte puestos de trabajo	30 día	vie 23/09/22	vie 28/10/22	0%
57	1.13.9	Acta de devolucion espacios de trabajo a satisfacior	0 días	lun 31/10/22	lun 31/10/22	0%
58	**1.14**	**250. Cargue**	**20 día**	**mié 12/10/22**	**vie 4/11/22**	**0%**
59	1.14.1	251. Envio protocolo de cargue y descargue	1 día	mié 12/10/22	jue 13/10/22	0%
60	1.14.2	252. Aprobacion protocolo cargue y descargue	0 días	mié 12/10/22	mié 12/10/22	0%
61	1.14.3	253. Inicio de grabacion cargue	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
62	1.14.4	254. Inicio grabacion interior del camio	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
63	1.14.5	255. Registro fotografico del cargue y al interior del	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
64	1.14.6	256. Cargue de cajas al camion	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
65	1.14.7	257. Toma de registro fotografico finalizacion del ca	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
66	1.14.8	258. Cierre de camion con presinto	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
67	1.14.9	259.Toma de registro fotografico con escoltas y con	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
68	1.15	260. Seguimiento ruta de camion por GPS	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
69	**1.16**	**280. Llegada y descargue camion bogota**	**28 día**	**mié 12/10/22**	**lun 14/11/22**	**0%**
70	1.16.1	281. Inicio grabacion interior del camion	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%




Id	EDT	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	% completado
71	1.16.2	282. Registro fotografico	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
72	1.16.3	283. Apertura del presinto	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
73	1.16.4	284. Registro fotografico al interior del camion	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
74	1.16.5	285. Descargue unidades de conservacion en estiba	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
75	1.16.6	286. Verificacion por parte de la interventoria	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
76	1.16.7	287. Generacion de acta de llegada	20 día	mié 12/10/22	vie 4/11/22	0%
77	**1.17**	**Ubicacion**	**28 día**	**mié 12/10/22**	**lun 14/11/22**	**0%**
78	1.17.1	Ubicacion en estanteria unidades de conservacion	28 día	mié 12/10/22	lun 14/11/22	0%
79	1.18	Entrega de diagnóstico en conservación preventiva.	0 días	lun 10/10/22	lun 10/10/22	0%
80	**1.19**	**Entrega de Plan de intervención en conservación.**	**1 día**	**lun 3/10/22**	**mar 4/10/22**	**0%**
81	1.19.1	Capacitacion en conservacion preventiva	1 día	lun 3/10/22	mar 4/10/22	0%
82	**1.20**	**Procesamiento de 100 Metros Lineales**	**56 día**	**lun 26/09/22**	**mié 30/11/22**	**0%**
83	1.20.1	Insercion Documentacion	41 día	jue 13/10/22	mié 30/11/22	0%
84	1.20.2	Solicitud mesa de trabajo interventoria definicion d	1,38 d	lun 26/09/22	mar 27/09/22	0%
85	1.20.3	Firma de acta definicion de parametros organizació	1 día	lun 26/09/22	mar 27/09/22	0%
86	1.20.4	Capacitacion grupo de trabajo parametros de organ	1 día	jue 13/10/22	vie 14/10/22	0%
87	1.20.5	Clasificación Documental	12 día	lun 17/10/22	lun 31/10/22	0%
88	1.20.6	Ordenación Documental	12 día	lun 17/10/22	lun 31/10/22	0%
89	1.20.7	Depuración Documental	12 día	lun 17/10/22	lun 31/10/22	0%
90	1.20.8	Primeros Auxilios	12 día	lun 17/10/22	lun 31/10/22	0%
91	**1.21**	**Procesamiento de 1500 Metros Lineales**	**25 día**	**mar 1/11/22**	**mié 30/11/22**	**0%**

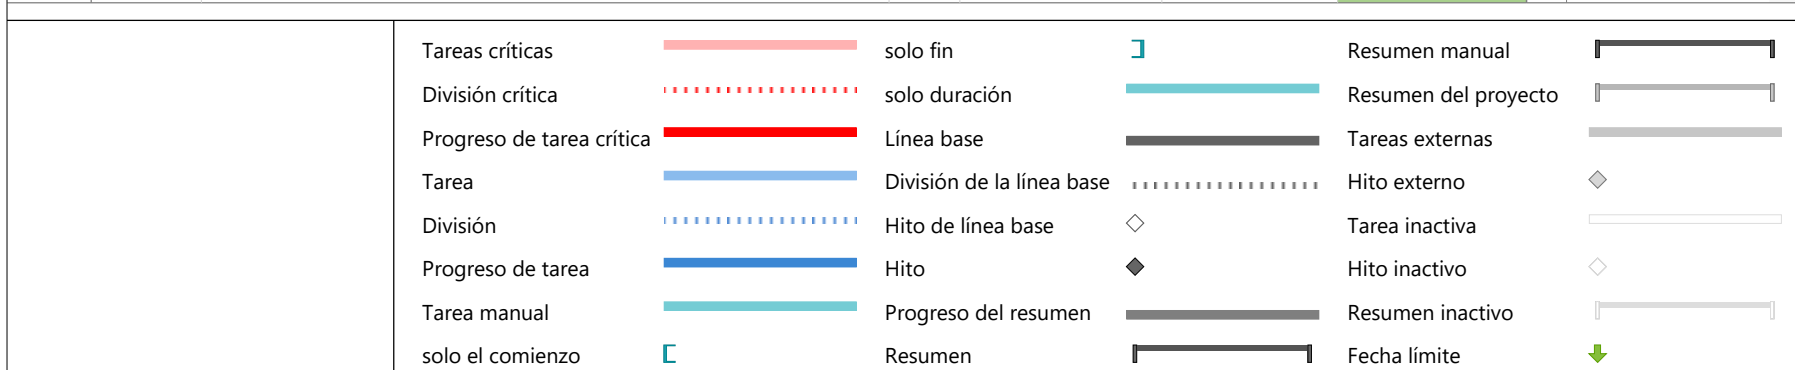


Id	EDT	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	% completado
92	1.21.1	Clasificación Documental	25 día	mar 1/11/22	mié 30/11/22	0%
93	1.21.2	Ordenación Documental	25 día	mar 1/11/22	mié 30/11/22	0%
94	1.21.3	Depuración Documental	25 día	mar 1/11/22	mié 30/11/22	0%
95	1.21.4	Primeros Auxilios	25 día	mar 1/11/22	mié 30/11/22	0%
96	**1.22**	**Procesamiento de 3041 Metros Lineales**	**19 día**	**jue 1/12/22**	**vie 23/12/22**	**0%**
97	1.22.1	Clasificación Documental	19 día	jue 1/12/22	vie 23/12/22	0%
98	1.22.2	Ordenación Documental	19 día	jue 1/12/22	vie 23/12/22	0%
99	1.22.3	Depuración Documental	19 día	jue 1/12/22	vie 23/12/22	0%
100	1.22.4	Primeros Auxilios	19 día	jue 1/12/22	vie 23/12/22	0%
101	**1.23**	**Control de calidad procesos de organización**	**73 día**	**vie 14/10/22**	**vie 6/01/23**	**0%**
102	1.23.1	Control de calidad procesos de organización 1	1 día	vie 14/10/22	vie 14/10/22	0%
103	1.23.2	Control de calidad procesos de organización 2	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	0%
104	1.23.3	Control de calidad procesos de organización 3	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%
105	1.23.4	Control de calidad procesos de organización 4	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	0%
106	1.23.5	Control de calidad procesos de organización 5	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	0%
107	1.23.6	Control de calidad procesos de organización 6	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	0%
108	1.23.7	Control de calidad procesos de organización 7	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	0%
109	1.23.8	Control de calidad procesos de organización 8	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%
110	1.23.9	Control de calidad procesos de organización 9	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%
111	1.23.10	Control de calidad procesos de organización 10	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0%
112	1.23.11	Control de calidad procesos de organización 11	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	0%

Id	EDT	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	% completado
113	1.23.12	Control de calidad procesos de organización 12	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%
114	1.23.13	Control de calidad procesos de organización 13	1 día	vie 6/01/23	vie 6/01/23	0%
115	1.23.14	Foliación	60 día	lun 17/10/22	lun 26/12/22	0%
116	**1.23.15**	**Control de calidad procesos de foliacion**	**73 día**	**vie 14/10/22**	**vie 6/01/23**	**0%**
117	1.23.15.1	Control de calidad procesos de foliacion 1	1 día	vie 14/10/22	vie 14/10/22	0%
118	1.23.15.2	Control de calidad procesos de foliacion 2	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	0%
119	1.23.15.3	Control de calidad procesos de foliacion 3	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%
120	1.23.15.4	Control de calidad procesos de foliacion 4	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	0%
121	1.23.15.5	Control de calidad procesos de foliacion 5	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	0%
122	1.23.15.6	Control de calidad procesos de foliacion 6	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	0%
123	1.23.15.7	Control de calidad procesos de foliacion 7	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	0%
124	1.23.15.8	Control de calidad procesos de foliacion 8	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%
125	1.23.15.9	Control de calidad procesos de foliacion 9	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%
126	1.23.15.1	Control de calidad procesos de foliacion 10	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0%
127	1.23.15.1	Control de calidad procesos de foliacion 11	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	0%
128	1.23.15.1	Control de calidad procesos de foliacion 12	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%
129	1.23.15.1	Control de calidad procesos de foliacion 13	1 día	vie 6/01/23	vie 6/01/23	0%
130	1.24	Digitalización	60 día	lun 17/10/22	lun 26/12/22	0%
131	**1.25**	**Indexacion**	**73 día**	**vie 14/10/22**	**vie 6/01/23**	**0%**
132	**1.25.1**	**Control calidad digitalizacion e indexacion**	**73 día**	**vie 14/10/22**	**vie 6/01/23**	**0%**
133	1.25.1.1	Control calidad digitalizacion e indexacion 1	1 día	vie 14/10/22	vie 14/10/22	0%

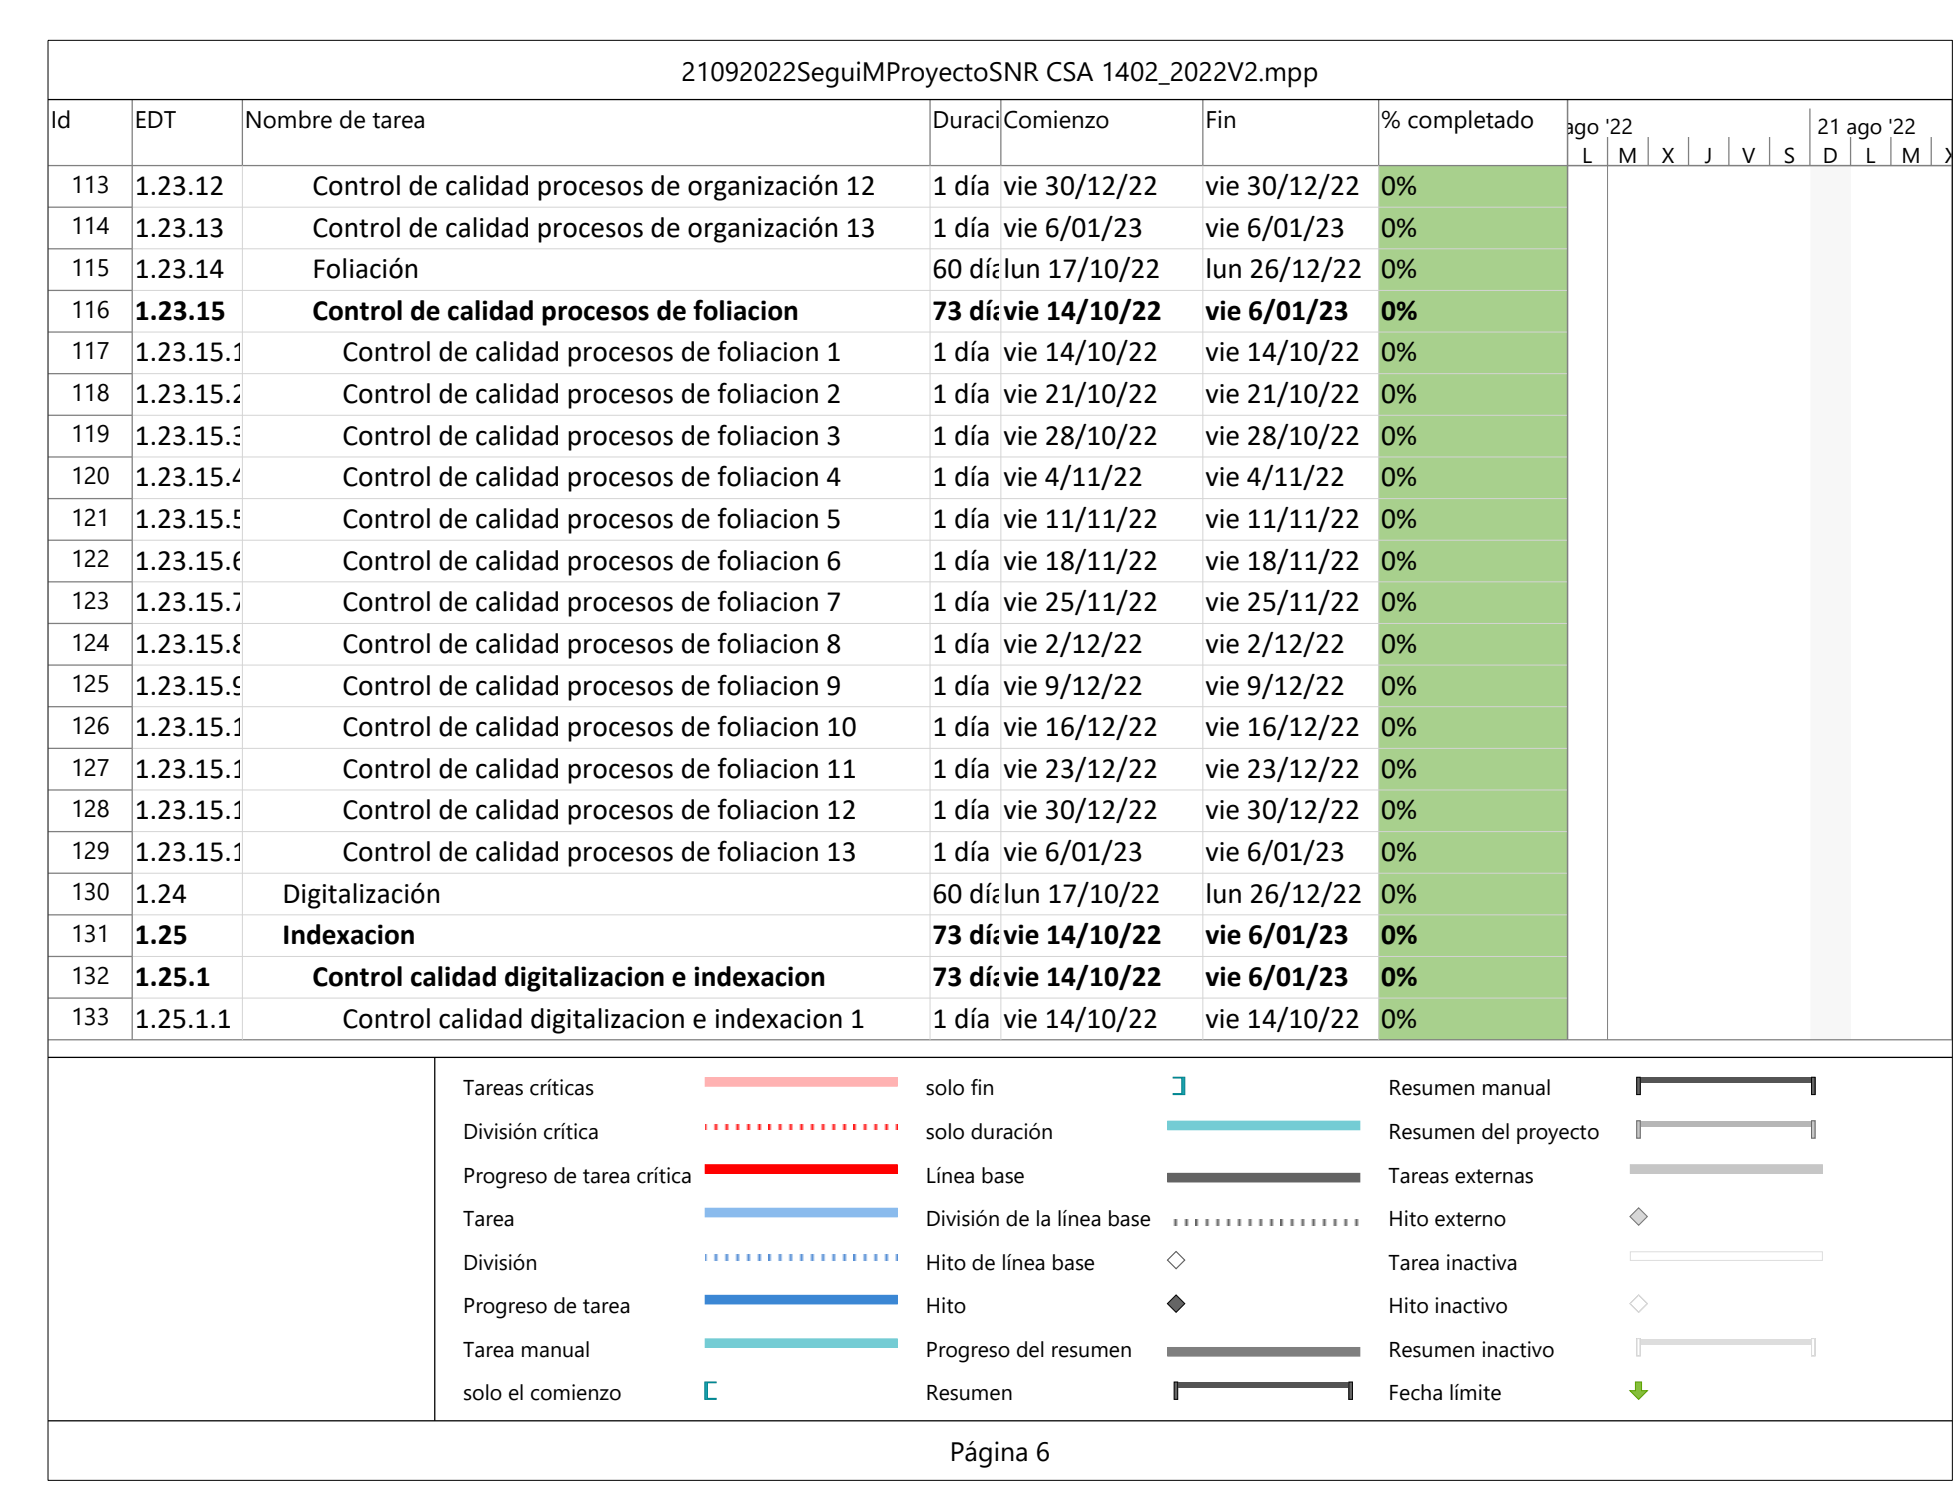



Id	EDT	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	% completado
134	1.25.1.2	Control calidad digitalizacion e indexacion 2	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	0%
135	1.25.1.3	Control calidad digitalizacion e indexacion 3	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	0%
136	1.25.1.4	Control calidad digitalizacion e indexacion 4	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	0%
137	1.25.1.5	Control calidad digitalizacion e indexacion 5	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	0%
138	1.25.1.6	Control calidad digitalizacion e indexacion 6	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	0%
139	1.25.1.7	Control calidad digitalizacion e indexacion 7	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	0%
140	1.25.1.8	Control calidad digitalizacion e indexacion 8	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	0%
141	1.25.1.9	Control calidad digitalizacion e indexacion 9	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	0%
142	1.25.1.10	Control calidad digitalizacion e indexacion 10	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	0%
143	1.25.1.11	Control calidad digitalizacion e indexacion 11	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	0%
144	1.25.1.12	Control calidad digitalizacion e indexacion 12	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%
145	1.25.1.13	Control calidad digitalizacion e indexacion 13	1 día	vie 6/01/23	vie 6/01/23	0%
146	1.26	Descripción Documental	60 día	lun 17/10/22	lun 26/12/22	0%
147	1.27	Generacion hojas de control	60 día	lun 17/10/22	lun 26/12/22	0%
148	1.28	Encarpetado	60 día	lun 17/10/22	lun 26/12/22	0%
149	1.29	Almacenamiento en unidades de conservacion	60 día	lun 17/10/22	lun 26/12/22	0%
150	1.30	Rotulación de Cajas y Carpetas	60 día	lun 17/10/22	lun 26/12/22	0%
151	1.31	Entrega para aprobación de la interventoria de 100 M	8 días	mar 1/11/22	jue 10/11/22	0%
152	1.32	Corrección y Ajustes 100 Metros Lineales	4 días	vie 11/11/22	mié 16/11/22	0%
153	1.33	Informe entrega de 100 Metros Lineales	1 día	mié 16/11/22	jue 17/11/22	0%
154	1.34	Factura No. 100 metros Lineales	0 días	jue 17/11/22	jue 17/11/22	0%







Id	EDT	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	% completado
155	1.35	Entrega para aprobación de la interventoria de 1500 M	5 días	jue 1/12/22	mié 7/12/22	0%
156	1.36	Corrección y Ajustes 1500 Metros Lineales	3 días	jue 8/12/22	lun 12/12/22	0%
157	1.37	Informe entrega de 1500 Metros Lineales	1 día	mar 13/12/22	mié 14/12/22	0%
158	1.38	Factura No. 1500 metros Lineales	0 días	mié 14/12/22	mié 14/12/22	0%
159	1.39	Entrega para aprobación de la interventoria de 3041 M	3 días	lun 26/12/22	jue 29/12/22	0%
160	1.40	Corrección y Ajustes 3041 Metros Lineales	1 día	jue 29/12/22	vie 30/12/22	0%
161	1.41	Informe entrega de 3041 Metros Lineales	0 días	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%
162	1.42	Revision final por parte del apoyo a la supervisión	1 día	vie 30/12/22	sáb 31/12/22	0%
163	1.43	Informe Final del Proyecto, y entregables del contra	1 día	vie 30/12/22	sáb 31/12/22	0%
164	1.44	Factura No. 3041 metros Lineales	0 días	vie 30/12/22	vie 30/12/22	0%
165	1.45	Custodia de la documentacion por seis meses	69 día	mié 12/10/22	sáb 31/12/22	0%
166	**1.46**	**cierre del proyecto**	**1 día**	**vie 30/12/22**	**sáb 31/12/22**	**0%**
167	1.46.1	Firma de cierre del proyecto	1 día	vie 30/12/22	sáb 31/12/22	0%




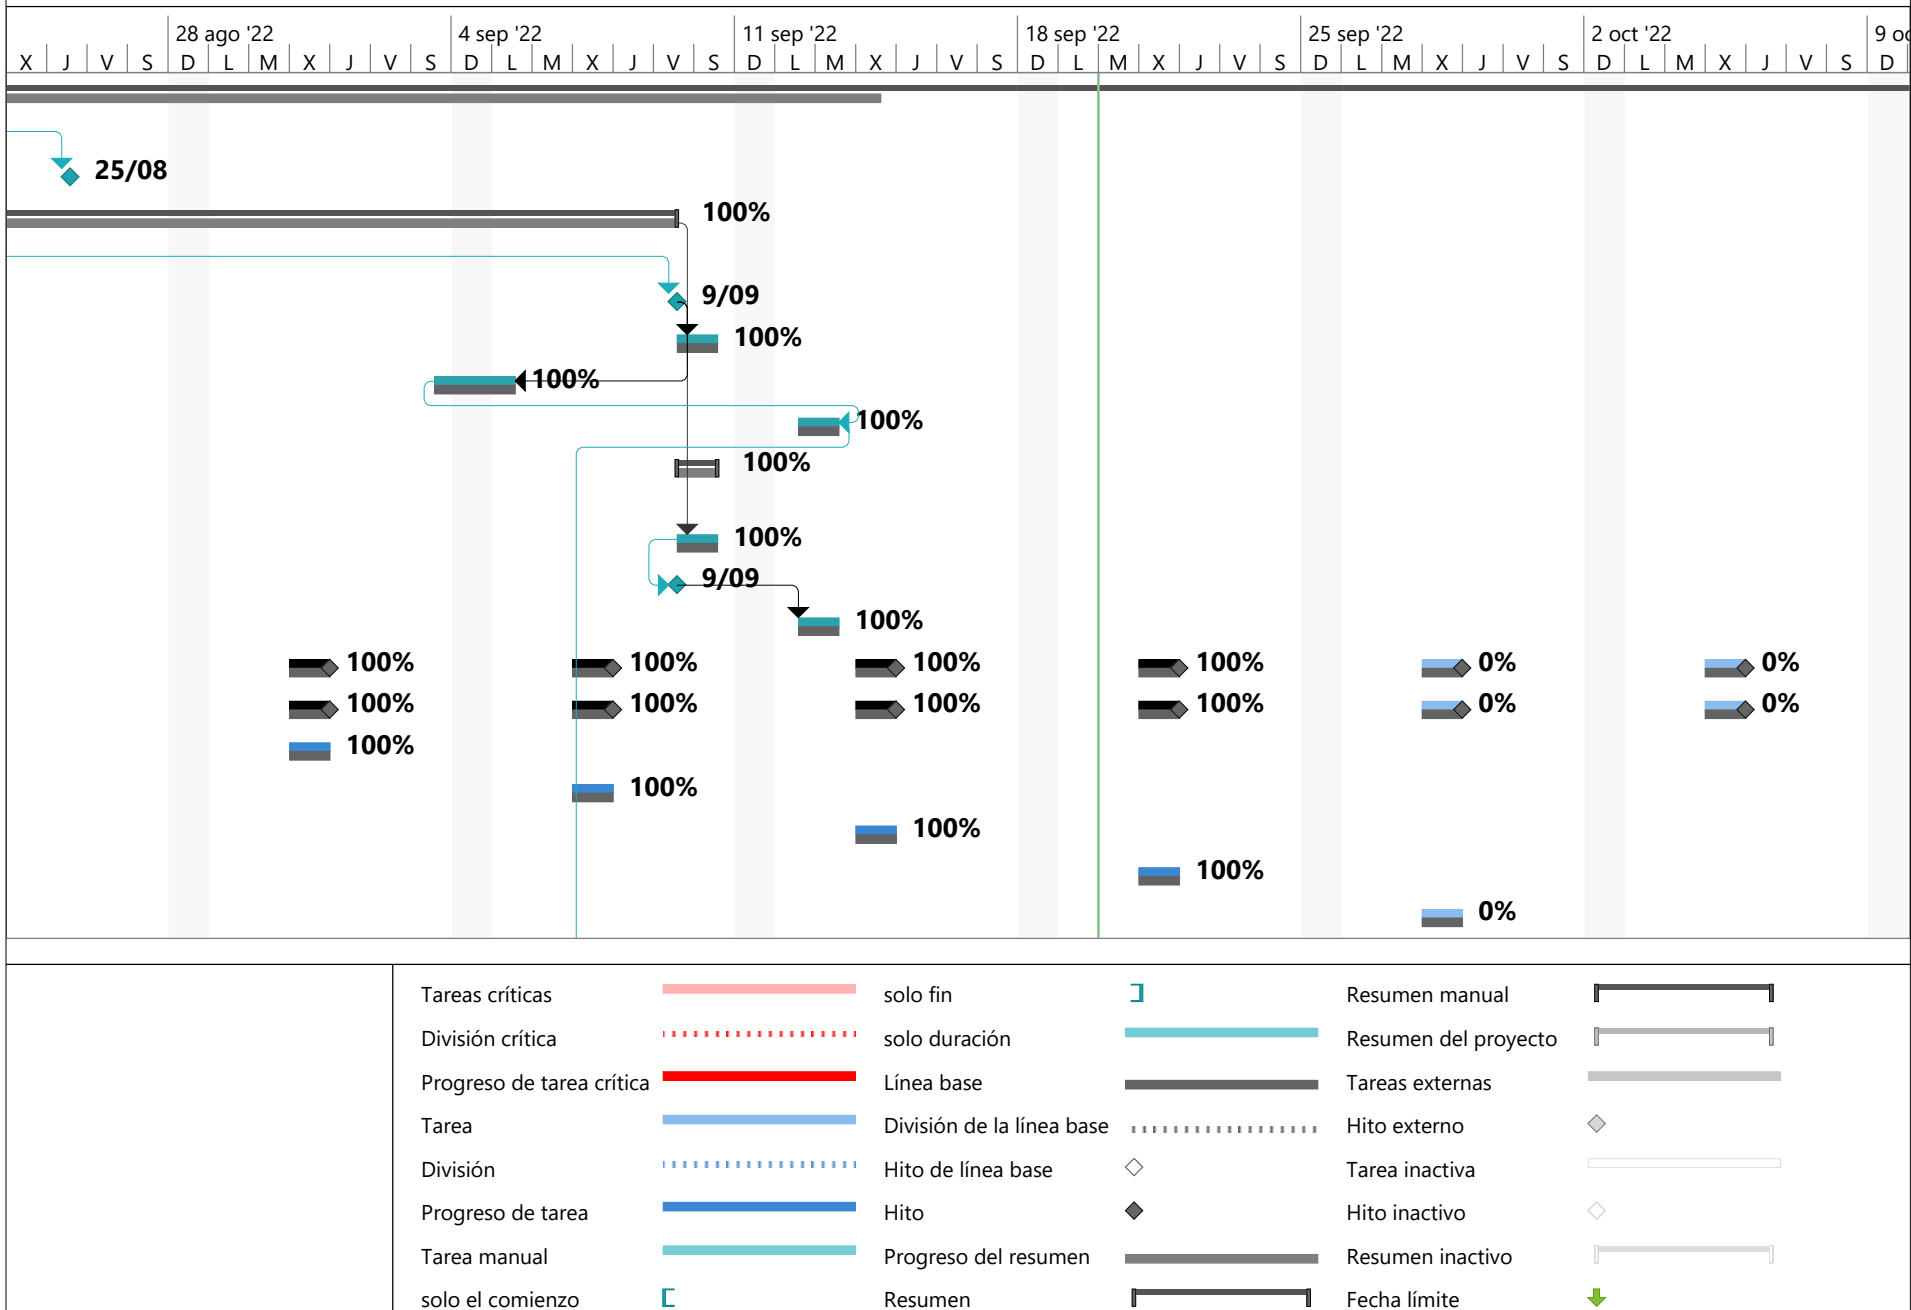

28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
25/08
9/09
9/09
100%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

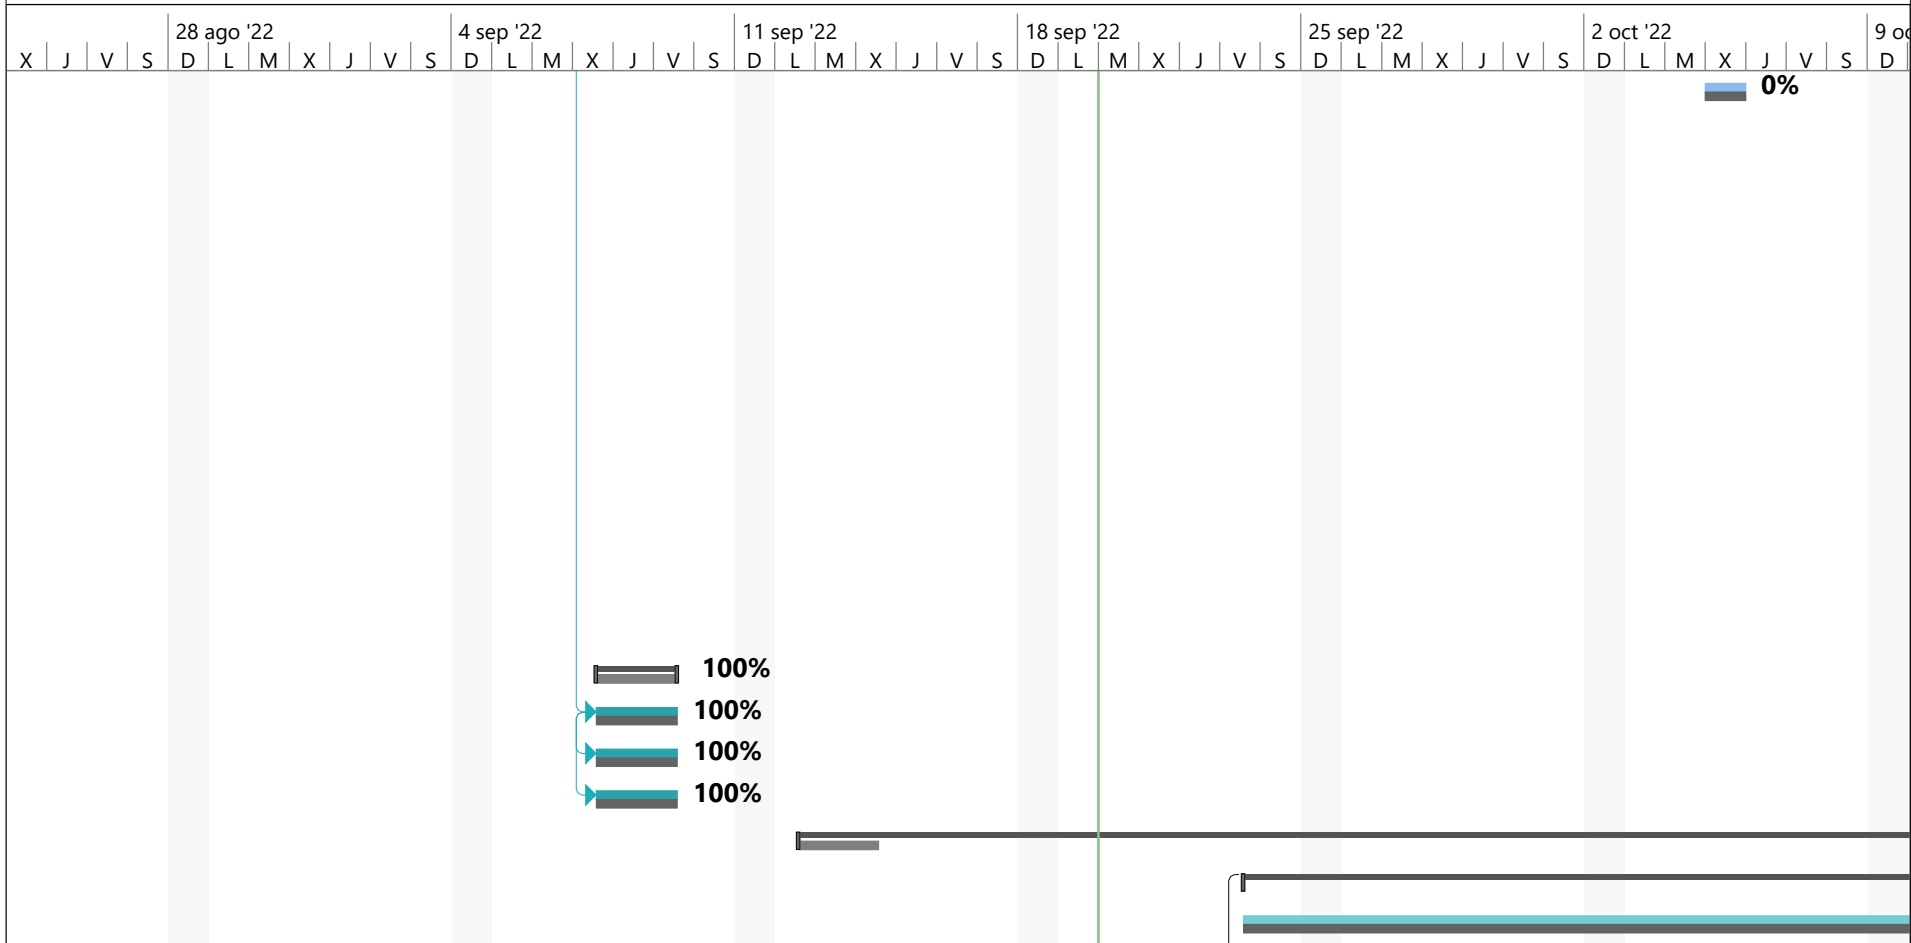


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

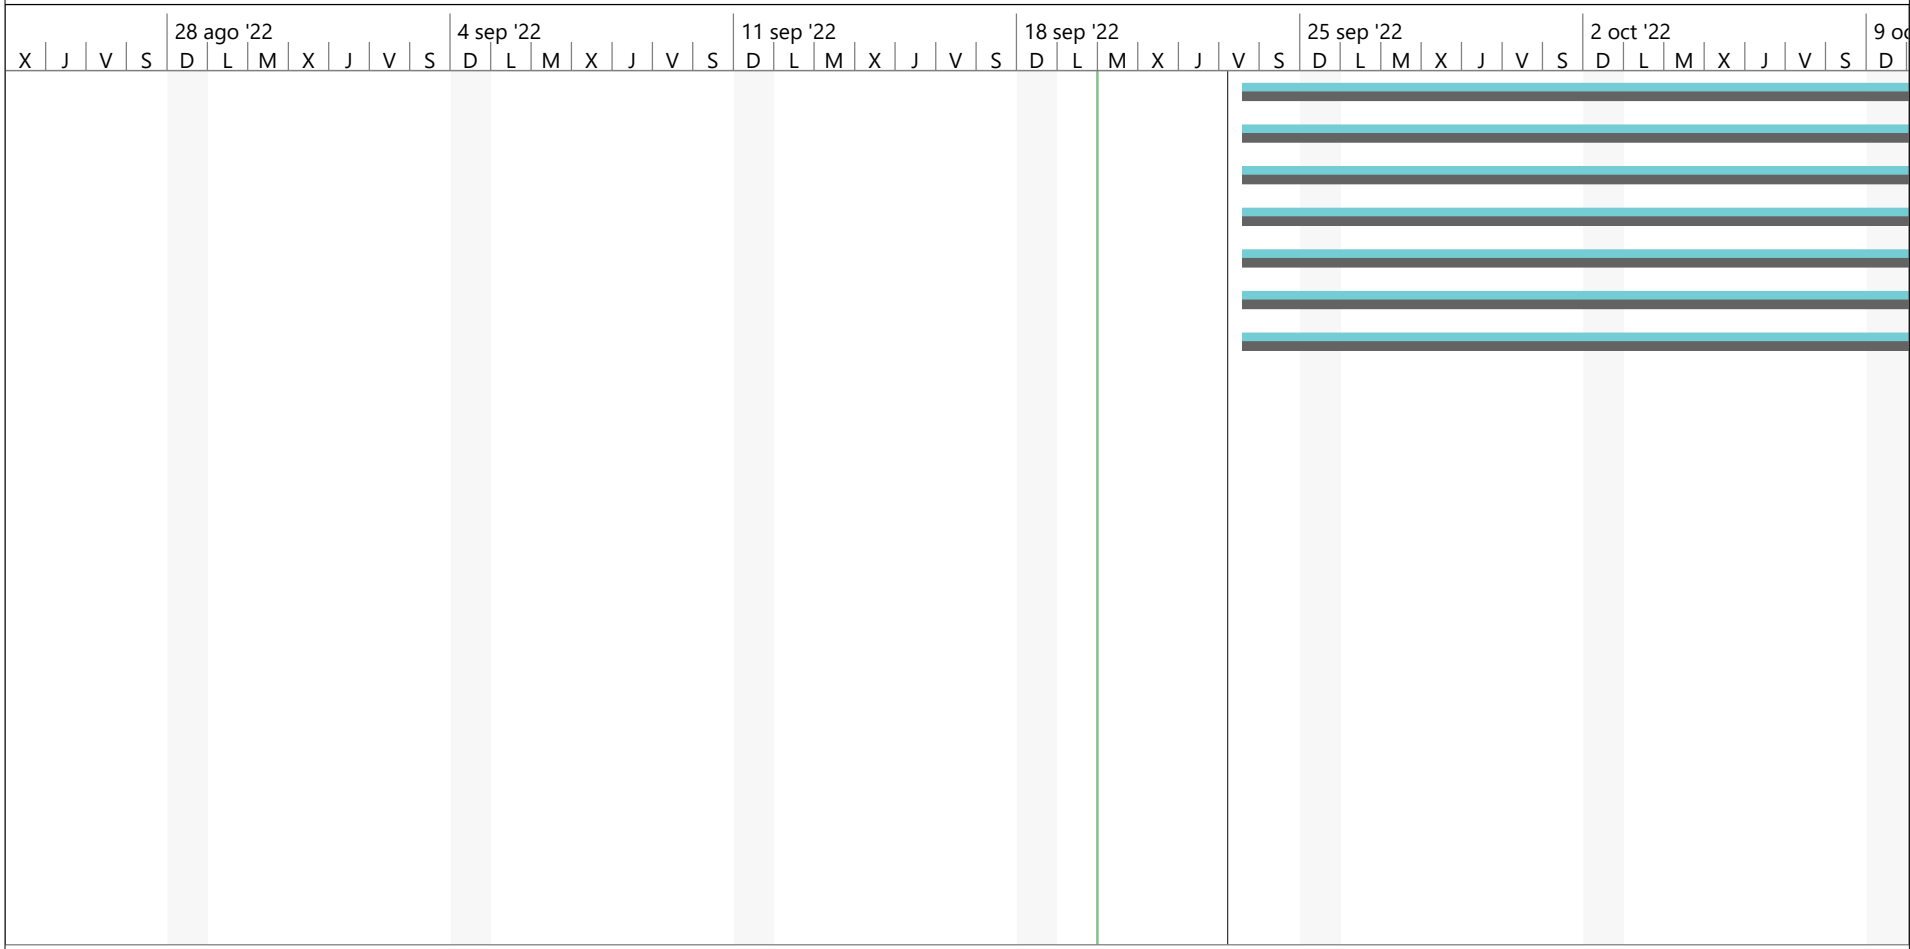

28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

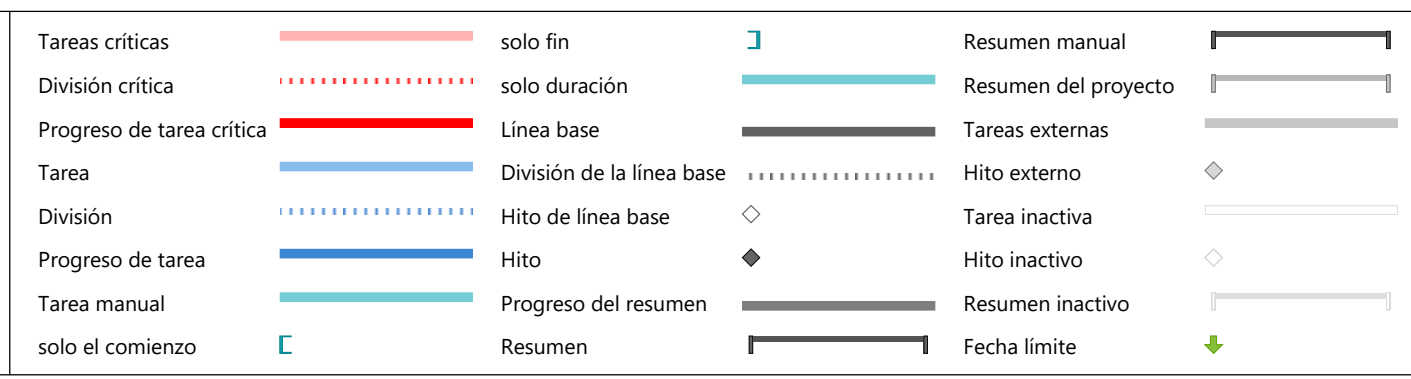

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

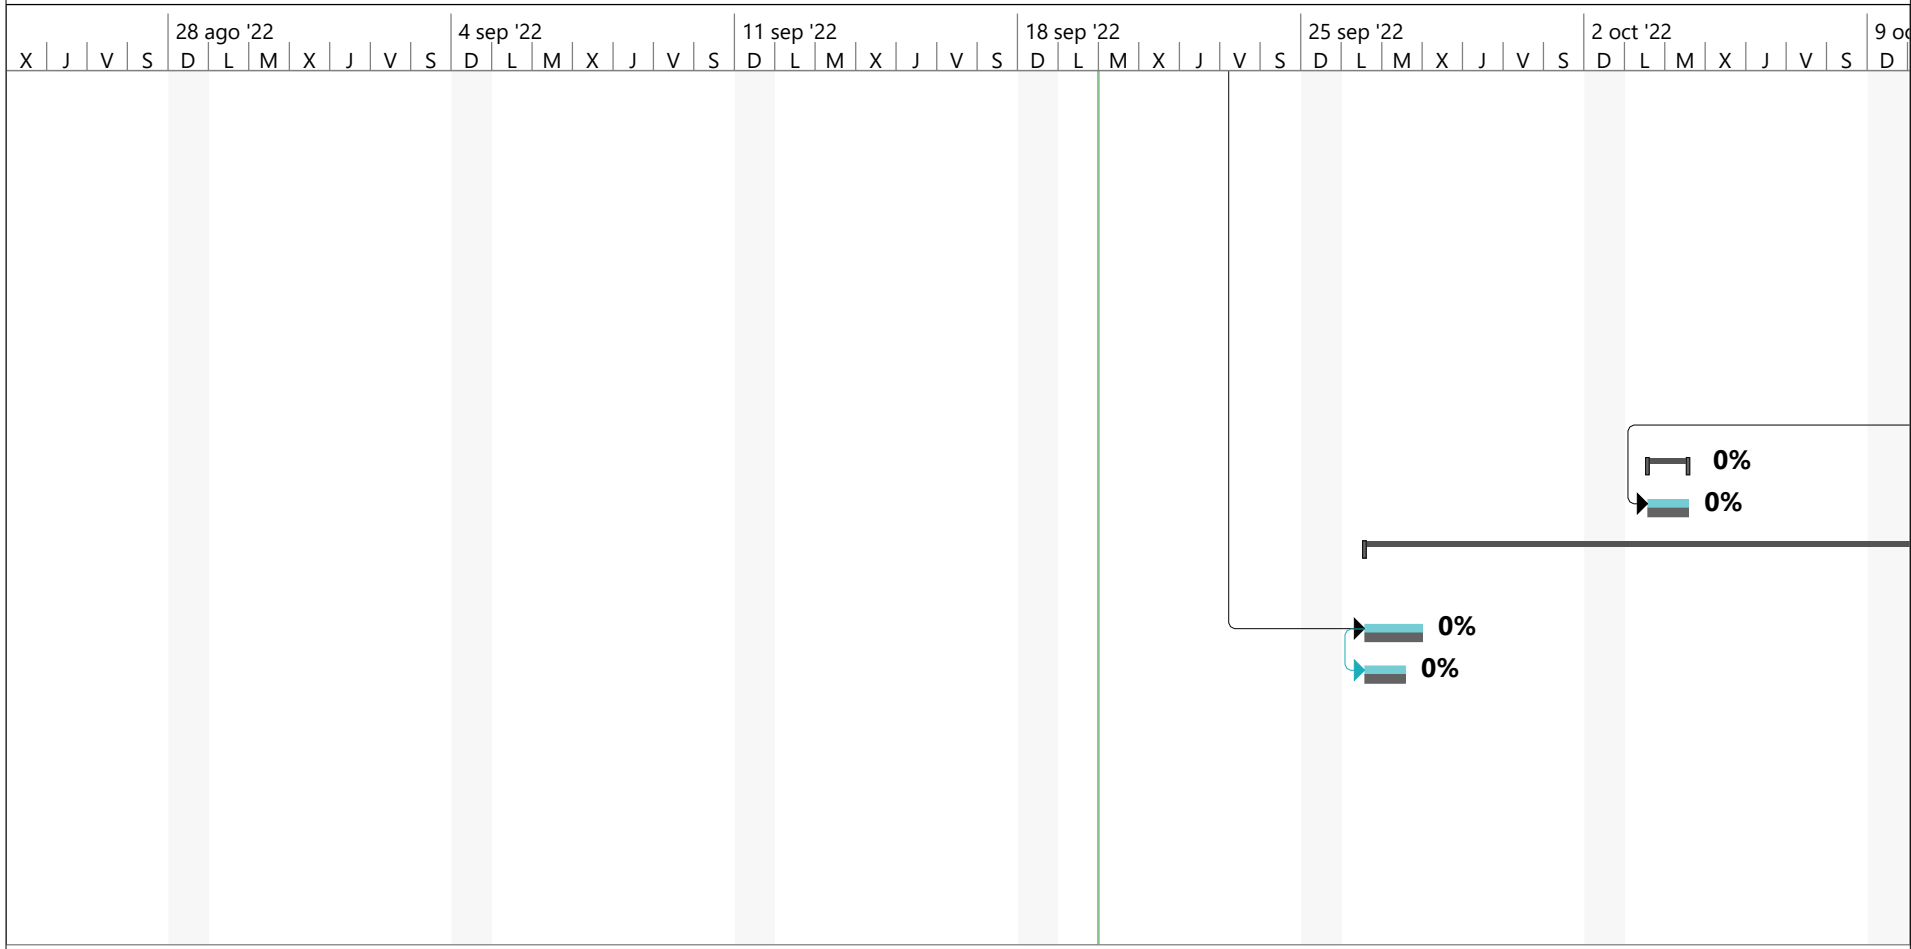


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

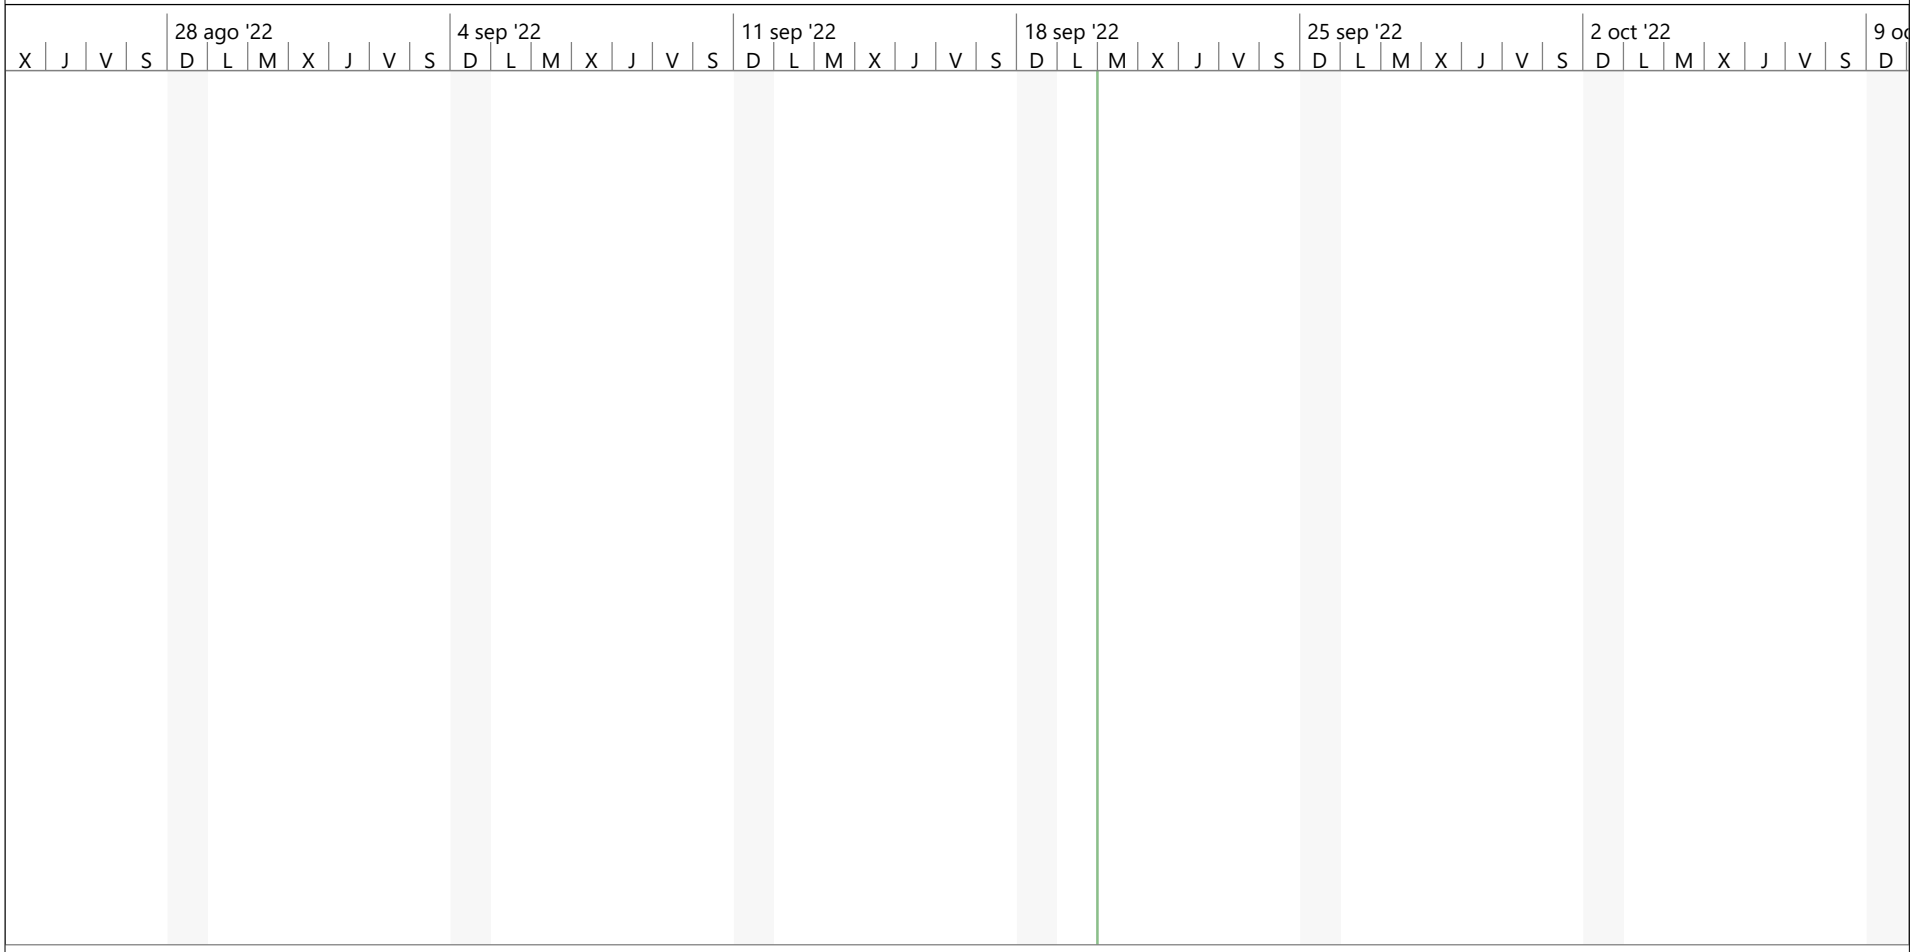
28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

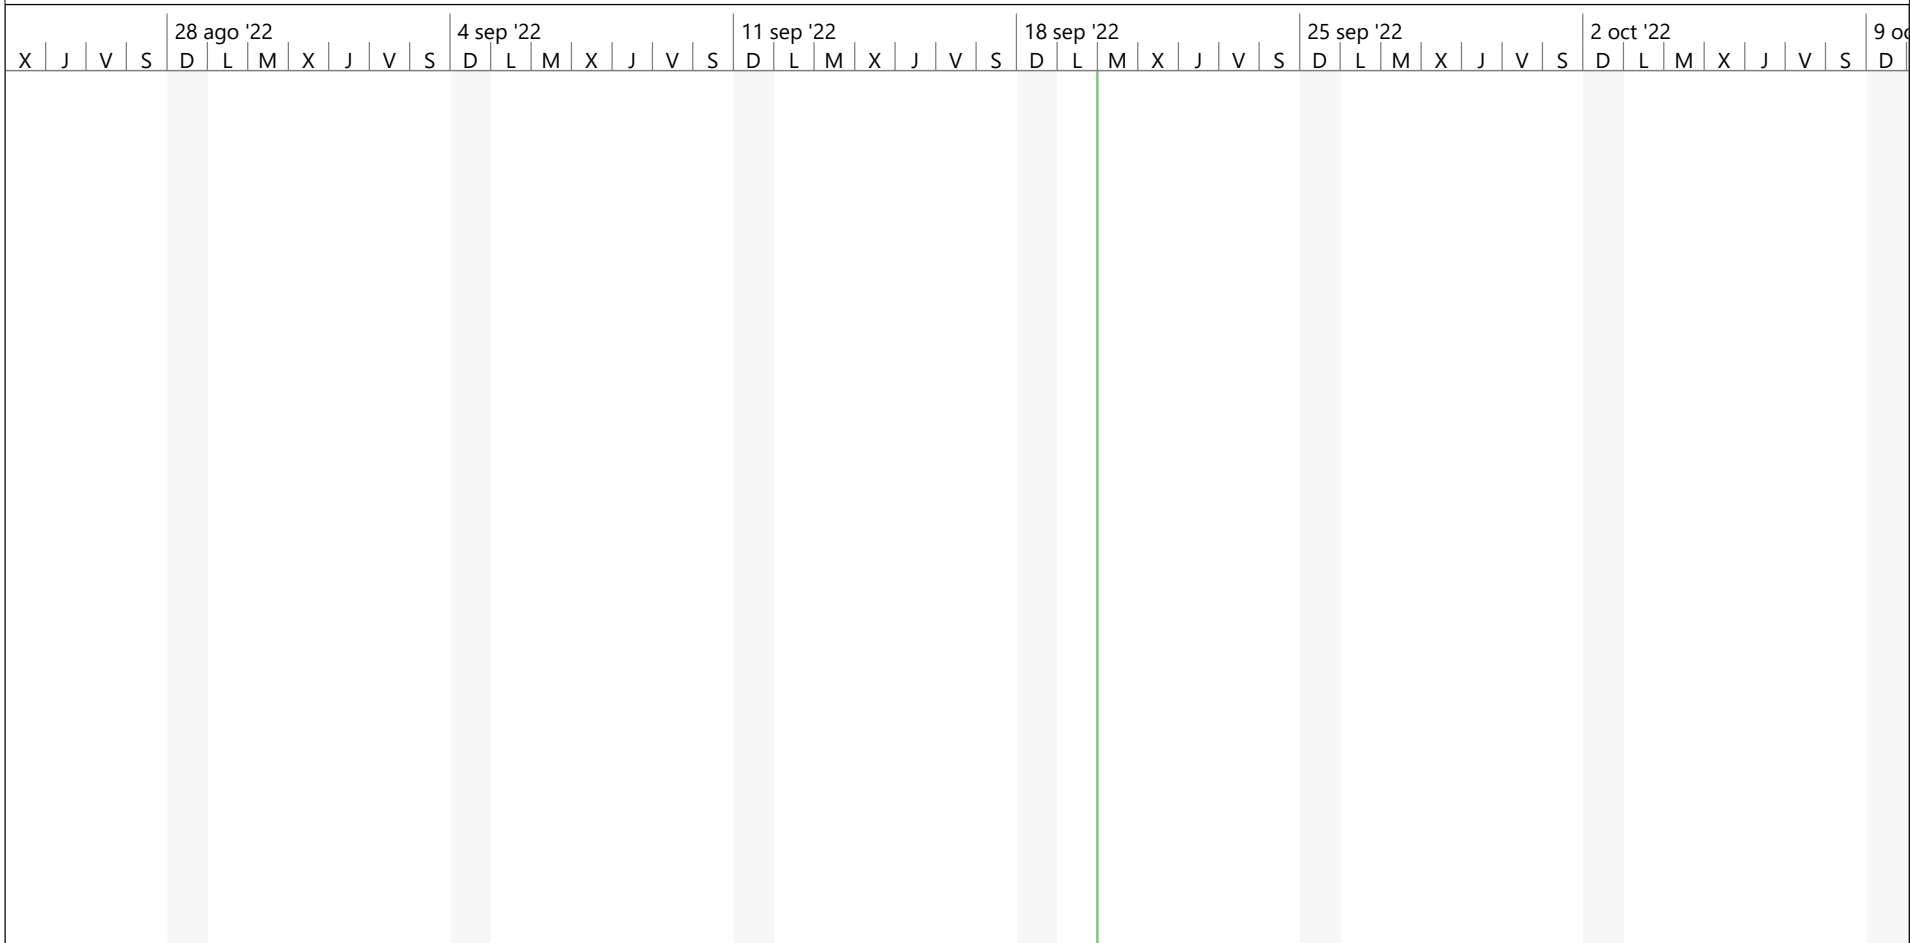


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

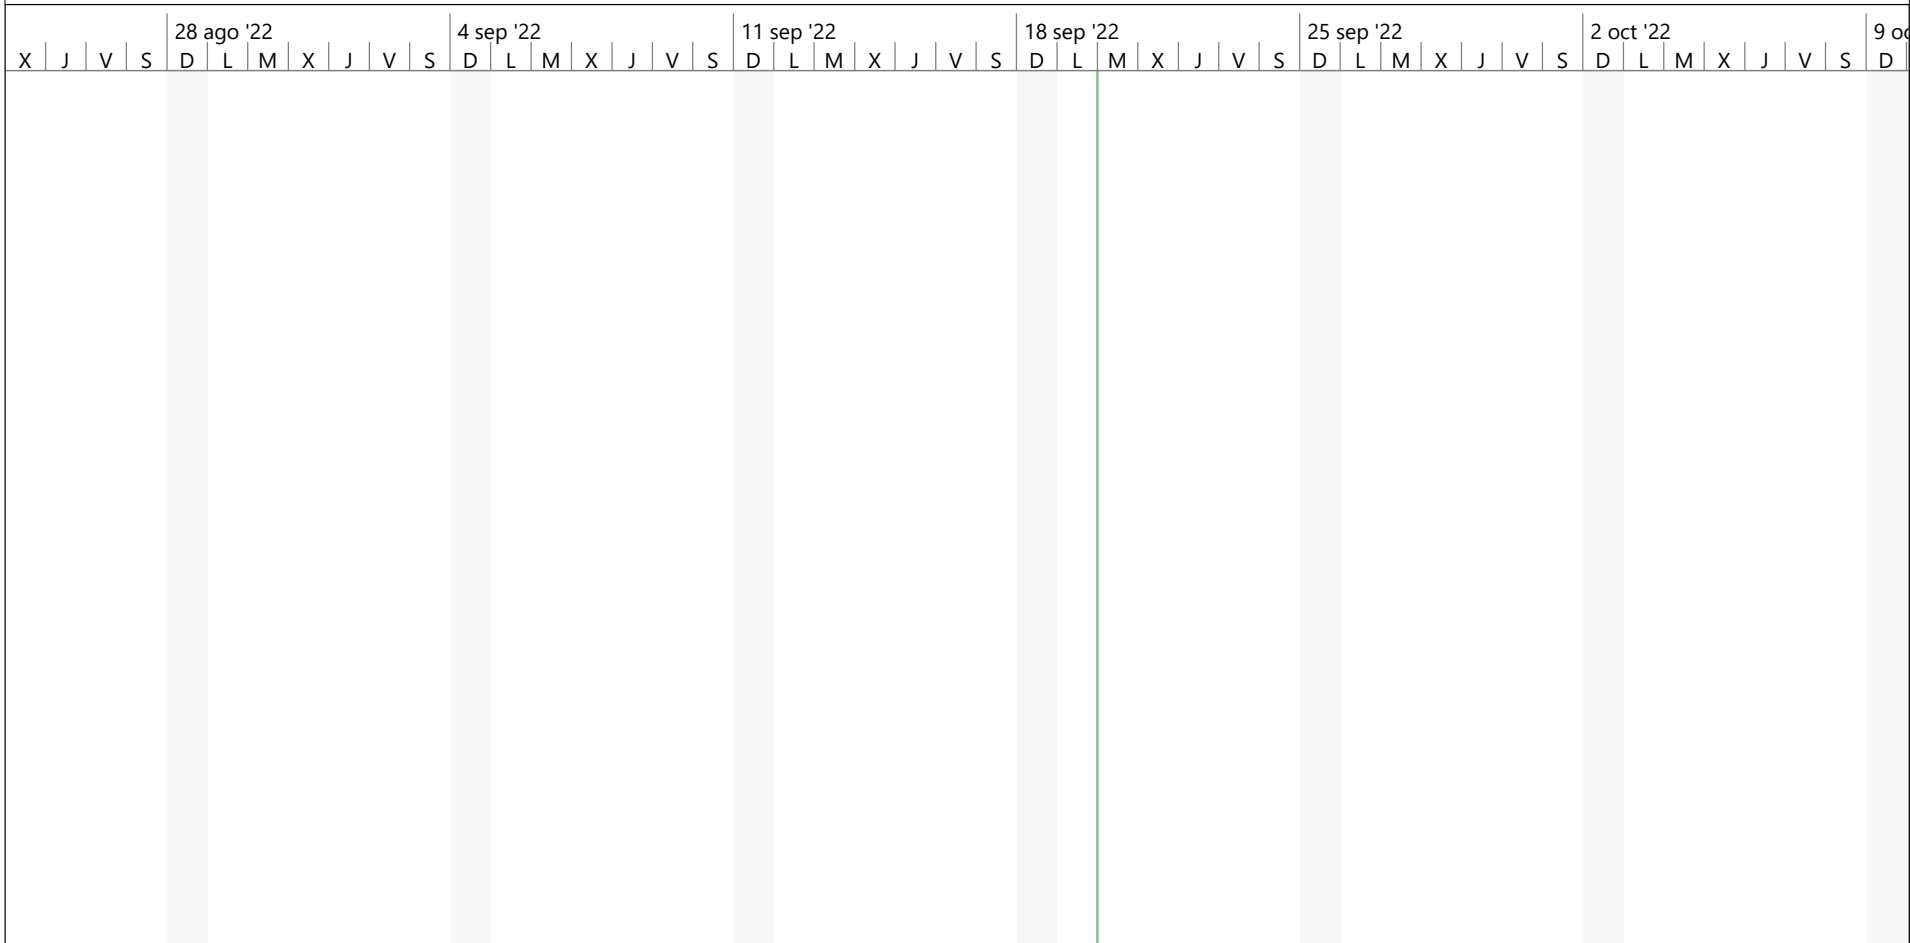


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

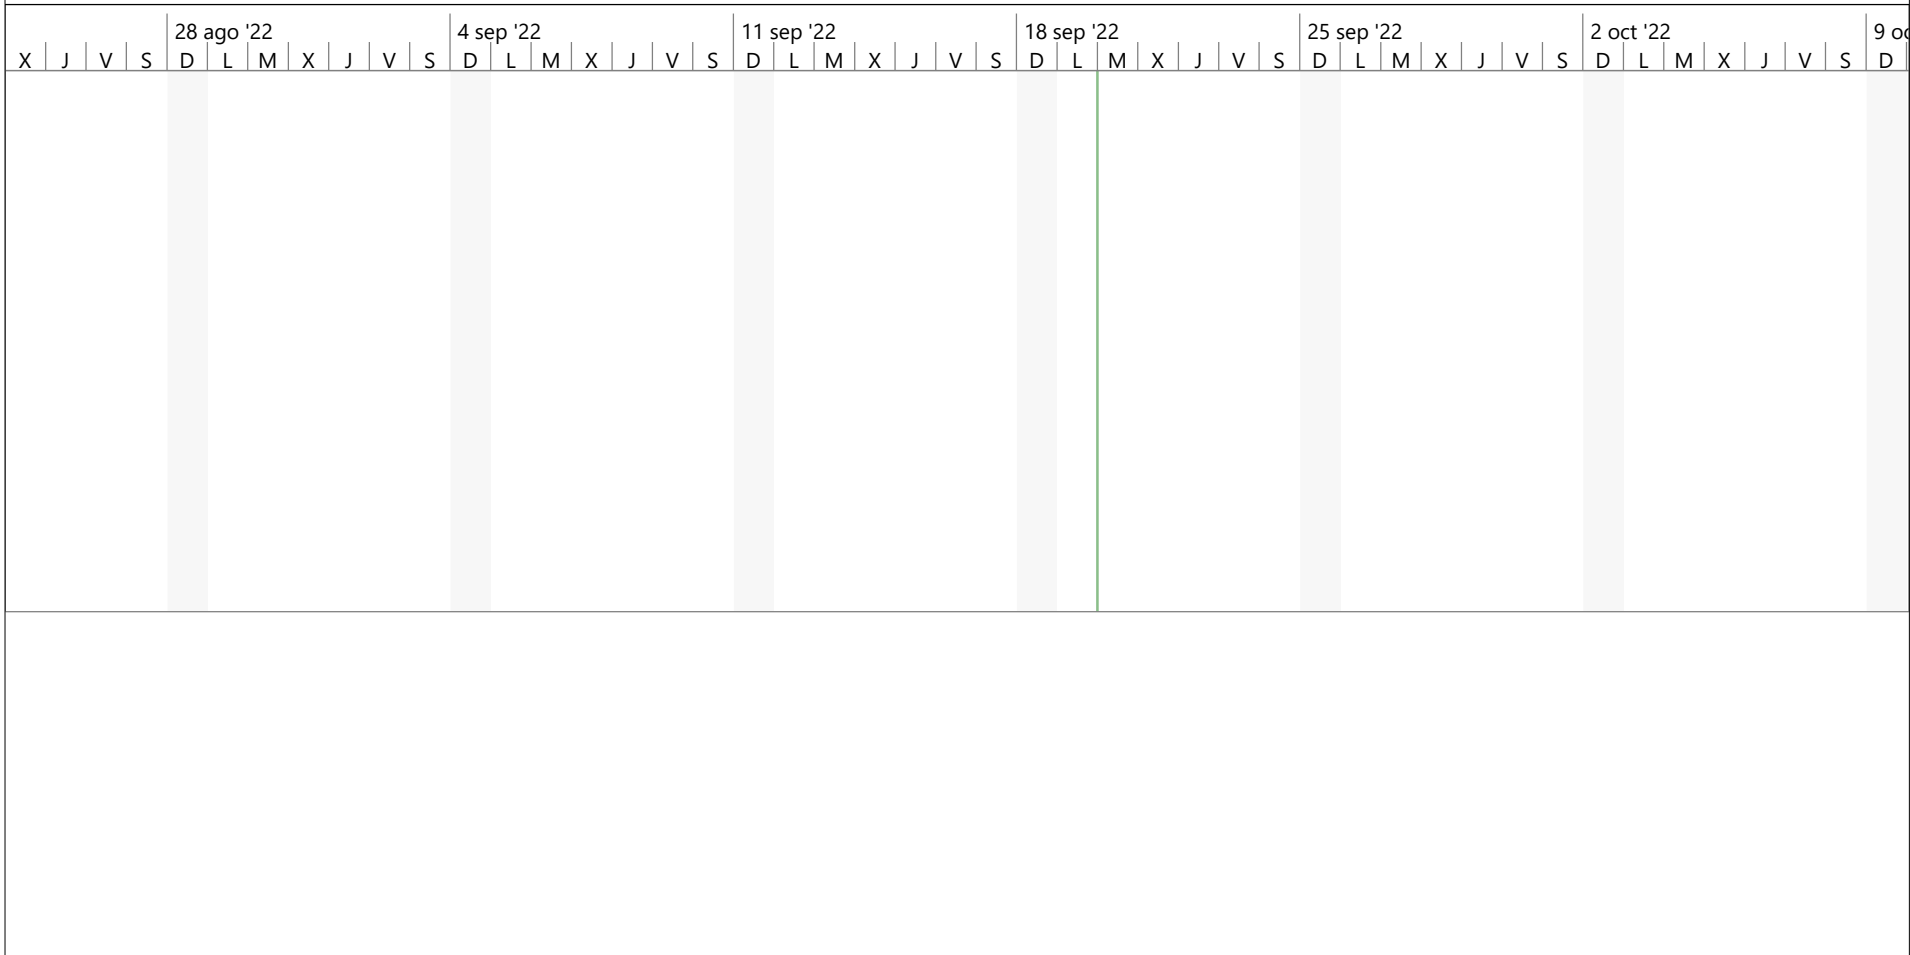


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

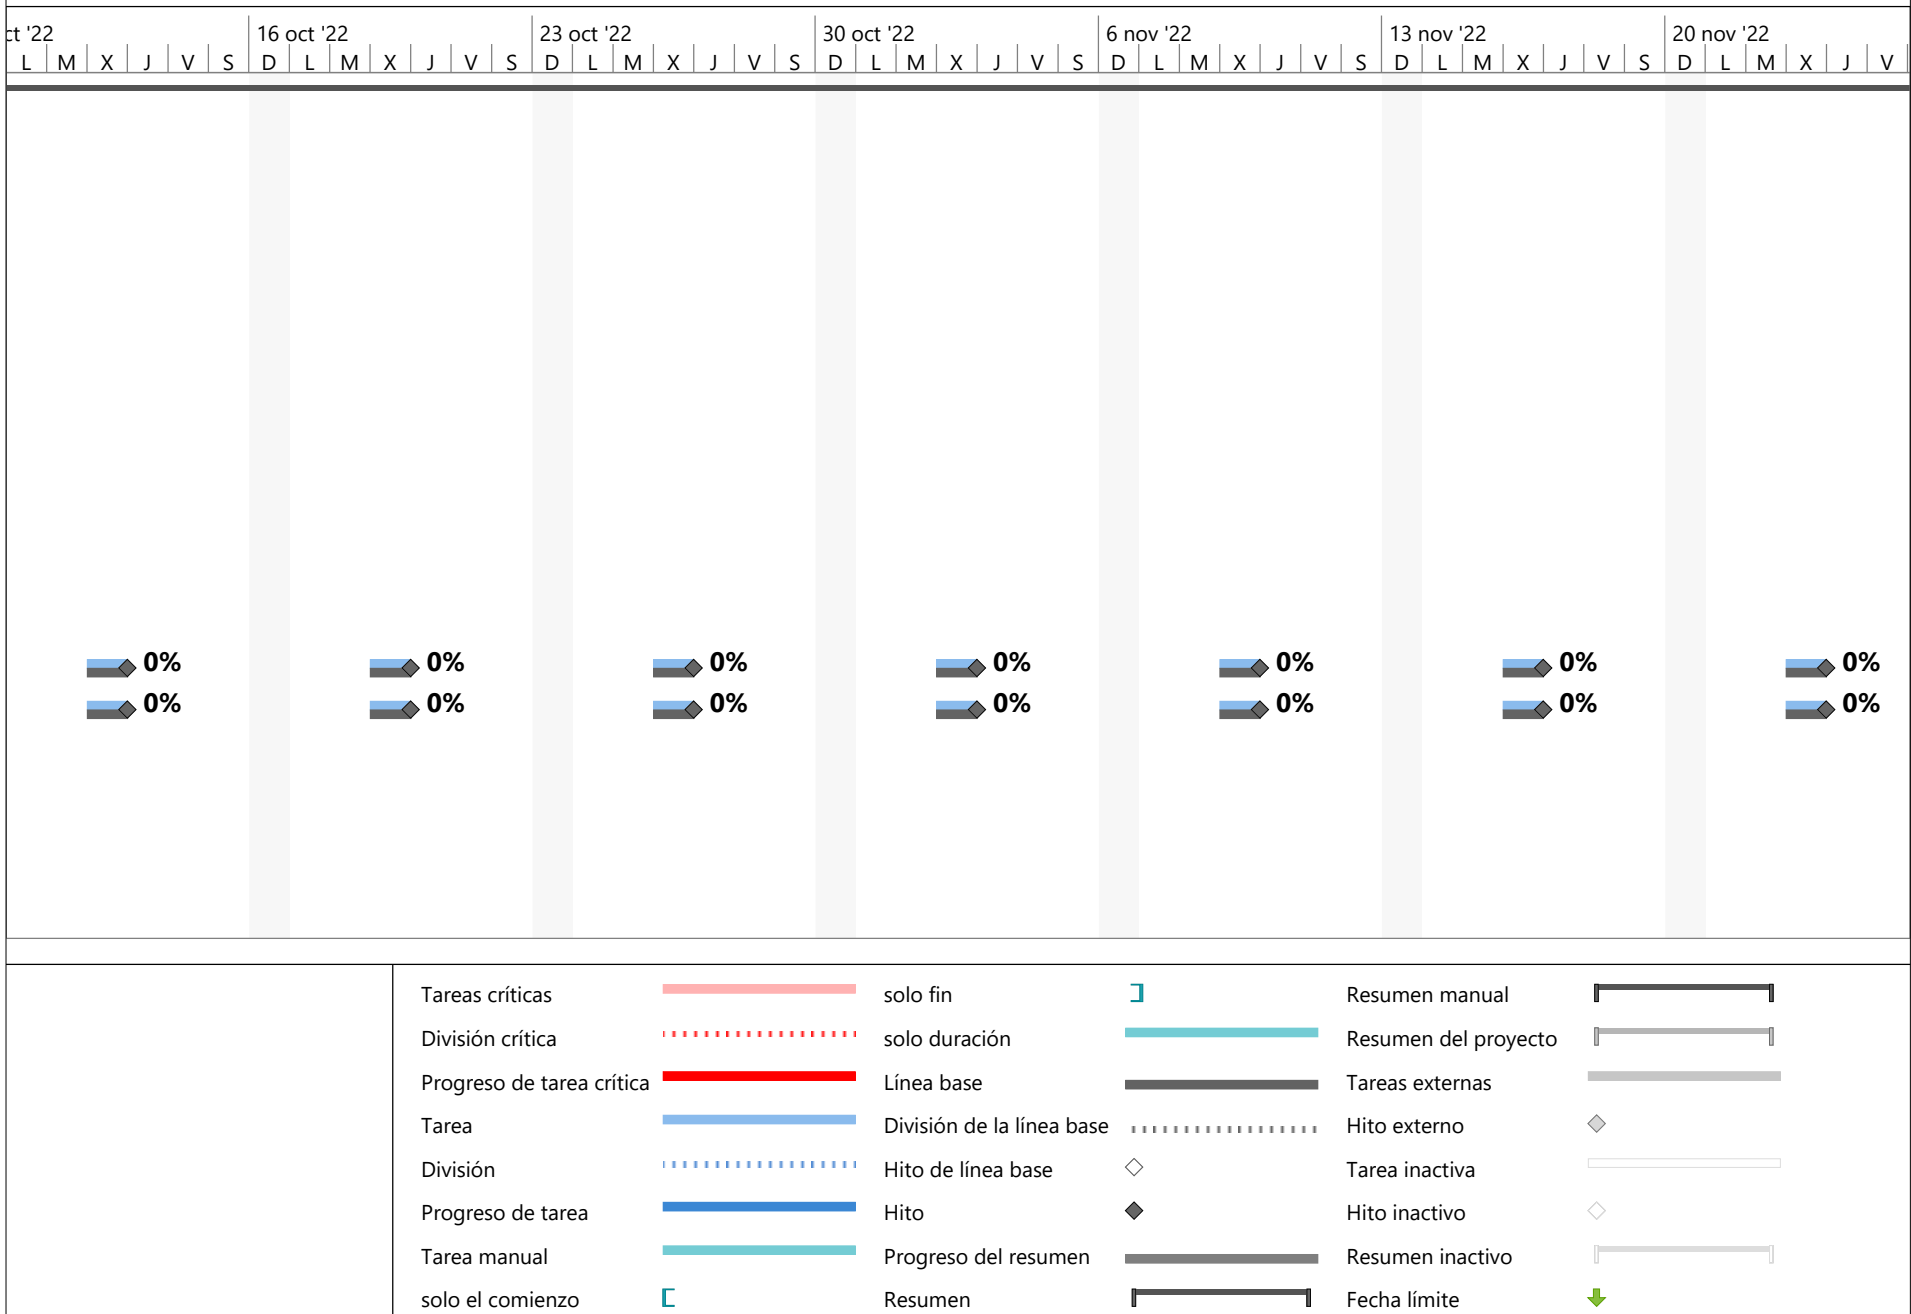
ct '22
16 oct '22
23 oct '22
30 oct '22
6 nov '22
13 nov '22
20 nov '22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite



ct '22
16 oct '22
23 oct '22
30 oct '22
6 nov '22
13 nov '22
20 nov '22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

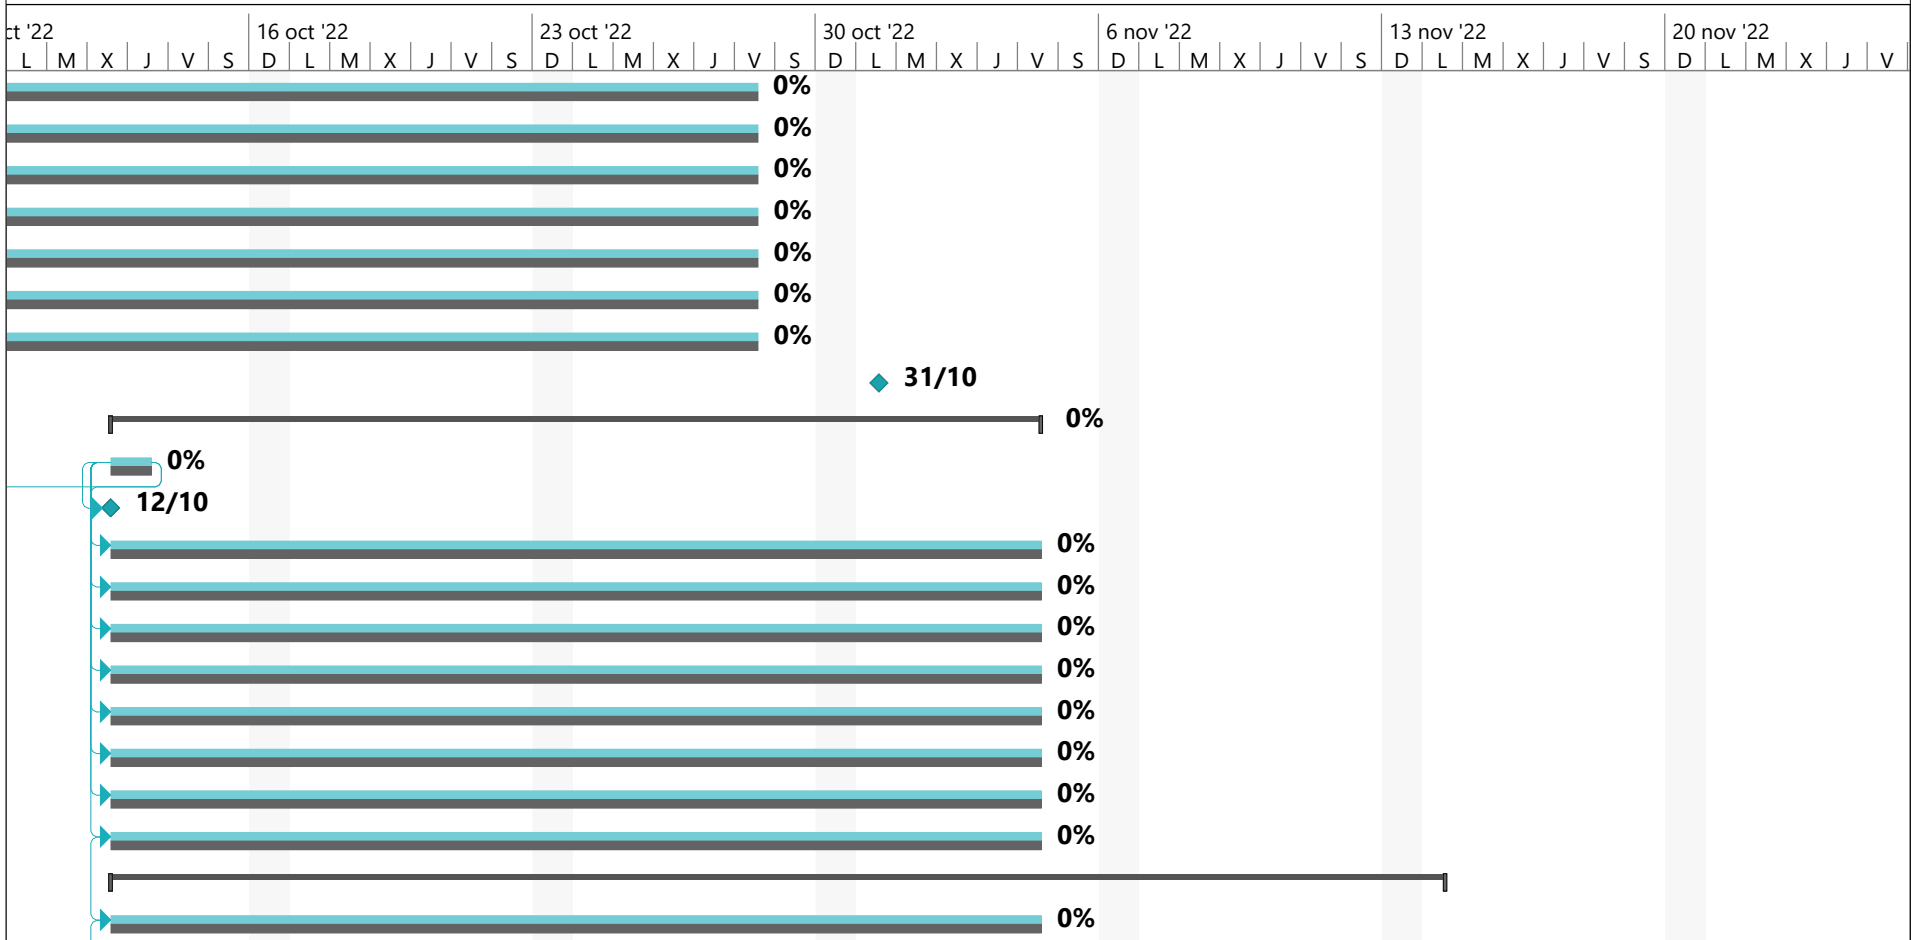


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

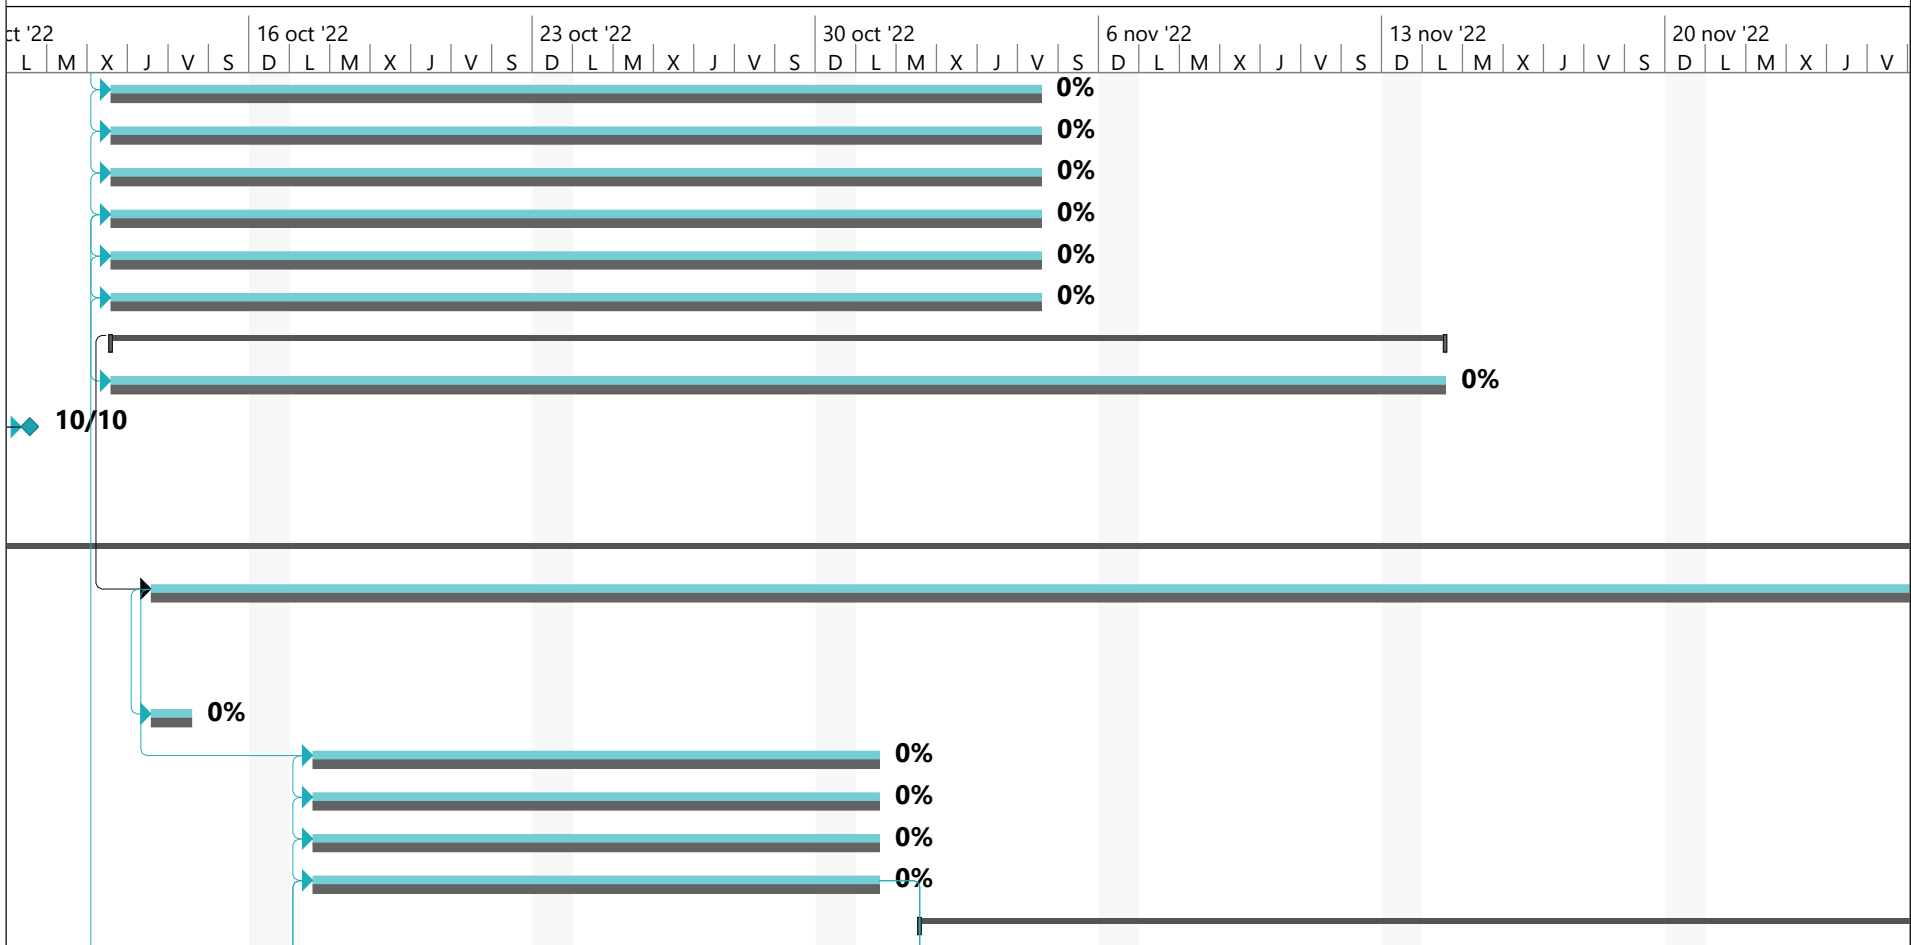


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

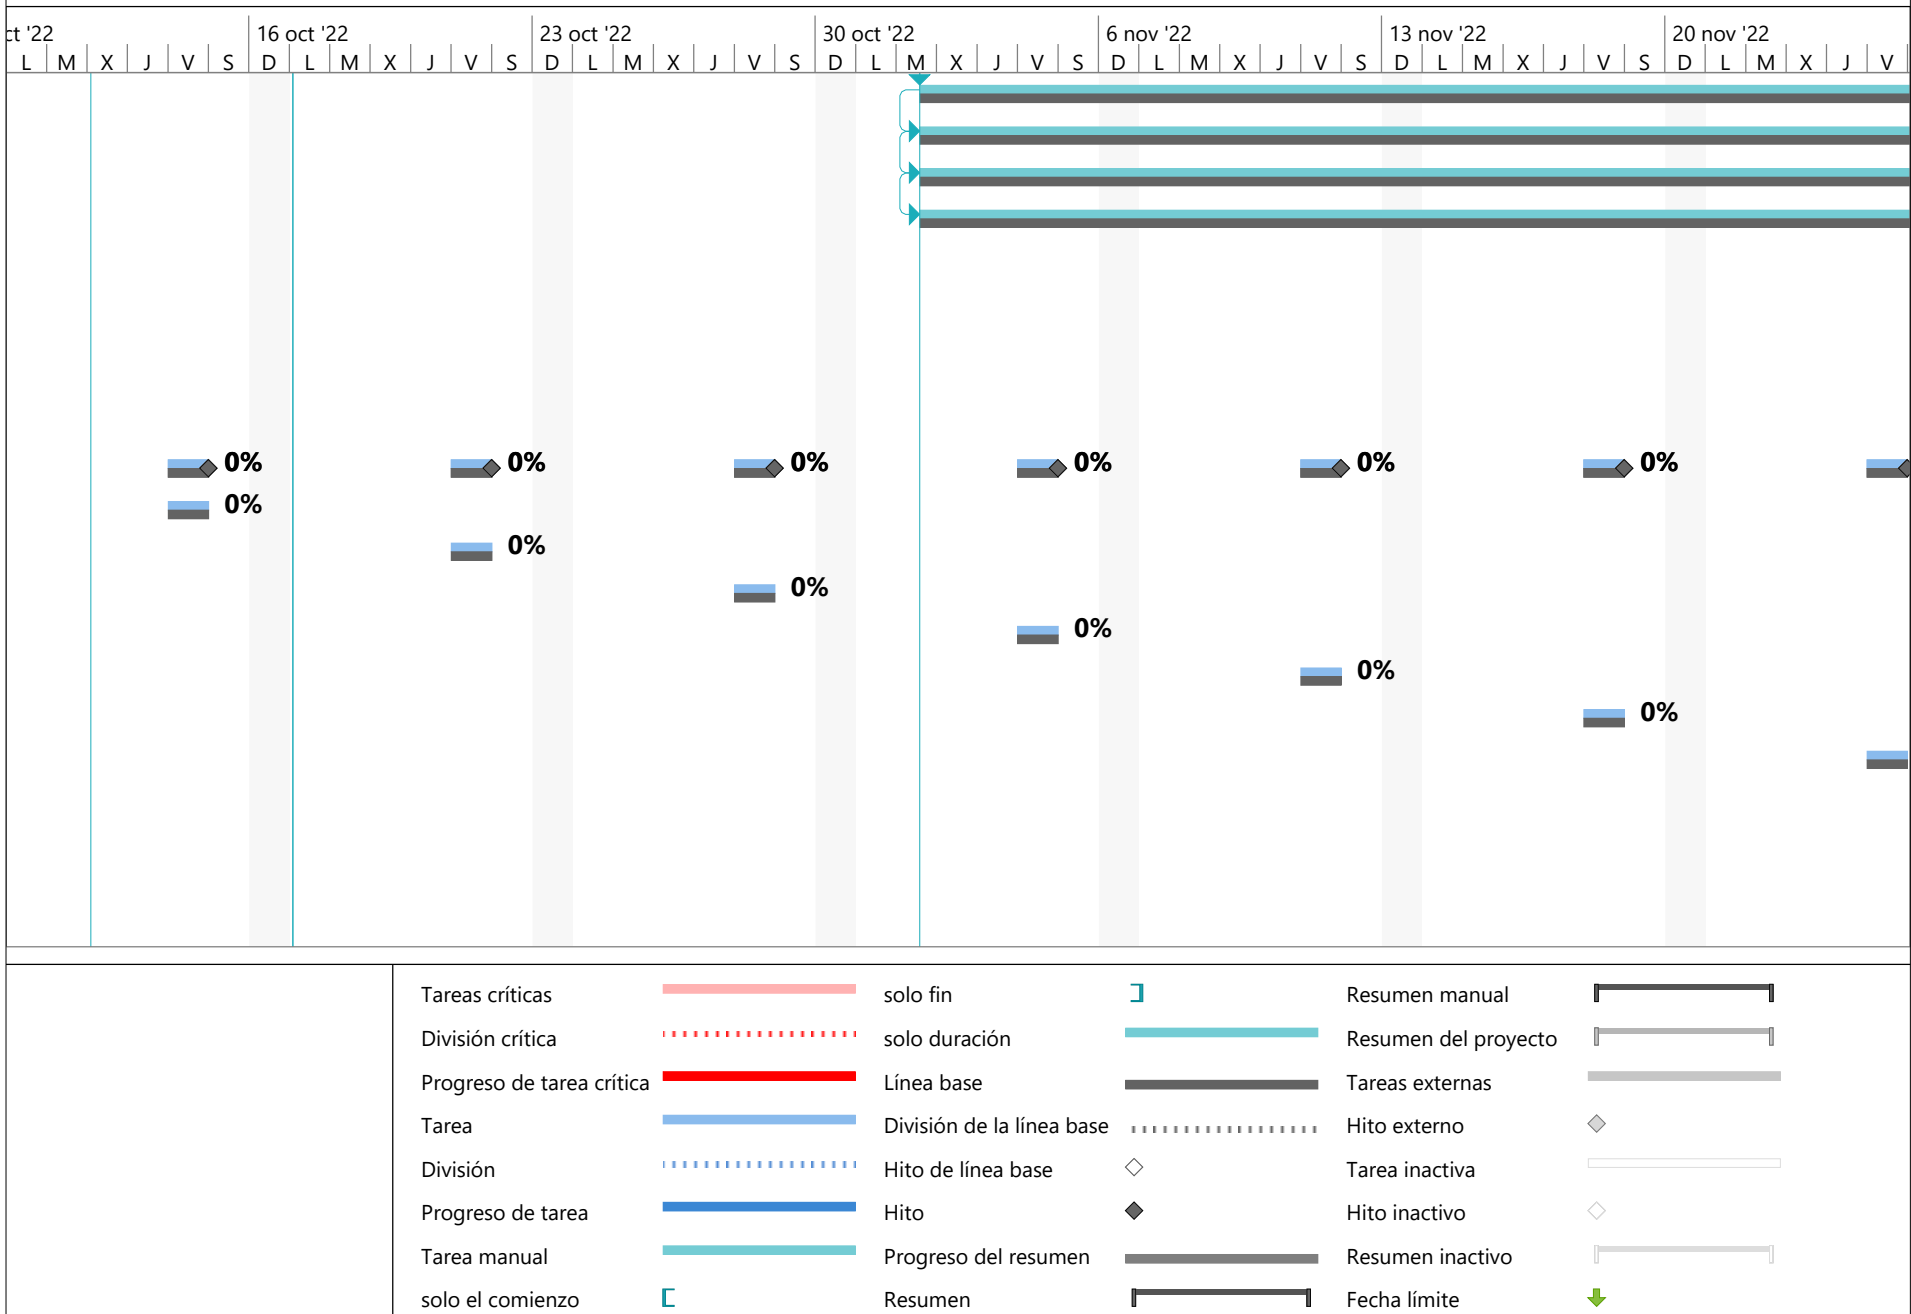
ct '22
16 oct '22
23 oct '22
30 oct '22
6 nov '22
13 nov '22
20 nov '22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite



ct '22
16 oct '22
23 oct '22
30 oct '22
6 nov '22
13 nov '22
20 nov '22
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

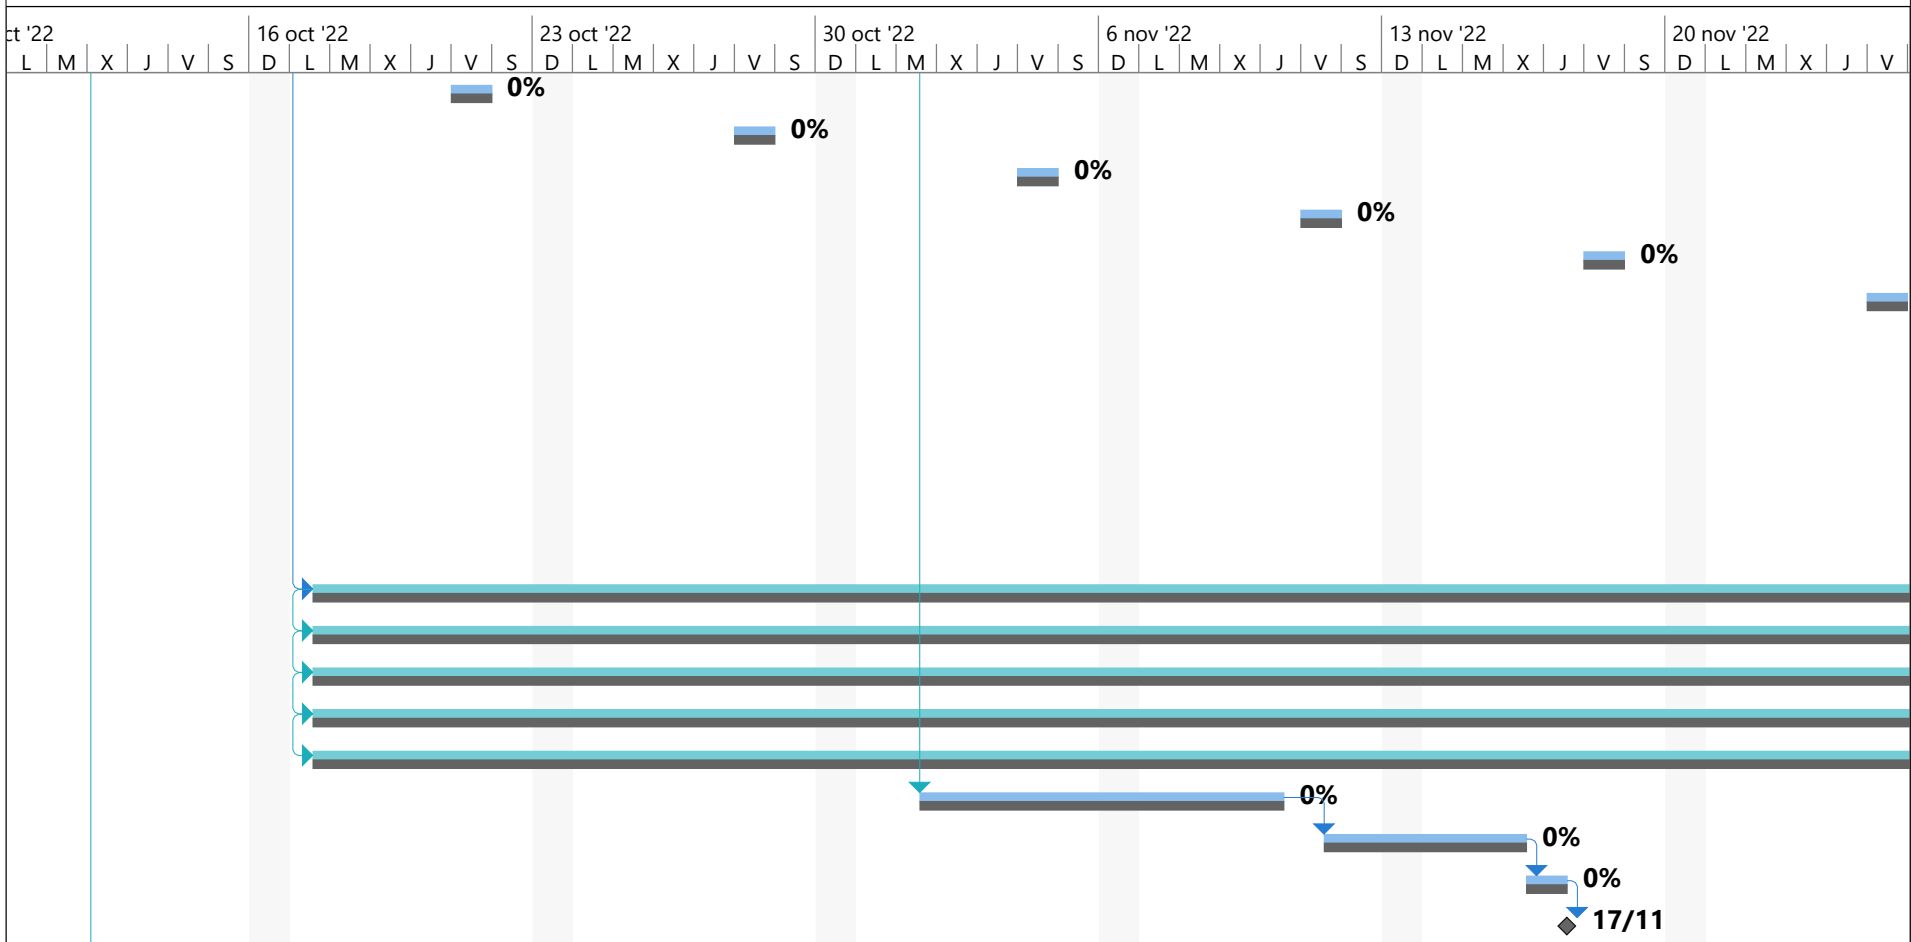



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

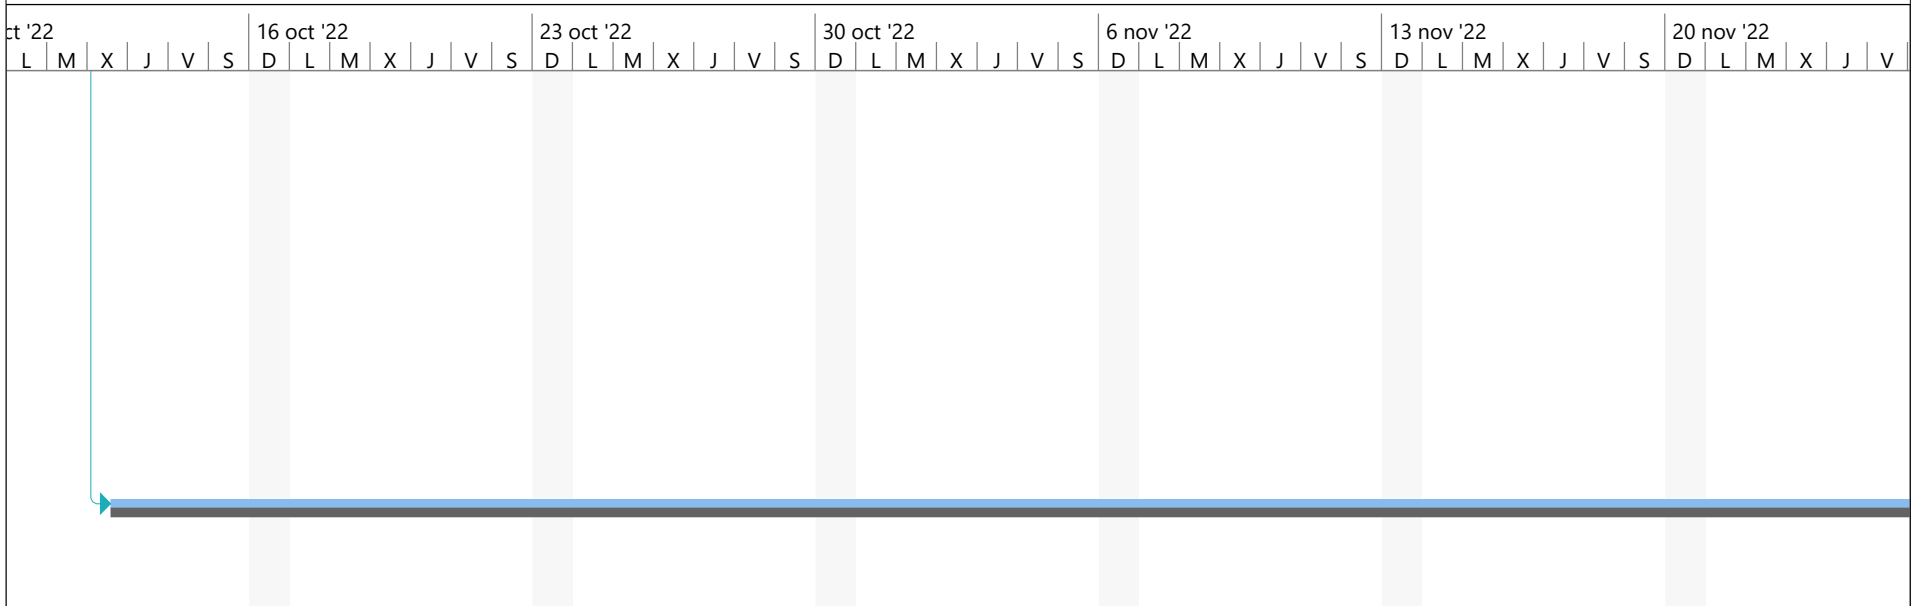



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

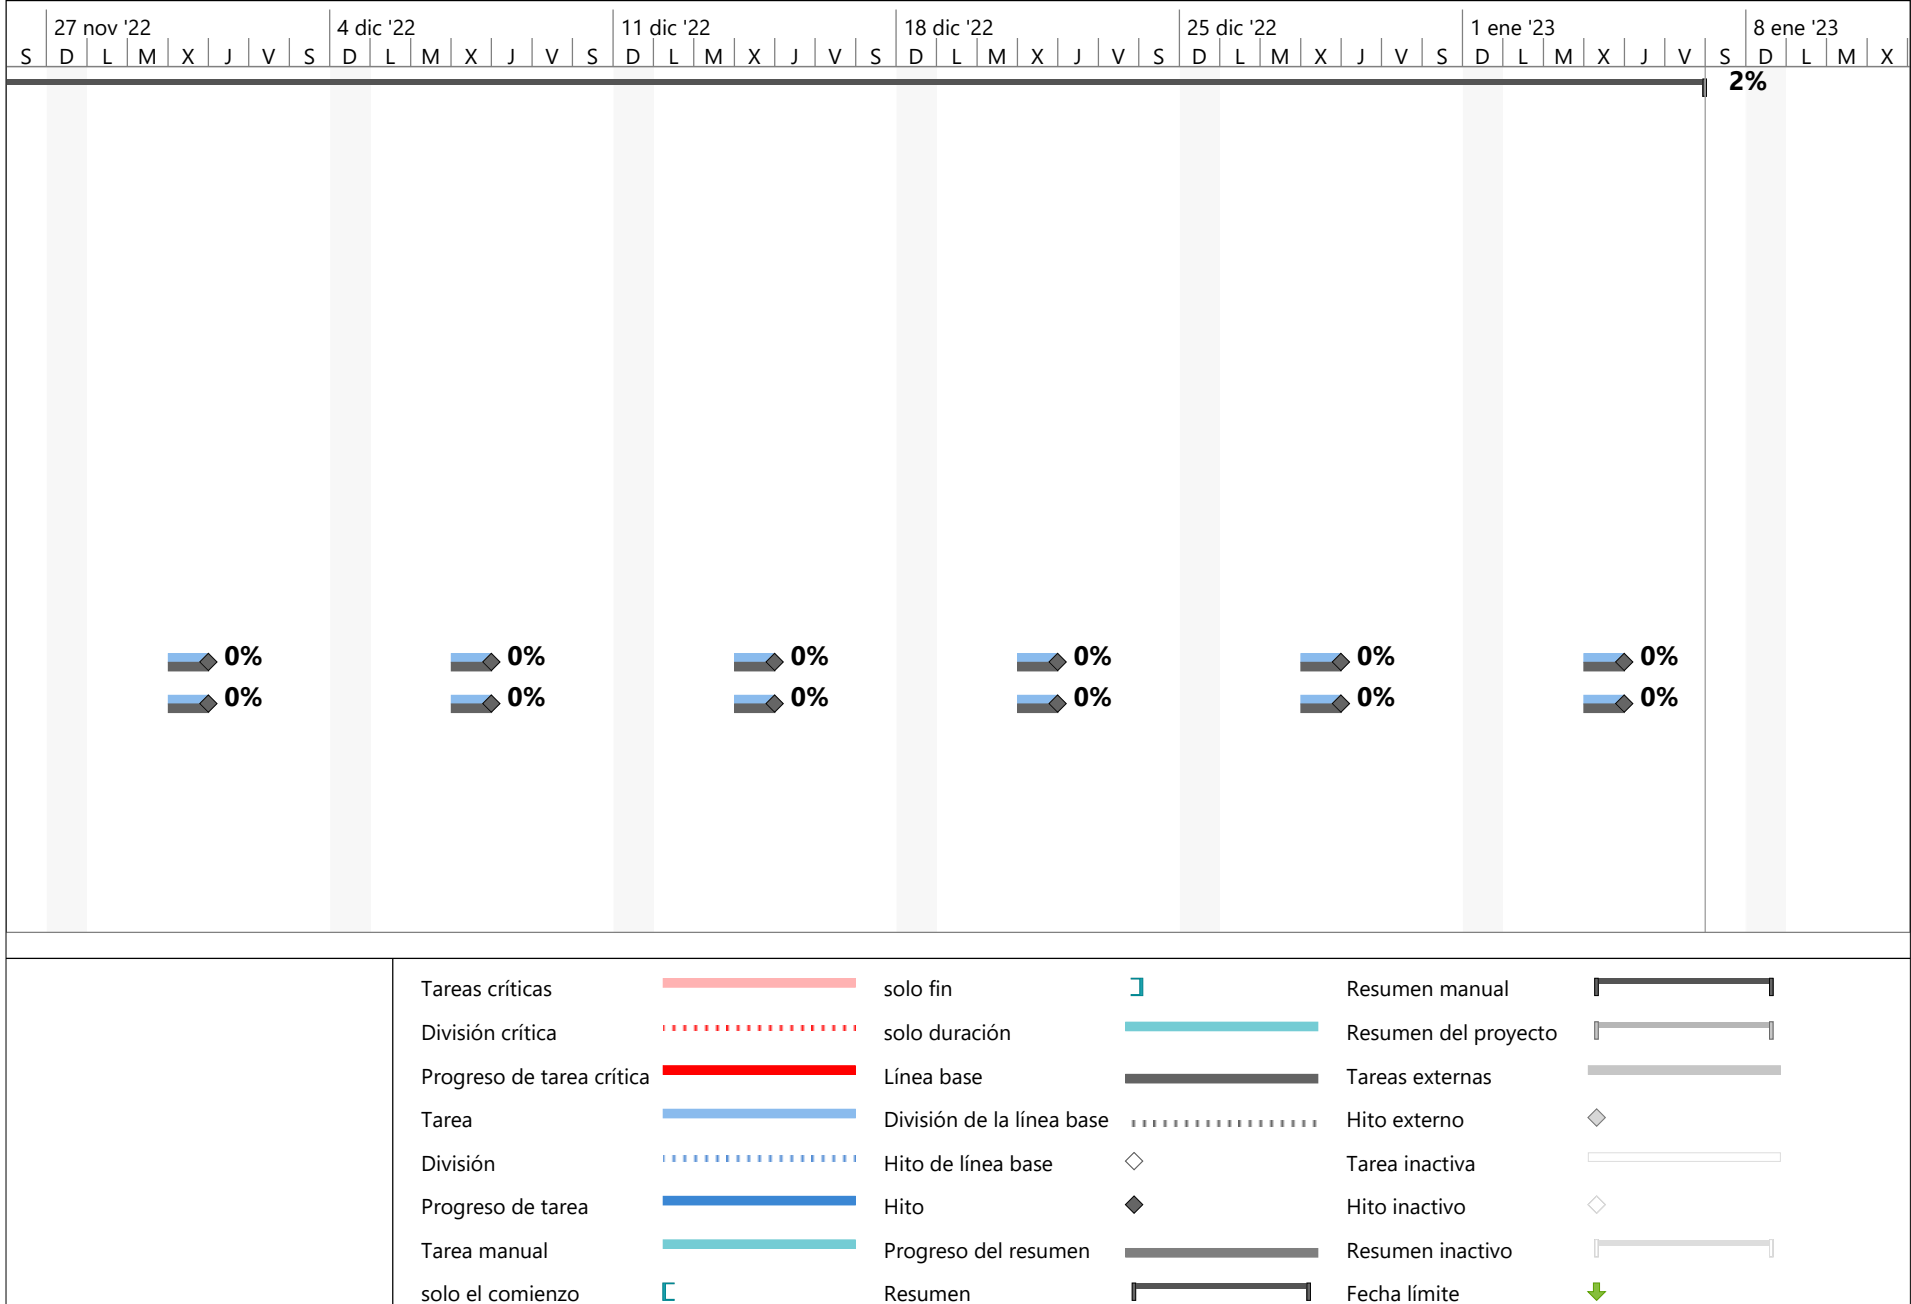

27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

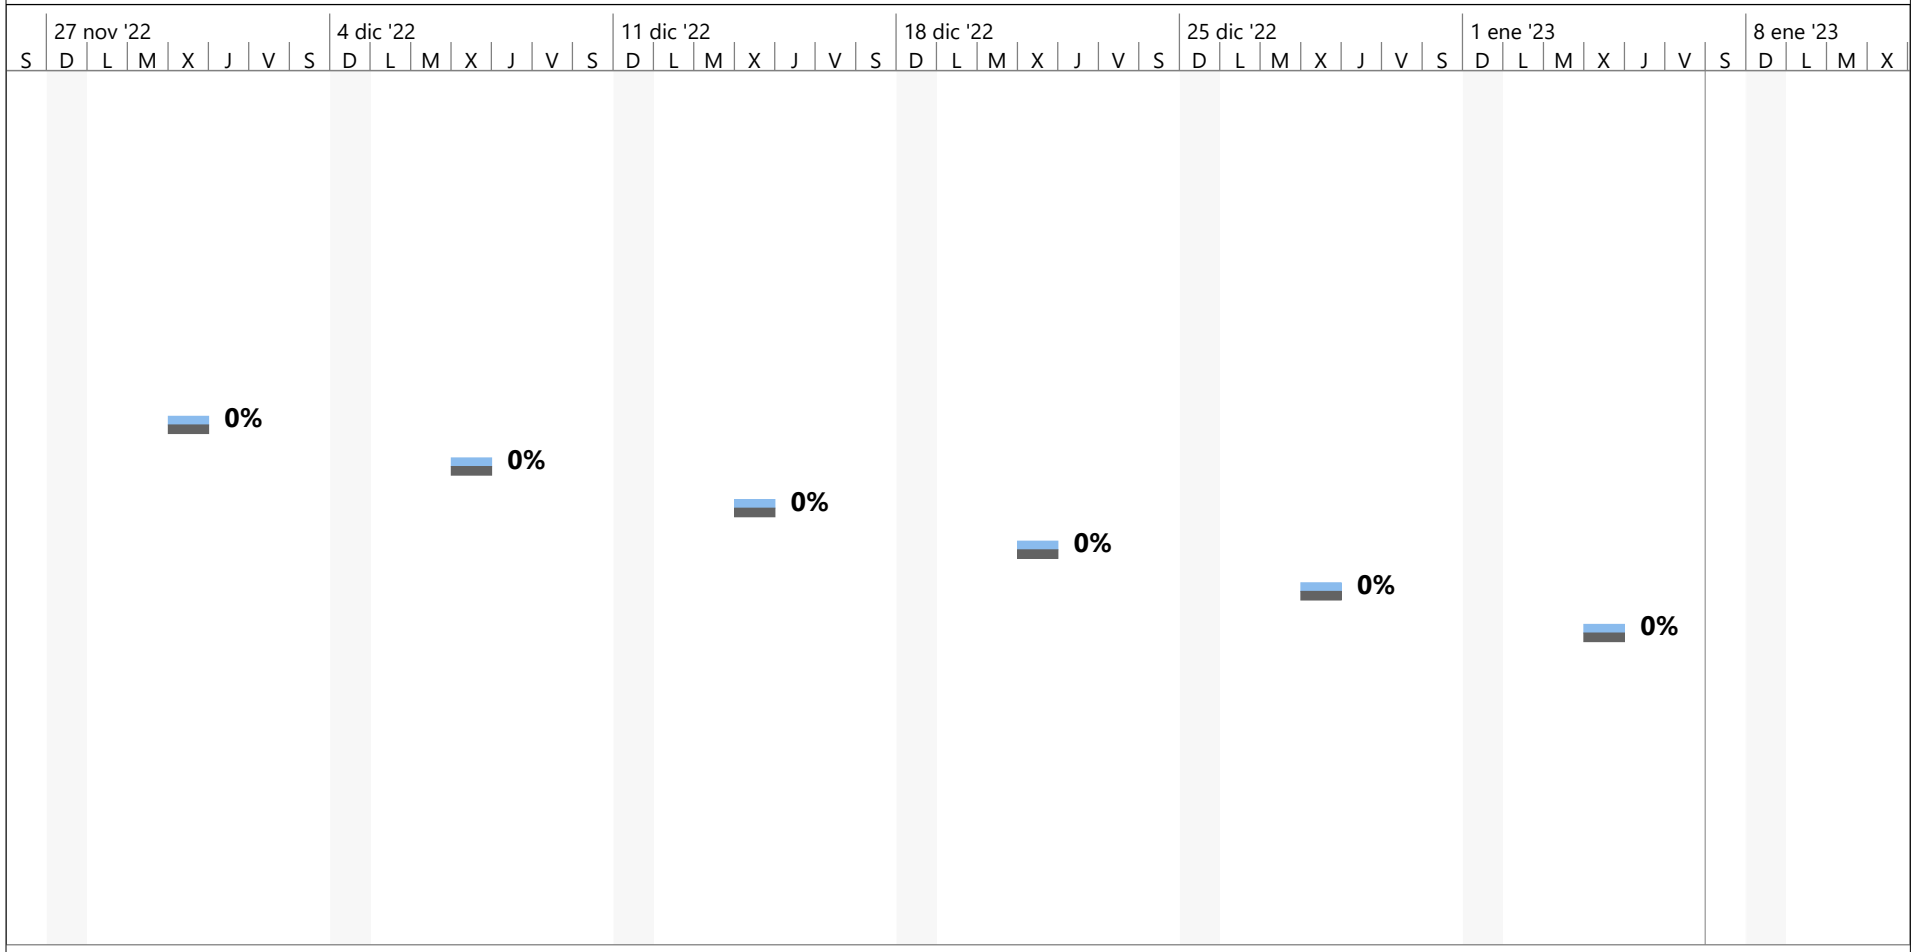

27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
0%
0%
0%
0%
0%
0%



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

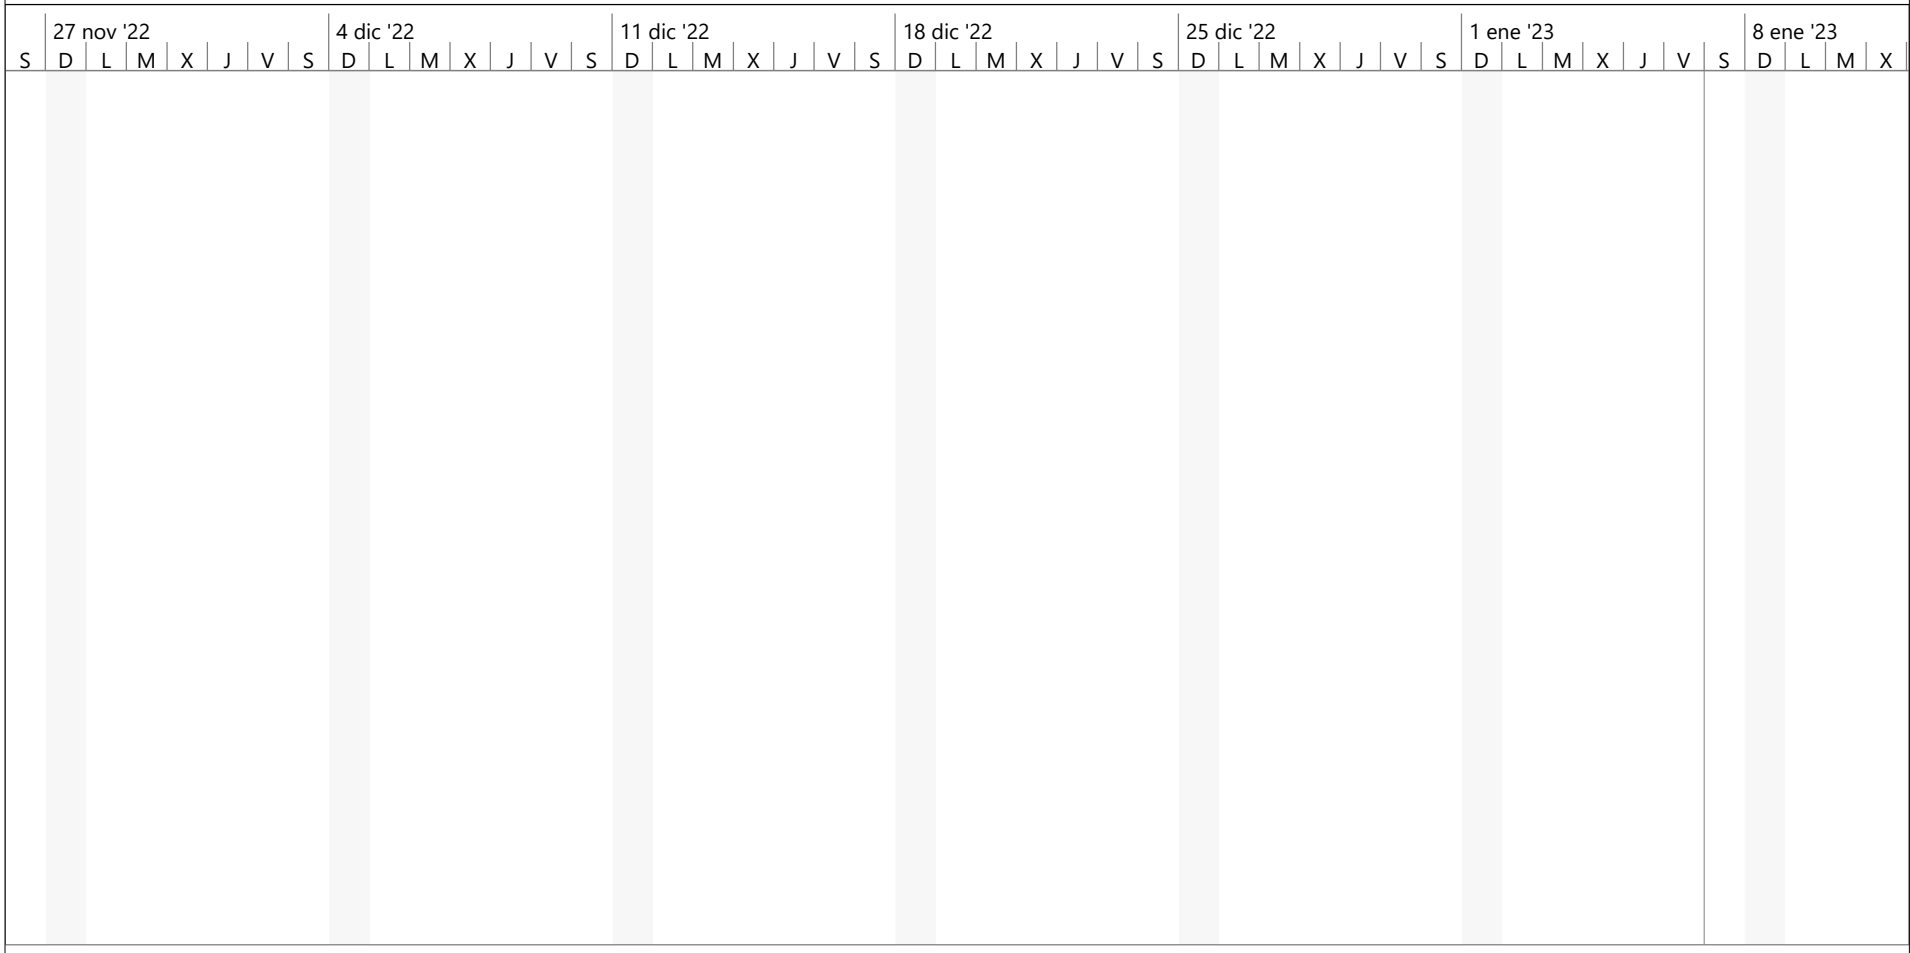
27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

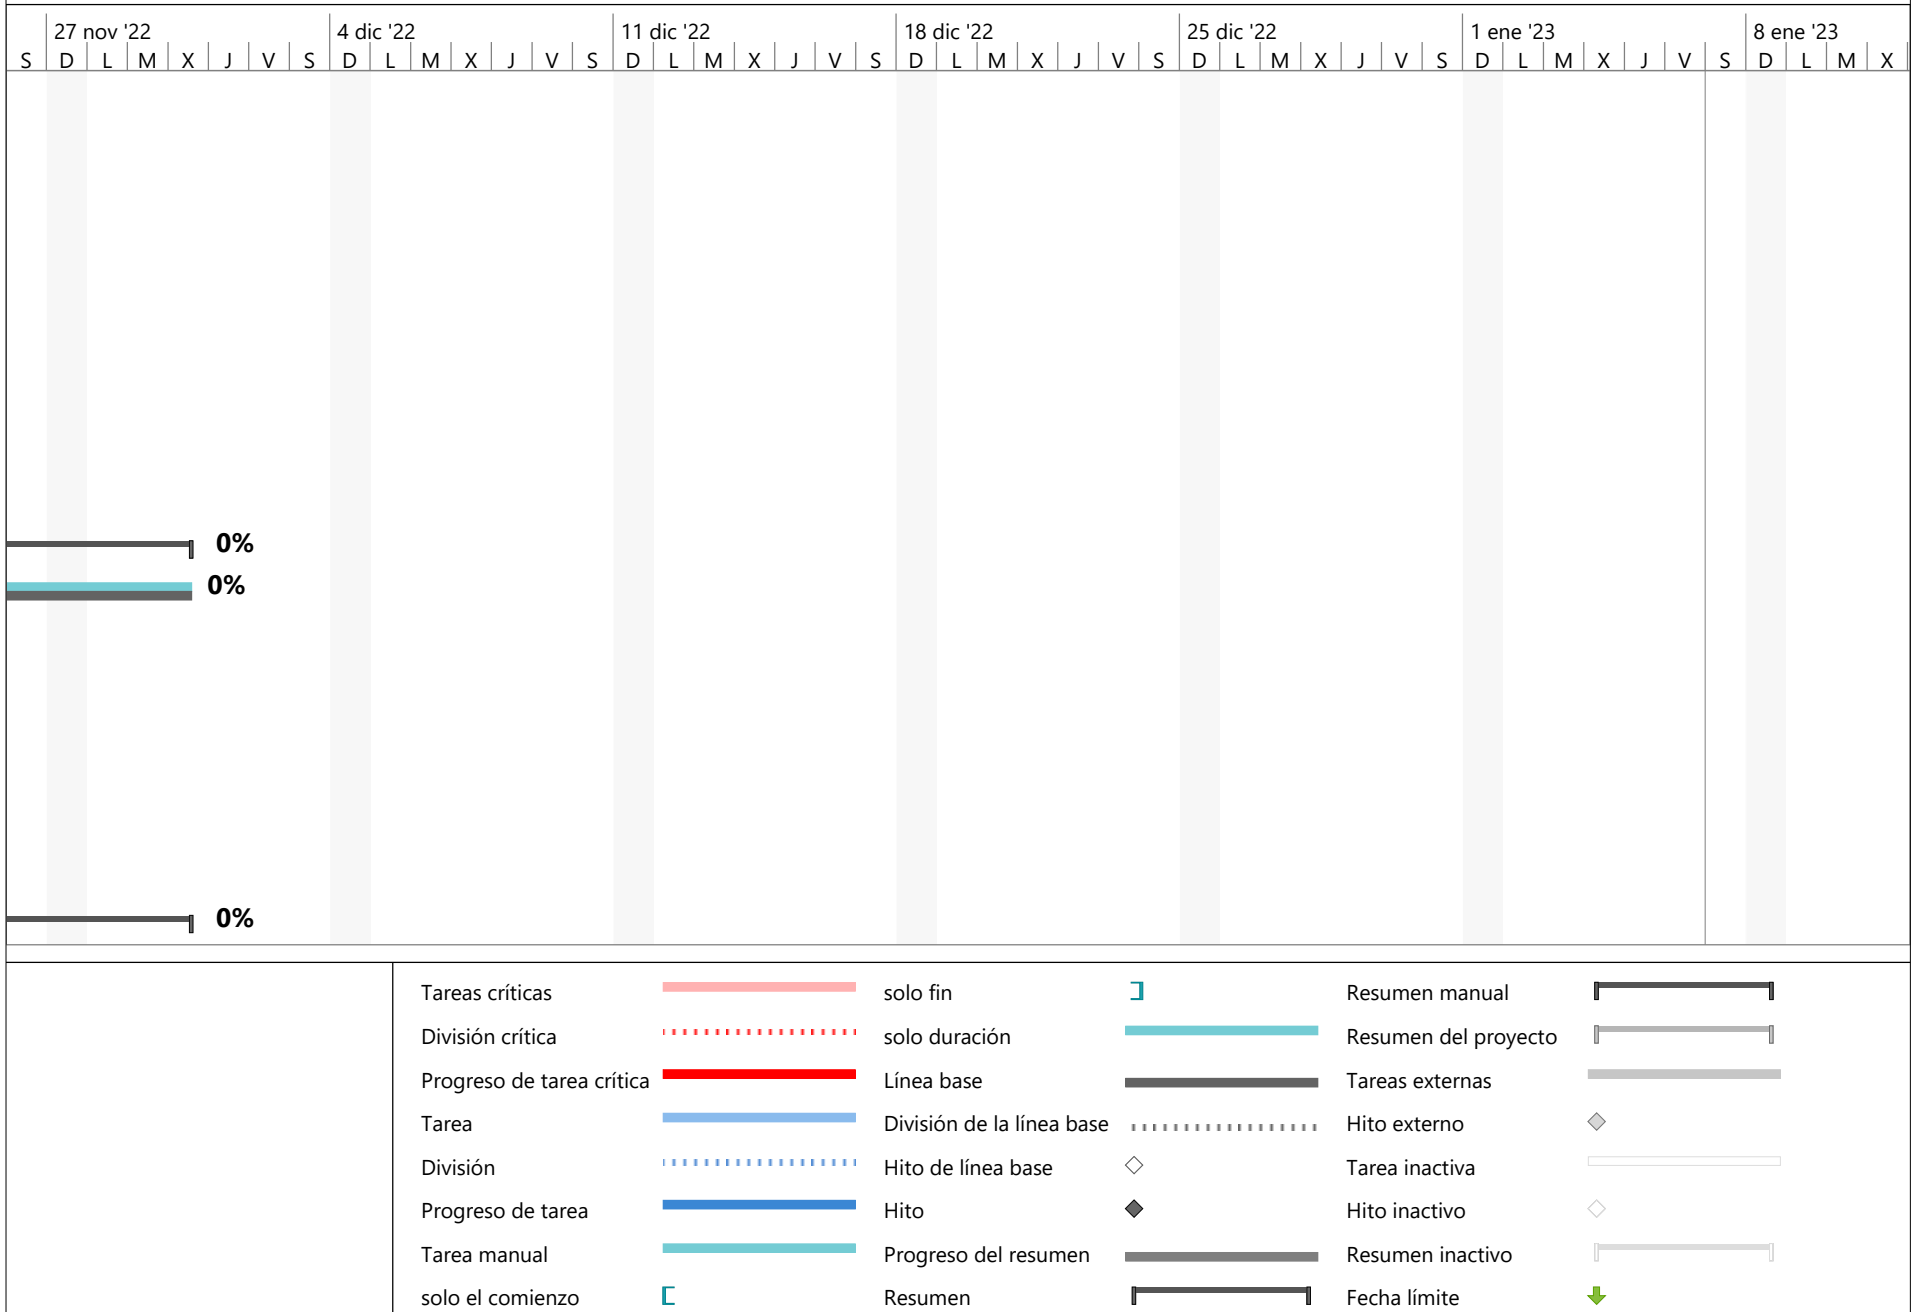

27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
0%
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

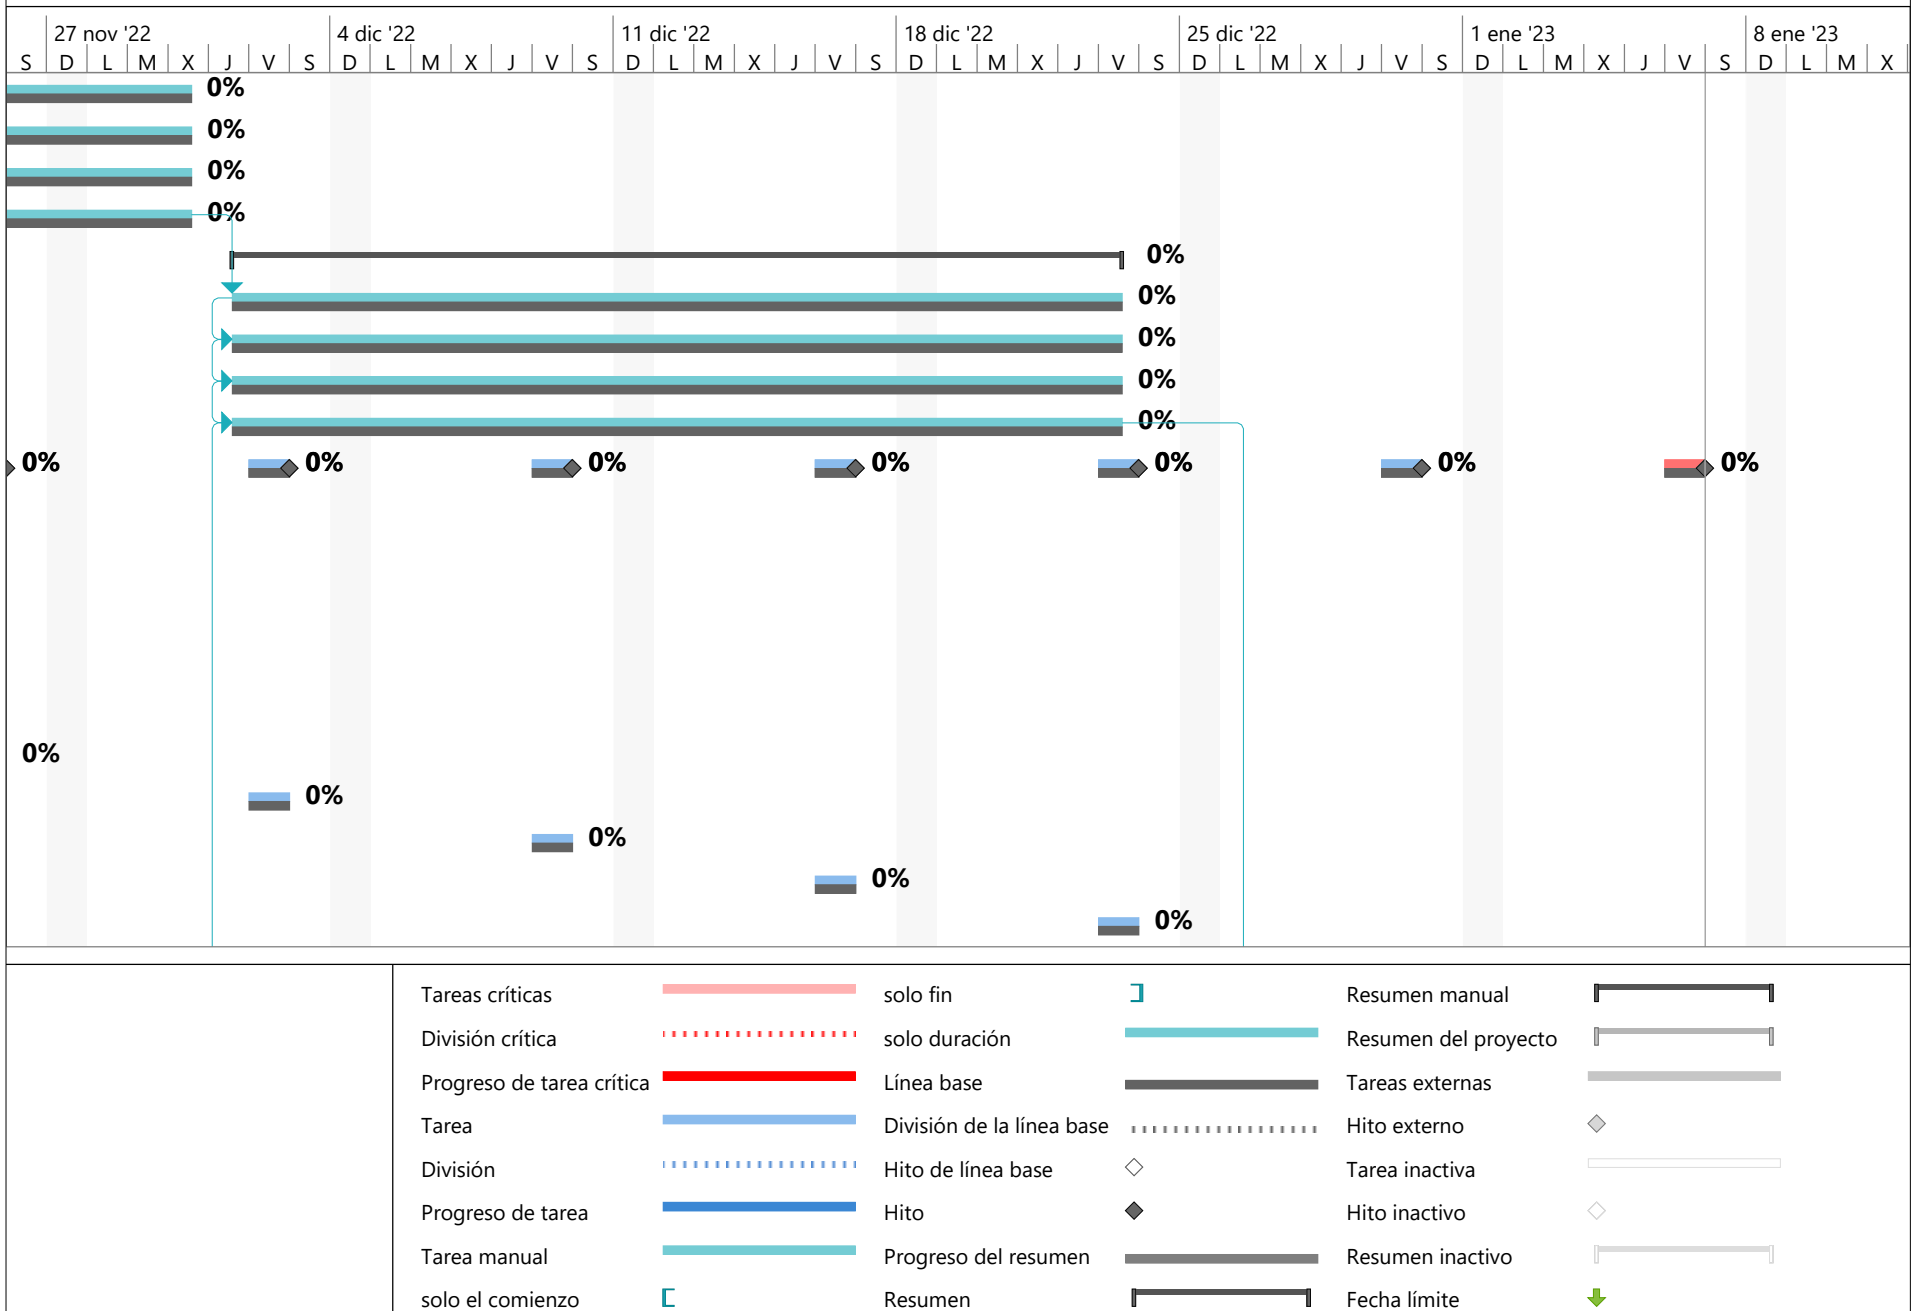
27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

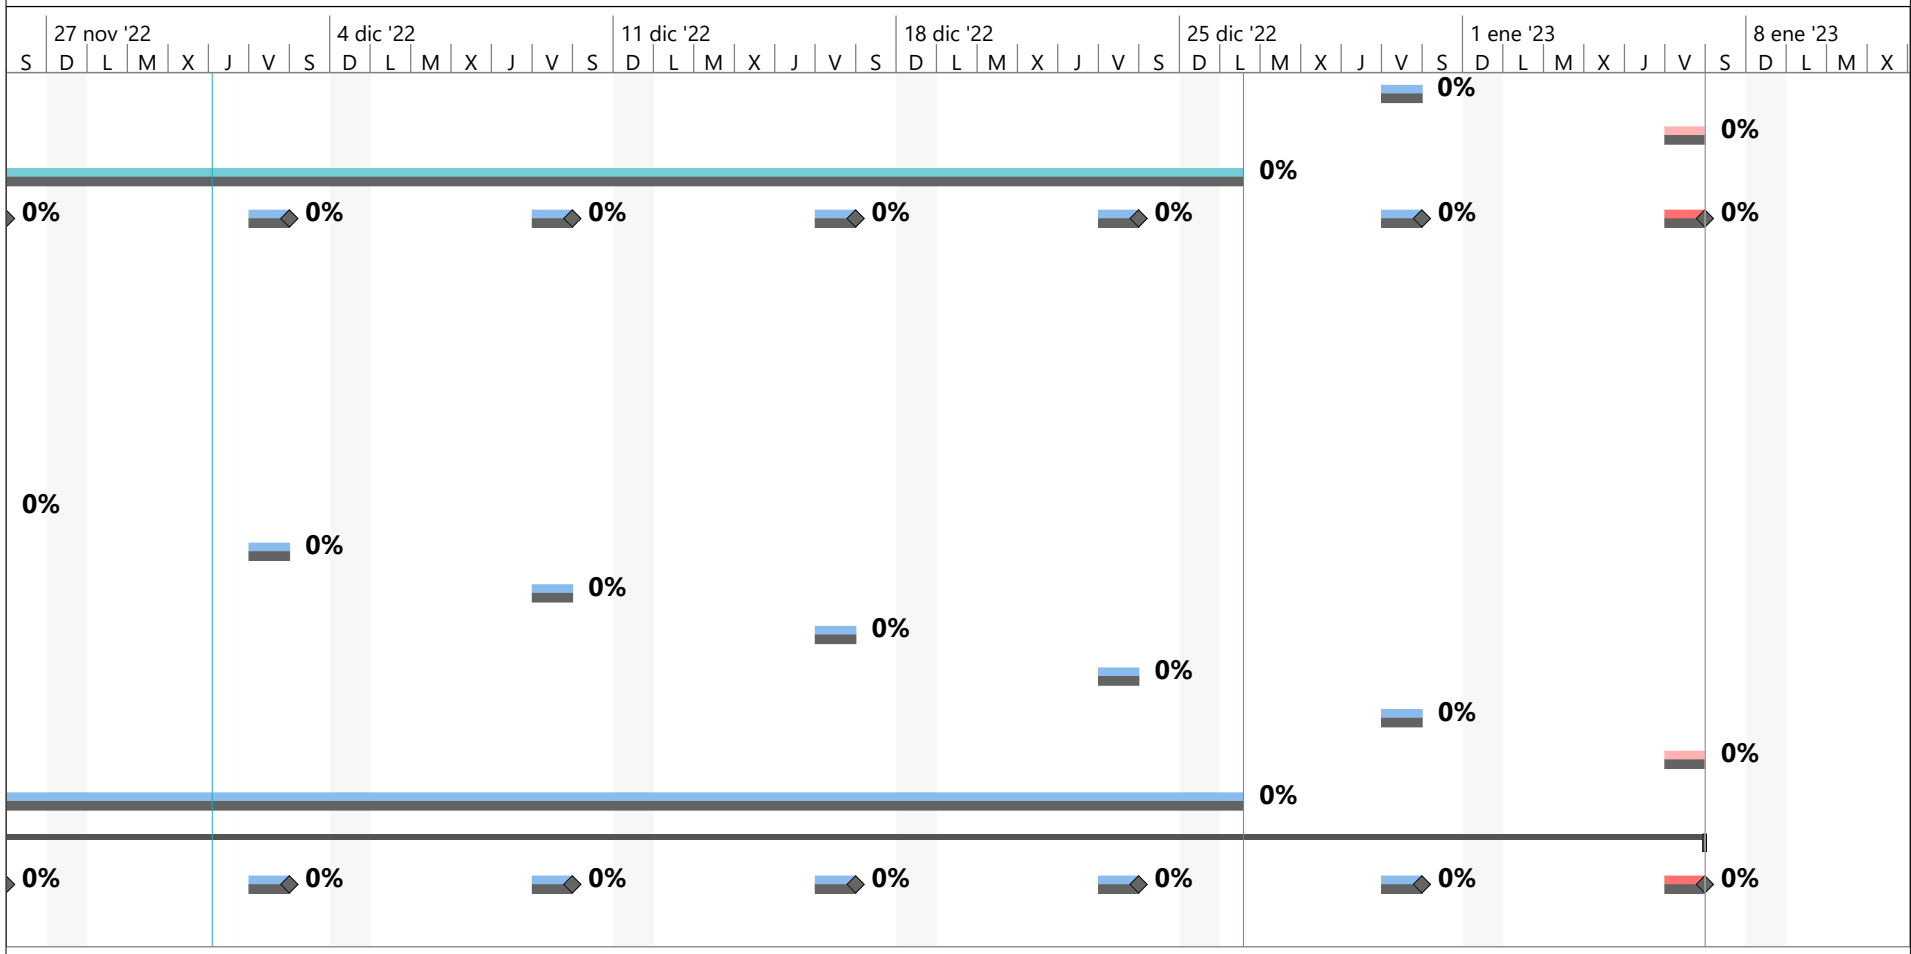

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

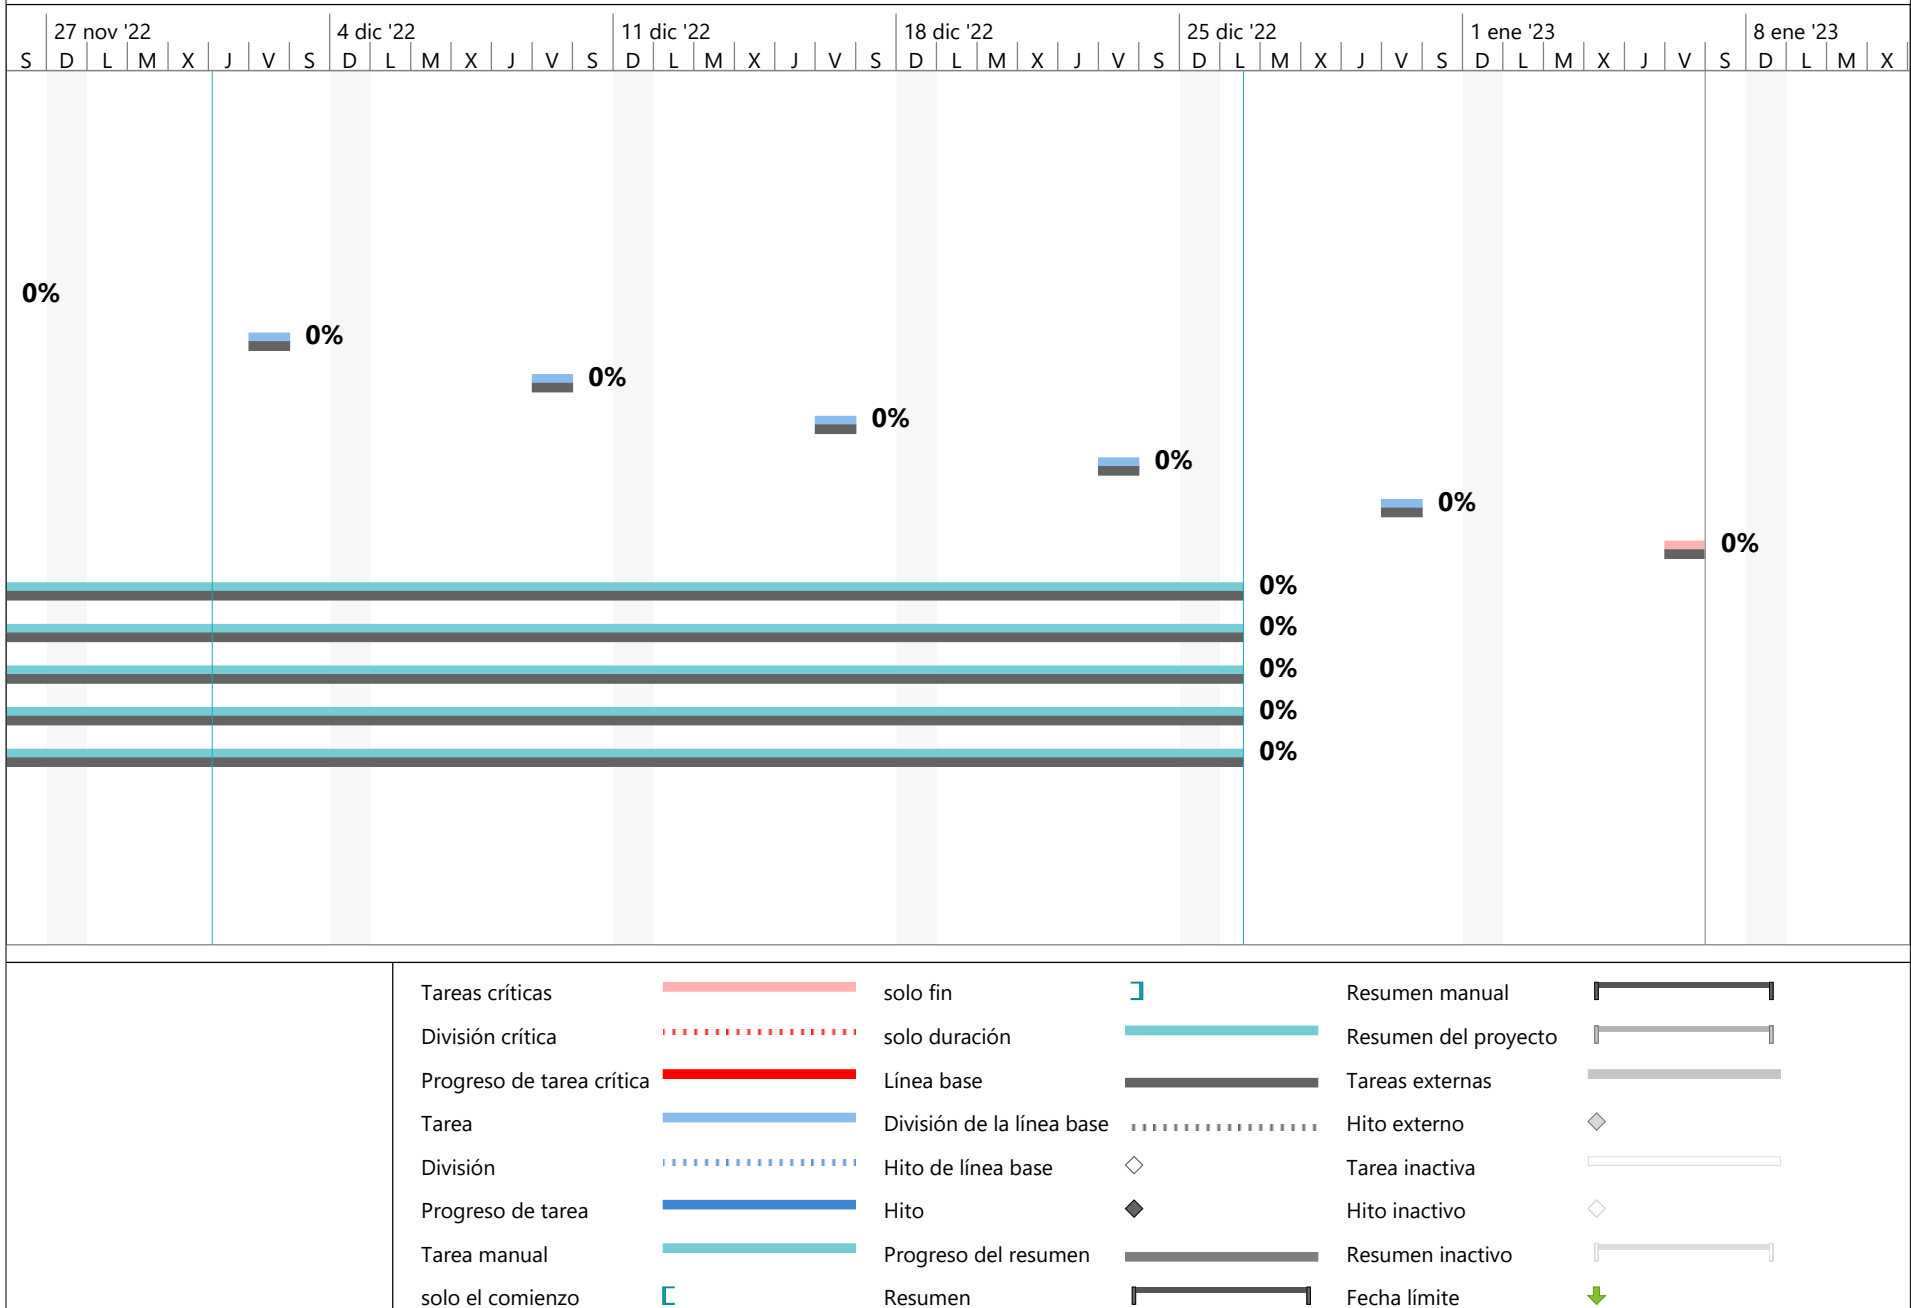
27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

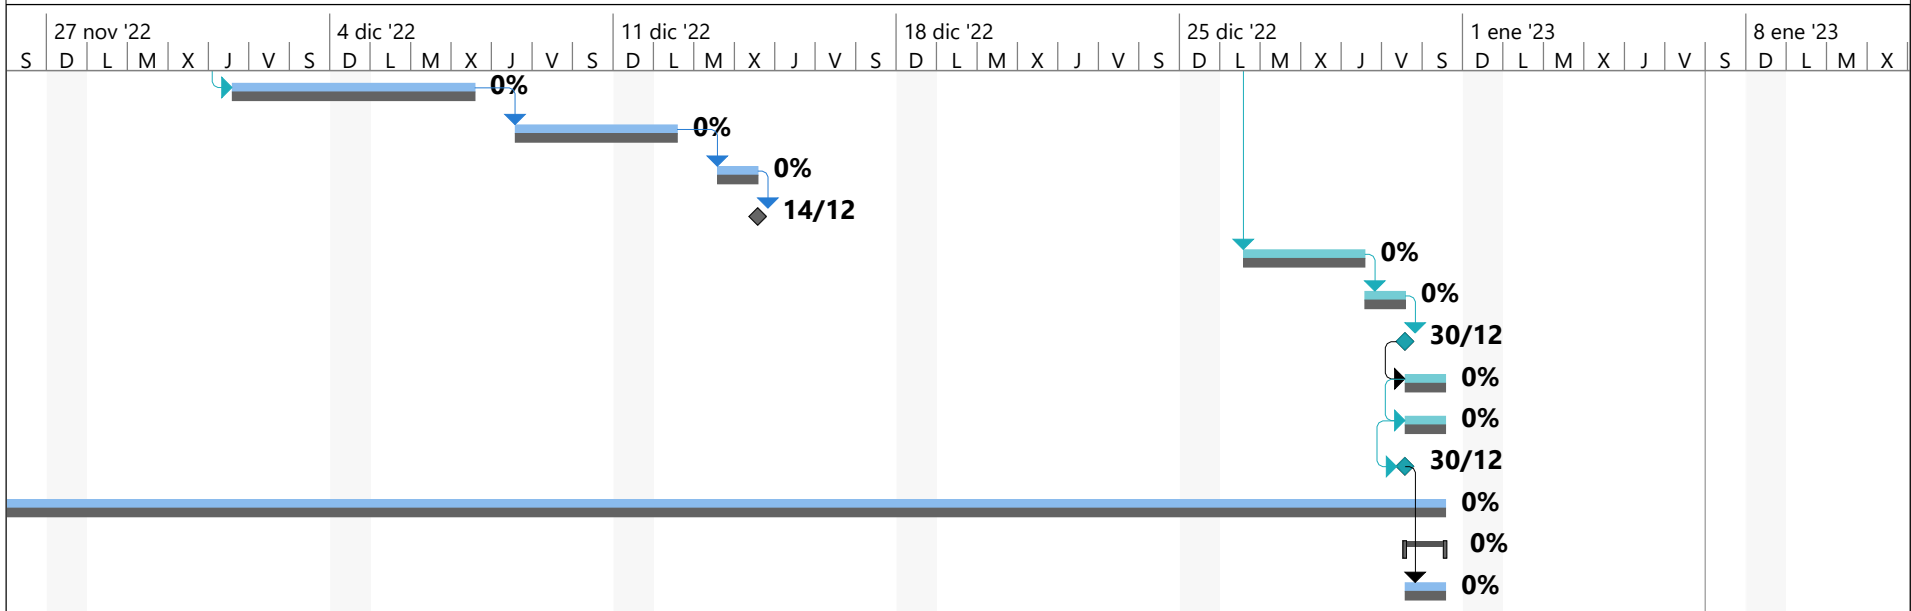

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
