	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CODAF – JETIC – DIASI

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 12. Año: 2022
CONTRATO N°. 081-00-A-COFAC-GOCOP-2022
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA S.A.S NIT. 900-440-779-0
VALOR DEL CONTRATO: $ 309.475.368,00

FORMA DE PAGO: La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:
El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera:
Pagos Vigencia 2022: Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de noviembre del 2022, al 11 de diciembre de 2022 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2023.
Los pagos se realizarán contra presentación de factura, acta de recibo a satisfacción parcial o total, paz y salvo de pago a los aportes parafiscales y de seguridad social y demás documentos requeridos para pago, una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar.
Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FECHA FIRMA: Día 03. Mes 08. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica:
FECHA DE FIRMA: No aplica
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 10/08/2022 hasta el 11/12/2022
Porcentaje Avance en tiempo: 91.13 %
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 74.59 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: 4.04 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 95.96 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Juan Carlos Valencia Ortiz	Gerente de Proyecto	Ingeniero de Sistemas
Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero JFORMS, JREPORTS y Base de Datos Oracle	Ingeniero de Sistemas
Sergio Alejandro Cano Salerno	Ingeniero Angular 4, apiREST en Java con Autenticación JWT, Base de Datos Oracle y JASPER REPORTS	Ingeniero de Sistemas
Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero Oracle Forms y Reports	Ingeniero de Sistemas
Joe Ronald Flórez Rada	Ingeniero PHP, base de datos MYSQL	Ingeniero de Sistemas
Adrián Ricardo Rojas Villegas	(PHP-Laravel) base de datos Microsoft SQL Server	Ingeniero de Sistemas

Yair Morales Muñoz	POWERBI, bases de datos Oracle, SQL Server	Ingeniero de Sistemas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No __X____ Sí _____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No __X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X___
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Que, desde su adjudicación del proceso en el SECOP II el día 10 agosto del 2022, se dió inicio a la ejecución con el acta de inicio publicada con fecha mencionada, se han venido desarrollando las actividades contractuales.
A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de octubre, así:

1. Se continúan realizando reuniones orientadas al levantamiento de requerimientos para desarrollos de los diferentes sistemas de información de la Fuerza (SIIOC2, Auditor Plus, Módulo Certificaciones, CEFUC, Plan Carrera, BD Oracle, SIEFA, Hermes, Dicex, Pruebas Fisicas, Control Denuncias), lo anterior con la finalidad de poder definir la Historia de Usuario que plasme la cantidad de horas utilizadas para poder dar continuidad a los desarrollos.
2. En el mes de noviembre se recibieron 2235 horas de desarrollo de acuerdo a las estimaciones y horas comprometidas descritas en este informe. A continuación se indica el histórico de Historias de Usuarios de acuerdo a levantamiento de requerimientos, así:

SEPTIEMBRE 2022

a. Historia de Usuario 001-01-Sprint 01-SIIOC2CicloOperacional.pdf (59 horas)
b. Historia de Usuario 001-02-Sprint 01-SIIOC2CicloOperacional.pdf (146 horas)
c. Historia de Usuario 001-03-Sprint 01-SIIOC2CicloOperacional.pdf (195 horas)
d. Historia de Usuario 001-04-Sprint 01-SIIOC2CicloOperacional.pdf (122 horas)
e. Historia de Usuario 001-05-Sprint 01-SIIOC2CicloOperacional.pdf (59 horas)
f. Historia de Usuario 002-Sprint 01-SIIOC2DoctrinaOperacional.pdf (32 horas)
g. Historia de Usuario 003-Sprint 01-SIIOC2FormaFLIBMINDIG.pdf (48 horas)
h. Historia de Usuario 005-Sprint 01-SIIOC2FAutonomías TEPLAS .pdf (96 horas)
i. Historia de Usuario 006-Sprint 01-SIIOC2SIMULADOR.pdf (72 horas)

j. Historia de Usuario 007-Sprint 01-SIIOC2SSabana de Vuelo .pdf (16 horas)
k. Historia de Usuario 008-Sprint 01-SIIOC2ReportePruebaFisica .pdf (16 horas)
l. Historia de Usuario 010-Sprint 02-SIIOC2Pantalla de Obstáculos .pdf (02 horas)
m. Historia de Usuario 011-Sprint 01-SIIOC2SOrdenOperacione JES.pdf (04 horas)
n. Historia de Usuario 012-Sprint 01-SIIOC2Correo Electrónico.pdf (40 horas)
o. Historia de Usuario 013-Sprint 01-SIIOC2AlertasSIIOC2.pdf (04 horas)
p. Historia de Usuario 014-Sprint 02-PlandeCarrera.pdf (30 horas)
q. Historia de Usuario 015-Sprint 02-CEFUC.pdf (193 horas) **En total se realizarán 161 horas**
Se informa que de acuerdo al análisis realizado por parte del funcional en cuanto a la Historia de Usuario 015-Sprint 02-CEFUC correspondiente a 193 horas, se evalúa de acuerdo a necesidades funcionales que 32 horas de dicho paquete no son viables ejecutarlas, quedando así un total de 161 horas autorizadas para desarrollo.

Total Horas Cotizadas Septiembre: 1102 horas

OCTUBRE 2022
r. Historia de Usuario 016-Sprint 02-PruebasIngles.pdf (92 horas)
s. Historia de Usuario 017-Sprint 02-Intranet.pdf (52 horas) **Por necesidades de la Fuerza no se realiza este requerimiento, quedando disponible las 52 horas**.
t. Historia de Usuario 018-Sprint 02-PLANDECARRERA.pdf (05 horas)
u. Historia de Usuario 019-Sprint 02-MttoBDOracle.pdf (10 horas)
v. Historia de Usuario 020-Sprint 03-OracleForms.pdf (116 horas)
w. Historia de Usuario 021-Sprint 03-CertificacionesEnLinea.pdf (66 horas)
x. Historia de Usuario 022-Sprint 03-AuditorPlus.pdf (264 horas)
y. Historia de Usuario 023-Sprint 03-CEFUCPoligrafía.pdf (112 horas)
z. Historia de Usuario 024-Sprint 03-CapacitaciónReportesApex.pdf (320 horas)
aa. Historia de Usuario 025-Sprint 03-SIIOC2.pdf (05 horas)

Total Horas Cotizadas Octubre: 990 horas

NOVIEMBRE 2022
bb. Historia de Usuario 009-SIIOC2- CERTIFICADOS.pdf (1 hora)
cc. Historia de Usuario 026-Sprint 03-AUDITORIGEFA.pdf (3 horas)
dd. Historia de Usuario 027-DICEX.pdf (202 horas)
ee. Historia de Usuario 028-ControlDenuncias.pdf (55 horas)
ff. Historia de Usuario 029-Plan Carrera.pdf (64 horas)
gg. Historia de Usuario 030-CertificacionesReservistas.pdf (42 horas)
hh. Historia de Usuario 031-AplicacionWebMelgar.pdf (130 horas)
ii. Historia de Usuario 032-01-OrdenVisualización.pdf (380 horas)
jj. Historia de Usuario 032-02-OrdenVisualización.pdf (379 horas)
kk. Historia de Usuario 033-pantalla FREGISTR.pdf (16 horas)
ll. Historia de Usuario 034-SIIOC2- FLIBMINDIG.pdf (32 horas)
mm. Historia de Usuario 035-SIIOC2-FAIPARAMETRIZACION.pdf (60 horas)
nn. Historia de Usuario 036-SIIOC2- FAIGENERAL.pdf (148 horas)
oo. Historia de Usuario 037-Sprint 03-CEFUCPoligrafía.pdf (120 horas)
pp. Historia de Usuario 038-Sprint 03-ConsumoServiciosAnulacion.pdf (72 horas)
qq. Historia de Usuario 039-Sprint 03-SoluciónBDSIEFA.pdf (15 horas)
rr. Historia de Usuario 040-Sprint 03-AuditorPlus.pdf (321 horas)
ss. Historia de Usuario 042-BDOracleScript.pdf (4 horas)
tt. Historia de Usuario 044-Sprint 03-CEFUCTableroEstadistico.pdf (104 horas)

Total Horas Cotizadas Noviembre: 2148 horas

Acumulado Horas Cotizadas: 4135 horas

3. Se realiza entrega de desarrollos para las siguientes Historias de Usuario, así:

SEPTIEMBRE

a. Entrega HU001-01 (59 horas)
b. Entrega HU008 (16 horas)
c. Entrega HU010 (2 horas)
d. Entrega HU011 (04 horas)
e. Entrega HU003 (48 horas)
f. Entrega HU014 (30 horas)

Total Horas Entregadas Septiembre: 159 horas

OCTUBRE

g. Entrega HU001-03 (195 horas)
h. Entrega HU001-04 (122 horas)
i. Entrega Parcial HU006 (32 horas)
j. Entrega HU007 (16 horas)
k. Entrega HU013 (04 horas)
l. Entrega HU015 (161 horas)
m. Entrega HU018 (05 horas)
n. Entrega HU019 (10 horas)

Total Horas Entregadas Octubre: 545 horas

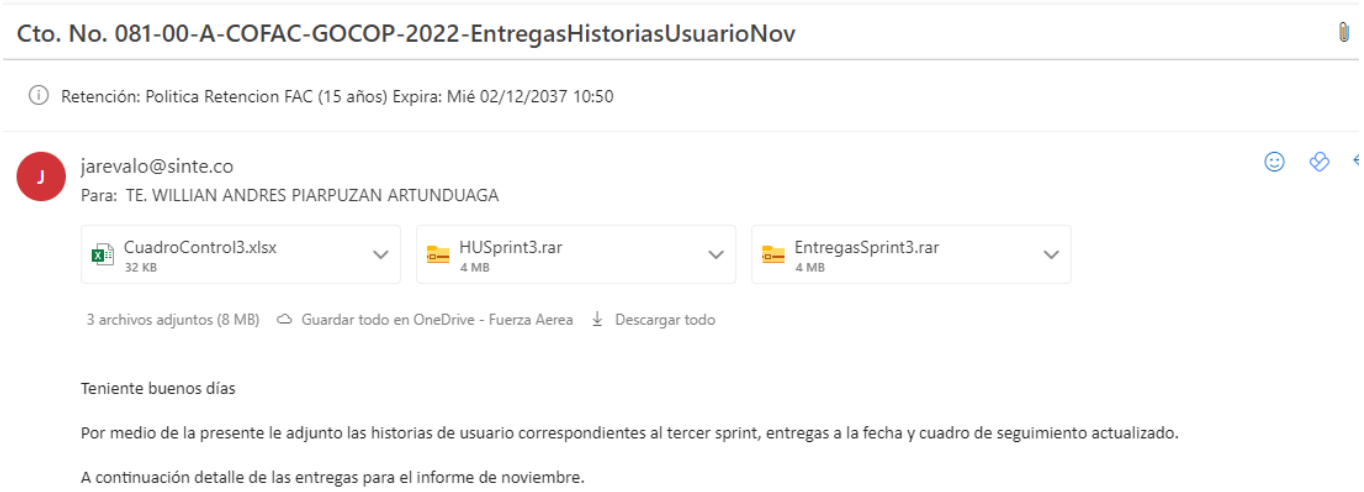
NOVIEMBRE

o. Entrega HU001-02 (146 horas)
p. Entrega HU001-05 (59 horas)
q. Entrega HU002 (32 horas)
r. Entrega HU005 (96 horas)
s. Entrega HU006-02 (40 horas)
t. Entrega HU012 (40 horas)
u. Entrega HU020 (116 horas)
v. Entrega HU021 (66 horas)
w. Entrega HU022 (264 horas)
x. Entrega HU023 (112 horas)
y. Entrega HU024 (320 horas)
z. Entrega HU025 (5 horas)
aa. Entrega HU026 (3 horas)
bb. Entrega HU028 (55 horas)
cc. Entrega HU029 (64 horas)
dd. Entrega HU030 (42 horas)
ee. Entrega HU032-01 (380 horas)
ff. Entrega HU033 (16 horas)
gg. Entrega HU034 (32 horas)
hh. Entrega HU035 (60 horas)
ii. Entrega HU036 (148 horas)
jj. Entrega HU037 (120 horas)
kk. Entrega HU039 (15 horas)
ll. Entrega HU042 (4 horas)

Total Horas Entregadas Noviembre: 2235 horas

Acumulado de Horas Entregadas: 2939 horas

Para el presente mes se recibe por vía email el Reporte Mensual de Avances y los documentos específicos de las Historias de Usuario y Entregas por parte del contratista de acuerdo a las obligaciones contractuales del anexo técnico, el cual no se anexan al presente informe de supervisión por tener información confidencial de códigos fuentes y datos de los sistemas de información de la Fuerza Aérea Colombiana.


Cto. No. 081-00-A-COFAC-GOCOP-2022-EntregasHistoriasUsuarioNov

Retención: Politica Retencion FAC (15 años) Expira: Mié 02/12/2037 10:50

jarevalo@sinte.co
Para: TE. WILLIAN ANDRES PIARPUZAN ARTUNDUAGA

CuadroControl3.xlsx 32 KB | HUSprint3.rar 4 MB | EntregasSprint3.rar 4 MB

3 archivos adjuntos (8 MB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Teniente buenos días

Por medio de la presente le adjunto las historias de usuario correspondientes al tercer sprint, entregas a la fecha y cuadro de seguimiento actualizado.

A continuación detalle de las entregas para el informe de noviembre.

Se realiza reunión el día 08/11/2022 evidenciando mayor avance en desarrollo de los requerimientos solicitados, una vez realizado el corte a fecha 30/11/2022 se ha dado cumplimiento de entrega de 2939 horas (74.59%) del total de 3940 horas (100%), es de aclarar que el contratista para este contrato asignó un plus de 300 horas adicionales siendo un total de 4240 horas de desarrollo las disponibles. De acuerdo a lo anterior y evidenciando avance en el objeto del contrato no se realizará reducción presupuestal.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Se realiza pago el día 01-11-2022 mediante Orden de Pago 348775422 para la factura FE75 por valor de $ 12.488.973
- Se encuentra pendiente se efectué giro de segundo pago con PAC Diciembre por valor de $ 42.808.115

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Está pendiente tramitar documentación (factura, acta recibo a satisfacción parcial, documentación de contratista) para pago de desarrollos realizados en noviembre y diciembre.
2. Está pendiente reuniones de seguimiento y recepciones de entregas finales del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRES
FIRMA:	
C.C. No.	1.130.620.818 DE CALI
DEPENDENCIA:	CODAF – JETIC – DIASI

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.
