INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 12 al 17 de septiembre de 2022 - Semana 10

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
9	35,00%	0,00%	11,54%	0,00%
10	38,89%	0,00%	12,46%	0,00%
11				
12				
13				
14				
15				
16				

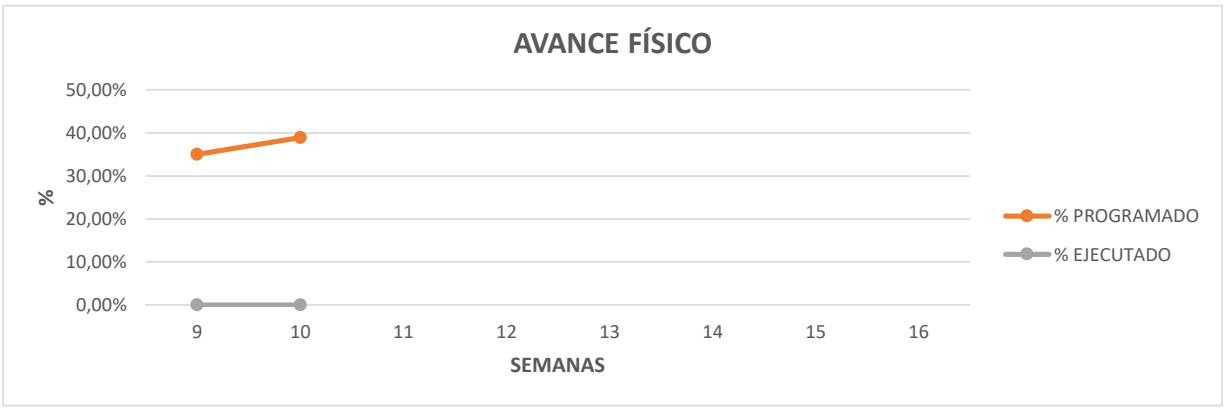

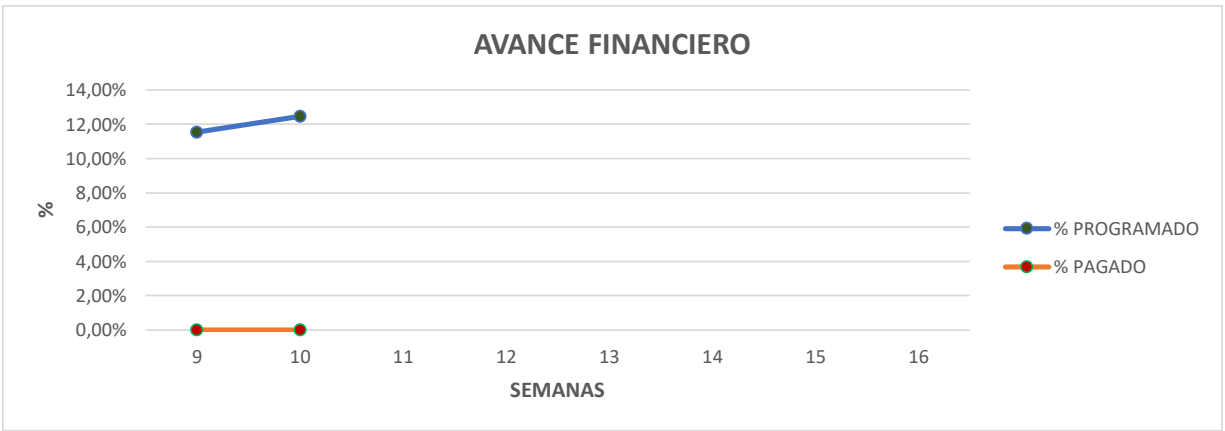

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:
El contratista continua ajustando el cronograma inicial de acuerdo a la fecha de acta de inicio, justificando los atrazos de la obra.
Se realizó una mesa de trabajo junto al contratista y la supervición del proyecto, para poder revisar avances y realizar la presentación de la nueva supervisora, la arquitecta Magaly Merchan.
Se esta avanzando en los informes semanales y mensuales atrazados, ya que la persona que se contrato para apoyo en la ejecución de las mismas por motivos personales hasta ahora logro estar disponible para actualizar la información retrasada.
3. ESTADO DEL TIEMPO :
El estado del tiempo en la categoria nublado tuvo un total de 23 horas, lluvioso 14 horas y tiempo seco 11 horas.
Las lluvias han disminuido considerablemente.
4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:
Se estuvo en un encuentro virtual para conocer los lineamientos de vigilancia en salud pública de viruela símica
con énfasis en entorno laboral.
5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:
No se ha trabajado en obra.
6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:
No se ha iniciado obra por motivo de ajustes al balance financiero y cronograma por parte del contratista y su posterior aprobación presupuestal por parte de interventoris y supervisión del proyecto. los tiempos de entrega de equipos a instalar no están en stock por los proveedores y también se continua con los tramites que están en curso ante ENEL CODENSA para la aprobación del proyecto de serie 3 de la subestación.
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
