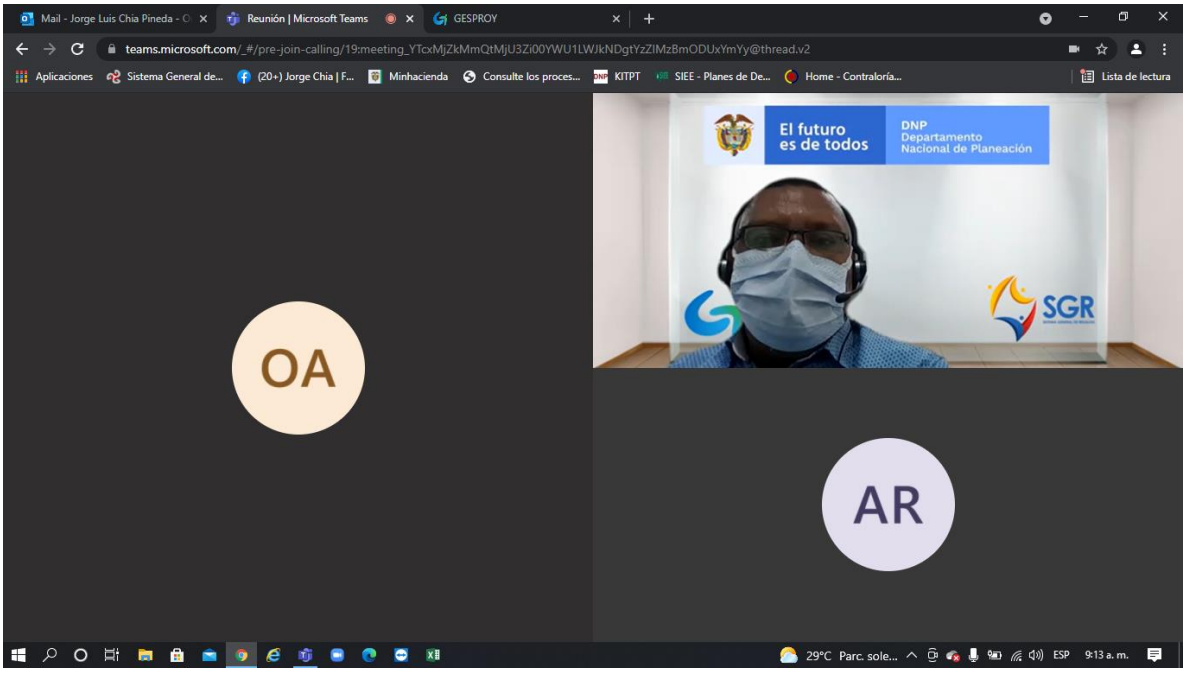
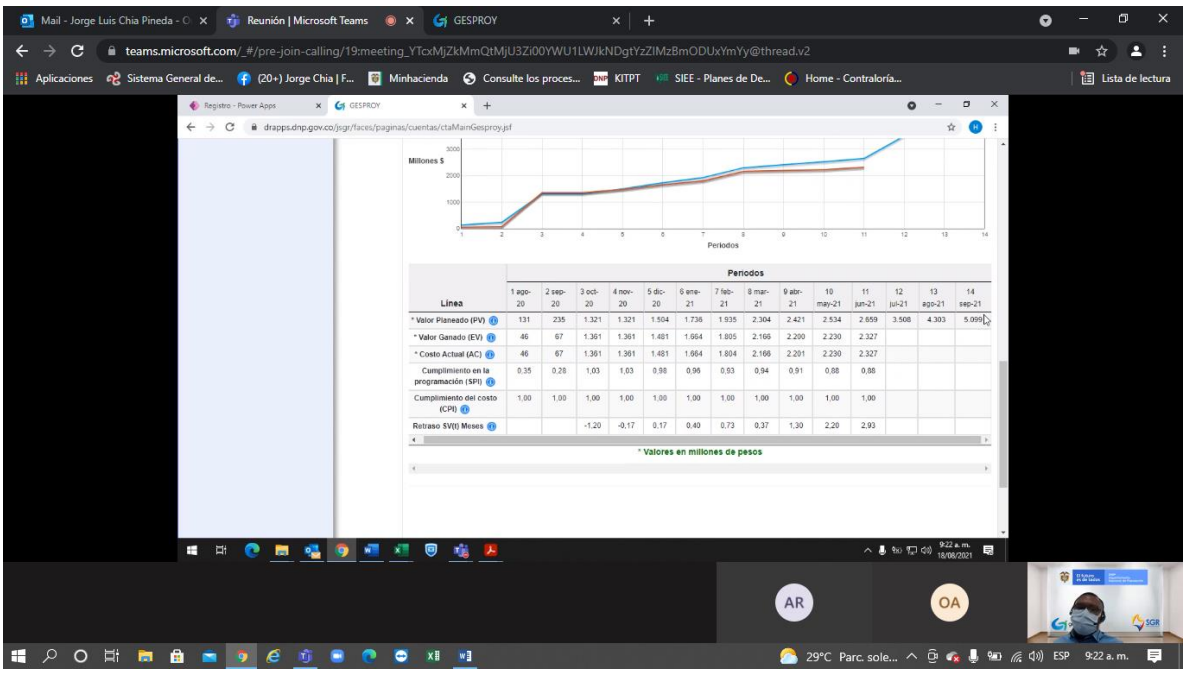
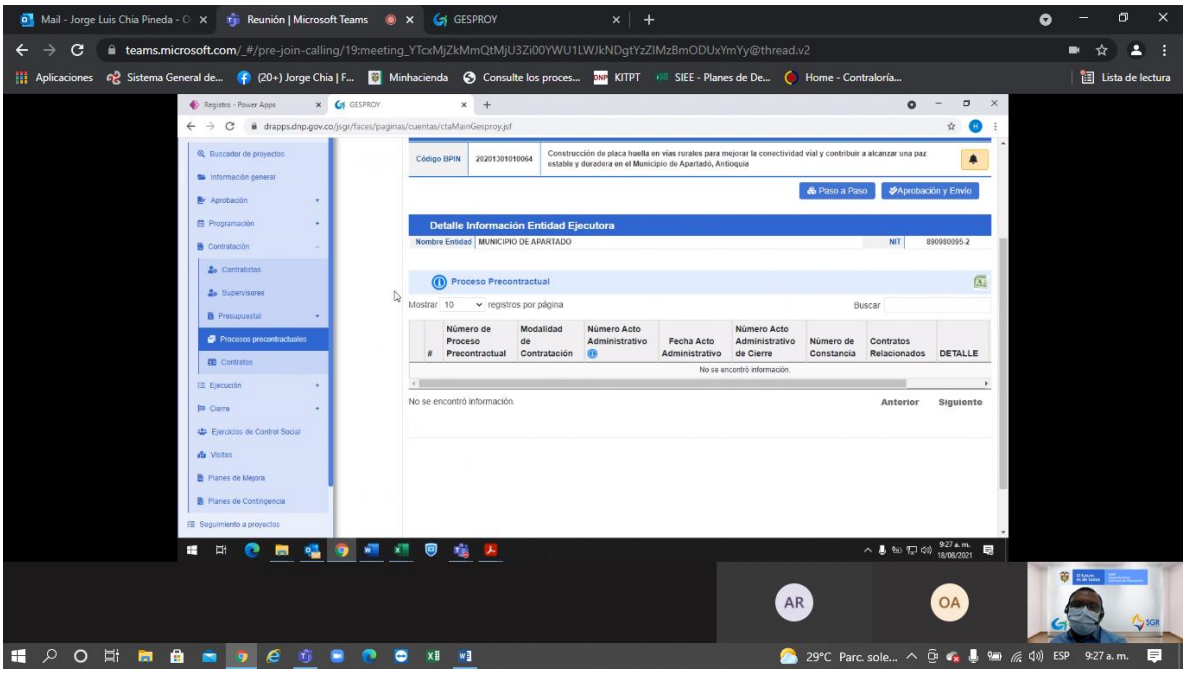
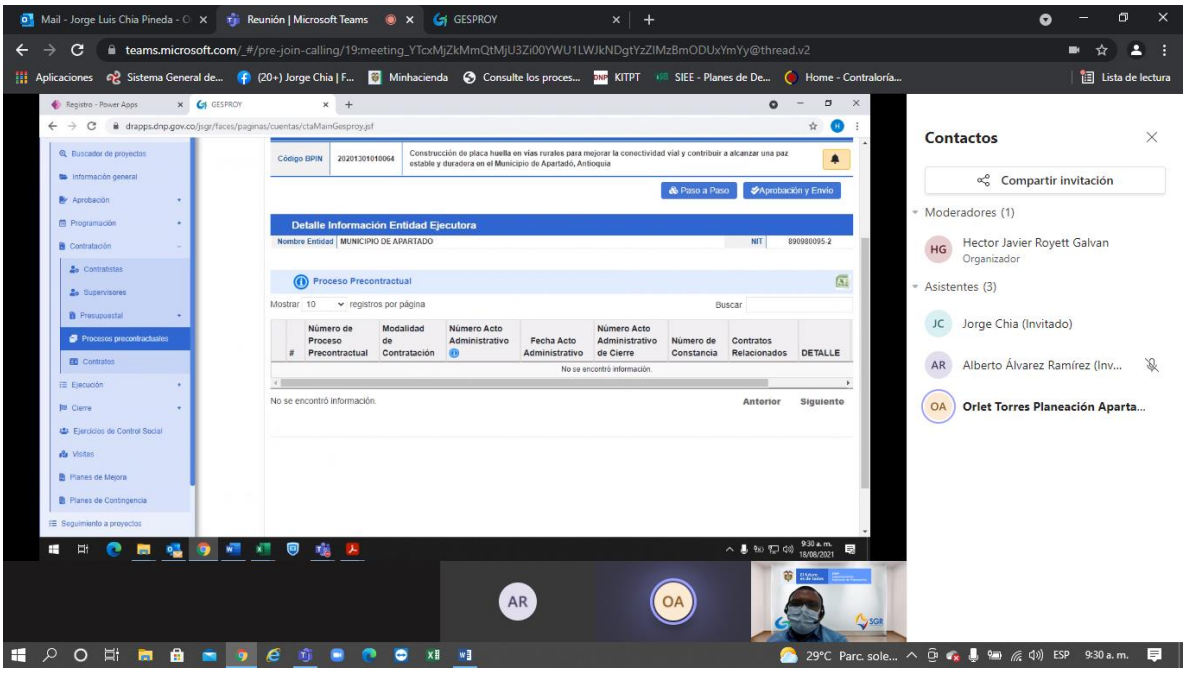
ASISTENCIA MESA TECNICA PROYECTOS REGALÍAS


Mail - Jorge Luis Chia Pineda - O
Reunión | Microsoft Teams
GESPROY
teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_YTcxMjZkMmQtMjU3Zi00YWU1LWJkNDgtYzZlMzBmODUxYmYy@thread.v2
Aplicaciones
Sistema General de...
(20+) Jorge Chia | F...
Minhacienda
Consulte los proces...
KITPT
SIEE - Planes de De...
Home - Contraloría...
Lista de lectura
El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación
SGR
OA
AR
29°C Parc. sole...
ESP
9:13 a. m.


Mail - Jorge Luis Chia Pineda - O
Reunión | Microsoft Teams
GESPROY
teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_YTcxMjZkMmQtMjU3Zi00YWU1LWJkNDgtYzZlMzBmODUxYmYy@thread.v2
Aplicaciones
Sistema General de...
(20+) Jorge Chia | F...
Minhacienda
Consulte los proces...
KITPT
SIEE - Planes de De...
Home - Contraloría...
Lista de lectura
Registro - Power Apps
GESPROY
drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Millones $
Periodos
Periodos
Línea
1 ago-20
2 sep-20
3 oct-20
4 nov-20
5 dic-20
6 ene-21
7 feb-21
8 mar-21
9 abr-21
10 may-21
11 jun-21
12 jul-21
13 ago-21
14 sep-21
* Valor Planeado (PV)
131 235 1.321 1.321 1.504 1.736 1.935 2.304 2.421 2.534 2.659 3.508 4.303 5.099
* Valor Ganado (EV)
46 67 1.361 1.361 1.481 1.664 1.805 2.166 2.209 2.230 2.327
* Costo Actual (AC)
46 67 1.361 1.361 1.481 1.664 1.804 2.166 2.201 2.230 2.327
Cumplimiento en la programación (SPI)
0,35 0,28 1,03 1,03 0,98 0,96 0,93 0,94 0,91 0,88 0,88
Cumplimiento del costo (CPI)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retraso SV(t) Meses
-1,20 -0,17 0,17 0,40 0,73 0,37 1,30 2,20 2,93
* Valores en millones de pesos
9:22 a. m.
18/08/2021
AR
OA
29°C Parc. sole...
ESP
9:22 a. m.


Mail - Jorge Luis Chia Pineda - O
Reunión | Microsoft Teams
GESPROY
teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_YTcxMjZkMmQtMjU3Zi00YWU1LWJkNDgtYzZlMzBmODUxYmYy@thread.v2
Aplicaciones
Sistema General de...
(20+) Jorge Chia | F...
Minhacienda
Consulte los proces...
KITPT
SIEE - Planes de De...
Home - Contraloría...
Lista de lectura
Registro - Power Apps
drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Código BPIN
2020130101006 4
Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE APARTADO
NIT
890980095-2
Proceso Precontractual
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Número de Proceso Precontractual
Modalidad de Contratación
Número Acto Administrativo
Fecha Acto Administrativo
Número Acto Administrativo de Cierre
Número de Constancia
Contratos Relacionados
DETALLE
No se encontró información.
Anterior
Siguiente
AR
OA
29°C Parc. sole...
ESP
9:27 a. m.


Mail - Jorge Luis Chia Pineda - O
Reunión | Microsoft Teams
GESPROY
teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_YTcxMjZkMmQtMjU3Zi00YWU1LWJkNDgtYzZlMzBmODUxYmYy@thread.v2
Aplicaciones
Sistema General de...
(20+) Jorge Chia | F...
Minhacienda
Consulte los proces...
KITPT
SIEE - Planes de De...
Home - Contraloría...
Lista de lectura
Contactos
Compartir invitación
Moderadores (1)
HG
Hector Javier Royett Galvan
Organizador
Asistentes (3)
JC
Jorge Chia (Invitado)
AR
Alberto Álvarez Ramírez (Inv...
OA
Orlet Torres Planeación Aparta...
AR
OA
29°C Parc. sole...
ESP
9:30 a. m.
